

**Dohoda o narovnání
vztahů vzniklých ze Smlouvy o dílo
č. j. KRPB-18929-26/ČJ-2022-0600VZ**

**Čl. I.
Účastníci dohody:**

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno

zastoupená

IČO:


DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní spojení:

e-mail:



(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Obchodní firma: **MENHIR projekt, s.r.o.**

sídlo: Horní 729/32, 639 00 Brno

zastoupená:

IČO:

DIČ:


bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 19907

kontaktní osoba:

e-mail:



(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně označováni jako „smluvní strany“)

uzavírají dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
tuto

**Dohodu o narovnání
vztahů vzniklých ze Smlouvy o dílo
č. j. KRPB-18929-26/ČJ-2022-0600VZ
(dále jen jako „Dohoda o narovnání“)**

Čl. II.

Předmět dohody a narovnání

2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25. 5. 2022 Smlouvu o dílo č. j.: KRPB-18929-19/ČJ-2022-0600VZ (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem plnění bylo vypracování a dodání projektové dokumentace ve stupních DBP, DUR, DSP a DPS. Rozsah a podrobný popis díla byl definován v Čl. II. „Předmět plnění“ Smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti uveřejněním v registru smluv dne 26. 5. 2022.

2.2. Doba ukončení byla stanovena v Čl. IV. „Místo a doba plnění“ Smlouvy takto:

Stupeň projektové dokumentace	Termín odevzdání PD včetně dokladové části v dnech počítaných od účinnosti smlouvy o dílo
DBP	do 60 dnů
DUR	do 250 dnů
DSP + DPS	do 340 dnů

A. Projektová dokumentace bouracích prací DBP byla zhotovitelem řádně dokončena a předána objednateli v souladu se Smlouvou o dílo dne 22. 7. 2022. O tomto předání byl vyhotoven písemně předávací protokol.

B. Doba plnění pro zpracování a odevzdání Projektové dokumentace pro území řízení DUR skončila uplynutím sjednané doby dne 31. 1. 2023.

C. Doba plnění pro zpracování a odevzdání Projektové dokumentace pro stavební povolení DSP a Projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu DPS skončila uplynutím sjednané doby dne 30. 4. 2023.

2.3. Zhotovitel rozpracoval pro objednatele před ukončením doby plnění stupně Projektové dokumentace DUR a DSP + DPS a dne 24. 4. 2023 písemně požádal objednatele o prodloužení termínu k plnění díla s uvedením důvodů (dále jen „Žádost“). S ohledem na časovou náročnost na posouzení opodstatněnosti důvodů uvedených zhotovitelem v žádosti nebylo možné zpracovat dodatek ke stávající Smlouvě o dílo v době trvání závazku ve vztahu k lhůtám plnění.

2.4. Po posouzení Žádosti objednatel přihlédl k objektivním důvodům, pro které došlo k prodloužení s termínem plnění na straně zhotovitele, za které objednatel považuje a zejména uznává:

- zhodnocení nutnosti vyhotovení statického posouzení únosnosti stěn servisní šachty výměňkové stanice KŘP Jmk,
- vyřešení majetkových poměrů se Správou železnic, který je vlastníkem pozemku – parcela č. 1370 k.ú.Veveří, Brno, dotčeného plánovanou výstavbou,
 - přesunutí elektrorozvaděče čerpací stanice kvůli dosažení maximálního zkapacitnění parkovacích ploch,
 - řešení likvidace dešťových vod, kdy BVaK nově nárokuje v zájmové oblasti maximální povolený odtok do dešťové kanalizace, a z toho důvodu je nutné navrhnout retenční nádrž s řízeným odtokem,
- změna koncepce celého dopravního řešení.

2.5. Z důvodu účelnosti a hospodárnosti se objednatel se zhotovitelem dohodl na dokončení vypracování a dodání Projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS, a to v těchto termínech pro ukončení:

Stupeň projektové dokumentace	Termín odevzdání PD včetně dokladové části
DUR	do 31. 8. 2023
DSP + DPS	do 31. 8. 2023

2.6. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že při plnění předmětu díla se budou řídit všemi ustanoveními Smlouvy o dílo č. j.: KRPB-18929-19/ČJ-2022-0600VZ ze dne 25. 5. 2022 – Čl. I. - Čl. XII. Smlouvy o dílo, kromě změn učiněných touto Dohodou o narovnání.

2.7. Pro vyloučení jakýkoliv pochybností se k podstatným náležitostem smluvních ujednání uvádí, že „Cena za dílo“ a jednotlivé části, jakožto výše smluvních pokut, byla sjednána ve Smlouvě o dílo a jejich výše zůstává nezměněna:

**2.7.1. Celková cena činí: bez DPH 820.000,-- Kč,
včetně DPH 992.200,-- Kč**

slovy: devětsetdevadesátdvatisícdvěstěkorunčeských.


DPH činí 21%


(za sjednanou cenu se považuje cena včetně DPH).

Cena za jednotlivé části činí:


Předmět VZ:	Cena bez DPH v Kč	DPH v %	Cena včetně DPH v Kč
A. Projektová dokumentace bouracích prací DBP	131.000,-	21%	158.510,- = uhrazená
B. Projektová dokumentace pro územní řízení DUR	115.000,-	21%	139.150,-
C. Projektová dokumentace pro stavební povolení DSP	275.000,-	21%	332.750,-
D. Projektová dokumentace provedení stavby DPS	299.000,-	21%	361.780,-
Cena celkem:	820.000,-	21%	992.200,-

2.7.2. Sankce a pokuty:

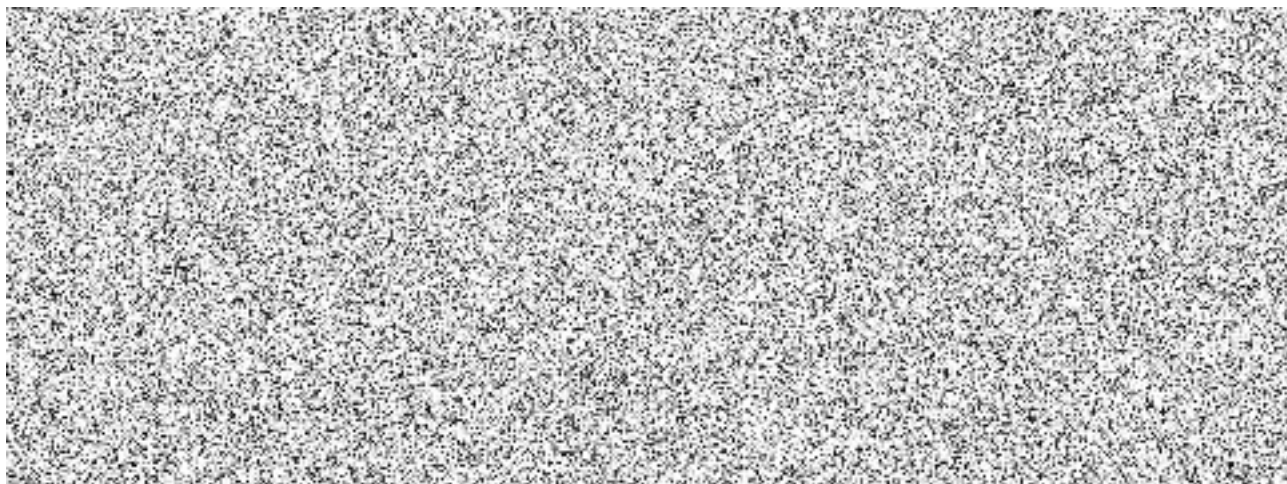




Čl. III. Smluvní pokuta



Čl. IV. Společná a závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.2.** Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto dohodu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah dohody za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření dohody rozhodující.
- 4.3.** Pokud není v této dohodě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 4.4.** Strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této dohody, jakož i dalších skutečností souvisejících se smluvním vztahem založeným touto dohodou, a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně podle jiných předpisů.
- 4.5.** Tato dohoda podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Strany prohlašují, že dohoda neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.
- 4.6.** Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto dohodu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou dohodu druhé smluvní straně.
- 4.7.** Tato dohoda obsahuje 4 (slovy: čtyři) strany textu.

Podepsáno elektronicky:



Podepsáno elektronicky:

