

# Příloha č. 1

## k Prováděcí smlouvě č. 20 „Vývoj aplikace ADIS – Legislativní změny -Konsolidační balíček“

### Rozsah Služeb, Cena a časový harmonogram

Tato Příloha č. 1 specifikuje rozsah Služeb vývoje aplikace ADIS v souvislosti s legislativními změnami dle čl. 1. Účel a předmět prováděcí smlouvy základní části této Prováděcí smlouvy, jejich Cenu a časový harmonogram plnění.

#### 1. ROZSAH SLUŽEB

Rozsah Služeb poskytovaných dle této Prováděcí smlouvy je uveden v člancích 3. *Definice dílčích aplikací a jejich ceny* a 5. *Předávání dokumentace* této Přílohy č. 1.

#### 2. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram Plnění dle této Prováděcí smlouvy vychází ze schválených harmonogramů distribučních termínů KM1c, KO1, KP1, KQ1 a KR1, které jsou uvedeny v čl. 2.3 *Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS* této Přílohy č. 1.

##### 2.1 Definice fakturačních termínů

Definice jednotlivých kroků (zejména SAZ, PTP a CNV) daného distribučního termínu jsou uvedeny ve Smlouvě, Příloha č. 1, čl. 4 (*Vývojový cyklus Aplikace ADIS – hlavní verze*). Pro přehlednost jsou též uvedeny v následující tabulce:

Krok	Popis kroku distribučního termínu
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování
CNV	Celoplošné nasazení verze

##### 2.2 Fakturační termíny a jejich kroky

Fakturační termín je určen jednak distribučním termínem a dále příslušným krokem tohoto distribučního termínu.

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc /rok	Definice fakturačního termínu
SAZ / KM1c	10 / 2023	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín KM1c
PTP / KM1c	12 / 2023	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín KM1c
CNV / KM1c	01 / 2024	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín KM1c

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc /rok	Definice fakturačního termínu
SAZ / KO1	10 / 2023	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín KO1
PTP / KO1	01 / 2024	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín KO1
CNV / KO1	02 / 2024	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín KO1
SAZ / KP1	10 / 2023	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín KP1
PTP / KP1	02 / 2024	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín KP1
CNV / KP1	03 / 2024	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín KP1
SAZ / KQ1	01 / 2024	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín KQ1
PTP / KQ1	04 / 2024	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín KQ1
CNV / KQ1	05 / 2024	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín KQ1
SAZ / KR1	02 / 2024	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín KR1
PTP / KR1	05 / 2024	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín KR1
CNV / KR1	06 / 2024	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín KR1

### 2.3 Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS

Skupiny úloh definované v článku 3.1 *Konsolidační balíček* této Přílohy č. 1 budou realizovány v rámci distribučních termínů KM1c, KO1, KP1, KQ1 a KR1, jejichž harmonogramy jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro jednotlivé harmonogramy se budou provádět pouze ty kroky vývojového cyklu ADIS, které jsou v těchto tabulkách uvedeny (tj. kroky v tabulce neuvedené se pro příslušný distribuční termín nepoužijí).

Kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, jsou zvýrazněny tučným písmem.

Pro harmonogramy dle této Prováděcí smlouvy platí, že uvádějí termíny kroků, které jsou platné v případě, že tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti do 01. 09. 2023 včetně, Pokud tato Prováděcí smlouva nabude později než 01. 09. 2023, posunou se všechny kroky harmonogramů o počet pracovních dnů, které uplynou od 01. 09. 2023 do data nabytí účinnosti této Prováděcí smlouvy. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun je určen počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramů je určeno počtem pracovních dnů.

Obě Smluvní strany se mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy písemně dohodnout na posunu či úpravě harmonogramů. Dřívější, než plánované splnění jednotlivých kroků je možné.

<b>Harmonogram distribučního termínu KM1c</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 01.09.2023	po 18.09.2023
S	Termín S	po 18.09.2023	-
PAZ	Příprava analytického zadání	út 19.09.2023	pá 29.09.2023
APŘ	Analytická prezentace řešení	út 19.09.2023	pá 29.09.2023
Z	Termín Z	pá 29.09.2023	-
<b>SAZ</b>	<b>Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu</b>	<b>pá 06.10.2023</b>	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	po 09.10.2023	pá 13.10.2023
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	po 16.10.2023	po 16.10.2023
TDK	Testy dílčích konverzí	út 17.10.2023	pá 20.10.2023
ITV	Integrace testovací verze	po 23.10.2023	po 23.10.2023
ITA	Interní testování aplikace	út 24.10.2023	út 24.10.2023
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	út 24.10.2023	út 24.10.2023
PPT	Předprezentační testování	st 25.10.2023	st 25.10.2023
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	čt 26.10.2023	čt 26.10.2023
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	pá 27.10.2023	st 08.11.2023
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	čt 09.11.2023	-
TVZ	Testování verze u zákazníka - jako II. testovací verze M1	pá 10.11.2023	pá 24.11.2023
UTE	Ukončení testování testovací verze	pá 24.11.2023	-
<b>PTP</b>	<b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b>	<b>pá 01.12.2023</b>	-
POV	Příprava ostré verze	po 27.11.2023	st 29.11.2023
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	čt 30.11.2023	pá 08.12.2023
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	po 11.12.2023	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	st 13.12.2023	po 18.12.2023
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	út 19.12.2023	út 02.01.2024
<b>CNV</b>	<b>Celoplošné nasazení verze</b>	<b>út 02.01.2024</b>	-

<b>Harmonogram distribučního termínu KO1</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 01.09.2023	po 18.09.2023
S	Termín S	po 18.09.2023	-
PAZ	Příprava analytického zadání	út 19.09.2023	st 18.10.2023
APŘ	Analytická prezentace řešení	čt 12.10.2023	st 18.10.2023
Z	Termín Z	st 18.10.2023	-
<b>SAZ</b>	<b>Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu</b>	<b>st 25.10.2023</b>	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	čt 26.10.2023	st 15.11.2023
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	čt 16.11.2023	čt 16.11.2023
TDK	Testy dílčích konverzí	po 20.11.2023	st 29.11.2023
ITV	Integrace testovací verze	čt 30.11.2023	čt 30.11.2023
ITA	Interní testování aplikace	pá 01.12.2023	pá 01.12.2023
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	pá 01.12.2023	pá 01.12.2023
PPT	Předprezentační testování	po 04.12.2023	po 04.12.2023
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	út 05.12.2023	út 05.12.2023
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	st 06.12.2023	čt 14.12.2023
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	pá 15.12.2023	-

<b>Harmonogram distribučního termínu KO1</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
TVZ	Testování verze u zákazníka	po 18.12.2023	út 09.01.2024
UTE	Ukončení testování testovací verze	út 09.01.2024	-
<b>PTP</b>	<b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b>	<b>út 16.01.2024</b>	-
POV	Příprava ostré verze	st 10.01.2024	po 15.01.2024
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	út 16.01.2024	út 23.01.2024
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	st 24.01.2024	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	pá 26.01.2024	pá 26.01.2024
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	čt 01.02.2024	čt 15.02.2024
<b>CNV</b>	<b>Celoplošné nasazení verze</b>	<b>čt 15.02.2024</b>	-

<b>Harmonogram distribučního termínu KP1</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 01.09.2023	po 18.09.2023
S	Termín S	po 18.09.2023	-
PAZ	Příprava analytického zadání	út 19.09.2023	st 18.10.2023
APŘ	Analytická prezentace řešení	čt 05.10.2023	st 18.10.2023
Z	Termín Z	st 18.10.2023	-
<b>SAZ</b>	<b>Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu</b>	<b>st 25.10.2023</b>	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	čt 26.10.2023	čt 30.11.2023
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	pá 01.12.2023	pá 01.12.2023
TDK	Testy dílčích konverzí	po 04.12.2023	út 02.01.2024
ITV	Integrace testovací verze	st 03.01.2024	st 03.01.2024
ITA	Interní testování aplikace	čt 04.01.2024	čt 04.01.2024
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	čt 04.01.2024	čt 04.01.2024
PPT	Předprezentační testování	pá 05.01.2024	pá 05.01.2024
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	po 08.01.2024	út 09.01.2024
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	st 10.01.2024	po 22.01.2024
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	út 23.01.2024	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	st 24.01.2024	čt 08.02.2024
UTE	Ukončení testování testovací verze	čt 08.02.2024	-
<b>PTP</b>	<b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b>	<b>čt 15.02.2024</b>	-
POV	Příprava ostré verze	pá 09.02.2024	st 14.02.2024
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	čt 15.02.2024	pá 23.02.2024
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	po 26.02.2024	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	st 28.02.2024	čt 29.02.2024
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	út 05.03.2024	út 19.03.2024
<b>CNV</b>	<b>Celoplošné nasazení verze</b>	<b>út 19.03.2024</b>	-

<b>Harmonogram distribučního termínu KQ1</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 01.09.2023	st 29.11.2023
S	Termín S	st 29.11.2023	-
PAZ	Příprava analytického zadání	čt 30.11.2023	po 08.01.2024

<b>Harmonogram distribučního termínu KQ1</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
APŘ	Analytická prezentace řešení	čt 21.12.2023	po 08.01.2024
Z	Termín Z	po 08.01.2024	-
<b>SAZ</b>	<b>Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu</b>	<b>po 15.01.2024</b>	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	út 16.01.2024	po 12.02.2024
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	út 13.02.2024	út 13.02.2024
TDK	Testy dílčích konverzí	st 14.02.2024	čt 07.03.2024
ITV	Integrace testovací verze	pá 08.03.2024	pá 08.03.2024
ITA	Interní testování aplikace	po 11.03.2024	po 11.03.2024
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	po 11.03.2024	po 11.03.2024
PPT	Předprezentační testování	út 12.03.2024	út 12.03.2024
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	st 13.03.2024	čt 14.03.2024
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	pá 15.03.2024	st 27.03.2024
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	čt 28.03.2024	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	út 02.04.2024	po 15.04.2024
UTE	Ukončení testování testovací verze	po 15.04.2024	-
<b>PTP</b>	<b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b>	<b>po 22.04.2024</b>	-
POV	Příprava ostré verze	út 16.04.2024	čt 18.04.2024
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	pá 19.04.2024	po 29.04.2024
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	út 30.04.2024	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	čt 02.05.2024	pá 03.05.2024
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	čt 09.05.2024	čt 23.05.2024
<b>CNV</b>	<b>Celoplošné nasazení verze</b>	<b>čt 23.05.2024</b>	-

<b>Harmonogram distribučního termínu KR1</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 01.09.2023	po 15.01.2024
S	Termín S	po 15.01.2024	-
PAZ	Příprava analytického zadání	út 16.01.2024	po 19.02.2024
APŘ	Analytická prezentace řešení	út 06.02.2024	po 19.02.2024
Z	Termín Z	po 19.02.2024	-
<b>SAZ</b>	<b>Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu</b>	<b>po 26.02.2024</b>	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	út 27.02.2024	čt 28.03.2024
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	út 02.04.2024	út 02.04.2024
TDK	Testy dílčích konverzí	st 03.04.2024	čt 18.04.2024
ITV	Integrace testovací verze	pá 19.04.2024	pá 19.04.2024
ITA	Interní testování aplikace	po 22.04.2024	po 22.04.2024
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	po 22.04.2024	po 22.04.2024
PPT	Předprezentační testování	út 23.04.2024	út 23.04.2024
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	st 24.04.2024	čt 25.04.2024
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	pá 26.04.2024	út 07.05.2024
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	čt 09.05.2024	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	pá 10.05.2024	út 21.05.2024
UTE	Ukončení testování testovací verze	út 21.05.2024	-
<b>PTP</b>	<b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b>	<b>út 28.05.2024</b>	-

<b>Harmonogram distribučního termínu KR1</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
POV	Příprava ostré verze	st 22.05.2024	po 27.05.2024
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	út 28.05.2024	st 05.06.2024
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	čt 06.06.2024	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	po 10.06.2024	út 11.06.2024
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	čt 13.06.2024	čt 27.06.2024
<b>CNV</b>	<b>Celoplošné nasazení verze</b>	<b>čt 27.06.2024</b>	-

### 3. DEFINICE DÍLČÍCH APLIKACÍ A JEJICH CENY

V následující tabulce je uveden seznam dílčích aplikací (Dílčích plnění) tvořících předmět plnění této Prováděcí smlouvy, s uvedením dílčích distribučních termínů, cen a pracností.

Číslování dílčích aplikací je až 3úrovňové:

- první dvojčíslí značí **aplikační oblast**: 01.xx, 02.xx, 01.xx.yy, 02.xx.yy, ... Např. 02.00 je aplikační oblast DAD Obecná správa daní,
- druhé nenulové dvojčíslí značí **skupinu úloh** v dané aplikační oblasti, tj. dílčí plnění, které má přiřazen společný distribuční termín, celkovou cenu a celkovou pracnost,
- třetí dvojčíslí pak značí **dílčí úlohu** dané skupiny úloh.

Pro jednotlivé skupiny úloh je uvedena dohodnutá pracnost služeb „Úpravy ADIS dle specifikace“ v člověkodnech (MD = Manday), kterou dále v tomto článku označujeme „**P**“.

Z této pracnosti **P** je spočítána cena každé skupiny úloh se započtením služeb „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“ dle článku 2.2 (*Cena a platební podmínky*) Přílohy 4 Smlouvy následujícím způsobem:

$$\text{cena skupiny úloh v Kč bez DPH} = P * 12\,985,75 + P * 0,1 * 16\,820,13$$

Cena za položku „Dokumentace“ v níže uvedené tabulce představuje aktualizaci následujících Materiálů v návaznosti na Dílčí plnění:

- analytických zadání,
- uživatelské příručky ADIS,
- distribučních listů jednotlivých verzí ADIS,
- datových modelů databází ADIS.

Veškeré Materiály dokumentace ADIS jsou předávány v nematerializované podobě jako soubory, reference na tyto soubory v aplikaci SŘA a reference na fyzické servery SŘA, na kterých jsou tyto informace uloženy, pokud nebude dohodnuto jinak, v souladu s čl. 5. *Předávání dokumentace* této Přílohy 1.

Zkratka DT v následující tabulce (i dále v této Příloze 1) značí Distribuční termín.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

### 3.1 Konsolidační balíček

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
	<b>Dokumentace</b>	<b>KR1</b>				
<b>01.00</b>	<b>EDA Evidence daní</b>					
<b>01.01</b>	<b>Automatizace převádění plateb pomocí hromadných řádků - úpravy pro nové DP DHH</b>	<b>KO1</b>	<b>HL202302955</b>			
01.01.01	Úprava Přikazování PLP do ČNB - úpravy ve výběru PLP pro médium do ČNB (hromadný řádek do ČNB)					
01.01.02	Tvorba soupisů daně z hazardu pro média do ČNB, včetně prohlížení PLP jimi tvořenými					
01.01.03	Zpracování úprav do evidence Soupisy za účelem použití i pro daň z hazardu					
01.01.04	Úpravy v nahrávání hromadných řádků pro převody plateb daně z hazardních her - generování detailních PLV při zpracování média z ČNB/zpracování bankovních výpisů					
01.01.05	Zpracování úprav při výběru kladné PLV k doplňku PLP pro daň z hazardu					
<b>01.08</b>	<b>Zpracování ODÚ – úpravy v souvislosti se zrušením PP</b>	<b>KP1</b>				
01.08.01	Úpravy výběrů pro společně zprac ODÚ evidovaných pro VČP PP společně s ODÚ zřizovatele					
01.08.02	Úpravy prohlížení pro společně zprac ODÚ evidovaných pro VČP PP společně s ODÚ zřizovatele					
01.08.03	Úpravy funkcí pro zmrazení, rušení ODÚ pro společně zprac ODÚ evidovaných pro VČP PP společně s ODÚ zřizovatele					
01.08.04	Úpravy funkcí pro zobrazení detailních informací o ODÚ pro společně zprac ODÚ evidovaných pro VČP PP společně s ODÚ zřizovatele					
01.08.05	Úpravy funkcí pro zobrazení souhrnných informací o ODÚ pro společně zprac ODÚ evidovaných pro VČP PP společně s ODÚ zřizovatele					
01.08.06	Promítnutí změn do společných funkcí pro ODÚ zobrazovaných pro daňové subjekty a druhy příjmu průřezově po klávesách CTRL-N					
<b>01.09</b>	<b>Zpracování ODÚ – úpravy v souvislosti s novými DP DHH</b>	<b>KP1</b>				
01.09.01	Zakládání ODÚ pro druhy příjmu daně z hazardu - úpravy pro nové DP DHH					





Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
01.09.02	Funkce pro zmrazení, rušení ODÚ pro druhy příjmu daně z hazardu - úpravy pro nové DP DHH					
01.09.03	Funkce pro zobrazení detailních informací o ODÚ pro druhy příjmu daně z hazardu - úpravy pro nové DP DHH					
01.09.04	Výběr a zobrazení souhrnných informací na ODÚ pro druhy příjmu daně z hazardu - úpravy pro nové DP DHH					
01.09.05	Promítnutí změn do společných funkcí pro ODÚ zobrazovaných pro daňové subjekty a druhy příjmu průřezově po klávesách CTRL-N					
01.09.06	Funkcí pro dávkové zmrazení, rušení ODÚ pro druhy příjmu daně z hazardu - úpravy pro nové DP DHH					
01.09.07	Funkce pro zakládání vazby DSDP pro druhy příjmu daně z hazardu - úpravy pro nové DP DHH					
<b>01.10</b>	<b>Výpisy stavů ODÚ - zpracování změn pro druhy příjmu daně z hazardu</b>	<b>KR1</b>				
01.10.01	Tvary pro odpis - zohlednění možné existence odpisu na jiném DP DHH - úpravy pro nové DP DHH					
01.10.02	Tvary pro posečkání - zohlednění možné existence posečkání na jiném DP DHH - úpravy pro nové DP DHH					
01.10.03	Tvary pro "daň.Sub. s přeplatky. a nedopl." - zohlednění možné existence více DP DHH - úpravy pro nové DP DHH					
<b>01.12</b>	<b>Výpisy ODÚ - zpracování změn pro druhy příjmu daně z hazardu</b>	<b>KR1</b>				
01.12.01	Zohlednění nových DP DHH při zadání DP DHH do podmínky pro výběr DP					
<b>02.00</b>	<b>DAD Obecná správa daní</b>					
<b>02.01</b>	<b>Úprava párování DPZ a DPS - zavedení párování ODÚ zřizovatele PP a ODÚ PP DP 71, 771, 772 v souvislosti se zrušením PP</b>	<b>KO1</b>	<b>HL202302951</b>			
02.01.01	Zavedení souběžného zpracování více ODÚ (zřizovatel/PP) ve výběru ODÚ pro párování					
02.01.02	Zavedení souběžného zpracování více ODÚ (zřizovatel/PP) ve vlastním párování					
02.01.03	Zavedení souběžného zpracování více ODÚ (zřizovatel/PP) ve vybraných předkolech párování					





Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
02.01.04	Zajištění správného párování POV na úrok z prodlení pro více ODÚ (zřizovatel/PP) s ohledem na vymáhání (uhrazovací pořadí)					
02.01.05	Zajištění správného párování POV z rozhodnutí o PPO pro více ODÚ (zřizovatel/PP) s příslušnými posečkanými/prominutými/odepsanými POV					
02.01.06	Zajištění správného párování pro více ODÚ (zřizovatel/PP) při pozbytí účinnosti rozhodnutí o posečkání					
02.01.07	Vytváření PŘD a PLV podle vazeb z fiktivního párování pro více ODÚ (zřizovatel/PP), pevné vazby					
02.01.08	Zavedení současného zpracování více ODÚ (zřizovatel/PP) v rušení párování					
02.01.09	Zavedení současného zpracování více ODÚ (zřizovatel/PP) v ručním párování					
02.01.10	Úprava volby Prohlížení pro zobrazení zřizovatele a příslušných PP					
02.01.11	Zavedení "pevných" vazeb před 1.1.2024 a možnost přepárování jednotlivých ODÚ (zřizovatel/PP), konverze					
02.01.12	Zajištění správného nastavení a vyhodnocování příznaku spárovanosti pro zpracování více ODÚ (zřizovatel/PP)					
02.01.13	Výpisy párování - úprava pro více ODÚ (zřizovatel/PP)					
02.01.14	Automatické párování - vyřazení PP z výběru a párování v rámci ODÚ zřizovatele					
02.01.15	Zavedení současného zpracování více ODÚ (zřizovatel/PP) ve fiktivním párování					
02.01.16	Zavedení současného zpracování více ODÚ (zřizovatel/PP) do funkcí pro nastavení příznaku pro přepárování ODÚ					
<b>02.02</b>	<b>Potvrzení o tzv. bezdlužnosti a stavu ODÚ - v souvislosti se zrušením PP</b>	<b>KP1</b>	<b>HL202302951</b>			
02.02.01	Zpracování změn do vložení potvrzení o stavu ODÚ pro PP					
02.02.02	Zpracování změn kontrol a zobrazení pro FÚ z CRDS pro PP					
02.02.03	Zpracování změn řádků potvrzení o stavu ODÚ – výpočet zůstatků za ODÚ Zřizovatel a PP					






Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
02.02.04	Zpracování změn výběru a zobrazení jednotlivých nedoplatků o stavu ODÚ - výběr a zobrazení ODÚ Zřizovatel a PP					
02.02.05	Úprava jednotlivých tiskových tvarů potvrzení pro ODÚ Zřizovatel a PP					
02.02.06	Zpracování změn do sam. zpracování řádků o stavu ODÚ pro ODÚ Zřizovatel a PP					
02.02.07	Kontrola na spárovanost mezi ODÚ Zřizovatel a PP					
02.02.08	Kontrola nezaúčtovaných POV z posečkáni, kontrola na zúčtení ODÚ, kontrola přeplatků a nedoplatků mezi ODÚ Zřizovatel a PP					
02.02.09	Zpracování souvisejících změn do programu pro zprac. odpovědi na stavy ODÚ pro ODÚ Zřizovatel a PP					
<b>02.03</b>	<b>Převádění a vracení přeplatků - v souvislosti se zrušením PP</b>	<b>KP1</b>	<b>HL202302951</b>			
02.03.01	Zpracování žádostí poplatníka i žádostí jiného správce – omezení vložení žádosti pro VČP PP					
02.03.02	Zpracování žádostí poplatníka – úpravy v akci Vystav PLP pro vyhodnocování stavu ODÚ evidovaných pro VČP PP společně s ODÚ zřizovatele					
02.03.03	Zpracování ROP – omezení vložení žádosti pro VČP PP					
02.03.04	Zpracování ROP – úpravy v akci Generuj PLP pro vyhodnocování stavu ODÚ evidovaných pro VČP PP společně s ODÚ zřizovatele					
02.03.05	Zpracování PLP – určení poplatníka, kterému se má vracet při pořízení PLP pro VČP PP či zřizovatele					
02.03.06	Zpracování PLP – určení stavu ODÚ evidovaných pro VČP PP společně s ODÚ zřizovatele					
<b>02.04</b>	<b>Úprava úročení DPZ a DPS v souvislosti se zrušením PP</b>	<b>KO1</b>	<b>HL202302951</b>			
02.04.01	Úročení - podpora výběrů a kontrol v souvislosti s rušením PP					
02.04.02	Vyrozumění o úroku z prodlení - podpora výběrů a kontrol v souvislosti s rušením PP					
02.04.03	Vyrozumění o úroku z prodlení - tisk hlavičky v souvislosti s rušením PP					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
<b>02.05</b>	<b>PPO - změny v souvislosti se zrušením PP</b>	<b>KQ1</b>	<b>HL202302951</b>			
02.05.01	Zpracování změn ve zpracování Rozhodnutí o posečkání a dalších rozhodnutí pro ODÚ Zřizovatel a PP – změna výběru Rozhodnutí, kontroly PP					
02.05.02	Úprava tiskových tvarů rozhodnutí pro ODÚ Zřizovatel a PP					
02.05.03	Úprava přepisování úroku z posečkání, hlídání hranice 1000 Kč					
02.05.04	Vyrozumění o úroku z posečkání - podpora výběrů a kontrol v souvislosti s rušením PP					
02.05.05	Vyrozumění o úroku z posečkání - tisk hlavičky v souvislosti s rušením PP					
<b>02.06</b>	<b>Předpisy - změny v souvislosti se zrušením PP</b>	<b>KO1</b>	<b>HL202302951</b>			
02.06.01	Zpracování POV V DAD – úpravy kontrol pro vkládání/aktualizaci POV pro čísla DS=PP pro neuatomatizované DP					
<b>02.07</b>	<b>DIS+ - změny ve vynášení a zobrazování termínů povinností pro ODK v souvislosti se zrušením PP</b>	<b>KO1</b>	<b>HL202302951</b>			
02.07.01	Vyblokování PP z termínů pro podání					
02.07.02	Vyblokování PP z termínů pro placení záloh					
02.07.03	Termíny splatnosti PP vynášet od 1.1.2024 do ODK zřizovatele					
<b>02.801</b>	<b>DHH - párování předpisů a plateb</b>	<b>KP1</b>	<b>HL202302952</b>			
02.801.01	Zpracování nových DP do výběru, listování, kontrol					
02.801.02	Zpracování nových DP do ručního párování					
02.801.03	Zpracování nových DP do tvorby PLV/PLP pro převod mezi DP DHH					
02.801.04	Zpracování nových DP do nastavování příznaku pro přepárování ODÚ					
02.801.05	Zpracování nových DP do tvorby a rušení pevných vazeb "DHH"					
02.801.06	Zpracování nových DP do volání úročení k datu poslední úhrady za ZO					
02.801.07	Zpracování nových DP do triggerů pro nastavení příznaků pro přepárování ODÚ					
02.801.08	Ošetření nových DP ve výpisech z párování					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
<b>02.802</b>	<b>DHH - automatické párování předpisů a plateb</b>	<b>KP1</b>	<b>HL202302952</b>			
02.802.01	Zpracování nových DP do zpracování automatického párování					
02.802.02	Zpracování nových DP do zpracování parametrů spuštění aut. párování					
02.802.03	Zpracování nových DP do protokolů o spuštění aut. párování					
02.802.04	Zpracování nových DP do výpisů z aut. párování					
02.802.05	Zpracování nových DP do generování avíz pro nezpracované ODÚ DHH					
<b>02.803</b>	<b>DHH - fiktivní párování předpisů a plateb, funkce pro párování</b>	<b>KP1</b>	<b>HL202302952</b>			
02.803.01	Zpracování nových DP do fiktivního párování					
02.803.02	Zpracování nových DP do funkcí pro tvorbu souboru s výpisem párování					
02.803.03	Zpracování nových DP do funkcí pro nastavení příznaku pro přepárování ODÚ					
<b>02.901</b>	<b>DHH - úrok z prodlení</b>	<b>KP1</b>	<b>HL202302952</b>			
02.901.01	Zpracování nových DP do výběru, listování, kontrol					
02.901.02	Zpracování nových DP do algoritmů úročení, vyblokování úroku při pozbytí účinnosti rozhodnutí o posečkání					
02.901.03	Zpracování nových DP do předepisování úroku na DP 460 a rušení předepsání					
02.901.04	Zpracování nových DP do funkce na určování ZO					
02.901.05	Zpracování nových DP do funkcí z úročení (vystavený úrok, předepsaný úrok, přeřazení úroku, prominutý úrok, výpis informací z úročení, výpis informací o POV na úrok)					
02.901.06	Zpracování nových DP do výpisu podkladů pro úrok z prodlení					
02.901.07	Zpracování nových DP do výpisu vět na úrok z prodlení					
02.901.08	Zpracování nových DP do výpisu POV s neukončeným úrokem z prodlení - 3 tvary					
02.901.09	Zpracování nových DP do výpisu spočítaných a předepsaných úroků z prodlení - tvary					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
02.901.10	Zpracování nových DP do výpisu ODÚ s úrokem do minimální výše					
02.901.11	Zpracování nových DP do výpisu vazeb POV na úrok - 2 tvary					
02.901.12	Zpracování nových DP do výpisu evidence pořízených přeplatků					
02.901.13	Zpracování nových DP do statistik pro úrok z prodlení					
02.901.14	Zpracování nových DP do logických kontrol na úrok (7 kontrol) a kontroly t_v_urok					
<b>02.902</b>	<b>DHH - Vyrozumění o úroku z prodlení</b>	<b>KP1</b>	<b>HL202302952</b>			
02.902.01	Zpracování nových DP do zpracování vyrozumění					
02.902.02	Zpracování nových DP do tisku vyrozumění					
02.902.03	Ošetření nových DP ve výpisech vyrozumění o úroku z prodlení					
<b>02.903</b>	<b>DHH - automatické předepsání úroku z prodlení</b>	<b>KP1</b>	<b>HL202302952</b>			
02.903.01	Zpracování nových DP do zpracování automatického předepsání úroku z prodlení					
02.903.02	Zpracování nových DP do zpracování parametrů spuštění aut. předepsání úroku z prodlení					
02.903.03	Zpracování nových DP do protokolů o spuštění aut. předepsání úroku z prodlení					
02.903.04	Zpracování nových DP do výpisů z aut. předepsání úroku z prodlení					
<b>02.904</b>	<b>DHH - funkce pro úročení</b>	<b>KP1</b>	<b>HL202302952</b>			
02.904.01	Zpracování nových DP do fiktivního úročení					
02.904.02	Zpracování nových DP do funkce pro plnění t_v_urok					
02.904.03	Zpracování nových DP do funkcí pro test zúročení ODÚ ke dni					
02.904.04	Zpracování nových DP do funkce pro vyblokování úroku z posečkání					
<b>02.10</b>	<b>DHH - úloha potvrzení bezdlužnosti a stavu ODÚ</b>	<b>KP1</b>	<b>HL202302952</b>			
02.10.01	Zpracování změn řádků potvrzení o stavu ODÚ - výpočet zůstatků pro nové druhy příjmů daně z hazardu					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
02.10.02	Zpracování změn výběru jednotlivých nedoplatků o stavu ODÚ - výběr a zobrazení nových druhů příjmů daně z hazardu					
02.10.03	Úprava tiskových tvarů potvrzení pro nové druhy příjmů daně z hazardu					
02.10.04	Zpracování změn do samostatného zpracování řádků potvrzení o stavu ODÚ pro nové druhy příjmů daně z hazardu					
02.10.05	Kontrola spárovanosti pro nové druhy příjmů daně z hazardu					
02.10.06	Kontrola nezaúčtovaných POV z posečkáni, kontrola přeplatků a nedoplatků mezi novými druhy příjmů daně z hazardu					
02.10.07	Zpracování souvisejících změn do programu pro zpracování. odpovědí na stavy ODÚ pro nové druhy příjmů daně z hazardu					
<b>02.13</b>	<b>DHH - zpracování nových DP do úlohy PPO</b>	<b>KP1</b>	<b>HL202302952</b>			
02.13.01	Úpravy zpracování rozhodnutí o posečkáni/prominutí/odpisu - kontroly pro nové druhy příjmů daně z hazardu					
02.13.02	Zpracování řádků rozhodnutí o posečkáni/prominutí/odpisu - výběr a zpracování POV pro nové druhy příjmů daně z hazardu					
02.13.03	Úpravy předepsání/zrušení předepsání rozhodnutí o posečkáni/prominutí/odpisu pro nové druhy příjmů daně z hazardu					
02.13.04	Úpravy nahrazení rozhodnutí pro nové druhy příjmů daně z hazardu					
02.13.05	Úpravy zpracování Pozbytí účinnosti pro nové druhy příjmů daně z hazardu					
02.13.06	Úprava zpracování ukončení posečkáni daně před původně stanoveným termínem pro nové druhy příjmů daně z hazardu					
02.13.07	Úprava zpracování tiskových tvarů jednotlivých rozhodnutí pro nové druhy příjmů daně z hazardu					
<b>02.16</b>	<b>Úpravy zobrazení ODÚ v DIS+ na PMD v souvislosti s úpravami DHH a úpravy plnění VS při generování pl. údajů pro PP</b>	<b>KO1</b>				
02.16.01	Úprava plnění VS při generování platebních údajů v DIS+ pro PP					




Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
02.16.02	Úprava sdruženého zobrazení DP DHH na ODÚ v DIS+ - rozšíření o nové DP DHH					
<b>02.111</b>	<b>Zpracování žádostí daňového subjektu o vrácení/převedení přeplatku - ošetření algoritmů pro společné zpracování druhů příjmu daně z hazardu – úpravy pro nové DP DHH</b>	<b>KQ1</b>				
02.111.01	Zpracování řádků žádosti – omezení samostatného zpracování DP DHH – úpravy pro nové DP DHH					
02.111.02	Vystav PLP ze žádosti - Zpracování kontrol spárování pro druhy příjmu daně z hazardu – úpravy pro nové DP DHH					
02.111.03	Vystav PLP ze žádosti – společné zpracování druhů příjmů DHH ve zpracování DAL a Má Dátí – úpravy pro nové DP DHH					
02.111.04	Úprava algoritmů fiktivního párování pro druhy příjmu daně z hazardu pro vlastní vrácení a převádění přeplatků – úpravy pro nové DP DHH					
02.111.05	Potlačení kontrol na nespárované ODÚ pro druhy příjmu daně z hazardu, kdy jejich součet je vyrovnáný – úpravy pro nové DP DHH					
<b>02.112</b>	<b>Zpracování rozhodnutí o vrácení/převedení přeplatku - promítnutí společného zpracování druhů příjmu pro daň z hazardu – úpravy pro nové DP DHH</b>	<b>KQ1</b>				
02.112.01	Zpracování kontrol spárování pro druhy příjmu daně z hazardu při generování platebních poukazů – úpravy pro nové DP DHH					
02.112.02	Úpravy tiskových tvarů rozhodnutí o vrácení/převedení přeplatků pro druhy příjmu daně z hazardu – úpravy pro nové DP DHH					
<b>02.113</b>	<b>Zpracování žádostí správce (část pro dožadujícího i dožádaného) o převedení přeplatku - promítnutí společného zpracování druhů příjmu pro daň z hazardu</b>	<b>KQ1</b>				
02.113.01	Zpracování kontrol spárování na druhy příjmu daně z hazardu do volby Generování nedoplatků na dožadujícím FÚ – úpravy pro nové DP DHH					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
02.113.02	Zpracování kontrol spárování na druhy příjmu daně z hazardu do volby Vystav PLP na dožádaném FÚ – úpravy pro nové DP DHH					
02.113.03	Úprava algoritmů fiktivního párování pro druhy příjmu daně z hazardu pro vlastní realizaci pokrývání nedoplatků přeplatky – úpravy pro nové DP DHH					
02.113.04	Tisk výkazu nedoplatků – úpravy pro nové DP DHH					
02.113.05	Tisk Sdělení – úpravy pro nové DP DHH					
<b>02.22</b>	<b>DHH - úpravy pro úrok z posečkané částky</b>	<b>KP1</b>				
02.22.01	Zpracování nových DP do předepsání a rušení předepsání úroku z posečkané částky					
02.22.02	Zpracování nových DP do zpracování vyrozumění o úroku z posečkané částky					
02.22.03	Zpracování nových DP do tisku vyrozumění o úroku z posečkané částky					
<b>02.24</b>	<b>Úrok hrazený správcem daně - úpravy v souvislosti se zrušením PP</b>	<b>KO1</b>				
02.24.01	Zpracování úroku z vratitelného přeplatku – omezení vložení záhlaví s DP 71, 771, 772 s VČP PP					
02.24.02	Zpracování úroku z vratitelného přeplatku – úpravy Řádku záhlaví – umožnění vložení a zobrazení poplatníka VČP PP pro souběžné zpracování více ODÚ (zřizovatel/PP)					
02.24.03	Zpracování úroku z vratitelného přeplatku – úpravy při Generování řádku pro souběžné zpracování více ODÚ (zřizovatel/PP)					
02.24.04	Zpracování úroku z vratitelného přeplatku - Zavedení souběžného zpracování více ODÚ (zřizovatel/PP) v určení limitu 1000 Kč pro DP=71, 771, 772					
02.24.05	Zpracování úroku z vratitelného přeplatku - úpravy v předepisování POV na úrok v souvislosti se zrušením PP (POV na zřizovatele)					
02.24.06	Zpracování úroku z vratitelného přeplatku - úpravy výběru POV v souvislosti se zrušením PP ve Vyrozumění o úroku z vratitelného přeplatku					


































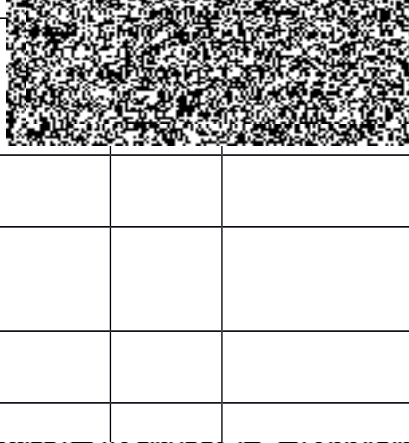

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
02.24.07	Výpisy úroku z vratitelného přeplatku - úpravy spojené se zavedením nové položky Řádku záhlaví					
02.24.08	Zpracování úroku z nesprávně stanovené daně – omezení vložení záhlaví s DP 71, 771, 772 s VČP PP					
02.24.09	Zpracování úroku z nesprávně stanovené daně – úpravy Řádku záhlaví – umožnění vložení a zobrazení poplatníka VČP PP pro souběžné zpracování více ODÚ (zřizovatel/PP)					
02.24.10	Zpracování úroku z nesprávně stanovené daně - úpravy v předepisování POV na úrok v souvislosti se zrušením PP (POV na zřizovatele)					
02.24.11	Zpracování úroku z nesprávně stanovené daně - úpravy výběru POV v souvislosti se zrušením PP ve Vyrozměnění o úroku z nesprávně stanovené daně					
02.24.12	Výpisy úroku z nesprávně stanovené daně - úpravy spojené se zavedením nové položky Řádku záhlaví					
<b>02.25</b>	<b>Úrok hrazený správcem daně - úpravy v souvislosti s novými DP DHH</b>	<b>KP1</b>				
02.25.01	Zpracování úroku z vratitelného přeplatku - Zavedení souběžného zpracování více ODÚ (všech DP DHH) v určení limitu 1000 Kč					
02.25.02	Zpracování úroku z vratitelného přeplatku - Úprava v předepisování úroku z vratitelného přeplatku					
02.25.03	Zpracování vyroz. o úroku z vratitelného přeplatku – úpravy spojené se zavedením fikt. DP pro DHH					
02.25.04	Zpracování úroku z nesprávně stanovené daně – úpravy ve vložení záhlaví DHH - zavedení fikt. DP					
02.25.05	Zpracování úroku z nesprávně stanovené daně – úpravy při Vložení řádku – umožnění vložení DP DHH					
02.25.06	Zpracování vyroz. o úroku z nesprávně stanovené daně – úpravy spojené se zavedením fikt. DP pro DHH					
02.25.07	Výpisy úroku z nesprávně stanovené daně - úpravy spojené se zavedením nové položky Řádku záhlaví					





Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
02.26	<b>PMD - Plnění doplňkových informací k POV- DPRPOVD1 – zohledněné nových DP DHH</b>	KP1		[Noise]		
02.26.01	PMD - Plnění doplňkových informací k POV- DPRPOVD1 – zohledněné nových DP DHH					
02.27	<b>ODÚ - Zobrazení informací o DS/ODÚ po stisku kláves CTRL-N – zohlednění dalších DP pro DHH</b>	KP1		[Noise]		
02.27.01	ODÚ - Zobrazení informací o DS/ODÚ po stisku kláves CTRL-N – zohlednění dalších DP pro DHH					
02.28	<b>Zpracování výnosů na DP s TP=8 - úpravy pro nové DP DHH</b>	KR1		[Noise]		
02.28.01	Zohlednění nových DP DHH při kontrole odeslání podílů					
02.28.02	Zohlednění nových DP DHH při vytvoření doplňků pro odeslání Výnosů					
02.29	<b>Počty daňových subjektů - úpravy pro nové DP DHH</b>	KR1		[Noise]		
02.29.01	Zohlednění nových DP DHH při výběru záznamů pro přehled za DHH					
02.30	<b>Úpravy ve Zpracování žádosti o vrácení přeplatku v souvislosti s rušením registrace k dani z příjmů fyzických osob</b>	KR1				
02.30.01	Zobrazení příznaku „Podnikající FO“ ve formuláři pro listování žádosti					
02.30.02	Zohlednění příznaku "Podnikající FO" ve Zpracování řádku žádosti - zablokování vrácení na adresu pro neregistrované podnikající FO					
02.30.03	Ošetření PO ve Zpracování řádku žádosti - zablokování vrácení na adresu pro PO					
02.31	<b>Úpravy ve Zpracování PLP v souvislosti s rušením registrace k dani z příjmů fyzických osob</b>	KR1		[Noise]		
02.31.01	Zohlednění příznaku "Podnikající FO" ve Zpracování PLP - zablokování vrácení na adresu pro neregistrované podnikající FO					
02.31.02	Ošetření PO ve Zpracování PLP - zablokování vrácení na adresu pro PO					



Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
03.00	DAD exe Obecná správa daní - vymáhání					
03.03	<b>Úpravy algoritmů funkcí užitých ve Vymáhání pro nové druhy příjmů daně z hazardních her (DHH)</b>	KP1				
03.03.01	Úpravy funkcí pro dotahování původních čísel jednacích, z kterých vyplývá POV, pro evidence - daň z hazardních her					
03.03.02	Úprava sestav z dat pro GFR pro nové druhy příjmů					
03.03.03	Úprava při předání druhu příjmů do EPI u exekučních příkazů - zapracování daně z hazardních her					
03.03.04	Úprava při předání druhu příjmů do EPI u Rozhodnutí o zřízení zástavního práva - zapracování daně z hazardních her					
03.03.05	Úprava při předání druhu příjmů do EPI u výkazu nedoplatků pro exekuce - zapracování daně z hazardních her					
03.03.06	Úprava při předání druhu příjmů do EPI v Evidenci Prohlášení o majetku - zapracování daně z hazardních her					
03.03.07	Úprava při předání druhu příjmů do EPI ve výzvě k zaplacení nedoplatku ručitelem §57 - zapracování daně z hazardních her					
03.03.08	Úprava při předání druhu příjmů do EPI u přihlášky do likvidace/pozůstalosti - zapracování daně z hazardních her					
03.03.09	Úprava při předání druhu příjmů do EPI u výkazu nedoplatků pro přihlášky soudu - zapracování daně z hazardních her					
03.03.10	Úprava při předání druhu příjmů do EPI u Potvrzení o zániku zástavního práva - zapracování daně z hazardních her					
03.03.11	Úprava při předání druhu příjmů do EPI u Vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu - zapracování daně z hazardních her					
03.03.12	Úprava při předání druhu příjmů do EPI u Rozhodnutí o odložení exekučního příkazu - zapracování daně z hazardních her					
03.03.13	Úprava při předání druhu příjmů do EPI u Rozhodnutí o pokračování exekučního příkazu - zapracování daně z hazardních her					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
03.03.14	Úprava při předání druhu příjmů do EPI u Rozhodnutí o zastavení exekučního příkazu - zapracování daně z hazardních her					
03.03.15	Úprava při předání druhu příjmů do EPI u předání nedoplatku soudu/exekutorovi/do dražby - zapracování daně z hazardních her					
03.03.16	Úprava při předání druhu příjmů do EPI u Rozhodnutí o náhradě hotových výdajů - zapracování daně z hazardních her					
03.03.17	Úprava při předání druhu příjmů do EPI u Sdělení o konečné výši úroku na exekučním příkaze - zapracování daně z hazardních her					
03.03.18	Úprava při předání druhu příjmů do EPI u Rozhodnutí o změně exekučního titulu - zapracování daně z hazardních her					
03.03.19	Úprava při předání druhu příjmů do EPI u Zajišťovacího příkazu - zapracování daně z hazardních her					
03.03.20	Úprava při předání druhu příjmů do EPI u Rozhodnutí o zrušení Rozhodnutí o zřízení zástavního práva - zapracování daně z hazardních her					
03.03.21	Úprava při předání druhu příjmů do EPI u Vyrozumění o právní moci Rozhodnutí o zrušení Rozhodnutí o zřízení zástavního práva - zapracování daně z hazardních her					
03.03.22	Zpracování druhu příjmů daň z hazardních her do žádostí MPV (mezinárodní pomoc při vymáhání) jako daně z příjmu nebo majetku.					
<b>04.00</b>	<b>DAD kon Obecná správa daní - kontroly</b>					
<b>04.01</b>	<b>Úpravy v Evidenci Kontrolních úkonů - Zpracování nových druhů příjmů pro DHH</b>	<b>KQ1</b>				
04.01.01	Úpravy v Záhlaví Kontrolního úkonu					
04.01.02	Úpravy ve Zjištění Kontrolního úkonu					
04.01.03	Zpracování změn v Oznámení o zahájení daňové kontroly					
04.01.04	Zpracování změn do Přečodu z KÚ do Kontroly					
04.01.05	Blokace přesunů Kontrolních úkonů, ZMP					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
<b>04.02</b>	<b>Úpravy v Evidenci Kontrol - Zpracování nových druhů příjmů pro DHH</b>	<b>KQ1</b>				
04.02.01	Úprava v Předmětu kontroly					
04.02.02	Zpracování změn do Sdělení dosavadního výsledku kontrolního zjištění					
04.02.03	Zpracování změn do Oznámení o ukončení daňové kontroly					
04.02.04	Blokace přesunů Kontrol, ZMP					
<b>05.00</b>	<b>EPI Evidence písemností FÚ</b>					
<b>05.01</b>	<b>Písemnosti - změny v souvislosti se zrušením PP</b>	<b>KO1</b>				
05.01.01	Omezení vložení písemnosti pro VČP PP					
05.01.02	Omezení opravy subjektu písemnosti na VČP PP					
05.01.03	Omezení založení části spisu/spisu pro VČP PP					
05.01.04	Omezení opravy subjektu části spisu/spisu na VČP PP					
<b>05.02</b>	<b>Úpravy v EPI pro nové DP DHH</b>	<b>KP1</b>				
05.02.01	Úprava funkce pro převod zmocnění – doplnění nových DP pro DHH					
05.02.02	Zpracování nových DP DHH do funkce pro nastavení vlastníka části spisu při změně správce DSDP					
05.02.03	Zpracování nových DP DHH do určení vlastníka části spisu ve funkci pro automatizované zařazení do složky					
05.02.04	Zpracování nových DP DHH do dávkové změny vlastníka – rotace dle správce					
05.02.05	Zpracování nových DP DHH do testování přístupu pro správce v akci Vlastník					
05.02.06	Zpracování nových DP DHH do funkcionalit pro nastavení vlastníka v Evidenci části spisů a složek					
<b>05.03</b>	<b>Úpravy ve vybraných úlohách v souvislosti s rušením registrace k dani z příjmů fyzických osob</b>	<b>KR1</b>				
05.03.01	Nahrazení „Příznaku DIČ“ novým příznakem „Podnikající FO“ ve funkci pro tisk hlaviček formulářů					
<b>06.00</b>	<b>IRS Interní registry subjektů ADIS</b>					
<b>06.01</b>	<b>Rušení plátcových pokladen od 01.01.2024</b>	<b>KM1c</b>	<b>HL202302931</b>			
06.01.01	Doplnění data zániku u všech plátcových pokladen					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
06.01.02	Zrušení registrace všech registrovaných plátcových pokladen datem 1.1.2024					
<b>06.02</b>	<b>Rušení plátcových pokladen od 01.01.2024 – Úpravy EPO a JRF</b>	<b>KM1c</b>	<b>HL202302931</b>			
06.02.01	Zablokování odeslání EPO formulářů pro plátcovy pokladny					
06.02.02	Úpravy ve zpracování JRF					
<b>06.03</b>	<b>Zrušení registrace k dani z příjmů fyzických osob a registrace plátce k dani z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně</b>	<b>KM1c</b>	<b>HL202303323</b>			
06.03.01	Zrušení registrace k dani z příjmů fyzických osob					
06.03.02	Zrušení registrace plátce k dani z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně					
06.03.03	Úprava registračních EPO formulářů – WWW část					
06.03.04	Úprava zpracování registračních podání (EPO i JRF) – FÚ část					
<b>06.04</b>	<b>Zavedení informace o podnikající FO</b>	<b>KM1c</b>				
06.04.01	Rozšíření datového modelu FÚ a MF o struktury pro evidenci informace o podnikající FO					
06.04.02	Zpracování informace o podnikající FO do datových struktur využívaných pro přenos kmenových údajů					
06.04.03	Rozšíření úloh zajišťujících tvorbu a následný příjem dat při přenosu kmenových údajů mezi CRDS a FÚ o informaci o podnikající FO					
06.04.04	Úloha pro aktualizaci a prohlížení informace o podnikající FO v aplikaci pro správu RDS a v aplikaci pro prohlížení dat evidovaných v CRDS					
06.04.05	Rozšíření aplikace MF pro prohlížení kmenových dat (aplikace provozovaná v databázi MF)					
06.04.06	Zobrazení informace o podnikající FO v dotazovacím systému WWW: ADIS - Registr daňových subjektů					
06.04.07	Rozšíření stávajících funkcí aplikace pro zpracování RDS v souvislosti se zavedením informace o podnikající FO					
06.04.08	Rozšíření stávajících funkcí pro synchronizaci DS s CRDS o zpracování informace o podnikající FO					







Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH			
06.04.09	Rozšíření stávajících funkcí aplikace pro tisk DS v souvislosti se zavedením informace o podnikající FO								
06.04.10	Dávkové iniciální naplnění informace o podnikající FO								
<b>07.00</b>	<b>PRU Průřezové funkce</b>								
<b>07.01</b>	<b>Standardní seskupení úloh a akcí (SSUA), oblasti a činnosti (O/Č) - změny dle požadavků GFŘ/FÚ</b>	<b>KR1</b>							
07.01.01	Průběžné úpravy, rozšiřování a distribuce seskupení úloh a akcí formou konverzních programů ADIS								
07.01.02	Průběžné úpravy, rozšiřování a distribuce Oblast/Činnost formou konverzních programů ADIS								
07.01.03	Aktualizace přístupových práv všech pracovníků ÚFO v konverzi při změně Oblast/Činnost, seskupení úloh a akcí								
<b>07.02</b>	<b>Systémové změny a výpisy dat pro nové tabulky na FÚ/GFŘ</b>	<b>KR1</b>							
07.02.01	Systémové změny a výpisy dat pro nové tabulky na FÚ								
07.02.02	Systémové změny a výpisy dat pro nové tabulky na GFŘ								
<b>10.00</b>	<b>ZMP Změna místní příslušnosti</b>								
<b>10.02</b>	<b>Úpravy související se zrušením plátcových pokladen od 01.01.2024</b>	<b>KO1</b>							
10.02.01	Automatizované založení ZMP pro plátcovy pokladny při vložení ZMP zřizovatele								
10.02.02	Blokace založení a zrušení ZMP pro plátcovy pokladny								
10.02.03	Automatizované zrušení ZMP pro plátcovy pokladny při zrušení ZMP zřizovatele								
10.02.04	Rozšíření funkcionalit pro tvorbu datového souboru při zpracování ZMP zřizovatele a plátcových pokladen								
10.02.05	Automatizované zrušení datového souboru pro ZMP plátcových pokladen a zřizovatele								
<b>13.00</b>	<b>DAD knz Obecná správa daní - Konkurzy</b>								
<b>13.01</b>	<b>Insolvenční řízení - úpravy v souvislosti s novými DP DHH</b>	<b>KR1</b>							
13.01.01	Generování pohledávek pro Daň z hazardních her - ošetření úroků na jiném druhu příjmů než úročitelná POV – úpravy pro nové DP DHH								

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
13.01.02	Kontroly při Uzavření záznamů s DP DHH včetně kontrol úroku – úpravy pro nové DP DHH					
13.01.03	Úpravy fiktivního párování pro převod PLV z druhu příjmu 6 na druh příjmu s nedoplatky - ošetření souběžného zpracování DP DHH – úpravy pro nové DP DHH					
13.01.04	Akce DP – společné zpracování DP DHH – úpravy pro nové DP DHH					
13.01.05	Generuj pohledávky – všechny DP DHH – úpravy pro nové DP DHH					
13.01.06	Evidence odhadnutých pohledávek pro Daň z hazardních her – úpravy pro nové DP DHH					
13.01.07	Zpracování výkazů nedoplatků v insolvenčním řízení - Úprava při předání druhu příjmu do EPI u výkazu nedoplatků pro přihlášky do insolvenčního řízení – úpravy pro nové DP DHH					
<b>22.00</b>	<b>DPF Daň z příjmu fyzických osob</b>					
<b>22.01</b>	<b>Novela ZDP (konsolidační balíček) - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPF pro ZO 2024 - část WWW</b>	<b>KR1</b>	<b>HL202302969</b>			
22.01.01	Vytvoření nové písemnosti DPFDP7 z písemnosti DPFDP6 - od ZO roku 2024					
22.01.02	Úprava stránek formuláře pro zadávání údajů DAP DPF - za ZO roku 2024					
22.01.03	Úprava struktury vstupního souboru pro DAP DPF - za ZO roku 2024					
22.01.04	Úprava kontrol a přepočtů pro DAP DPF - za ZO roku 2024					
22.01.05	Úprava nápovědy pro DAP DPF - za zdaňovací období roku 2024					
22.01.06	Úprava tisku DAP DPF do PDF - za zdaňovací období roku 2024					
22.01.07	Úprava průvodce vyplněním DAP DPF - za zdaňovací období od roku 2024					
22.01.08	Vytvoření konverzí položek pro načtení údajů za předchozí ZO					
22.01.09	Zpracování nové písemnosti do EPO					
22.01.10	Zpracování nové písemnosti do DIS+					
<b>22.02</b>	<b>Novela ZDP (konsolidační balíček) - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPF ze závislé činnosti pro ZO 2024 - část WWW</b>	<b>KR1</b>	<b>HL202302969</b>			
22.02.01	Vytvoření nové písemnosti DPFZC2 z písemnosti DPFZC1 - od ZO roku 2024					



Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
22.02.02	Úprava stránek formuláře pro zadávání údajů DAP DPF ze závislé činnosti - za ZO roku 2024					
22.02.03	Úprava struktury vstupního souboru pro DAP DPF ze závislé činnosti - za ZO roku 2024					
22.02.04	Úprava kontrol a přepočtů pro DAP DPF ze závislé činnosti - za ZO roku 2024					
22.02.05	Úprava nápovědy pro DAP DPF ze závislé činnosti - za zdaňovací období roku 2024					
22.02.06	Úprava tisku DAP DPF do PDF ze závislé činnosti - za zdaňovací období roku 2024					
22.02.07	Vytvoření konverzí položek pro načtení údajů za předchozí ZO					
22.02.08	Zpracování nové písemnosti do EPO					
22.02.09	Zpracování nové písemnosti do DIS+					
<b>22.03</b>	<b>Novela ZDP (konsolidační balíček) - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPF pro část ZO 2024 – ADIS</b>	<b>KO1</b>				
22.03.01	Zpracování změn do vkládání a aktualizace oddílů DAP/VYM DPF (včetně zpracování doměrku DPF)					
22.03.02	Zpracování změn do formulářů pro prohlížení DAP/VYM DPF (včetně prohlížení doměrku DPF)					
22.03.03	Zpracování změn do kontrol akce Odsouhlasení DAP/VYM a do kontrol protokolu o dříve vyměřených DAP DPF					
22.03.04	Zohlednění změn nového formuláře DAP DPF ve výpisech a statistikách DPF (úroveň FÚ i GFŘ)					
<b>22.04</b>	<b>Novela ZDP (konsolidační balíček) - EPO - Zpracování úprav vyplývajících z obou DAP DPF pro ZO 2024 - část FÚ</b>	<b>KR1</b>				
22.04.01	Úprava úplných opisů DAP DPF ve zpracování písemností - souborů					
22.04.02	Úprava obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat					
22.04.03	Úprava funkce pro volbu "Oprav" ve Zpracování písemností - došlých dat					
22.04.04	Úprava funkce pro "Kontrolu a nahrání" DAP DPF ve Zpracování písemností - došlých dat					
22.04.05	Úprava funkce pro "Výpisy písemnosti - došlých dat" - DAP DPF					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
22.04.06	Úprava funkcí pro výběr údajů z vyměření DPF a vytvoření XML odpovědi dle požadavku poplatníka					
22.04.07	Zpracování nově zaváděných písemností DPFZC2 a DPFDP7 do úloh Písemnosti/soubory a Došlá data					
<b>22.05</b>	<b>Úpravy ve vybraných úlohách DPF v souvislosti s rušením registrace k dani z příjmů fyzických osob</b>	<b>KR1</b>				
22.05.01	Nahrazení „Příznaku DIČ“ novým příznakem „Podnikající FO“ ve vybraných úlohách DPF					
22.05.02	Úprava algoritmu kontroly registrace k dani ve vybraných úlohách DPF					
<b>22.06</b>	<b>Úpravy ve vztahu ke generování adresáta písemností v AO DPF</b>	<b>KR1</b>	<b>HL202300520</b>			
22.06.01	Vytvoření funkce pro upozornění na nutné ověření nastaveného doručování písemností DPF					
22.06.02	Zpracování volání funkce do jednotlivého režimu spuštění akce Záznam předání vybraných evidencí DPF					
<b>23.00</b>	<b>DPP Daň z příjmu právnických osob</b>					
<b>23.03</b>	<b>Novela ZDP (zákon o přeměnách a konsolidační balíček) - úpravy v úloze pro Zpracování DAP DPP</b>	<b>KM1c</b>	<b>HL202302764, HL202302763</b>			
23.03.01	Zohlednění úprav souvisejících s novelizací § 38ma odst. 1 písm. d) ZDP (viz HL202302763)					
23.03.02	Zohlednění úprav souvisejících s prodloužením zákona "lex Ukrajina"					
23.03.03	Zohlednění úprav souvisejících s novelizací ustanovení § 21 odst. 1 ZDP (sazba daně)					
<b>23.04</b>	<b>Novela ZDP (zákon o přeměnách a konsolidační balíček) - úpravy ve formuláři EPO</b>	<b>KO1</b>	<b>HL202302764</b>			
23.04.01	Úprava kontrol a rozbalovací nabídky EPO na položce 04 (souvisejících s novelizací § 38ma odst. 1 písm. d) ZDP - viz HL202302763)					
23.04.02	Úprava kontrol a přepočtů řádku 260 II. oddílu (lex Ukrajina)					
23.04.03	Změna algoritmů kontrol a předvyplnění řádků 280 a 284 (změna sazby daně dle § 21)					
23.04.04	Aktualizace pokynů včetně dynamického zobrazení					
23.04.05	Aktualizace a Úprava úplného PDF opis					

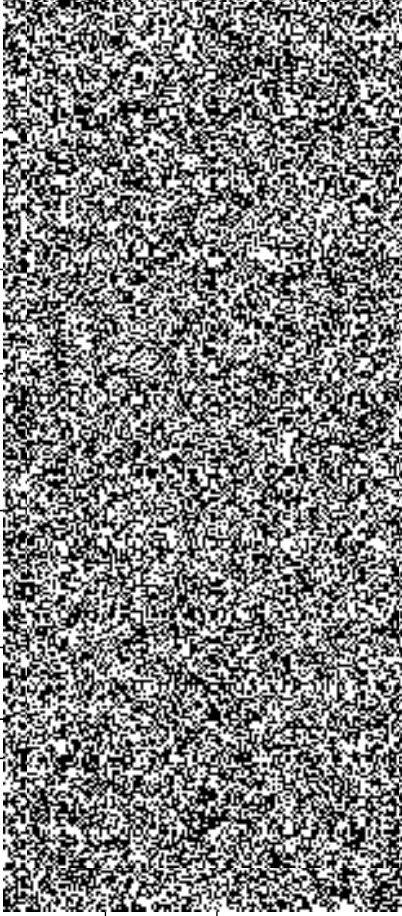
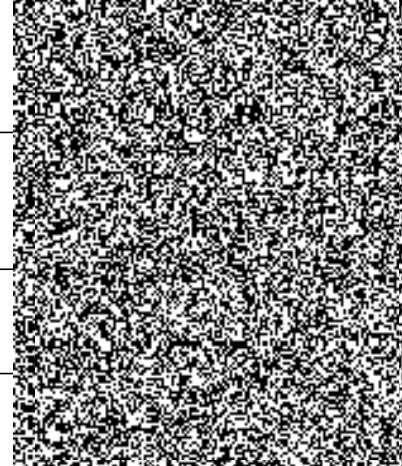

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
<b>23.05</b>	<b>EPO - Dopady cizí měny při správě daní – ÚV - FÚ</b>	<b>KO1</b>	<b>HL202302764</b>			
23.05.01	Úprava tabulky pro přijetí DAP (ÚV) DPP – nová položka Měna					
23.05.02	Úprava funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů					
23.05.03	Úprava úplného opisu DAP DPP ve Zpracování písemností – souborů					
23.05.04	Úprava obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat					
23.05.05	Úprava funkce pro "Kontrolu a nahrání" DAP DPP ve Zpracování písemností - došlých dat					
23.05.06	Úprava funkce pro "Výpisy písemnosti - došlých dat" - DAP DPP					
<b>23.06</b>	<b>Dopady cizí měny při správě daní – ÚV</b>	<b>KQ1</b>	<b>HL202302764</b>			
23.06.01	Zpracování změn do vkládání a aktualizace ÚV DPP (nová položka Měna)					
23.06.02	Úprava kontrol ÚV se zohledněním Měny v evidenci ÚV DPP					
23.06.03	Úprava kontrol ÚV se zohledněním Měny v DAP DPP (Odsouhlasení, VYM DAP DPP)					
23.06.04	Zohlednění Měny v Žádosti o předání ÚZ na MSp					
23.06.05	Úprava kontrol ÚV se zohledněním Měny v ostatních evidencích					
23.06.06	Zohlednění Měny ve Výpisech ÚV					
<b>23.07</b>	<b>EPO - Dopady cizí měny při správě daní - WWW</b>	<b>KO1</b>	<b>HL202302764</b>			
23.07.01	Úprava struktury vět - zavedení nové položky Měna					
23.07.02	Úprava přepočtů a kontrol					
23.07.03	Úprava nápovědy a pokynů					
23.07.04	Úprava PDF opisu					
23.07.05	Doplnění dynamického zobrazení podle ZO					
<b>25.00</b>	<b>DSL Daň silniční</b>					
<b>25.01</b>	<b>Zaokrouhlování dílčí daně DSL - EPO</b>	<b>KM1c</b>	<b>HL202303087</b>			
25.01.01	EPO - Úprava přepočtu					
25.01.02	EPO - Úprava kontrol					
25.01.03	EPO - Úprava pokynů					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
<b>25.02</b>	<b>Zpracování DAP DSL - Zaokrouhlování dílčí daně DSL - čb ADIS</b>	<b>KM1c</b>				
25.02.01	Zohlednění úprav zaokrouhlení ve výpočtu hodnot II. oddílu DAP DSL					
25.02.02	Zohlednění úprav zaokrouhlení v Odsouhlasení DAP DSL					
25.02.03	Zohlednění úprav zaokrouhlení v Odsouhlasení VYM DSL					
<b>25.03</b>	<b>Úpravy ve vybraných úlohách DSL v souvislosti s rušením registrace k dani z příjmů fyzických osob</b>	<b>KR1</b>				
25.03.01	Úprava algoritmu kontroly registrace k dani ve vybraných úlohách DSL					
<b>26.00</b>	<b>DNE Daň z nemovitých věcí</b>					
<b>26.01</b>	<b>Úpravy EPO průvodce vyplněním DAP DNE v souvislosti s konsolidačním balíčkem a novelou ZDNE – část PMD</b>	<b>KM1c</b>	<b>HL202302981</b>			
26.01.01	Změna definice předmětu daně J					
26.01.02	Vypuštění roku dokončení zd. stavby a zd. jednotky					
26.01.03	Zúžení daně u vodní plochy - vypuštění kódu pozemku D od ZO 2024					
26.01.04	Úprava § 11a - místnost k podnikání u staveb a jednotek					
26.01.05	Úprava § 15 - chov ryb					
<b>26.02</b>	<b>Úpravy EPO formuláře DAP DNE v souvislosti s konsolidačním balíčkem a novelou ZDNE – část PMD</b>	<b>KM1c</b>	<b>HL202302982</b>			
26.02.01	Zúžení daně u vodní plochy - vypuštění kódu pozemku D					
26.02.02	Úpravy související se změnami osvobození dle § 4 odst. 1 písm. h)					
26.02.03	Úpravy související se změnami osvobození dle § 9 odst. 1 písm. g) a m)					
26.02.05	Úprava výpočtu minimální daně u spoluvlastnických podílů podle § 15 odst. 4					
26.02.06	Stanovení místního koeficientu podle § 12 pro předměty daně A, B, W“					
<b>26.03</b>	<b>Konverze osvobození - přenosy</b>	<b>KM1c</b>	<b>HL202302983</b>			
26.03.01	Přenos DAP DNE - překonvertování a výmaz osvobození dle §4					
26.03.02	Přenos DAP DNE - překonvertování a výmaz osvobození dle §9					
26.03.03	Předvyplnění DAP (PMD) - překonvertování osvobození dle §4 a §9					
26.03.04	Zavedení nových důvodů změny výše daně					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
26.03.05	Ošetření důvodů změny daně u § 9.i.4					
26.03.06	Evidence ENNV - překonvertování důvodu nezdanitelnosti §4/i/4					
<b>26.04</b>	<b>Úpravy FÚ - zúžení předmětu daně o vodní plochy</b>	<b>KM1c</b>	<b>HL202302983</b>			
26.04.01	Přenos DAP DNE - zrušení listů s předmětem daně "D"					
26.04.02	Úprava funkce pro určení povinnosti doručovat					
26.04.03	Zavedení nového důvodu změny výše daně (u rušených listů)					
26.04.04	Předvyplnění DAP (PMD) + Ověření DAP (PMD - zařazení vodních ploch mezi nezdanitelné NV					
<b>26.05</b>	<b>Úpravy FÚ - nová sazba daně, nový předmět daně Q dle § 6 odst. 2</b>	<b>KM1c</b>	<b>HL202302983</b>			
26.05.01	Zpracování nového předmětu daně do stávajících algoritmů ADIS					
26.05.02	Zpracování nového předmětu daně do algoritmů výpočtu sazeb a koeficientů					
26.05.03	Zpracování nového předmětu daně do zpracování a výpisů DAP					
26.05.04	Úpravy kontroly DAP oproti ISKN					
26.05.05	Úpravy přenosu DAP - překonvertování a rozdělení listů s předmětem daně G					
26.05.06	Zavedení nového důvodu změny výše daně při automatické změně předmětu a sazby daně					
26.05.07	Úpravy předvyplnění DAP pro PMD					
26.05.08	Úpravy ověření DAP pro PMD					
<b>26.06</b>	<b>Úpravy FÚ - budovy pro rodinnou rekreaci</b>	<b>KM1c</b>	<b>HL202302983</b>			
26.06.01	Přenos DAP - překonvertování a rozdělení listů s předmětem daně "H" + nepřepočítání listů s příslušenstvím					
26.06.02	Předvyplnění DAP (PMD) - překonvertování předmětů daně "H"					
26.06.03	Zavedení nového důvodu změny výše daně při automatické změně předmětu a sazby daně					
26.06.04	Rozšíření překonvertování o jednorázový výmaz záznamů ENNV					
<b>26.07</b>	<b>Úpravy FÚ - místní koeficient</b>	<b>KM1c</b>	<b>HL202302983</b>			
26.07.01	Zobrazování místního koeficientu s hodnotou 1					
26.07.02	Úprava algoritmu výpočtu koeficientu – rozsah hodnoty od 0,5					


Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
26.07.03	Úprava algoritmu výpočtu koeficientu – pro odst. 2 – předměty daně A, B, W					
26.07.04	Úprava evidence místních koeficientů – rozsah hodnoty od 0,5					
26.07.05	Úprava evidence místních koeficientů – pro odst. 2 – předměty daně A, B, W					
26.07.06	Úprava evidence importů koeficientů – rozsah hodnoty od 0,5					
26.07.07	Úprava evidence importů koeficientů – pro odst. 2 – předměty daně A, B, W					
26.07.08	Úprava algoritmů vynášení koef. na MF/MI – pro odst. 2 – předměty daně A, B, W					
26.07.09	Úpravy výpisů místních koeficientů					
<b>26.08</b>	<b>Úpravy FÚ - úpravy EPI-Došlých dat</b>	<b>KM1c</b>				
26.08.01	Zpracování nově zaváděné písemnosti DNEDP6 do úloh Písemnosti/soubory a Došlá data					
<b>26.11</b>	<b>Úpravy FÚ - změny § 8 odstavce 4</b>	<b>KM1c</b>	<b>HL202302983</b>			
26.11.01	Úpravy kontrol DAP na KN - eliminace uživatelů z vyjmutých kontrol na KN (obdobu pozemků)					
26.11.02	Úpravy kontrol uživatelů v kontrole DAP DNE a v evidenci spoluvlastnických podílů					
<b>26.12</b>	<b>Úpravy FÚ - přečíslování odstavce § 9</b>	<b>KM1c</b>	<b>HL202302983</b>			
26.12.01	Přečíslování paragrafu ve formulářích, popisu položky apod.					
26.12.02	Úpravy vyhodnocování důvodů změny daně					
<b>26.13</b>	<b>Úpravy aplikace "Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí" na PMD v souvislosti s konsolidačním balíčkem a novelou ZDNE</b>	<b>KM1c</b>	<b>HL202303149</b>			
26.13.01	Zavedení principu zobrazení variabilních textů podle ZO a doplnění textů pro rok 2024 ve výsledcích vyhledávání					
26.13.02	Vytvoření dynamické nabídky předmětů daně podle roku ZO					
26.13.03	Zobrazení nového údaje "Inflační koeficient" ve výsledcích vyhledávání					
26.13.04	Zohlednění typu parcely při vyhledávání koeficientů					
26.13.05	Zobrazení informace o možnosti uplatnit osvobození pozemku podle § 4v a § 4z					


Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
<b>26.14</b>	<b>Úpravy FÚ - změny § 15 odst. 4</b>	<b>KM1c</b>	<b>HL202302983</b>			
26.14.01	Úpravy algoritmů ADIS v souvislosti se zvýšením minimální daně pro SP (evidence SP, IV. oddíl DAP, Kontrola DAP, předepsání DAP a další akce s DAP)					
<b>26.15</b>	<b>Úpravy FÚ - změny §1a odst.3 (vícenásobný výskyt předmětů daně u zpevněných ploch)</b>	<b>KM1c</b>	<b>HL202303689</b>			
26.15.01	Úpravy kontrol DAP na KN - sčítání výměr v odchylce na KN					
26.15.02	Úpravy předvyplnění pro PMD - dotahování zpevněných ploch u nepřiznaných pozemků					
<b>30.00</b>	<b>DPZ Daň z příjmu ze závislé činnosti</b>					
<b>30.01</b>	<b>Úprava EPO písemností DPZ umožňujících podání pro typ daňového subjektu "L - plátcova pokladna" v souvislosti s rušením plátcových pokladen</b>	<b>KO1</b>	<b>HL202303272</b>			
30.01.01	Mechanismus pro zamezení podat EPO podání s typem daňového subjektu "L"					
30.01.02	Úprava písemnosti DPZVD6 - Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti					
30.01.03	Úprava písemnosti DPZMB1 - ŽÁDOST podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů (měsíční daňové bonusy)					
30.01.04	Úprava písemnosti DPZDB1 - ŽÁDOST podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů (doplatek na daňovém bonusu)					
<b>30.02</b>	<b>Úpravy ve zpracování úloh DPZ pro typ daňového subjektu "L - plátcova pokladna" v souvislosti s rušením plátcových pokladen</b>	<b>KO1</b>				
30.02.01	Úpravy ve zpracování úloh DPZ pro typ daňového subjektu "L - plátcova pokladna" v souvislosti s rušením plátcových pokladen					
<b>30.03</b>	<b>Úprava EPO obecné písemnosti DADPIS znemožňující podání pro typ daňového subjektu "L - plátcova pokladna" v souvislosti s rušením plátcových pokladen</b>	<b>KO1</b>	<b>HL202303272</b>			
30.03.01	Zrušení výběru typu "L - plátcova pokladna" z nabídky typů subjektu					
30.03.02	Úprava identifikace subjektu					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
<b>30.04</b>	<b>Úpravy ve Zpracování žádostí o poukázání daň. bonusu v souvislosti s rušením registrace k dani z příjmů fyzických osob</b>	<b>KR1</b>				
30.04.01	Zohlednění příznaku "Podnikající FO" ve Zpracování žádostí o poukázání daň. bonusu - zablokování vracení na adresu pro neregistrované podnikající FO					
30.04.02	Ošetření PO ve Zpracování žádostí o poukázání daň. bonusu - zablokování vracení na adresu pro PO					
<b>30.05</b>	<b>Úpravy ve Zpracování žádostí o vrácení přepl. z roč. z. v souvislosti s rušením registrace k dani z příjmů fyzických osob</b>	<b>KR1</b>				
30.05.01	Zohlednění příznaku "Podnikající FO" ve Zpracování řádku žádosti - zablokování vracení na adresu pro neregistrované podnikající FO					
30.05.02	Ošetření PO ve Zpracování řádku žádosti - zablokování vracení na adresu pro PO					
<b>31.00</b>	<b>DPS Daň z příjmu srážková</b>					
<b>31.01</b>	<b>Úprava EPO písemností DPS umožňujících podání pro typ daňového subjektu "L - plátcova pokladna" v souvislosti s rušením plátcových pokladen</b>	<b>KO1</b>	<b>HL202303272</b>			
31.01.01	Mechanismus pro zamezení podat EPO podání s typem daňového subjektu "L"					
31.01.02	Úprava písemnosti DPSVD2 - Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně					
31.01.03	Úprava písemnosti DPSHL1 - Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí					
<b>31.02</b>	<b>Úpravy ve zpracování úloh DPS pro typ daňového subjektu "L - plátcova pokladna" v souvislosti s rušením plátcových pokladen</b>	<b>KO1</b>				
31.02.01	Úpravy ve zpracování úloh DPS pro typ daňového subjektu "L - plátcova pokladna" v souvislosti s rušením plátcových pokladen					
<b>31.03</b>	<b>Úpravy ve vybraných úlohách DPS v souvislosti s rušením registrace k dani z příjmů fyzických osob</b>	<b>KR1</b>				
31.03.01	Nahrazení „Příznaku DIČ“ novým příznakem „Podnikající FO“ ve vybraných úlohách DPS					



Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
31.03.02	Úprava algoritmu kontroly registrace k dani ve vybraných úlohách DPS					
<b>41.00</b>	<b>DHH Daň z hazardních her</b>					
<b>41.01</b>	<b>EPO - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb. - nový formulář DAP DHH v EPO - část WWW</b>	<b>KO1</b>				
41.01.01	Vytvoření popisu struktury vstupního souboru pro nový formulář DAP DHH					
41.01.02	Tvorba stránky Záhloví					
41.01.03	Tvorba stránky oddílu I.					
41.01.04	Tvorba stránky oddílu II.					
41.01.05	Tvorba stránky oddílu III.					
41.01.06	Tvorba stránky oddílu IV.					
41.01.07	Tvorba stránky přílohy A II. Oddílu					
41.01.08	Tvorba stránky přílohy B II. Oddílu					
41.01.09	Tvorba stránky přílohy C II. Oddílu					
41.01.10	Tvorba stránky přílohy D II. Oddílu					
41.01.11	Tvorba stránky přílohy E II. Oddílu					
41.01.12	Tvorba stránky přílohy F II. Oddílu					
41.01.13	Tvorba stránky přílohy G II. Oddílu					
41.01.14	Tvorba stránky přílohy H II. Oddílu					
41.01.15	Tvorba stránky přílohy CH II. Oddílu					
41.01.16	Tvorba laické a úprava odborné nápovědy					
41.01.17	Implementace volání společného rozhraní REST-API funkcí					
41.01.18	Doplnění vztahů mezi kontrolami do metainformací EPO					
41.01.19	Doplnění definice základních kontrol položek přímo v metadatech EPO					
41.01.20	Naplnění vzhledových metainformací					
41.01.21	Tvorba PDF, HTML a TXT opisu					
41.01.22	Zpracování omezení pro vkládání Přiznání k dani z hazardních her - od 2. čtvrtletí roku 2019 - EPO podání DHHDP2					
41.01.23	Zpracování nové písemnosti do EPO3					
41.01.24	Zpracování nové písemnosti do DIS+					
<b>41.02</b>	<b>EPO - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb. - nový formulář DAP DHH v EPO - část EPI</b>	<b>KP1</b>				
41.02.01	Realizace nových tabulek pro přijetí přiznání k dani z hazardních her pro ZO od účinnosti novely					
41.02.02	Změna plnění záznamů do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
41.02.03	Změny algoritmů kontrolních funkcí ve Zpracování písemností - souborů					
41.02.04	Úpravy úplného opisu přiznání ve Zpracování písemností - souborů					
41.02.05	Doplnění obrazovek pro přiznání dani z hazardních her pro ZO od účinnosti novely ve volbě "Prohlížení" (II. Oddíl, III. Oddíl, IV. Oddíl, Příloha A, Příloha B, Příloha C, Příloha D, Příloha E, Příloha F, Příloha G, Příloha H, Příloha CH) ve Zpracování písemností - došlých dat					
41.02.06	Úpravy volby "Kontrola a nahrání" - doplnění nových kontrol a úprava algoritmů (samovyměření/samodoměření, ne zahájení doměřovacího řízení, zastavení řízení) pro nahrání do aplikací DHH ve Zpracování písemností - došlých dat					
41.02.07	Úprava úlohy "Výpisy písemností - došlých dat", doplnění opisu o nové položky					
<b>41.03</b>	<b>Zpracování DAP DHH - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb. - nový formulář DAP DHH v ADIS FÚ</b>	<b>KP1</b>				
41.03.01	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DAP - Hledej a zobrazení					
41.03.02	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DAP - Vlož					
41.03.03	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DAP - Oprav II. Oddíl, III. Oddíl, IV. Oddíl, Příloha A, Příloha B, Příloha C, Příloha D, Příloha E, Příloha F, Příloha G, Příloha H, Příloha CH					
41.03.04	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DAP - Zruš					
41.03.05	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DAP - Prohlížení - II. Oddíl					
41.03.06	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DAP - Prohlížení - III. Oddíl					
41.03.07	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DAP - Prohlížení - IV. Oddíl					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
41.03.08	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DAP - Prohlížení - Příloha A					
41.03.09	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DAP - Prohlížení - Příloha B					
41.03.10	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DAP - Prohlížení - Příloha C					
41.03.11	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DAP - Prohlížení - Příloha D					
41.03.12	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DAP - Prohlížení - Příloha E					
41.03.13	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DAP - Prohlížení - Příloha F					
41.03.14	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DAP - Prohlížení - Příloha G					
41.03.15	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DAP - Prohlížení - Příloha H					
41.03.16	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DAP - Prohlížení - Příloha CH					
41.03.17	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - Akce - činnost Samovyměření/samodoměření					
41.03.18	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - Akce - činnost Nezahájení doměřovacího řízení					
41.03.19	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - Akce - činnost Zastavení řízení					
41.03.20	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - Akce - činnost Zruš Samovyměření/samodoměření					
<b>41.04</b>	<b>Doměření DAP DHH - Zpracování novelty zákona 187/2016 Sb. - nový formulář DAP DHH v ADIS FÚ</b>	<b>KQ1</b>				
41.04.01	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DOM - Vlož					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
41.04.02	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DOM - Oprav II. Oddíl, III. Oddíl, IV. Oddíl, Příloha A, Příloha B, Příloha C, Příloha D, Příloha E, Příloha F, Příloha G, Příloha H, Příloha CH					
41.04.03	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DOM - Zruš					
41.04.04	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DOM - Prohlížení II. Oddíl, III. Oddíl, IV. Oddíl, Příloha A, Příloha B, Příloha C, Příloha D, Příloha E, Příloha F, Příloha G, Příloha H, Příloha CH					
41.04.05	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DOM - Odsouhlasení					
41.04.06	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DOM - Předepsání					
41.04.07	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DOM - Zrušení předepsání					
41.04.08	Promítnutí změn formuláře přiznání do aplikace Zpracování DAP DHH - činnost DOM - Kontrolní protokol					
<b>41.05</b>	<b>Zpracování DoPLVY/Rozhodnutí DHH - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb. - nový formulář DAP DHH</b>	<b>KQ1</b>				
41.05.01	Zpracování DoPLVY DHH - činnost Záznam předání - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.					
41.05.02	Zpracování DoPLVY DHH - činnost Tisk - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.					
41.05.03	Zpracování Rozhodnutí o ODP DHH (plné vyhovění - zrušení předchozího rozhodnutí) - činnost Tisk - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.					
41.05.04	Zpracování Rozhodnutí o ODP DHH (plné vyhovění - změna předchozího rozhodnutí) - činnost Tisk - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.					
41.05.05	Zpracování Rozhodnutí o ODP DHH (částečné vyhovění) - činnost Tisk - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
<b>41.06</b>	<b>Výpisy DAP DHH - Zapracování novely zákona 187/2016 Sb.</b>	<b>KR1</b>				
41.06.01	Prohlížení/Výpisy - realizace nových výběrových obrazovek pro variantu výběru pro období OD 2024					
41.06.02	Prohlížení/Výpisy - realizace nových tvarů výstupů pro tvar sestavy Zkrácený výpis pro variantu výběru pro období OD 2024					
41.06.03	Prohlížení/Výpisy - realizace nových tvarů výstupů pro tvar sestavy Úplný výpis pro variantu výběru pro období OD 2024					
41.06.04	Prohlížení/Výpisy - realizace nových tvarů výstupů pro tvar sestavy Výpis s údaji o kontrole pro variantu výběru pro období OD 2024					
41.06.05	Prohlížení/Výpisy - realizace nových tvarů výstupů pro tvar sestavy Výpis s údaji o pokutě pro variantu výběru pro období OD 2024					
<b>41.07</b>	<b>Generování nepodaných DAP DHH - Zapracování novely zákona 187/2016 Sb.</b>	<b>KQ1</b>				
41.07.01	Zpracování DAP DHH - činnost Generuj - Zapracování novely zákona 187/2016 Sb.					
41.07.02	Generování nepodaných DAP z CRON - Zapracování novely zákona 187/2016 Sb.					
<b>41.08</b>	<b>Pokuta za OTD DHH - Zapracování novely zákona 187/2016 Sb.</b>	<b>KR1</b>				
41.08.01	Pokuta za OTD DHH - úpravy v činnosti Hledej a Zobrazení pro ZO od 2024					
41.08.02	Pokuta za OTD DHH - úpravy v Vlož pro ZO od 2024					
41.08.03	Pokuta za OTD DHH - úpravy v činnosti Prohlížení POV pro ZO od 2024					
41.08.04	Pokuta za OTD DHH - úpravy v činnosti Platební výměr pro ZO od 2024					
41.08.05	Pokuta za OTD DHH - úpravy v činnosti Předepsání pro ZO od 2024					
41.08.06	Pokuta za OTD DHH - úpravy v Zrušení předepsání pro ZO od 2024					
<b>41.09</b>	<b>Zpracování POV DHH - Zapracování novely zákona 187/2016 Sb.</b>	<b>KQ1</b>				
41.09.01	Zpracování POV DHH - úpravy v činnosti Prohlížení pro nové DP pro ZO od 2024					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
41.09.02	Zpracování POV DHH - úpravy v činnosti Vlož pro nové DP pro ZO od 2024					
41.09.03	Zpracování POV DHH - úpravy v činnosti Oprav pro nové DP pro ZO od 2024					
41.09.04	Zpracování POV DHH - úpravy v činnosti Stornuj pro nové DP pro ZO od 2024					
41.09.05	Zpracování POV DHH - úpravy v činnosti Zaúčtování pro nové DP pro ZO od 2024					
<b>41.10</b>	<b>Výpisy POV DHH - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.</b>	<b>KR1</b>				
41.10.01	Výpisy POV - Prohlížení/Výpisy - realizace úprav výběrů pro nové DP pro období OD 2024					
41.10.02	Výpisy POP - Prohlížení/Výpisy - realizace úprav výběrů pro nové DP pro období OD 2024					
<b>41.11</b>	<b>Zpracování VYZPO DHH - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.</b>	<b>KQ1</b>				
41.11.01	Zpracování VYZOP DHH - činnost Záznam předání - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.					
<b>41.12</b>	<b>Zpracování VYZOP DHH - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.</b>	<b>KQ1</b>				
41.12.01	Zpracování VYZOP DHH - činnost Záznam předání - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.					
<b>41.13</b>	<b>Zpracování VYZPU DHH - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.</b>	<b>KQ1</b>				
41.13.01	Zpracování VYZPU DHH - činnost Záznam předání - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.					
<b>41.14</b>	<b>Zpracování ODP DHH - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.</b>	<b>KQ1</b>				
41.14.01	Výzva k odstranění vad odvolání - činnost Záznam předání - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.					
41.14.02	Rozhodnutí o zamítnutí/zastavení řízení - činnost Záznam předání - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.					
41.14.03	Postoupení nadřízenému orgánu - činnost Záznam předání - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.					
<b>41.15</b>	<b>Zpracování DAP DHH - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb. - dočasná blokáce zpracování DAP DHH pro ZO od 2024 do realizace úloh dle stanovených DT</b>	<b>KM1c</b>				
41.15.01	Blokace Zpracování DAP DHH - činnost Vlož					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
41.15.02	Blokace Zpracování DAP DHH - činnost Oprav					
41.15.03	Blokace Zpracování DAP DHH - DOM - činnost Vlož					
41.15.04	Blokace Zpracování DAP DHH - Pokuta - činnost Vlož					
<b>45.00</b>	<b>CIS Správa číselníků</b>					
<b>45.01</b>	<b>Zavedení nových celostátních číselníků a změny dosavadních</b>	<b>KR1</b>				
45.01.01	Zpracování nových CIS a změny CIS na GFŘ					
45.01.02	Výpisy nových CIS a změn CIS na ÚFO					
45.01.03	Příprava na odeslání nových a změněných CIS z GFŘ					
45.01.04	Dávková aktualizace CIS na GFŘ					
45.01.05	Dávková aktualizace CIS na ÚFO (mimo GFŘ)					
<b>67.00</b>	<b>SFÚ Statistické přehledy za FÚ</b>					
<b>67.01</b>	<b>DHH - zohlednění ve statistikách SFÚ</b>	<b>KP1</b>				
67.01.01	Zpracování nových DP do funkce pro tvorbu dat pro tabulky č. 7					
67.01.02	Zpracování nových DP do Operativních statistik FÚ - Počty daňových subjektů					
<b>69.00</b>	<b>GFR Generální finanční ředitelství</b>					
<b>69.01</b>	<b>Úprava sestav DAP DPP v souvislosti s KSB</b>	<b>KQ1</b>	<b>HL202302949</b>			
69.01.01	Úprava programu pro přebírání dat posledního vyměření					
69.01.02	Úprava programu pro výstup sestav					
69.01.03	Zohlednění Měny ve funkci pro výběr dat z DAP/ÚV DPP pro účely MF Statistik					


#### 4. CENA

##### 4.1 Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“

Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“ dle této Prováděcí smlouvy bude placena na základě akceptace fakturačních termínů definovaných v článku 2.2 *Fakturační termíny a jejich kroky* této Přílohy č. 1 dle tabulky níže.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

#### Konsolidační balíček

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
KM1c				65 249 544,00
KO1				
KP1				
KQ1				
KR1				
			<b>CELKEM Kč bez DPH</b>	<b>65 249 544,00</b>

#### 4.2 Cena za služby řízení vývoje ADIS - Poměrná část dle rozsahu úprav ADIS


V rámci této Prováděcí smlouvy č. 20 objednává Objednatel služby Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS.

Celková výše ceny za služby řízení vývoje ADIS činí 3 910 231,52 Kč (slovy: tři miliony devět set deset tisíc dvě stě třicet jedna korun českých a padesát dva haléře) bez daně z přidané hodnoty.

Tato cena (za služby řízení vývoje ADIS) bude Objednatelem hrazena v 8 stejných měsíčních splátkách ve výši 488 778,94 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát osm tisíc sedm set sedmdesát osm korun českých a devadesát čtyři haléřů) bez DPH, a to vždy zpětně po skončení každého z kalendářních měsíců v období od 01. 11. 2023 do 30. 06 2024. Příslušný daňový doklad bude Zhotovitelem vždy vystaven do 15 (patnácti) dnů od skončení daného kalendářního měsíce.

#### 4.3 Cena za služby koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti ADIS

- Dohled nad dodržováním bezpečnostních požadavků
- Dohled a koordinace tvorby dokumentace s ohledem na bezpečnost
- Dohled nad architekturou nových úprav aplikace ADIS s dopadem do bezpečnosti
- Bezpečnostní konzultace nových úprav ADIS
- Účast na jednání týmu bezpečnosti v rámci vývoje nových úprav ADIS
- Koordinace požadavků na integraci nových úprav aplikace ADIS do systému řízení bezpečnosti

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
KM1c				1 866 136,96
KO1				
KP1				
KQ1				
KR1				
			<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>1 866 136,96</b>

### 5. PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE

Jednotlivé části dokumentace budou předávány následujícím způsobem, kde jejich předání Zadavateli bude protokolárně potvrzeno uvedeným způsobem.



### 5.1 Analytická zadání jednotlivých distribučních termínů

Analytická zadání („AZ“) budou dostupná online v aplikaci „Analytická zadání“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. AZ jsou vypracována nejpozději k termínu SAZ příslušného distribučního termínu.

Předání AZ se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného podpisového protokolu o splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání /dílního projektu“ dle harmonogramu příslušného distribučního termínu v souladu s postupem uvedeným v Smlouvě.

### 5.2 Uživatelská příručka ADIS

Uživatelská příručka ADIS bude dostupná online v aplikaci „Příručka v. XX“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. Příručka bude pravidelně aktualizována nejpozději k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Aktualizace uživatelské příručky se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

### 5.3 Distribuční listy jednotlivých verzí ADIS

Příslušné distribuční listy pro jednotlivé úrovně aplikace „FÚ“, „MF“ a „ET“ budou předávány ve formě textových souborů jako nedílná část instalačních souborů aplikačního programového vybavení každé předávané verze ADIS. Kromě toho budou jednotlivé distribuční listy dostupné online v aplikaci „Distribuční listy“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz.

Předání distribučních listů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

### 5.4 Datové modely

Datové modely budou dostupné online v aplikaci „Datové modely“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. Aktuální datový model ve struktuře Enterprise Architect (fyzický a logický) a export datového modelu ve formě RTF/PDF souborů bude předáván prostřednictvím aplikace „Datové modely“ k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Předání datových modelů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.
