

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: PBB Čechův most, úprava zastávky,  
Praha 1, č.a. 999 412/42  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava  
konstrukčních vrstev vozovky

Číslo SO/PS / číslo změny  
SO/PS:

1

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby č. 3/22/6100/126 uzavřené dne 25.01.2023  
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

### Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Rozpad položky 991
- (f) Přílohy k položce 991

Paré č.

Příjemce

1  
2

Zadavatel  
Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

### 1. Výluka tramvajové trati

Dne 3.8.2023 se uskutečnilo jednání za účasti zástupců TSK, AD, THMP, DPP, EUROVIA a SWARCO. Z jednání vyplynulo, že dojde ke kolizi tramvajového provozu a stavby a zakázku nelze realizovat bez výlučky tramvajové trati po nezbytně nutnou dobu. Dopravní podnik navrhl a objednatel odsouhlasil výlukou TT od 9.10. do 20.10.2023.

V době výlučky proběhla pokládka krytu chodníku podél Vltavy z litého asfaltu a rekonstrukce zastávky Čechův most v obou směrech vč. odvodnění komunikace. Součástí rekonstrukce odvodnění byla výměna těles uličních vpustí UV2 a UV3, přičemž přípojka UV3 je vedena v těsné blízkosti tramvajového tělesa a práce nelze realizovat za provozu TT.

Změna spočívala v projednání a realizaci výlučky TT za účelem pokládky krytů komunikací s užitím technologií pro dosažení co nejvyšší rovinnosti finálních povrchů z důvodu provozu cyklistů.

Změna, která nemění povahu zakázky a její hodnota je nižší než limit 15% původní hodnoty závazku, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	985 873,45	985 873,45

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy  
Ve věci projednání změn

jméno

datum

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (místopředseda  
představenstva)

jméno

Ing. Josef Richtř

datum

Ing. Josef  
podpis Richtř


Digálně podepsal  
Ing. Josef Richtř  
Datum: 2024.03.25  
14:32:55 +01'00'


Zhotovitel


jméno


datum

Číslo paré:
























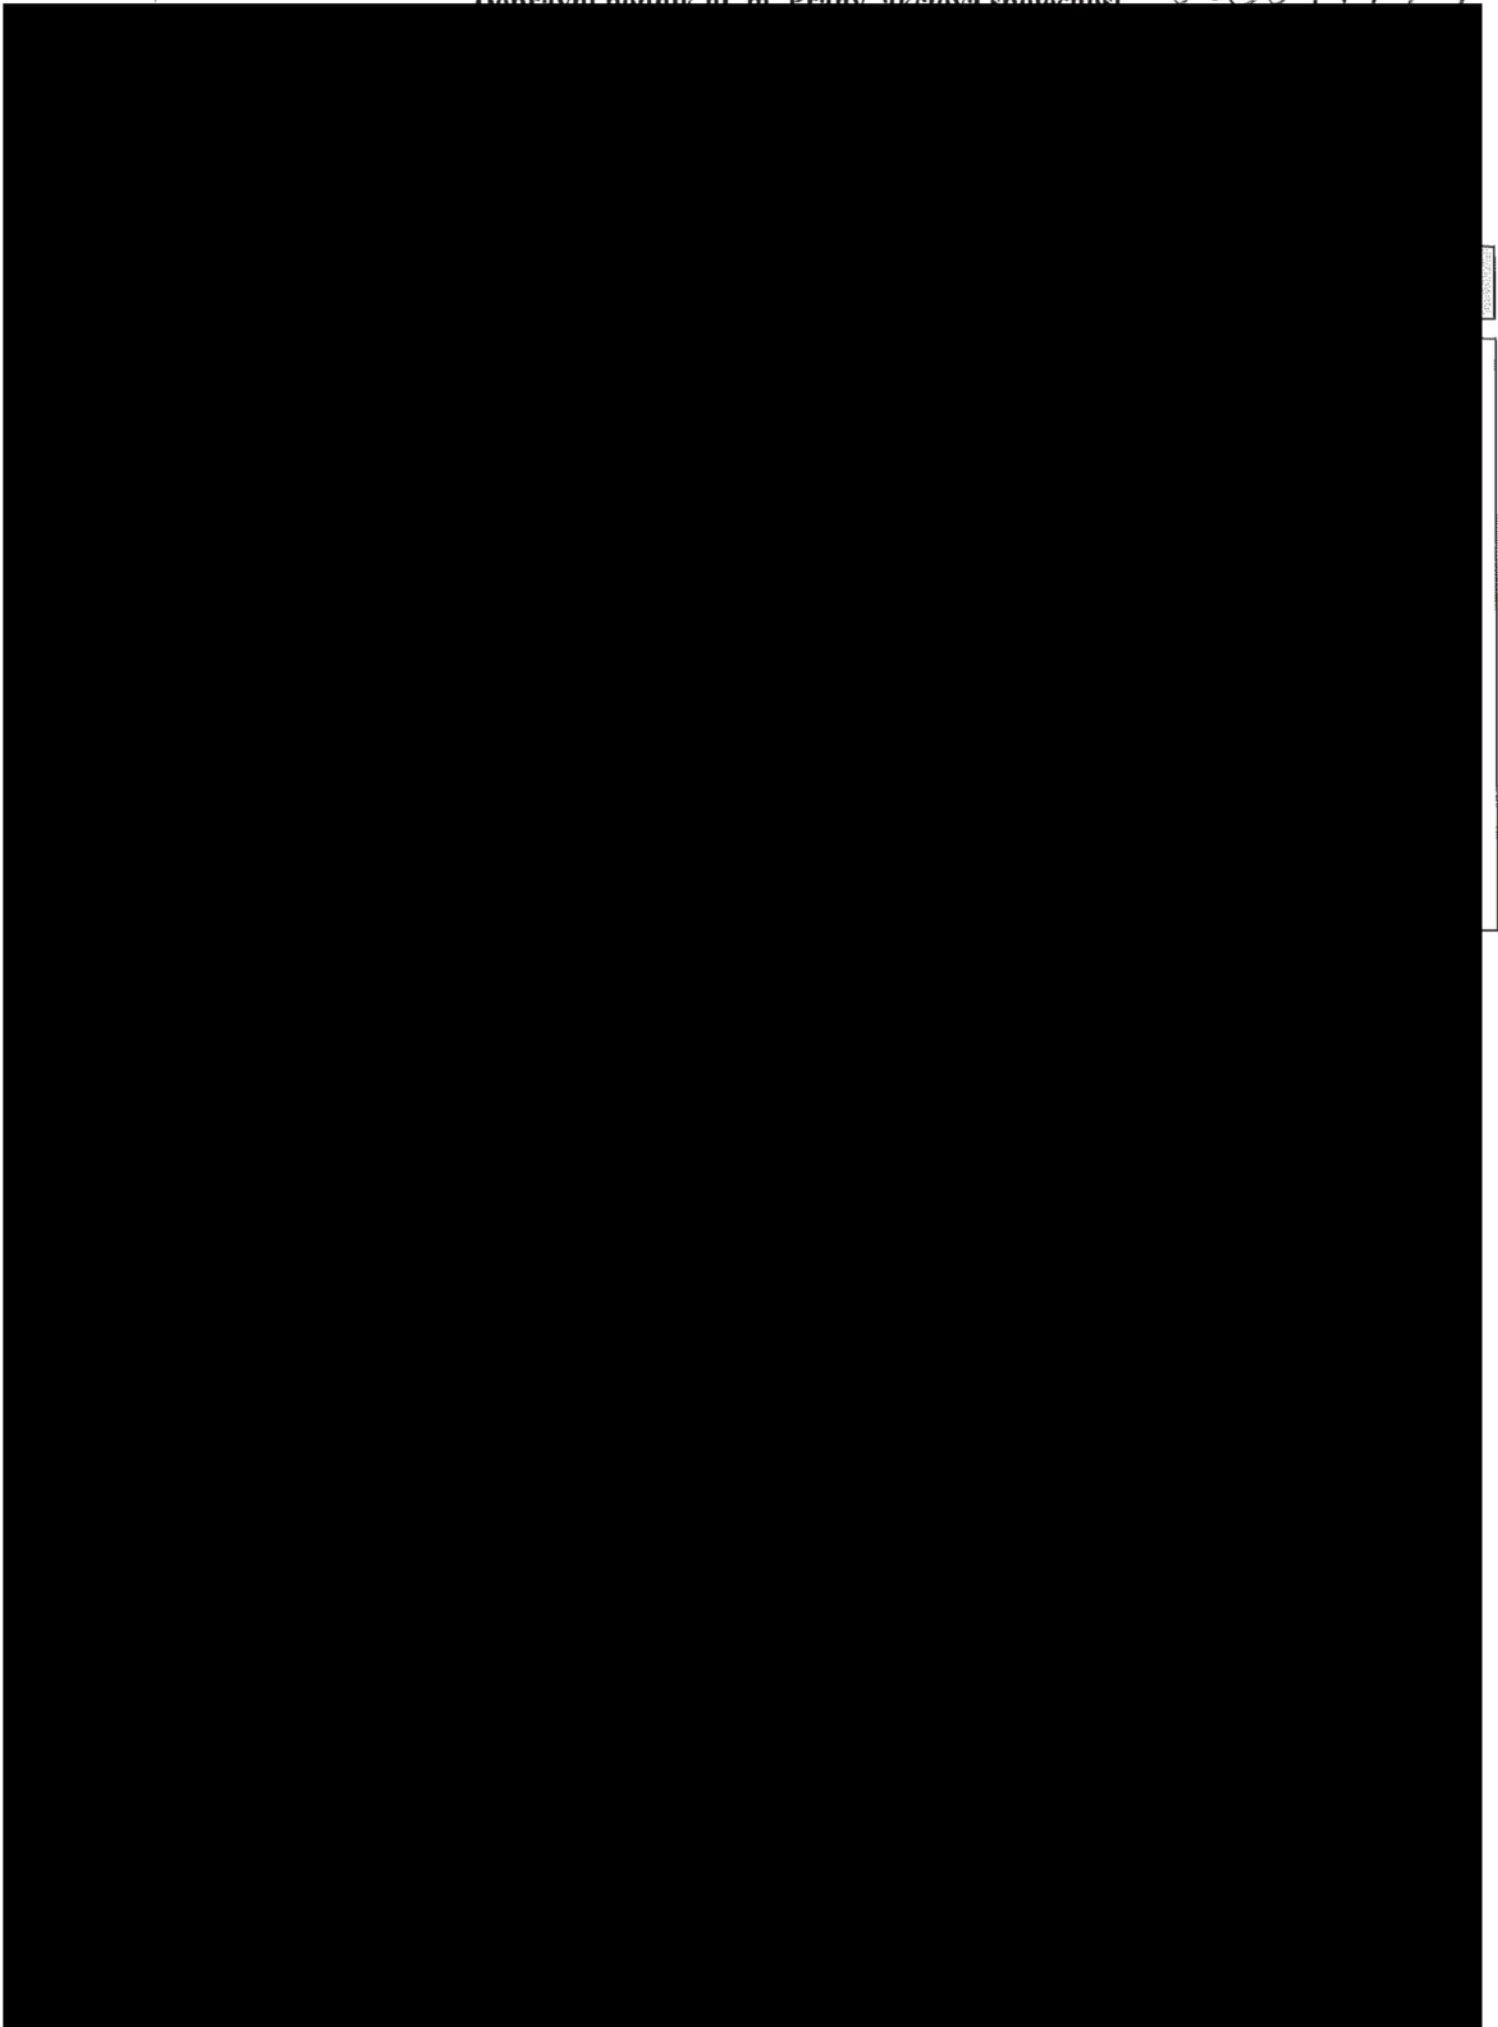












Doprav  
tel. +42  
IČ 0000  
bankov




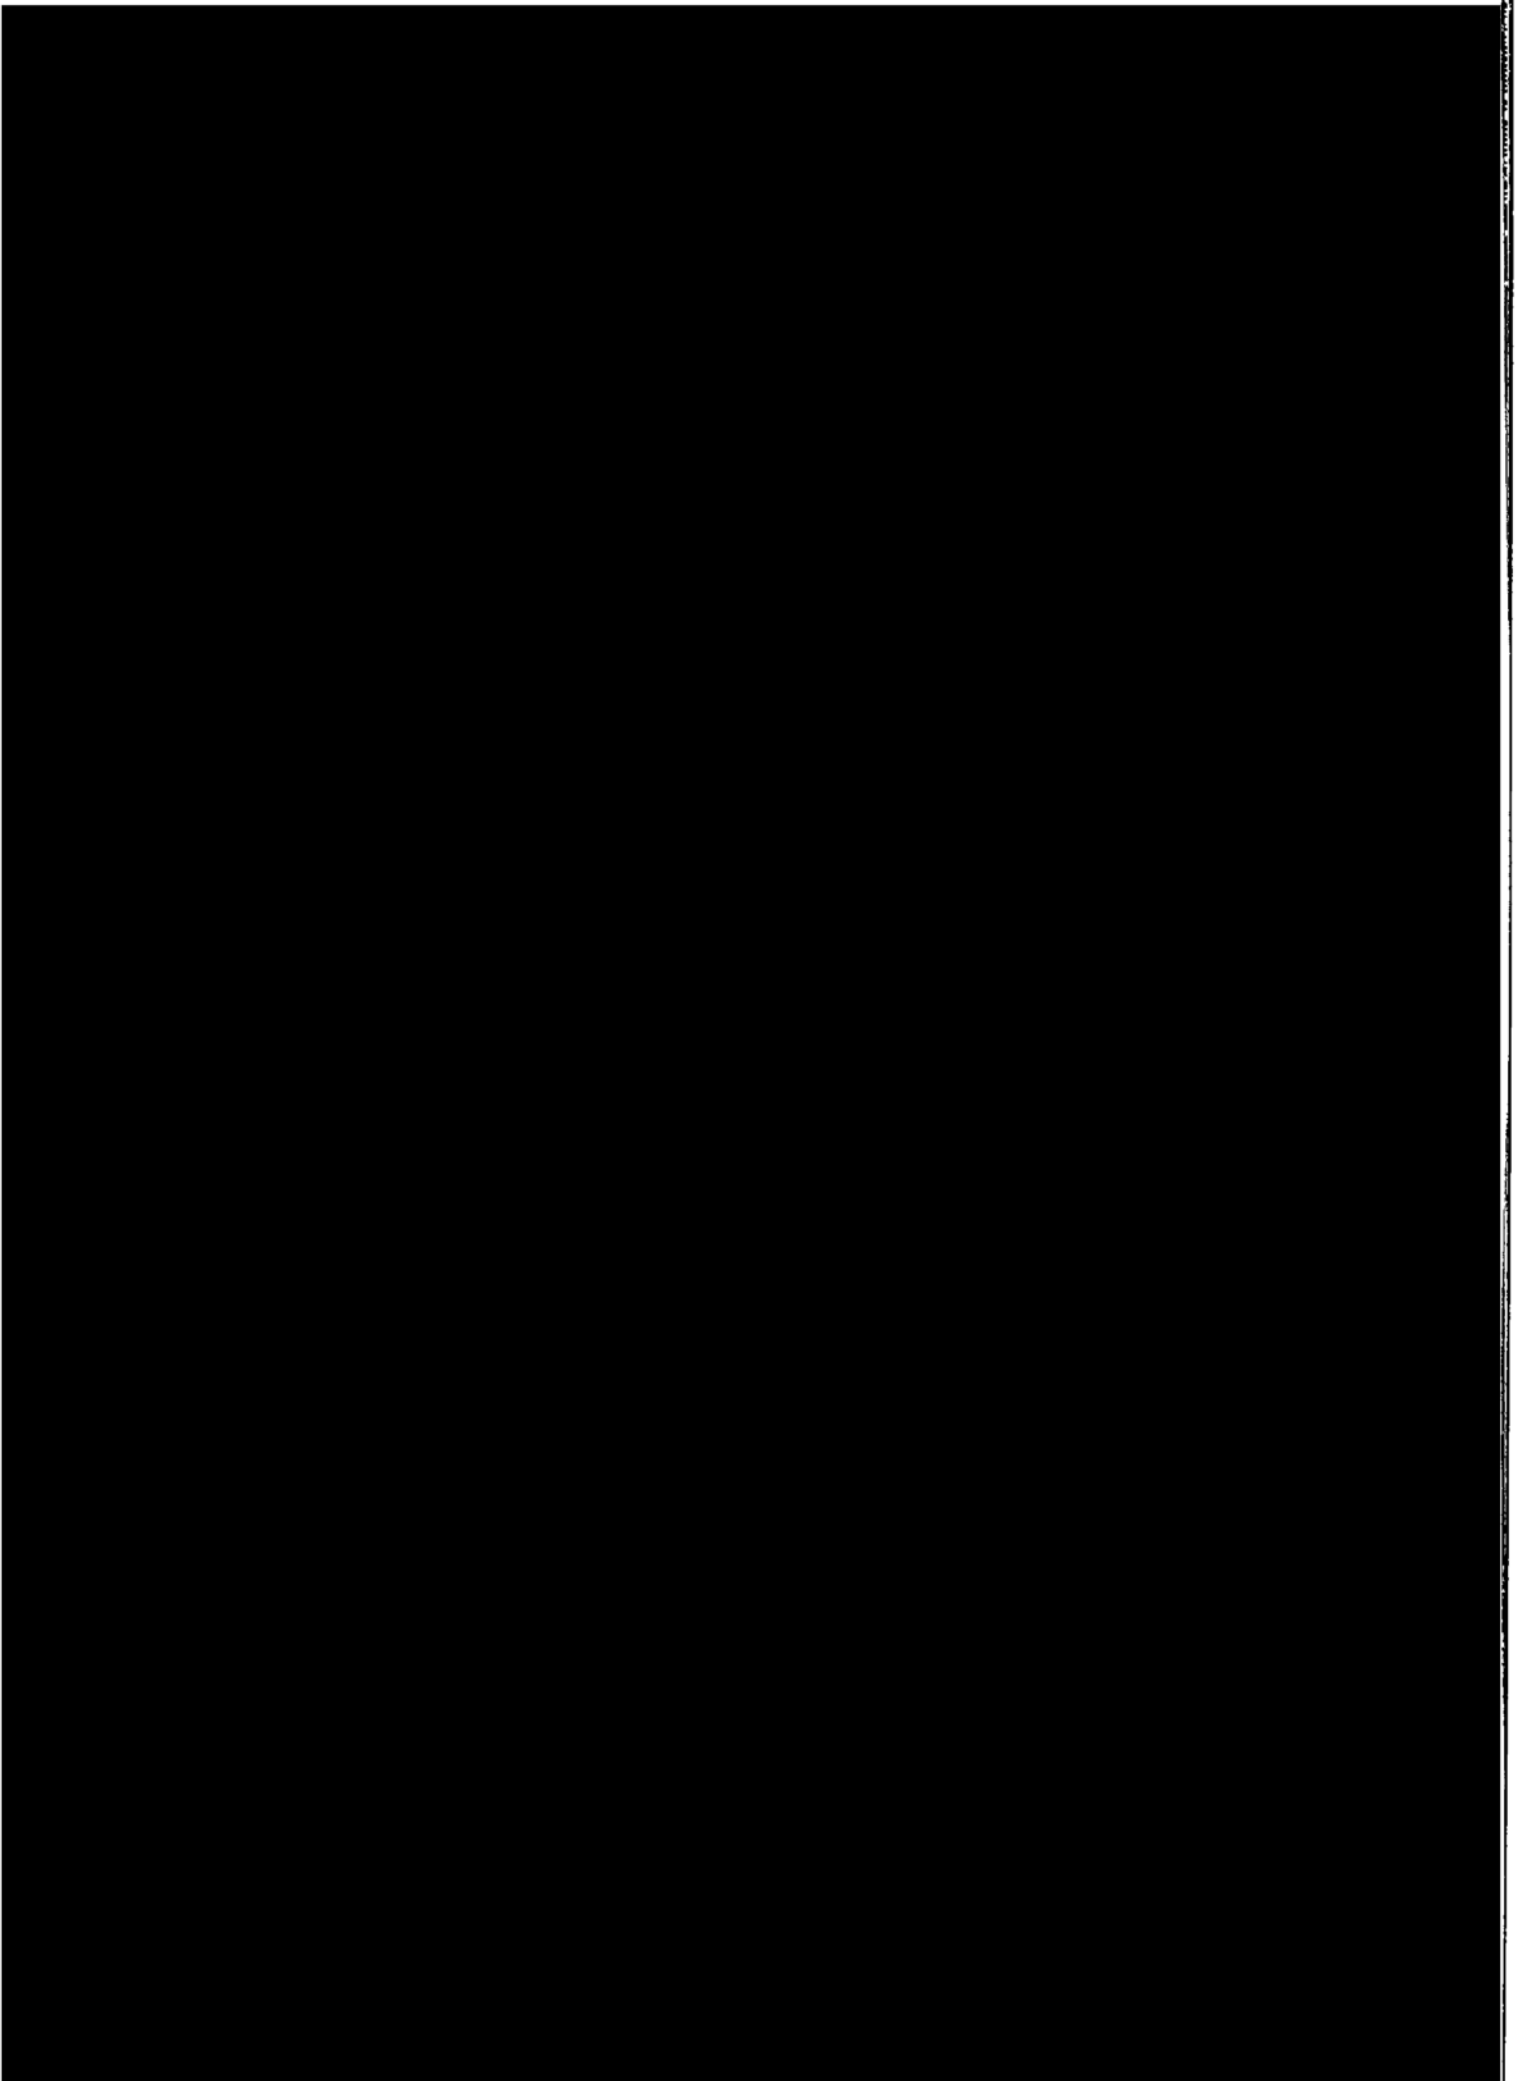



2 \_\_\_\_\_

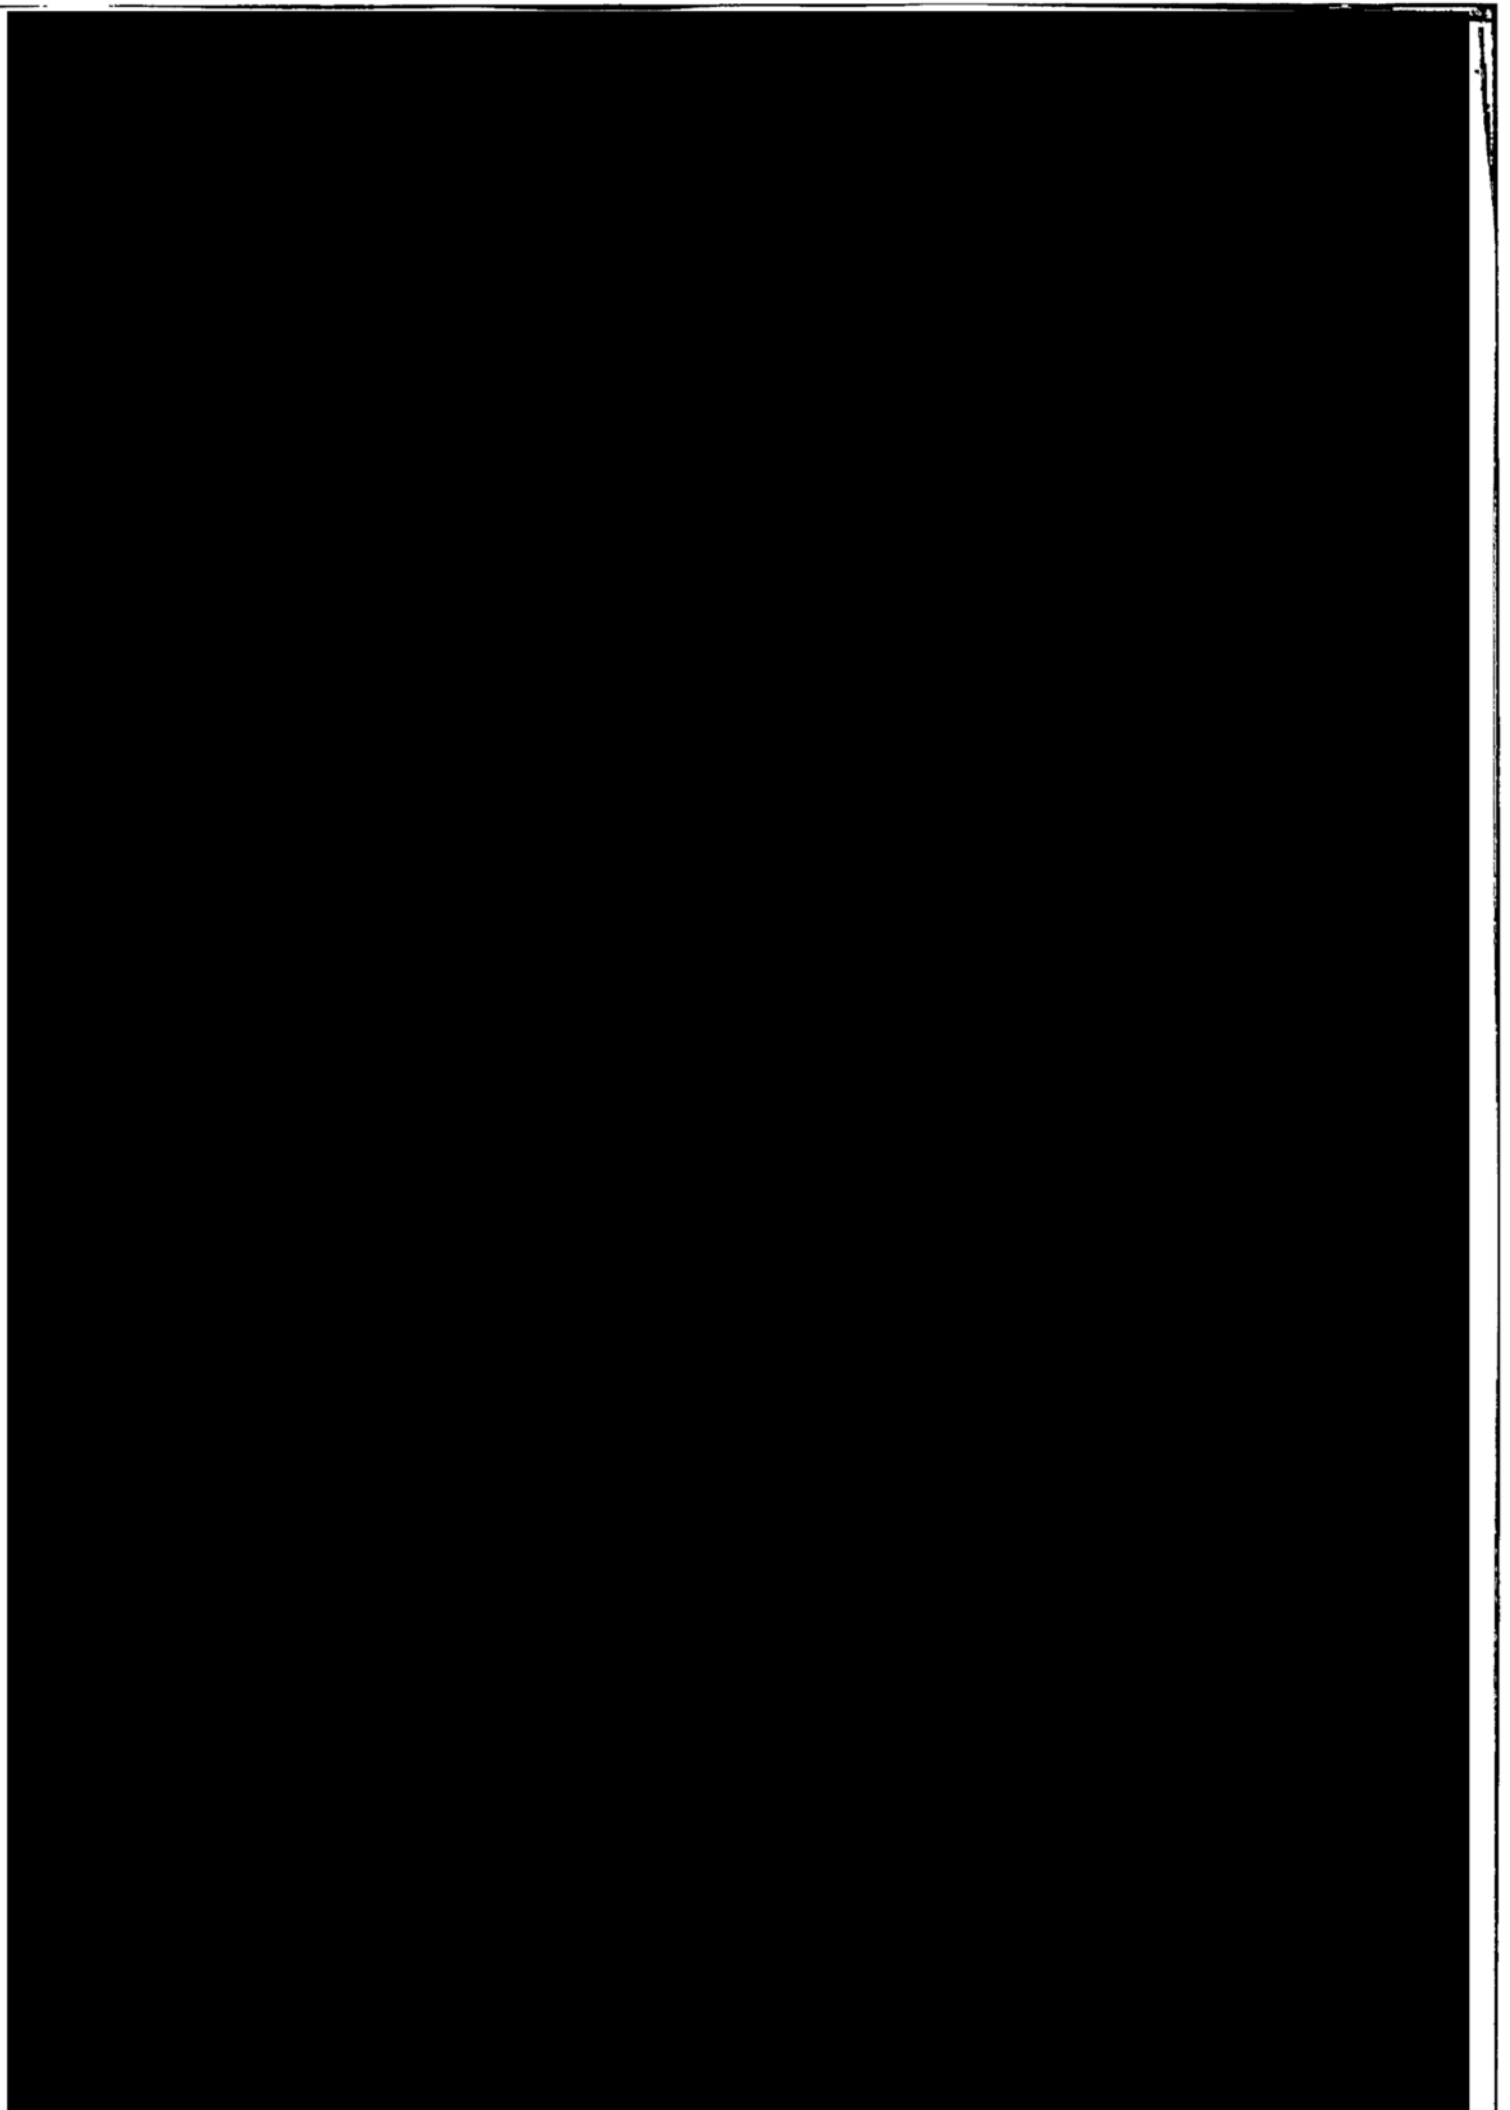









ZAK. č. 125090000398

ESS/47990/23  
JP/153/23/253000

11.9.2023/102/253200



Objednávka č. 4249836957

U každé faktury prosím uvádějte číslo objednávky

Datum  
24.08.2023

**Objednatel**  
EUROVIA CS, a.s.  
zav. Praha západ  
K Hájm 946  
155 00 Praha 5 - Stodůlky

**Dodavatel**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Sokolovská 42/217  
190 00 Praha 9

Dodavatel č. 1220000004  
Vaše č. telefonu

<b>Dodací adresa:</b>	<b>Fakturační adresa</b> EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 MUCODE 1511 zav. Praha západ PO Box 202 160 41 Praha 6 euroviacs.faktury@vinci-construction.com	<b>Název stavby</b> PBB Čechův most, úprava zastávky, P1 <b>Číslo stavby</b> 1511.3041287MTO.01 <b>Dodací lhůta</b> <b>Zpracoval(a)</b> Iva DVOŘÁČKOVÁ <b>T/</b> <b>GSM/</b> +420734686893 <b>F/</b>
<b>Platební podmínky:</b> 30 dní po doručení faktury	E/ iva.dvorackova@vinci-construction.com	

Dle cenové kalkulace (příloha) objednáme opravu poškozených trakčních kabelů na stavbě Čechův most  
Termín : dle dohody se stavbyvedoucím  
Kontakt : Ing. Martin Křížek - stavbyvedoucí - tel. 734 764 945 (Eurovia CS, a.s., závod Praha západ)

Dne 7.9.2023 rozšiřujeme objednávku o druhou položku dle cenové nabídky z 1.9.2023 (příloha) na proměření NK + ZK na Nábřeží Edvarda Beneše

Pol.	Označení	Množství	Jedn.	Cena za měř. jedn. (Kč)	Cena bez DPH (Kč)
00010	montážní práce <u>(již přidělená ZAK.: 125090000398)</u>	45.681	JV	1,00	45.681,00
00020	<u>proměření NK + ZK, Nábř. Edv. Beneše</u>	<u>27.600</u>	<u>(JV)</u>	<u>(1,00)</u>	<u>27.600,00</u>

Cena celkem bez DPH (Kč) 73.281,00


**EUROVIA na jednu akci a na jednu firmu objednávku původní navyšuje.**

Fakturu, prosím, zašlete na emailovou adresu uvedenou pod fakturační adresou. V případě, že nemůžete fakturu zaslat e-mailem, zašlete ji v tištěné formě na fakturační adresu. Podmínky pro přijímání faktur jsou umístěné na webu společnosti [www.vinci-construction.cz](http://www.vinci-construction.cz) v sekci **Udržitelnost - Dodavatelské faktury**. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky a musí k ní být přiložen objednatelům potvrzený doklad o provedeném plnění. V případě, že je předmětem plnění zboží, je dodavatel v souladu s platnými právními předpisy povinen spolu s plněním předat objednateli i doklady osvědčující, že zboží splňuje podmínky stanovené právními předpisy pro uvedení na trh, popř. obsahující důležité informace pro uživatele zboží. Při nedodržení uvedených pravidel nebude faktura akceptována.

Pokud je součástí objednávky dodání na pracoviště objednatelů nebo jakékoli práce na pracovišti objednatelů, musí dodavatel kromě legislativních požadavků dodržovat i požadavky BOZP, PO, OŽP uvedené v dokumentu Požadavky BOZP, PO, OŽP umístěné na webu společnosti [www.vinci-construction.cz](http://www.vinci-construction.cz) v sekci **Udržitelnost - Bezpečnost při práci**.


Objednatel je oprávněn svou pohledávkou na zaplacení smluvní pokuty započítat proti pohledávce dodavatele na zaplacení ceny poskytnutého plnění. Dodavatel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku na zaplacení ceny poskytnutého plnění třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatelů. V případě porušení zákazu zastavení pohledávky je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny poskytnutého plnění.

Potvrzenou objednávkou nám, prosím, zašlete obratem emailem. Objednávku potvrďte uvedením jména, příjmení, podpisu oprávněné osoby a razítka v kolonce „Dodavatel“ níže. Jakákoliv změna objednávky musí být objednatelům písemně odsouhlasena. Informace o zpracování osobních údajů, které objednatel získá a) od druhé smluvní strany v průběhu plnění smlouvy založené touto objednávkou a/nebo b) v rámci komunikace s Vámi, jsou uvedeny v informačním memorandu zveřejněném na internetových stránkách objednatelů, případně na [www.vinci-construction.cz](http://www.vinci-construction.cz) v sekci **Udržitelnost - GDPR**. Nepokračujte v komunikaci s objednavatelem v případě, že a) se s těmito informacemi neseznámíte, b) s nimi neseznámíte osoby, jejichž údaje hodláte objednatelům zpřístupnit.



EUROVIA CS, a.s.  
závod Praha západ  
K Hájm 946  
155 00 Praha 5 - Stodůlky  
T/ +420 235 005 111 - F/ +420 235 005 202 - [www.vinci-construction.cz](http://www.vinci-construction.cz)  
IČ : 45274924, DIČ : CZ45274924

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561



EUROVIA CS, a.s.  
závod Praha západ  
K Hájm 946  
155 00 Praha 5 - Stodůlky

**Platební podmínky:** Objednatel se zavazuje uhradit na základě vystaveného daňového dokladu účtovanou cenu do 30 dnů ode dne doručení tohoto daňového dokladu objednateli. Dnem úhrady je vždy den odepsání předmětné finanční částky z účtu objednatele.

V případě skluzu plateb investora stavby vůči objednateli objednatel uhradí faktury zhotovitele do 5 dnů ode dne připsání na účet objednatele.

DPH bude připočtena podle platných předpisů. Objednatel je plátcem DPH ve smyslu §92e zákona 235/2004Sb.

Faktury budou předkládány v pouze v 1 vyhotovení, nebudou k nim lepeny přílohy a faktury nebudou sešívány (kancelářskou sponkou být spojeny mohou). Případně další doklady budou k fakturám přikládány v přílohách o formátu A4 (jednotlivé doklady v původním stavu nebude možné elektronicky zpracovat a proto objednatel bude takové faktury vracet). Při zpracování faktur bude zachována minimální gramáž papíru 80g/m<sup>2</sup> bez jakýchkoliv reklamních potisků na lícové či rubové straně.

Objednané a dodávané zboží musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. v platném znění. Musí splňovat veškeré technické požadavky po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, musí být bezpečný a splňovat hygienické požadavky i s ohledem na ochranu životního prostředí dle závazných evropských norem.

Informace o zpracování osobních údajů, ke kterým společnost ze Skupiny EUROVIA CS („Společnost“) získá a) od druhé smluvní strany přístup v průběhu plnění smlouvy založené touto objednávkou; b) v rámci komunikace s Vámi, jsou uvedeny v informačním memorandu zveřejněném na internetových stránkách <http://www.eurovia.cz>, v záložce „GDPR“. Nepokračujte v komunikaci se Společností v případě, že se a) s těmito informacemi neseznámíte; b) že s nimi neseznámíte osoby, jejichž údaje hodláte Společnosti zpřístupnit.

Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě této objednávky vůči objednateli třetí osobě; přičemž toto ustanovení se vztahuje na i tzv. factoring.


Příloha: č. 1 – Cenová nabídka ze dne 1.9.2023 je nedílnou součástí této objednávky.

 **EUROVIA**  
EUROVIA CS, a.s.  
závod Praha západ  
K Hájtům 946  
155 00 Praha 5 - Stodůlky

*(Handwritten signature)*

**Ing. Petr Tesař**  
ředitel závodu Praha západ  
EUROVIA CS, a.s.  
na základě plné moci

Co: Ing. Tožička, hlavní stavbyvedoucí

 **Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Sokolovská 42/217, Vysočany  
190 00 Praha 9

*(Handwritten signature)*

112

Dne: 23.08.2023

Genová nabídka na :	OPRAVA POŠKOZENÝCH TRAKČNÍCH KABELŮ NK 59 B,C
Zkrácený název akce:	NK 59 B,C

Místo: NÁBŘEŽÍ EDVARDA BENEŠE


Objednavatel:		Dodavatel :	
EUROVIA CS, a.s.		Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost	
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OBLAST ČECHY STŘED		se sídlem Praha 9	
ZÁVOD PRAHA ZÁPAD		Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9	
K HÁJŮM 946, 155 00 PRAHA 5		IČ: 00005886, DIČ: CZ 00005886	
IČ:	45274924	Zápis v obch.rejstříku, vedeném MS v Praze dne 11.7.1991,	
DIČ:	CZ45274924	sp.zn.: Rg.: B 847	
Kontaktní osoba:	KŘÍŽEK MARTIN	Kontaktní osoba:	Šmejkal Jindřich
Mobil:	734 764 945	Mobil:	606 609 397
E-mail	martin.krizek@vinci-	E-mail	smejkalj@dpp.cz

poř. číslo	popis položek - I. Etapa	cena bez DPH			
		m.j.	množství	jednotková cena	cena celkem
1	KABEL AHKCY 1x500	m	8	732,00	5 856,00
2	SPOJKA KABELOVÁ IJPC 1x500	ks	4	2 496,00	9 984,00
3	MĚŘICÍ VŮZ	h	3	2 400,00	7 200,00
4	MONTÁŽNÍ PRÁCE	h	9	1 049,00	9 441,00
5	CENTRÁLNÍ POHOTOVOSTNÍ ČETA	h	6	2 200,00	13 200,00
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
cena celkem bez DPH				Kč	45 681,00


Kontaktní osoba  
Münster Luděk  
mistr  
724176760  
MunsterL@dpp.cz

[www.dpp.cz](http://www.dpp.cz)

Schválil  
Šmejkal Jindřich  
vedoucí provozu  
606609397  
smejkalj@dpp.cz



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9  
253200 - provoz Kabelová síť  
adresa pracoviště:  
Sazečská 1, 108 00 Praha 10  
[www.dpp.cz](http://www.dpp.cz)



Dne: 01.09.2023

Cenová nabídka na :	PROMĚŘENÍ NAPÁJECÍCH A ZPĚTNÝCH TRAKČNÍCH KABELŮ
Zkrácený název akce:	PROMĚŘENÍ NK+ZK

Místo: NÁBŘEŽÍ EDVARDA BENEŠE


<b>Objednavatel:</b> EUROVIA CS, a.s. Odštěpný závod oblast Čechy střed závod Praha západ	<b>Dodavatel :</b> Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost se sídlem Praha 9 Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČ: 00005886, DIČ: CZ 00005886		
IČ:	Zápis v obch.rejstříku, vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp.zn.: Rg.: B 847		
DIČ:			
Kontaktní osoba:	Ing Martin Křížek	Kontaktní osoba:	Šmejkal Jindřich
Mobil:	734 674 945	Mobil:	606 609 397
E-mail	martin.krizek@vinci-cor	E-mail	smejkalj@dpp.cz

poř. čísł.	popis položek - I. Etapa	cena bez DPH			
		m.j.	množství	jednotková cena	cena celkem
1	MĚŘÍCÍ VŮZ Uzk	h	6	2 400,00	14 400,00
2	CENTRÁLNÍ POHOTOVOST- VYPNUTÍ, ZAJIŠTENÍ	h	6	2 200,00	13 200,00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
				cena celkem bez DPH	Kč 27 600,00


**Kontaktní osoba**  
Münster Luděk  
mistr  
724176760  
MunsterL@dpp.cz

[www.dpp.cz](http://www.dpp.cz)

**Schválil**  
Šmejkal Jindřich  
vedoucí provozu  
606609397  
smejkalj@dpp.cz



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9  
253200 - provoz Kabelová síť  
adresa pracoviště:  
Sazečská 1, 108 00 Praha 10  
[www.dpp.cz](http://www.dpp.cz)



## Zápis o předání díla

Stavba :

OPRAVA A PROMĚŘENÍ NAPÁJECÍCH A ZPĚTNÝCH TRAKČNÍCH KABELŮ

Datum :

05.12.2023

<b>Dodavatel :</b>		<b>Objednatel:</b>	
Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost		EUROVIA CS, a.s.	
se sídlem Praha 9		Odštěpný závod oblast Čechy střed	
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9		závod Praha západ	
IČ: 00005886, DIČ: CZ 00005886			
Kontaktní osoba:	Šmejkal Jindřich	IČ:	
Mobil:	606609397	DIČ:	
E-mail:	smejkalj@dpp.cz	Kontaktní osoba:	Ing Martin Křížek
číslo zakázky DP:	125090000398	Mobil:	7346749 45
číslo jednací DP:		E-mail:	martin.krizek@vinci-cor

číslo objednávky:	4249836957	ze dne :	7.9.2023
-------------------	------------	----------	----------

### Rozpis práce dle položek

Pořadové číslo položky	popis položek	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	cena celkem bez DPH
1	MĚŘICÍ VŮZ UzK	h	9	Kč 2 400,00	Kč 21 600,00
2	CENTRÁLNÍ POHOTOVOST- VYPNUTÍ, ZAJIŠTENÍ	h	12	Kč 2 200,00	Kč 26 400,00
3	KABEL AHKCY 1x500	m.	8	Kč 732,00	Kč 5 856,00
4	SPOJKA KABELOVÁ LJPC 1x500	ks	4	Kč 2 496,00	Kč 9 984,00
5	MONTÁŽNÍ PRÁCE	h	9	Kč 1 049,00	Kč 9 441,00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
<b>celková cena bez DPH</b>					<b>Kč 73 281,00</b>

Dnešního dne bylo předáno provedení prací dle položek.  
Rozsah provedení prací je v souladu s výše uvedenou objednávkou.

Za dodavatele  
předal :

J. Šmejkal

*J. Šmejkal*  
2532001 provoz Kabelová síť 1

Nedodělky a vady :

Za odběratele  
převzal : M. Křížek

**EUROVIA**

EUROVIA CS, a.s.  
závod Praha západ  
K Hájům 946

155 00 Praha 5 - Stodůlky



Dne: 05.12.2023

Cenová nabídka na :	OPRAVA A PROMĚŘENÍ NAPÁJECÍCH A ZPĚTNÝCH TRAKČNÍCH KABELŮ
Zkrácený název akce:	OPRAVA A PROMĚŘENÍ NK+ZK

Místo: NÁBŘEŽÍ EDVARDA BENEŠE

Objednavatel:		Dodavatel :	
EUROVIA CS, a.s.		Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost	
Odštěpný závod oblast Čechy střed		se sídlem Praha 9	
závod Praha západ		Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9	
		IČ: 00005886, DIČ: CZ 00005886	
IČ:		Zápis v obch.rejstříku, vedeném MS v Praze dne 11.7.1991,	
DIČ:		sp.zn.: Rg.: B 847	
Kontaktní osoba:	Ing Martin Křížek	Kontaktní osoba:	Šmejkal Jindřich
Mobil:	734 674 945	Mobil:	606 609 397
E-mail	<a href="mailto:martin.krizek@vinci-cor">martin.krizek@vinci-cor</a>	E-mail	<a href="mailto:smejkalj@dpp.cz">smejkalj@dpp.cz</a>

poř. čísł.	popis položek - I. Etapa			cena bez DPH	
		m.j.	množství	jednotková cena	cena celkem
1	MĚŘÍCÍ VŮZ Uzk	h	9	2 400,00	21 600,00
2	CENTRÁLNÍ POHOTOVOST- VYPNUTÍ, ZAJIŠTENÍ	h	12	2 200,00	26 400,00
3	KABEL AHKCY 1x500	m.	8	732,00	5 856,00
4	SPOJKA KABELOVÁ IJPC 1x500	ks	4	2 496,00	9 984,00
5	MONTÁŽNÍ PRÁCE	h	9	1 049,00	9 441,00
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
				cena celkem bez DPH	Kč 73 281,00

**Kontaktní osoba**  
**Münster Luděk**  
mistr  
724176760  
[MunsterL@dpp.cz](mailto:MunsterL@dpp.cz)

[www.dpp.cz](http://www.dpp.cz)

**Schválil**  
**Šmejkal Jindřich**  
vedoucí provozu  
606609397  
[smejkalj@dpp.cz](mailto:smejkalj@dpp.cz)

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9  
253200 - provoz Kabelová síť  
adresa pracoviště:  
Sazečská 1, 108 00 Praha 10  
[www.dpp.cz](http://www.dpp.cz)



Dopravní podnik  
hlavního města Prahy

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886

zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp.zn.: B 847

č.úctu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

IBAN - CZ40 0800 0000 0019 3073 1349, BIC - GIBACZPX

054429 / 23

**Faktura - Daňový doklad č: 2321010838**

Č.zakázky/Datum: 2050050201 / 30.10.2023  
Č.odběratele: 807567  
Č.objednávky/Datum: 4249924482 / 17.10.2023  
Datum vystavení dokladu: 31.10.2023  
Datum uskut.zdanit.plnění: 20.10.2023  
Datum splatnosti: 30.11.2023  
Způsob platby: Bankovní převod  
Měna: CZK  
Konstantní symbol: 0308



QR Platba



**Odběratel**

EUROVIA CS, a.s.  
U Michelského lesa 1581/2  
140 00 Praha 4 - Michle

DIČ: CZ45274924 IČO: 45274924

*MU CODE 1511*

Zkušební jízda tramvaje pro obnovení provozu dne 20.10.2023 , název stavby PBB Čechův most.

Označení	Sazba DPH	Jednotková cena	Hodnota
Číslo		Množství MJ	
služby ostatní		3.535,94 CZK	
TCJ00069	21 %	1 JV	3.535,94
Součet položek			3.535,94
	Sazba DPH	Cena vč.DPH	DPH
DPH brutto	21 %	3.535,94	613,68
			Cena bez DPH
			2.922,26
Celkem s DPH			3.535,94
Celkem k úhradě			3.535,94

Příloha: 1x objednávka

Kontaktní osoba /telefon:  
Michaela Hemrová 2961-92326

strana 1 z 1



Objednávka č. 4249924482  
U každé faktury prosím uvádějte číslo objednávky

Datum  
17.10.2023

Objednatel  
EUROVIA CS, a.s.  
zav.Praha západ  
K Hájm 946  
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Dodavatel  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Sokolovská 42/217  
190 00 Praha 9

Dodavatel č. 1220000004  
Vaše č. telefonu

<b>Dodací adresa:</b>	<b>Fakturační adresa</b> EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 MUCODE 1511 zav.Praha západ PO Box 202 160 41 Praha 6 euroviacs.faktury@vinci-construction.com	<b>Název stavby</b> PBB Čechův most, úprava zastávky, P1 <b>Číslo stavby</b> 1511.3041287MTO.01 <b>Dodací lhůta</b> <b>Zpracoval(a)</b> Iva DVOŘÁČKOVÁ <b>T/</b> <b>GSM/</b> +420734686893 <b>F/</b>
<b>Platební podmínky:</b> 30 dní po doručení faktury	E/ iva.dvorackova@vinci-construction.com	

Objednáváme u Vás v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění : jízdu zkušební tramvaje pro obnovění provozu.  
Kontakt : Ing. Tožička - hlavní stavbyvedoucí - tel. 731 602 151 (Eurovia CS, a.s., zlívod Praha západ)


Pol.	Označení	Množství	Jedn.	Cena za měř. jedn. (Kč)	Cena bez DPH (Kč)
00010	jízda zkušební tramvaje pro obnovení provozu	1	JV	3.000,00	3.000,00
<b>Cena celkem bez DPH (Kč)</b>					<b>3.000,00</b>

Fakturu, prosím, zašlete na emailovou adresu uvedenou pod fakturační adresou. V případě, že nemůžete fakturu zaslat e-mailem, zašlete ji v tištěné formě na fakturační adresu. Podmínky pro přijímání faktur jsou umístěné na webu společnosti [www.vinci-construction.cz](http://www.vinci-construction.cz) v sekci **Udržitelnost - Dodavatelské faktury**. Na fakturě musí být uvedeno číslo objednávky a musí k ní být přiložen objednatelům potvrzený doklad o provedeném plnění. V případě, že je předmětem plnění zboží, je dodavatel v souladu s platnými právními předpisy povinen spolu s plněním předat objednateli i doklady osvědčující, že zboží splňuje podmínky stanovené právními předpisy pro uvedení na trh, popř. obsahující důležité informace pro uživatele zboží. Při nedodržení uvedených pravidel nebude faktura akceptována.

Pokud je součástí objednávky dodání na pracoviště objednatele nebo jakékoliv práce na pracovišti objednatele, musí dodavatel kromě legislativních požadavků dodržovat i požadavky BOZP, PO, OŽP uvedené v dokumentu Požadavky BOZP, PO, OŽP umístěné na webu společnosti [www.vinci-construction.cz](http://www.vinci-construction.cz) v sekci **Udržitelnost - Bezpečnost při práci**.

Objednatel je oprávněn svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započítat proti pohledávce dodavatele na zaplacení ceny poskytnutého plnění. Dodavatel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku na zaplacení ceny poskytnutého plnění třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení zákazu zastavení pohledávky je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny poskytnutého plnění.

Potvrzenou objednávku nám, prosím, zašlete obratem emailem. Objednávku potvrďte uvedením jména, příjmení, podpisu oprávněné osoby a razítka v kolonce „Dodavatel“ níže. Jakákoliv změna objednávky musí být objednatelům písemně odsouhlasena. Informace o zpracování osobních údajů, které objednatel získá a) od druhé smluvní strany v průběhu plnění smlouvy založené touto objednávkou a/nebo b) v rámci komunikace s Vámi, jsou uvedeny v informačním memorandu zveřejněném na internetových stránkách objednatele, případně na [www.vinci-construction.cz](http://www.vinci-construction.cz) v sekci **Udržitelnost - GDPR**. Nepokračujte v komunikaci s objednavatelem v případě, že a) se s těmito informacemi neseznámíte; b) s nimi neseznámíte osoby, jejichž údaje hodláte objednateli zpřístupnit.



EUROVIA CS, a.s. zav.Praha západ K Hájm 946 155 00 Praha 5 - Stodůlky  
T/ +420 235 005 111 - F/ +420 235 005 202 - [www.vinci-construction.cz](http://www.vinci-construction.cz)  
IČ : 45274924, DIČ : CZ45274924,  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
