


OPRAVA PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU ŠTĚPKY TPI

CENOVÁ NABÍDKA

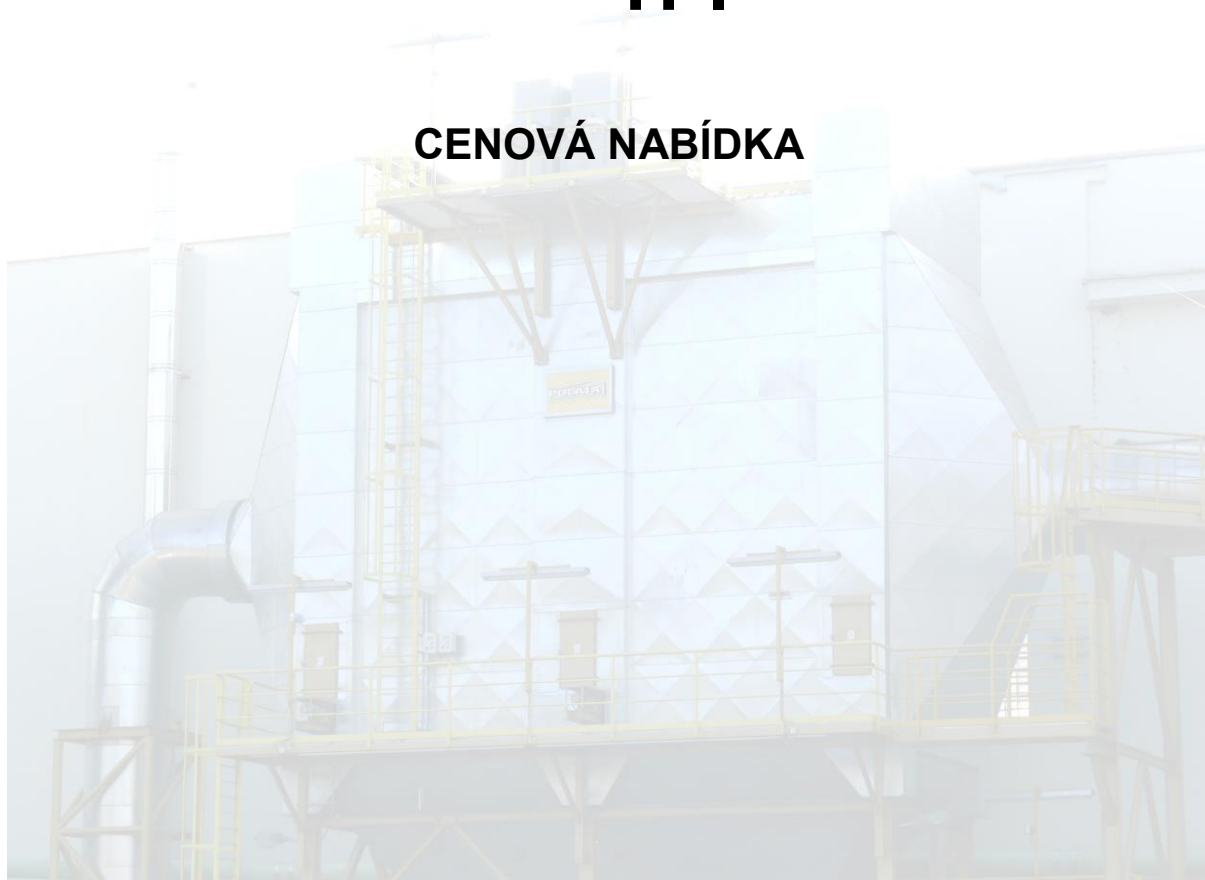

1. Postup prací

- Demontáž zařízení nad pásovým dopravníkem
 - o Bubnový rozrušovač
 - o Vibrační rošt
 - o Naváděcí plechy
 - o Hydraulické hadice a rozvod k pístům posuvné podlahy *)
 - o Zábradlí *)
 - o Odpojení elektrické instalace demontovaných částí
 - o Rozpojení pásu dopravníku
 - o Demontáž vodorovné části dopravníku včetně napínací stanice
 - o Vyčištění šachty dopravníku
- Odřezání boků šachty dopravníku a odstranění odřezaného materiálu ze šachty, likvidaci zajistí TPI
- Úprava ořezaných částí šachty
- Příprava pro uchycení vibračního roštu, bubnového rozrušovače, zábradlí
- Montáž prodlouženého dopravníku včetně napínací stanice
 - o Výměna opotřebovaných válečků, budou použity díly TPI
- Instalace prodlouženého pásu dopravníku
- Montáž náběhových plechů
- Montáž vibračního roštu včetně nového uchycení
- Montáž bubnového rozrušovače
- Montáž zábradlí *)
- Montáž hydrauliky pro písty posuvné podlahy *)
- Montáž elektrické instalace, která byla odstraněna
- Oprava nátěrů
- Zkoušky a doladění provozu

*) jen pokud se v průběhu prací ukáže nutnost této operace

Montážní a demontážní práce může zajistit POLATA

Řezání betonu dodavatelská firma

Úpravu vyřezaných ploch nějaká místní stavební firma

Prodloužení dopravníku zajistí SOLAU

Elektroinstalace MICROCOMP

2. Časová náročnost

Objednání prodloužení dopravníku 4-6 týdnů.

Demontáže 10 prac. dnů

Úpravy betonu 10 prac. dnů

Montáže 20 prac. dnů

Dokončení 5 prac. Dnů

Přesnější údaje jsou k dispozici v Termínovém harmonogramu v příloze.

3. Cena

- Demontáže 505 000,-
- Úpravy betonů 480 000,-
- Montáže 660 000,-
- Úprava dopravníku 750 000,-
- Dokončovací práce, elektřina 300 000,-

Celkem 2 695 000,- Kč

Cena je bez DPH.

Platby:

30% ceny při podepsání SoD, 70% po předání díla.

Tato cenová nabídka je předkládána s vědomím, že v současné ekonomické a politické situaci může nastat překážka dostupnosti surovin a může dojít k nárůstu cen surovin a polotovarů. Z těchto důvodů budou ve smlouvách aplikována následující opatření ve smyslu ust. § 2612 OZ:

Pokud dojde po podpisu smlouvy v průběhu realizace zakázky k výraznému zvýšení cen materiálů nebo služeb, bude uzavřen dodatek ke smlouvě o navýšení ceny díla. Za výrazný nárůst ceny materiálů nebo služeb se rozumí nárůst převyšující 10% ceny jednotlivého materiálu nebo služby. Navýšení ceny díla bude ze strany zhotovitele doloženo rozpočtem a dalšími dostupnými doklady. Zhotovitel vyzve objednatele k uzavření dodatku ohledně úpravy ceny díla návrhem dodatku a stanoví mu lhůtu k uzavření dodatku, která nesmí být kratší než 7 dní. Pokud objednatel na tento dodatek ve stanovené lhůtě nepřistoupí, má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit.

4. Platnost nabídky

Nabídka platí do 31.3.2025

5. Ochrana duševního vlastnictví

Veškeré informace obsažené v tomto návrhu jsou duševním vlastnictvím spol. POLATA s.r.o. a jsou považovány za přísně důvěrné. Obsah tohoto návrhu má důvěrný charakter a bez jeho souhlasu nesmí být sdělen třetí osobě. V případě porušení tohoto zákazu je spol. POLATA s.r.o. oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každý jednotlivý případ a kompenzaci vzniklé újmy, nákladů, ušlého zisku v plné výši.

