
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. UL 2025_0009**

mezi

CETIN a.s.

a

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na základě pověření Miroslavem Bednářem, supervizorem, VFS Čechy sever
bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(„**CETIN**“)

a

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

ID DS: bdnkk7w

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn.
Pr 86

zastoupená Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Společnost CETIN je podnikatelem dle Zákona o elektronických komunikacích a zajišťuje dle Zákona o elektronických komunikacích výstavbu a provoz sítí elektronických komunikací a je vlastníkem a provozovatelem Vedení a zařízení společnosti CETIN;
- B) Stavba vyvolala Překládku;
- C) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN zajistila Překládku,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích tuto

**Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(„Smlouva“)**

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN znamená cenový a technický návrh provedení Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Definitivní překládka znamená část Překládky v CTN označená za definitivní překládku, co do rozsahu určená položkami v CTN, je definitivní změnou trasy SEK, a nahrazuje Provizorní překládku; Definitivní překládku nelze začít realizovat dříve, než je dokončena realizace

Provizorní překládka; Definitivní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním – Etapou Překládky;

Etapa Překládky znamená kteroukoliv část Překládky, která je CTN určená za etapu, vymezená v CTN a co do rozsahu určená položkami v CTN; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Faktura znamená daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku a s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;

GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018;

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Projekt znamená realizační projektovou dokumentaci Překládky;

Provizorní překládka znamená část Překládky v CTN označená za provizorní překládku, co do rozsahu určená položkami v CTN; Provizorní překládka je dočasná změna trasy SEK, která bude nahrazena definitivní změnou trasy SEK; Provizorní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním – Etapou Překládky;

Překládka znamená stavbu v k.ú. Mšeno nad Nisou, Hraničná nad Nisou a Loučná nad Nisou spočívající (i) ve změně trasy nebo místa umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN, a/nebo (ii) v provedení zvýšené mechanické ochrany Vedení a zařízení společnosti CETIN v jeho stávající trase umístění, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky znamená přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK znamená komunikační síť ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) Zákona o elektronických komunikacích, tj. síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Stavba znamená stavbu pod označením „**Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou (Mšeno), opěrná zeď**“, jejímž stavebníkem je Stavebník;

Stavební připravenost znamená stav Stavby, který stavebně a technicky umožňuje umístění překládané části SEK, zejména jsou dokončeny hrubé terénní úpravy v nové trase Vedení a zařízení společnosti CETIN, vyřezány dřeviny, odstraněny neprovozované inženýrské sítě a jiné další objekty v trase a terén je zarovnaný do úrovně konečné nivity;

Stavební zákon znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

Vedení a zařízení společnosti CETIN znamená podzemní nebo nadzemní vedení komunikační sítě společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení společnosti CETIN;

Vyjádření o poloze sítě znamená „*Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací*“ ze dne 28. 11. 2024 vydané pod č.j. 339404/24, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o vyvlastnění znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění;

ZDPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o elektronických komunikacích znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2. Stavebník dle Vyjádření o poloze sítě vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3. Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPI Mšeno(JN)_opěrná zed’_III/29029“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1. Překládka bude realizována v rozsahu a na nemovitostech určených v CTN.
- 3.2. Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění každé z následujících podmínek:
 - a) pro stavbu Překládky je dle příslušných ustanovení Stavebního zákona vydáno povolení, povolení je pravomocné a společnosti CETIN bylo takové pravomocné povolení, včetně jeho grafické a dokladové části, předáno;
 - b) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou tak, že mezi společnostmi CETIN a každým vlastníkem každé nemovitosti dotčené v souvislosti s Překládkou je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle ust. § 104 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích nebo vzniklo společnosti CETIN oprávnění k užívání cizích nemovitostí dle ust. § 104a nebo je ve prospěch společnosti CETIN právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou dle Zákona o vyvlastnění vyvlastněno.
- 3.3. Společnost CETIN nemá povinnost (i) zahájit provedení Překládky dříve, než nastaly Předpoklady pro realizaci Překládky a (ii) provést Překládku, nejsou-li splněny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

- 3.4. Smluvní strany ujednávají, že není-li Smlouvou určeno jinak, platí pro Etapu Překládky práva a povinnosti Smluvních stran, lhůty a podmínky, ujednané Smlouvou pro Překládku.
- 3.5. Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.6. Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1. Společnost CETIN se zavazuje
 - a) před realizací Překládky:
 - (i) zajistit zpracování Projektu,
 - (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
 - b) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
 - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
 - (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
- 4.2. Stavebník je povinen před realizací Překládky:
 - a) zajistit rozhodnutí o povolení záměru o umístění stavby Překládky, přičemž stavba Překládky bude v žádosti o vydání povolení označena jako stavební objekt „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
 - b) plnit podmínky určené Vyjádřením o poloze sítě;
 - c) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Provizorní překládky a oznámit společnosti CETIN Stavební připravenost („**Kvalifikovaná výzva**“);
 - d) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky.

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru předat společnosti CETIN toto rozhodnutí včetně grafické a dokladové části, a to zasláním na email kontaktní osobě ve věcech smluvních dle odst. 8.1. Smlouvy.

- 4.3. Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední ze všech následujících podmínek:
 - a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
 - b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1. písm. a) Smlouvy;
 - c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2. Smlouvy.

- 4.4. Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ust. § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5. Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6. Jakákoliv lhůta určená společnosti CETIN Smlouvou k realizaci Překládky se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7. Dnem ukončení realizace Překládky a/nebo Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi odesláno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty určenou v odst. 8.2. Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky a/nebo Etapy Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1. Stavebník je dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2. Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **158 247,- Kč** (slovy: jedno sto padesát osm tisíc dvě stě čtyřicet sedm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3. Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě („**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do pěti (5) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4. V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2. Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení

- vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - f) náklady na identifikaci parcel,
 - g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - i) náklady související se zvláštním užíváním dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.5. Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu, se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi („**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů. Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **46 261,- Kč** (slovy: čtyřicet šest tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;
 - b) Faktura za Provizorní Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace dotčené Etapy Překládky dle odst. 4.7. Smlouvy;
 - c) Faktura za Definitivní Překládku bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace dotčené Etapy Překládky dle odst. 4.7. Smlouvy
 - d) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7. Smlouvy.

- 6.2. Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4. Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3. Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4. Faktury budou Stavebníkovi zasílány do datové schránky Stavebníka.
- 6.5. Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1. Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3. Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1. Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Hana Holušová
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel.: 720 752 377, e-mail: hana.holusova@cetin.cz

ve věcech technických: Jiří Kapras
funkce: specialista koordinace výstavby sítě
tel. 602 120 792, e-mail: jiri.kapras@cetin.cz

- 8.2. Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Růžička
funkce: ředitel
tel. 484 809 111 e-mail: posta@ksslk.cz

ve věcech technických: Ing. Martin Verner
funkce: specialista na přípravu projektů
tel. 484 809 123, e-mail: martin.verner@ksslk.cz

- 8.3. Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1. Smlouvu lze zrušit:
- (a) písemnou dohodou Smluvních stran;
 - (b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 9.2. Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:
- a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové prodlení trvá déle než šedesát (60) Dnů,
 - b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.
- Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení určeno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.3. Odstoupí-li společnost CETIN od Smlouvy dle odst. 9.2. Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4. Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 20 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5. Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6. Pokud Kvalifikovaná výzva pro Definitivní překládku nebude doručena společnosti CETIN nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne ukončení realizace Provizorní překládky dle odst. 4.7. Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.7. Pokud Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.8. Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1. Kvalifikovaná výzva pro Provizorní překládku musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ust. § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.

- 10.2. Smlouva pozbude účinnosti dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva pro Provizorní překládku.
- 10.3. Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy. Stavebník souhlasí s tím, že společnost CETIN provede na náklad Stavebníka veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu stavbou či dosavadní činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která jsou nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury.
- 10.4. Pozbytím účinnosti Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje („**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2. Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3. Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5. Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem uzavření Smlouvy.
- 12.2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o elektronických komunikacích. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.3. Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.
- Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání doručované společnosti CETIN, současně na e-mailovou adresu contract_termination@cetin.cz.
- 12.4. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na též dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny

- kontaktních osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku:
- a) § 557;
 - b) § 1767 odst. 2;
 - c) § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;
 - d) § 1743; a
 - e) § 2002 a § 2003.
- 12.7. Smluvní strany na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.8. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 1881 a § 1895 Občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.9. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami, převáží text Smlouvy.
- 12.10. Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.11. Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.12. Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

V Ústí nad Labem dne

V Liberci dne

Za CETIN:

Za Stavebníka:


Miroslav Bednář
supervizor, VFS Čechy sever
na základě pověření
CETIN a.s.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Jan Růžička
ředitel

Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace
(podepsáno elektronicky)

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES, 1:250

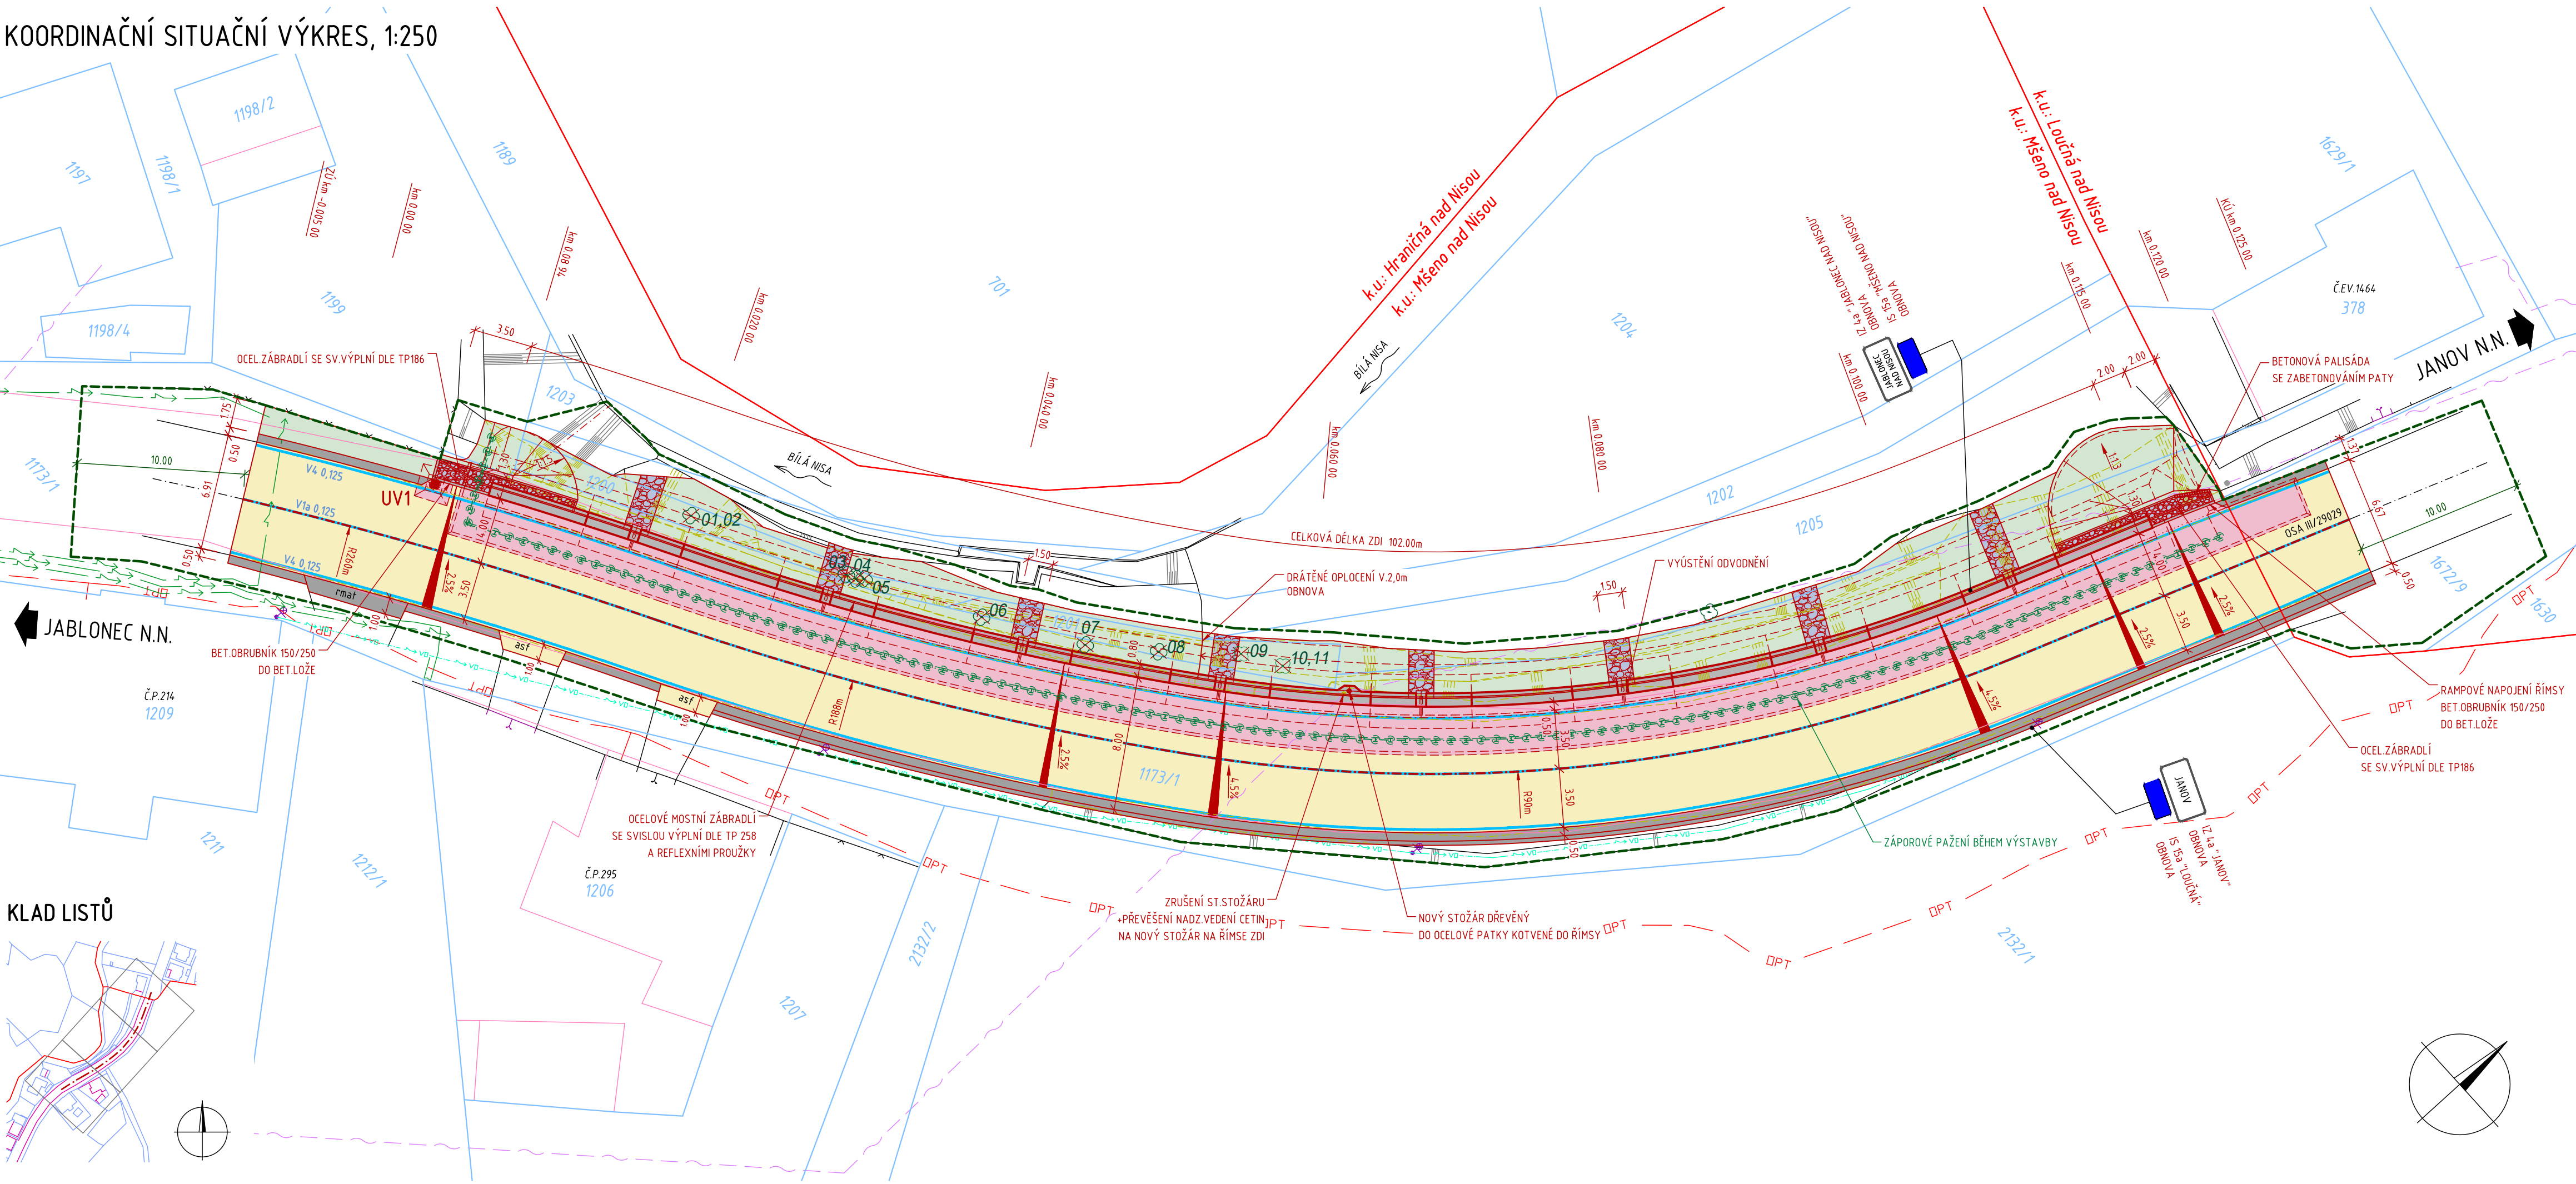

KLAD LISTŮ



POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY ZAJISTÍ ZHOTOVITEL VYTÝČENÍ A OCHRANU VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V MÍSTĚ STAVBY.
- PŘÍLOHA VYCHÁZÍ Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ A STAVU INŽ. SÍTÍ K 03/2023.
- PŘED VÝSTAVBOU BUDE ZHOTOVITELEM ZPRACOVÁN HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN A PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ.
- MÍSTA STYKU VOZOVKY S ŘÍMSAMI A OBRUBNÍKY, PROŘÍZNUTÉ SPÁRY VE VOZOVCE A MÍSTA NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKU BUDOU OPATŘENA ŽÁLKOVOU Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU.
- VŠECHNY KAMENNÉ DLAŽBY BUDOU PROVEDENY Z LIBERECKÉ ŽULY A BUDOU VYSPÁROVÁNY CEMMALTOU MC25-MX4.
- DLAŽBY BUDOU LEMOVÁNY BETONOVÝMI OBRUBNÍKY 100/250 ULOŽENÝMI DO BETONU Č25/30XF3, NEJÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK.
- VŠECHNY POVRCHY DOČASNÉHO ZÁBORU A DALŠÍ POVRCHY TERÉNU DOTČENÉ STAVBOU BUDOU PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU.
- PROVOZ NA KOMUNIKACI BUDE BĚHEM VÝSTAVBY OMEZEN - VIZ SO 180.
- PŘED PROVÁDĚNÍM DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ MUSÍ BÝT PŘIZVÁN ZÁSTUPCE DI POLICIE ČR K ODSOUHLASENÍ ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ZNAČENÍ.
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ JE MOŽNÉ ZŘÍDIT V OBLASTI DOČASNÉHO ZÁBORU S OHLEDEM NA DOPRAVNÍ OMEZENÍ.

LEGENDA:

- VOZOVKA TYP V1 - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
- VOZOVKA TYP V1x - OBNOVA ASFALT. KRYTU
- ZPEVNĚNÝ POVRCH - LOMOVÝ KÁMEN
- ZPEVNĚNÝ POVRCH - BETON
- OHUMUSOVÁNÍ + ZATRAVNĚNÍ
- POVRCH Z ASF. RECYKLÁTU
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STROMY KE KÁCENÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- PODZEMNÍ VEDENÍ NN - ČEZ Distribuce, a.s. (OCHRANNÉ PÁSMO 1,0m OD KABELU)
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ OPTICKÉ - CETIN, a.s. (OCHRANNÉ PÁSMO 1,5m OD KABELU)
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ METALICKÉ - CETIN, a.s. (OCHRANNÉ PÁSMO 1,5m OD KABELU)
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ METALICKÉ - CETIN, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ VO - JANOV NAD NISOU (OCHRANNÉ PÁSMO 1,5m OD KABELU)

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

- VLASTNICKÉ HRANICE KN
- SLOUČENÉ HRANICE KN
- HRANICE KÚ
- HRANICE STAVBY (DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU)

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Mšeno nad Nisou [656135]
OBEČ: Jablonec nad Nisou [563510]

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Loučná nad Nisou [657018]
OBEČ: Janov nad Nisou [563595]

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 180 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
- SO 251 - OPĚRNÁ ZEď V km 4,345

Investor:

Liberecký kraj

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Stavebník, mandatář:

KSSLK

KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC

LIBERECKÝ KRAJ

Krajská správa silnic Libereckého kraje

příspěvková organizace

České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IMCZ

spol. s r.o.

IMCZ, spol. s r.o.

Riegrova 196/8, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Tel.: +420 734 607 456 Email: imcz@imcz.cz

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Petr KOBZA

Podpis:

Akce:

Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou (Mšeno), opěrná zeď

Vypracoval:

Ing. Petr KOBZA

Podpis:

Část:

C - Situační výkresy

Souprava:

Stupeň:

DUSP/PDPS

Datum:

05/2024

Příloha:

Formát:

5 x A4

Měřítko:

1 : 100

Číslo:

Koordinální situační výkres

Číslo:

C.3

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

provizorní

577.



definitivní

1626/2

1628/2

551/2

SR70/4
JAN0836

577/1

1631/2

629

1631/8

503

504

1631/1

505

PSR6-1/11
JAN0205

1631/4

506

PSR6-1/12
JAN0933

622

1631/13

672

1631/10

1631/16

1631/7

1631/9

1629/1

1204

1205

1202

1201

JP7m+ kotva

JP7m provizorni

JP7m provizorni

1206


PURu295
JABM31

HSU


Loučná

Bílá Nisa (Rýnovická) (Rýnovická)

provizorní

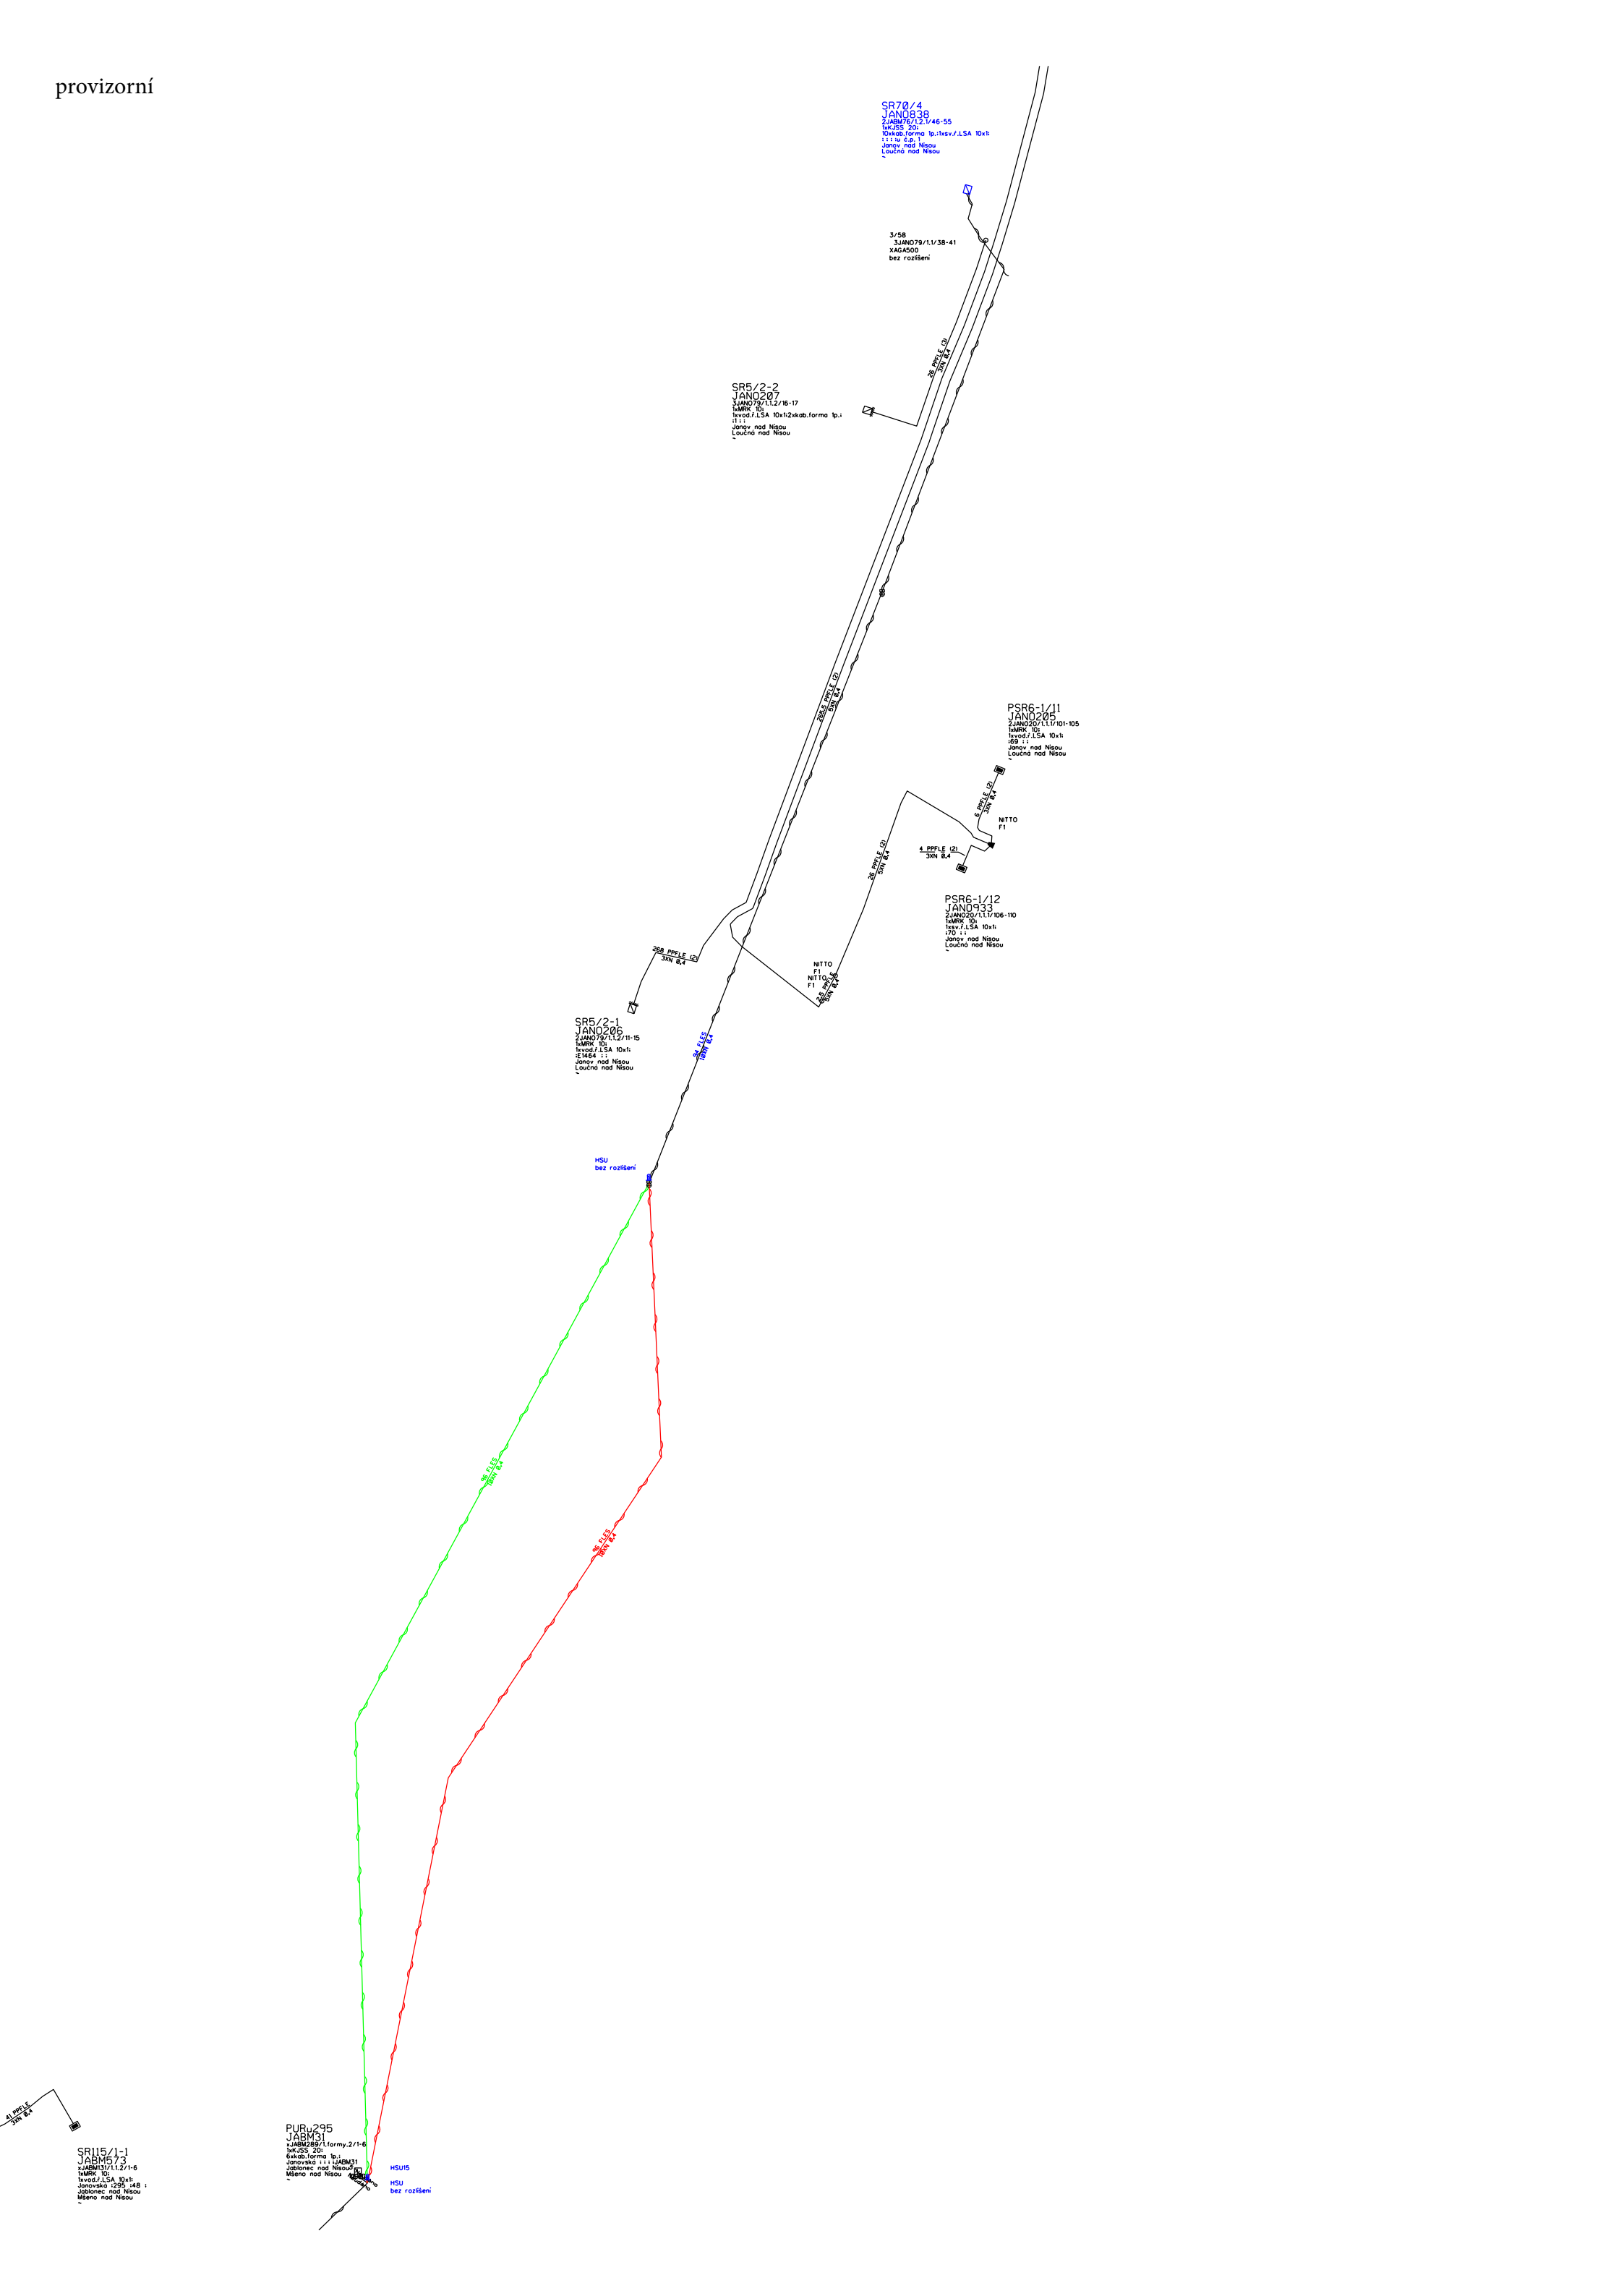

definitivní

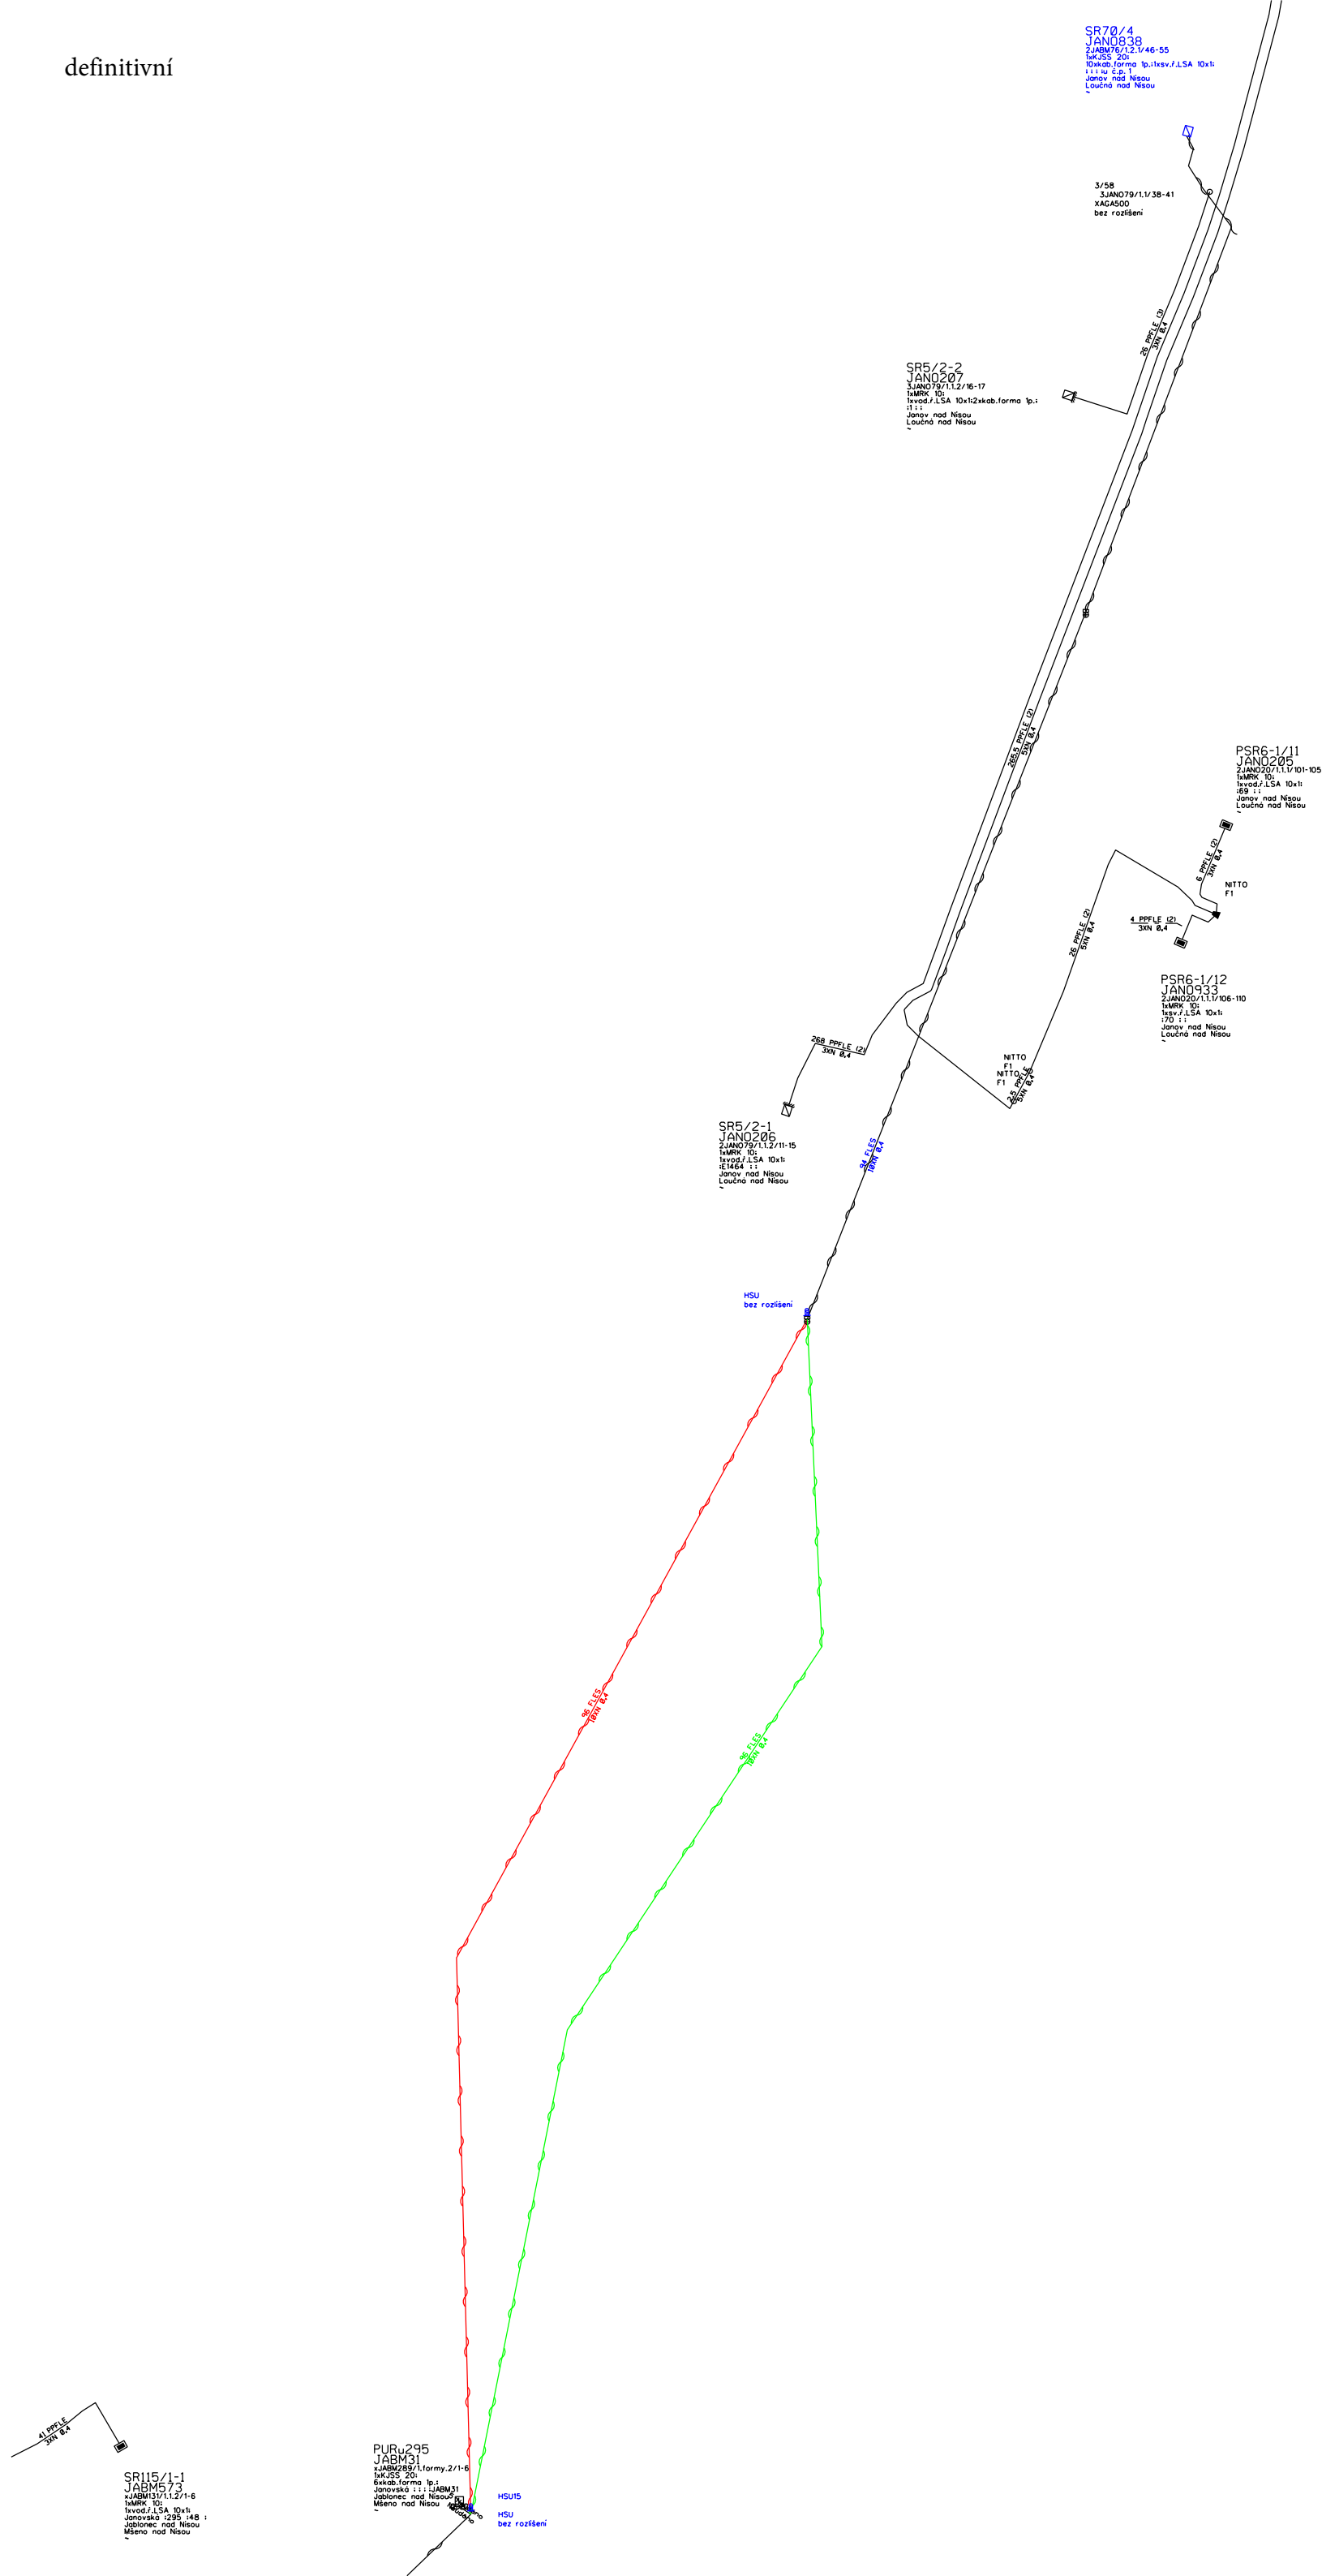

Název stavby: CTN - VPI Mšeno(JN)_opěrná zeď_III_29029 (ul. Janovská)

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	42 106,94 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	67 696,46 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 614,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 154,02 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	14 384,65 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	22 290,21 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady:	158 247 Kč
------------------	------------

z toho Příprava:	46 261 Kč
------------------	-----------

STAVEBNÍ ČINNOST	102 524,94 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	55 722,23 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	16 151,52 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		24388.44 JV	24 388,44 Kč
957746	Šetření technické rozšíření		1.00 ks	1 566,98 Kč
MONTÁŽ				
955016 S	Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN		192.00 m	9 674,88 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		2.00 ks	452,28 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		18.00 ks	940,32 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		20.00 ks	695,80 Kč
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové - kvalifikovaná koordinace se stavbou		8.00 hod.	5 427,20 Kč
954982 S	Montáž samonosných kabelů nad 5 XN		192.00 m	11 704,32 Kč
955285 S	Montáž spojky hrncové		2.00 ks	1 376,48 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu		7127.85 JV	7 127,85 Kč
954987 S	Vystrojení jednod.patkov.stož.s kotvou		1.00 ks	4 291,67 Kč

954985 S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	2.00 ks	6 501,42 Kč
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách	2.00 ks	1 354,36 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km	1.00 ks	7 166,30 Kč
955026 S	Zrušení jednod.patkov.stož.s kotvou	1.00 ks	4 142,96 Kč
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	2.00 ks	6 840,62 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	7 614,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	4 154,02 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	4 923,38 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene odhad plnění VBŘ, KSSLK - legalizace	2000.00 JV	2 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	3 231,05 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	4 230,22 Kč

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
305463 S	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem		1.00 ks	250,11 Kč
305745 S	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm		1.00 kg	101,39 Kč
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm		0.90 kg	73,01 Kč
312240 S	Konektor UY2 přímý - plněný		80.00 ks	147,20 Kč
306358 S	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m		2.20 kg	365,84 Kč
306610 S	Matice napínače M 16 ČSN 021682		1.00 ks	64,76 Kč
306709 S	Napínač šroubový oko-hák M 20		2.00 ks	386,64 Kč
309698 S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm		1.00 ks	33,80 Kč
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm		3.00 ks	9 774,24 Kč
301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK		3.00 ks	9 563,37 Kč
313998 S	Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů		4.00 ks	740,84 Kč
307051 S	Svorka lanová D 12-15 mm		6.00 ks	152,52 Kč
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm		4.00 ks	64,68 Kč
306789 S	Svorník M 16x1520x85x85 FeZn		1.00 ks	155,46 Kč
306843 S	Svorník M 20x410x90x25		6.00 ks	364,98 Kč
306457 S	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371		1.00 ks	51,37 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
401646 S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601		4.00 ks	0,00 Kč
401706 S	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601		12.00 ks	0,00 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702		5.00 ks	0,00 Kč
404280 S	Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740		3.00 ks	0,00 Kč
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20		12.00 ks	0,00 Kč
408324 S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301		3.00 ks	0,00 Kč
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810		6.00 ks	0,00 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Položková databáze: 2025.02

Název stavby: PPD UR, PD, GEO, CTN, VBř, poplatky

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	42 106,94 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	12 555,05 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 614,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 154,02 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	14 384,65 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady:	80 816 Kč
z toho Příprava:	46 261 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	25 093,32 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	55 722,23 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	16 151,52 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		24388.44 JV	24 388,44 Kč
957746	Šetření technické rozšířené		1.00 ks	1 566,98 Kč
MONTÁŽ				
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové - kvalifikovaná koordinace se stavbou		8.00 hod.	5 427,20 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu		7127.85 JV	7 127,85 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m		1.00 ks	7 614,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ		1.00 ks	4 154,02 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	4 923,38 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene odhad plnění VBř, KSSLK - legalizace	2000.00 JV	2 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	3 231,05 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	4 230,22 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
-----------	------------------	---------------	----------	--------------

PPD - Propočet projektové dokumentace

Položková databáze: 2025.02

Název stavby: provizorní

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	23 743,60 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	13 897,33 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 37 641 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 37 640,93 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MONTÁŽ				
955016 S		Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN	96.00 m	4 837,44 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	226,14 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	9.00 ks	470,16 Kč
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	10.00 ks	347,90 Kč
954982 S		Montáž samonosných kabelů nad 5 XN	96.00 m	5 852,16 Kč
955285 S		Montáž spojky hrncové	1.00 ks	688,24 Kč
954985 S		Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	2.00 ks	6 501,42 Kč
954989 S		Vystrojení na stávajících podpěrách	1.00 ks	677,18 Kč
955026 S		Zrušení jednod.patkov.stož.s kotvou	1.00 ks	4 142,96 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
305789 S		Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.60 kg	48,67 Kč
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	40.00 ks	73,60 Kč
306709 S		Napínač šroubový oko-hák M 20	1.00 ks	193,32 Kč
305506 S		Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	2.00 ks	6 516,16 Kč

301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	2.00 ks	6 375,58 Kč
313998 S	Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů	2.00 ks	370,42 Kč
307051 S	Svorka lanová D 12-15 mm	3.00 ks	76,26 Kč
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	4.00 ks	243,32 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
401646 S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601	2.00 ks	0,00 Kč
401706 S	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601	8.00 ks	0,00 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	2.00 ks	0,00 Kč
404280 S	Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740	2.00 ks	0,00 Kč
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	8.00 ks	0,00 Kč
408324 S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	2.00 ks	0,00 Kč
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	4.00 ks	0,00 Kč

Název stavby: definitivní

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	31 397,81 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	8 392,87 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady:	39 791 Kč
-------------------------	------------------

STAVEBNÍ ČINNOST	39 790,68 Kč
------------------	--------------

NESTAVEBNÍ ČINNOST	0,00 Kč
--------------------	---------

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MONTÁŽ				
955016 S	Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN		96.00 m	4 837,44 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		1.00 ks	226,14 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		9.00 ks	470,16 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		10.00 ks	347,90 Kč
954982 S	Montáž samonosných kabelů nad 5 XN		96.00 m	5 852,16 Kč
955285 S	Montáž spojky hrncové		1.00 ks	688,24 Kč
954987 S	Vystrojení jednod.patkov.stož.s kotvou		1.00 ks	4 291,67 Kč
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách		1.00 ks	677,18 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km		1.00 ks	7 166,30 Kč
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru		2.00 ks	6 840,62 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
305463 S	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem		1.00 ks	250,11 Kč
305745 S	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm		1.00 kg	101,39 Kč
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm		0.30 kg	24,34 Kč

312240 S	Konektor UY2 přímý - plněný	40.00 ks	73,60 Kč
306358 S	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m	2.20 kg	365,84 Kč
306610 S	Matice napínače M 16 ČSN 021682	1.00 ks	64,76 Kč
306709 S	Napínač šroubový oko-hák M 20	1.00 ks	193,32 Kč
309698 S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	1.00 ks	33,80 Kč
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	1.00 ks	3 258,08 Kč
301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	1.00 ks	3 187,79 Kč
313998 S	Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů	2.00 ks	370,42 Kč
307051 S	Svorka lanová D 12-15 mm	3.00 ks	76,26 Kč
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm	4.00 ks	64,68 Kč
306789 S	Svorník M 16x1520x85x85 FeZn	1.00 ks	155,46 Kč
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	2.00 ks	121,66 Kč
306457 S	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371	1.00 ks	51,37 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevýkazovaný			
401646 S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601	2.00 ks	0,00 Kč
401706 S	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601	4.00 ks	0,00 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	3.00 ks	0,00 Kč
404280 S	Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740	1.00 ks	0,00 Kč
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	4.00 ks	0,00 Kč
408324 S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	1.00 ks	0,00 Kč
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	2.00 ks	0,00 Kč

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl Pr, vložka 86

Datum zápisu:	1. června 2002
Datum vzniku:	1. ledna 2002
Spisová značka:	Pr 86 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Název:	Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo:	České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Identifikační číslo:	709 46 078
Právní forma:	Příspěvková organizace
Předmět činnosti:	Vymezení hlavního účelu činnosti: správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci území působnosti organizace v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů příprava zabezpečení a vypořádání staveb na silnicích II. a III. třídy v rámci územní působnosti organizace tvorba a realizace schválené koncepce správy a údržby silnic v majetku kraje vedení evidence silnic zabezpečení výkonu zimní, běžné a souvislé údržby silnic, včetně zajištění opatření k bezpečnosti silničního provozu zajištění přípravy investiční a neinvestiční činnosti pro zřizovatele (diagnostika, projektová příprava, inženýrská činnost) krizové řízení a úkoly plynoucí z obrany státu prohlídky silnic a mostních objektů správa a údržba nemovitostí zajištění průběhu realizací stavební činnosti včetně uzavírání dohod o předčasném užívání staveb na pozemních komunikacích ve vlastnictví kraje a ostatním svěřeném majetku, uzavírání smluv o právu provést stavbu, příp. nájemních či o výpůjčce, to vše v případě, že uzavření takové smlouvy je nutné nebo účelné pro realizaci zamyšlené stavby investiční činnost na spravovaném majetku zajištění přípravy a administrace veřejných zakázek týkajících se svěřeného majetku, včetně účasti na komisích v rámci veřejných zakázek zajištění přípravy podkladů pro zadávací dokumentace k veřejným zakázkám týkajících se svěřeného majetku údržba a oprava silnic a mostů s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Doplňková činnost:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. pronájem nemovitostí
Statutární orgán:	
ředitel:	JAN RŮŽIČKA , dat. nar. 9. května 1962 Revoluční 1899/66, 466 01 Jablonec nad Nisou

	Den vzniku funkce: 1. ledna 2023
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému jménu připojí svůj podpis. Ředitel organizace plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn ve všech věcech jednat jménem organizace.
Zřizovatel:	Liberecký kraj, IČ: 708 91 508 U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
