

Smlouva o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

Název zakázky:

**„ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb
– Kralupy n. Vlt. – úprava GSM-R“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ,
Ke Štvanici 656/3,
186 00 Praha 8 - Karlín

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-2986/2025
číslo jednací: 9522/2025-SŽ-SSZ-OVZ
ISPROFOND: 5003520004

a

Kontron Transportation s.r.o.

se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00
IČO: 45311005, DIČ: CZ45311005
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8707
[redacted], číslo účtu: [redacted]
zastoupen: Ing. Petrem Vítkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Kontron Transportation s.r.o.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2025/VIT/1604

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“, „**Smlouva o dílo**“ nebo „**SOD**“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt. – úprava GSM-R**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány, a to dle pořadí závaznosti uvedeného ve Smluvních podmínkách:
 - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 20.05.2025
 - 1.2 Dopis nabídky datovaný 25.04.2025,
 - 1.3 Smluvní podmínky [(i) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně- technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; (ii) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně- technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č.j.224/2018-520-DOP-/1, účinné od 3.8.2018 (dále též jen Zvláštní podmínky)]
 - 1.4 Požadavky objednatele (dle odst. 1.1.1.5 Smluvních podmínek, m.j. VTP/DOKUMENTACE/07/24, VTP/R-F/17/25, ZTP_ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt. - úprava GSM-R – datum vydání 4.3.2025)
 - 1.5 Formuláře:
 - 1.5.1 Požadavky na výkon nebo funkci,
 - 1.6 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (dostupné <https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/>):
 - 1.6.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení – schváleno Ministerstvem dopravy dne 10. 11. 2020,
 - 1.6.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek FIDIC (1.vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem dopravy dne 20.2.2018,
 - 1.6.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek – 1.vydání, leden 2018,
 - 1.6.4 Metodika pro zlepšení díla (Value Engineering) - schváleno Ministerstvem dopravy dne 18. 6. 2019,
 - 1.6.5 Metodika pro akceleraci, verze II – 06/2024, schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy pod č.j. 8068/SFDI/140116/10682/2024, dne 17.06.2024.
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Požadavcích objednatele, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné

dokumentace související s Dílem a odstranění na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, <https://xdc.spravazeleznice.cz/>):
 - 5.1 Faktura,
 - 5.2 soupis zjišťovacích protokolů,
 - 5.3 zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92a odst. 1 zákona o DPH.
8. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
9. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
10. Lhůty stanovené v Pod-článku 1.11.5.1 Kapitoly 1 TKP a lhůty stanovené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se nepoužijí a nahrazují se lhůtou do 3 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení poslední Sekce, tj. do 3 měsíců ode dne vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla.
11. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 24 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
12. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
13. Objednatel si vyhrazuje:
 - 13.1 *NEOBSAZENO.*
 - 13.2 *NEOBSAZENO.*

14. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
15. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele / společníka / poddodavatele / člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po vyřešení případných sporů):

- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty významných činností při plnění Díla, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
- b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č. 8 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel / společníci / poddodavatelé / členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/poddodavatelé/ členové koncernu).

16. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

Objednatel vymezil ve Smluvních podmínkách požadavky sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak, aby jejich aplikací nebyly porušeny zásady zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

V rámci plnění Díla jde o dále uvedené požadavky:

- rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce,
- jednání vedená primárně distančním způsobem.

16.1 Zhotovitel se zavazuje si sjednat s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou, nebo kratší, dobu splatnosti daňových dokladů, jaké je sjednána v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ zjištěného porušení povinnosti, maximálně 200 000 Kč za každý případ.

16.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 16.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 16.1 této Smlouvy. Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

16.3 Porady a jednání dle Požadavků objednatel, budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

16.4 *NEOBSAZENO*

16.5 *NEOBSAZENO*

16.6 *NEOBSAZENO*

16.7 NEBSAZENO

16.8 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 16 této Smlouvy není dotčeno uplatňování smluvních pokut v souladu s Pod-článkem 4.27 Smluvních podmínek.

17. NEBSAZENO

18. Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

19. Mezinárodní sankce a střet zájmů

19.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,
- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
- c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném v odstavci 19.4 této Smlouvy (dále jen „**Sankční seznamy**“),
- d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

19.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 19 také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

19.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 19, oznámí tuto skutečnost bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

- 19.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
- 19.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nepřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 19.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 19.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 19.3 nebo některou z povinností dle odstavců 19.4 nebo 19.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 19.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 19.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

20. Požadavek na Poddodavatele

- 20.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.
- 20.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy) splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 20.1 této Smlouvy, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 20.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat podmínky dle odst. 20.1 této Smlouvy.
- 20.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 20.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 20.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 20.2 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 20.2, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

21. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelém jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
22. Je-li součástí Díla některá z technologií dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1735 ze dne 13. června 2024, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologií pro nulové čisté emise a měnění nařízení (EU) 2018/1724, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo, případně část Díla, jejíž součástí je některá z uvedených technologií a jež je Sekcí nebo postupným závazným milníkem, včas. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle Pod-článku 4.27 Smluvních podmínek.
23. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
24. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele |
| Příloha č. 7 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) |
| Příloha č. 8 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací) |
| Příloha č. 9 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 10 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 11 | NEOBSAZENO |

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.


V Praze


30.05.2025 11:47
.....Podepsáno elektronicky
Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze


Digitally signed
by 
Date: 2025.05.26
14:01:17 +02'00'

.....
Zhotovitel

Ing. Petr Vítek

jednatel společnosti
Kontron Transportation s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]
ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt. - úprava GSM-R			638 730 000	638 730 000
Cena díla za projektovou dokumentací stavby				
DPS	Projektová dokumentace pro povolení stavby			
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby			
Cena díla za autorský dozor				
Cena díla za zhotovení stavby				
Číslo objektu		Název objektu	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.2		Železniční sdělovací zařízení		
PS	PS 11-02-51	Olovnice - Kralupy n. Vlt. předměstí, TK+DOK		
PS	PS 12-02-51	Velvary - Kralupy n. Vlt. Předměstí, TK+DOK		
PS	PS 20-02-51	BTS Velké Žernoseky - BTS Lovosice ČOV, POK		
PS	PS 00-02-81	Přenosový systém, doplnění, levý břeh Labe		
PS	PS 00-02-82	Přenosový systém, doplnění, pravý břeh Labe		
PS	PS 00-02-83	Přenosový systém, levý břeh Labe		
PS	PS 00-02-84	Přenosový systém, pravý břeh Labe		
PS	PS 11-02-91	BTS Olovnice		
PS	PS 12-02-91	BTS Velká Bučina		
PS	PS 13-02-91	BTS Vepřek, úprava		
PS	PS 14-02-91	BTS Vraňany		
PS	PS 15-02-91	BTS Roudnice nad Labem, úprava		
PS	PS 16-02-91	BTS Bohušovice nad Ohří		
PS	PS 17-02-91	BTS Lovosice, úprava		
PS	PS 18-02-91	BTS Lovosice Třebenická		
PS	PS 19-02-91	BTS Sulejovice		
PS	PS 20-02-91	BTS Malé Žernoseky, úprava		
PS	PS 21-02-91	BTS Dolní Zálezly, úprava		
PS	PS 22-02-91	BTS Děčín jih, úprava		
PS	PS 23-02-91	BTS Děčín Přípeř		
PS	PS 24-02-91	BTS Malý Újezd, úprava		
PS	PS 25-02-91	BTS Třeboutice		
PS	PS 26-02-91	BTS Litoměřice d. n., úprava		
PS	PS 27-02-91	BTS Litoměřice ČOV		
PS	PS 28-02-91	BTS Velké Žernoseky		
PS	PS 29-02-91	BTS Ústí n. L. - Střekov		
PS	PS 30-02-91	BTS Svádov, úprava		
PS	PS 31-02-91	BTS Velké Březno, úprava		
PS	PS 32-02-91	BTS Malé Březno		
PS	PS 33-02-91	BTS Těchlovice, úprava		
PS	PS 34-02-91	BTS Boletice n. L.		
PS	PS 35-02-91	BTS Děčín východ, úprava		
PS	PS 36-02-91	BTS Březiny u Děčína		
PS	PS 36-02-92	BTS Březiny u Děčína přejezd		
PS	PS 36-02-93	BTS Malá Veleň		
PS	PS 37-02-91	BTS Mělník, úprava		
PS	PS 38-02-91	BTS Liběchov, úprava		
PS	PS 39-02-91	BTS Štětí, úprava		
PS	PS 40-02-91	BTS Hošťka, úprava		
PS	PS 41-02-91	BTS Polepy, úprava		
PS	PS 42-02-91	BTS Prackovice nad Labem, úprava		
PS	PS 43-02-91	BTS Brná n. L., úprava		
PS	PS 44-02-91	BTS Ústí n. L., úprava		
PS	PS 00-02-91	Doplnění centrálních částí		

PS	PS 00-02-92	Optimalizace a uvedení do provozu		
PS	PS 00-02-93	Radiovníky		
E.3.6		Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		
SO	SO 12-86-01	BTS Velká Bučina, přípojka nn		
SO	SO 18-86-01	BTS Lovosice Třebeňská, přípojka nn		
SO	SO 19-86-01	BTS Sulejovice, přípojka nn		
SO	SO 23-86-01	BTS Děčín Přípeř, přípojka nn		
SO	SO 25-86-01	BTS Třeboutice, přípojka nn		
SO	SO 25-86-02	BTS Třeboutice, úprava rozvodu 6kV		
SO	SO 27-86-01	BTS Litoměřice ČOV, přípojka nn		
SO	SO 27-86-02	BTS Litoměřice ČOV, úprava rozvodu 6kV		
SO	SO 28-86-01	BTS Velké Žernoseky, přípojka nn		
SO	SO 28-86-02	BTS Velké Žernoseky, úprava rozvodu 6kV		
SO	SO 29-86-01	BTS Ústí n. L. - Střekov, přípojka nn		
SO	SO 32-86-01	BTS Malé Březno, přípojka nn		
SO	SO 32-86-02	BTS Malé Březno, úprava rozvodu 6kV		
SO	SO 34-86-01	BTS Boletice n. L., přípojka nn		
SO	SO 34-86-02	BTS Boletice n. L., úprava rozvodu 6kV		
SO	SO 36-86-01	BTS Březiny u Děčína, přípojka nn		
SO	SO 36-86-02	BTS Březiny u Děčína přejezd, přípojka nn		
SO	SO 36-86-03	BTS Malá Veleň, přípojka nn		
		Všeobecné konstrukce a práce		
SO	98-98	Všeobecný objekt		

Příloha č. 1

Smlouva o dílo – Zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

„ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt. – úprava GSM-R“

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr)

Projekt manažer

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Odpovědný projektant

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Rádiový plánovač

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů

Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, sídlo poddodavatele, IČO	Věcný popis části plnění uvažovaného zadat poddodavateli (označené dle čísel a názvů jednotlivých SO a PS, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS))	% hodnoty poddodávky z nabídkové ceny
AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, Praha 10, IČO: 480 29 483	montážní práce a zajištění strojů a zařízení vyžadovaných při plnění veřejné zakázky v dané části díla PS 11-02-51 Olovnice - Kralupy n. Vlt. předměstí, TK+DOK PS 12-02-51 Velvary - Kralupy n. Vlt. Předměstí, TK+DOK PS 20-02-51 BTS Velké Žernoseky - BTS Lovosice ČOV, POK PS 11-02-91 BTS Olovnice, PS 12-02-91 BTS Velká Bučina PS 13-02-91 BTS Vepřek, úprava, PS 14-02-91 BTS Vraňany PS 15-02-91 BTS Roudnice nad Labem, úprava, PS 16-02-91 BTS Bohušovice nad Ohří PS 17-02-91 BTS Lovosice, úprava, PS 18-02-91 BTS Lovosice Třebenická PS 19-02-91 BTS Sulejovice, PS 20-02-91 BTS Malé Žernoseky, úprava PS 21-02-91 BTS Dolní Zálezly, úprava, PS 22-02-91 BTS Děčín jih, úprava PS 25-02-91 BTS Třeboutice, PS 26-02-91 BTS Litoměřice d. n., úprava PS 27-02-91 BTS Litoměřice ČOV, PS 28-02-91 BTS Velké Žernoseky PS 29-02-91 BTS Ústí n. L. - Střekov, PS 30-02-91 BTS Svádov, úprava PS 31-02-91 BTS Velké Březno, úprava, PS 32-02-91 BTS Malé Březno PS 33-02-91 BTS Těchlovice, úprava, PS 34-02-91 BTS Boletice n. L. PS 35-02-91 BTS Děčín východ, úprava, PS 36-02-91 BTS Březiny u Děčína PS 36-02-92 BTS Březiny u Děčína přejezd, PS 36-02-93 BTS Malá Veleň PS 37-02-91 BTS Mělník, úprava, PS 38-02-91 BTS Liběchov, úprava PS 39-02-91 BTS Štětí, úprava, PS 40-02-91 BTS Hošťka, úprava PS 41-02-91 BTS Polepy, úprava, PS 42-02-91 BTS Prackovice nad Labem, úprava PS 43-02-91 BTS Brná n. L., úprava, PS 44-02-91 BTS Ústí n. L., úprava PS 44-02-91 BTS Ústí n. L., úprava PS 00-02-93 Radiovníky SO 12-86-01 BTS Velká Bučina, přípojka nn, SO 19-86-01 BTS Sulejovice, přípojka nn SO 23-86-01 BTS Děčín Přípeř, přípojka nn, SO 25-86-01 BTS Třeboutice, přípojka nn SO 25-86-02 BTS Třeboutice, úprava rozvodu 6kV, SO 27-86-01 BTS Litoměřice ČOV, přípojka nn SO 27-86-02 BTS Litoměřice ČOV, úprava rozvodu 6kV, SO 32-86-02 BTS Malé Březno, úprava rozvodu 6kV SO 32-86-01 BTS Malé Březno, přípojka nn, SO 34-86-01 BTS Boletice n. L., přípojka nn SO 34-86-02 BTS Boletice n. L., úprava rozvodu 6kV, SO 36-86-01 BTS Březiny u Děčína, přípojka nn SO 36-86-02 BTS Březiny u Děčína přejezd, přípojka nn, SO 36-86-03 BTS Malá Veleň, přípojka nn 98-98 Všeobecný objekt	■ %
IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 03977471 a SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3, IČO: 257 93 349	projektové a zeměměřické práce, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace realizační, dokumentace skutečného stavu PS 11-02-51 Olovnice - Kralupy n. Vlt. předměstí, TK+DOK PS 12-02-51 Velvary - Kralupy n. Vlt. Předměstí, TK+DOK PS 20-02-51 BTS Velké Žernoseky - BTS Lovosice ČOV, POK PS 11-02-91 BTS Olovnice, PS 12-02-91 BTS Velká Bučina PS 13-02-91 BTS Vepřek, úprava, PS 14-02-91 BTS Vraňany PS 15-02-91 BTS Roudnice nad Labem, úprava, PS 16-02-91 BTS Bohušovice nad Ohří PS 17-02-91 BTS Lovosice, úprava, PS 18-02-91 BTS Lovosice Třebenická PS 19-02-91 BTS Sulejovice, PS 20-02-91 BTS Malé Žernoseky, úprava PS 21-02-91 BTS Dolní Zálezly, úprava, PS 22-02-91 BTS Děčín jih, úprava	■ %

	PS 25-02-91 BTS Třeboutice, PS 26-02-91 BTS Litoměřice d. n., úprava PS 27-02-91 BTS Litoměřice ČOV, PS 28-02-91 BTS Velké Žernoseky PS 29-02-91 BTS Ústí n. L. - Střekov, PS 30-02-91 BTS Svádov, úprava PS 31-02-91 BTS Velké Březno, úprava, PS 32-02-91 BTS Malé Březno PS 33-02-91 BTS Těchlovice, úprava, PS 34-02-91 BTS Boletice n. L. PS 35-02-91 BTS Děčín východ, úprava, PS 36-02-91 BTS Březiny u Děčína PS 36-02-92 BTS Březiny u Děčína přejezd, PS 36-02-93 BTS Malá Veleň PS 37-02-91 BTS Mělník, úprava, PS 38-02-91 BTS Liběchov, úprava PS 39-02-91 BTS Štětí, úprava, PS 40-02-91 BTS Hošťka, úprava PS 41-02-91 BTS Polepy, úprava, PS 42-02-91 BTS Prackovice nad Labem, úprava PS 43-02-91 BTS Brná n. L., úprava, PS 44-02-91 BTS Ústí n. L., úprava PS 44-02-91 BTS Ústí n. L., úpravaPS 00-02-93 Radiovníky SO 12-86-01 BTS Velká Bučina, přípojka nn, SO 19-86-01 BTS Sulejovice, přípojka nn SO 23-86-01 BTS Děčín Přípeř, přípojka nn, SO 25-86-01 BTS Třeboutice, přípojka SO 25-86-02 BTS Třeboutice, úprava rozvodu 6kV, SO 27-86-01 BTS Litoměřice ČOV, přípojka nn SO 27-86-02 BTS Litoměřice ČOV, úprava rozvodu 6kV, SO 32-86-02 BTS Malé Březno, úprava rozvodu 6kV SO 32-86-01 BTS Malé Březno, přípojka nn, SO 34-86-01 BTS Boletice n. L., přípojka nn SO 34-86-02 BTS Boletice n. L., úprava rozvodu 6kV, SO 36-86-01 BTS Březiny u Děčína, přípojka nn SO 36-86-02 BTS Březiny u Děčína přejezd, přípojka nn, SO 36-86-03 BTS Malá Veleň, přípojka nn 98-98 Všeobecný objekt	
TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava-Slezská Ostrava, Šenovská 543/101, PSČ 710 00 IČO: 45193771	Stožáry PS 11-02-91 BTS Olovnice, PS 12-02-91 BTS Velká Bučina, PS 14-02-91 BTS Vraňany, PS 16-02-91 BTS Bohušovice nad Ohří, PS 18-02-91 BTS Lovosice Třebenická, PS 19-02-91 BTS Sulejovice, PS 25-02-91 BTS Třeboutice, PS 27-02-91 BTS Litoměřice ČOV, PS 28-02-91 BTS Velké Žernoseky, PS 29-02-91 BTS Ústí n. L. – Střekov, PS 32-02-91 BTS Malé Březno, PS 34-02-91 BTS Boletice n. L., PS 36-02-91 BTS Březiny u Děčína, PS 36-02-93 BTS Malá Veleň	■ %
ELPRAMO s.r.o., Praha 9 - Hloubětín, Nademlejnská 600/1, PSČ 198 00, IČO: 28187903	Dodávka el. rozvaděčů, el. instalace PS 11-02-91 BTS Olovnice, PS 12-02-91 BTS Velká Bučina PS 13-02-91 BTS Vepřek, úprava, PS 14-02-91 BTS Vraňany PS 15-02-91 BTS Roudnice nad Labem, úprava, PS 16-02-91 BTS Bohušovice nad Ohří PS 17-02-91 BTS Lovosice, úprava, PS 18-02-91 BTS Lovosice Třebenická PS 19-02-91 BTS Sulejovice, PS 20-02-91 BTS Malé Žernoseky, úprava PS 21-02-91 BTS Dolní Zálezly, úprava, PS 22-02-91 BTS Děčín jih, úprava PS 25-02-91 BTS Třeboutice, PS 26-02-91 BTS Litoměřice d. n., úprava PS 27-02-91 BTS Litoměřice ČOV, PS 28-02-91 BTS Velké Žernoseky PS 29-02-91 BTS Ústí n. L. - Střekov, PS 30-02-91 BTS Svádov, úprava PS 31-02-91 BTS Velké Březno, úprava, PS 32-02-91 BTS Malé Březno PS 33-02-91 BTS Těchlovice, úprava, PS 34-02-91 BTS Boletice n. L. PS 35-02-91 BTS Děčín východ, úprava, PS 36-02-91 BTS Březiny u Děčína PS 36-02-92 BTS Březiny u Děčína přejezd, PS 36-02-93 BTS Malá Veleň PS 37-02-91 BTS Mělník, úprava, PS 38-02-91 BTS Liběchov, úprava PS 39-02-91 BTS Štětí, úprava, PS 40-02-91 BTS Hošťka, úprava PS 41-02-91 BTS Polepy, úprava, PS 42-02-91 BTS Prackovice nad Labem, úprava PS 43-02-91 BTS Brná n. L., úprava, PS 44-02-91 BTS Ústí n. L., úprava PS 44-02-91 BTS Ústí n. L., úprava	■ %
Elektrizace železnic Praha a. s. Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 IČ: 47115921	montážní práce a zajištění strojů a zařízení vyžadovaných při plnění veřejné zakázky v dané části díla PS 11-02-91 BTS Olovnice, PS 12-02-91 BTS Velká Bučina PS 13-02-91 BTS Vepřek, úprava, PS 14-02-91 BTS Vraňany PS 15-02-91 BTS Roudnice nad Labem, úprava, PS 16-02-91 BTS Bohušovice nad Ohří PS 17-02-91 BTS Lovosice, úprava, PS 18-02-91 BTS Lovosice Třebenická PS 19-02-91 BTS Sulejovice, PS 20-02-91 BTS Malé Žernoseky, úprava	■ %


	PS 21-02-91 BTS Dolní Zálezly, úprava, PS 22-02-91 BTS Děčín jih, úprava PS 25-02-91 BTS Třeboutice, PS 26-02-91 BTS Litoměřice d. n., úprava PS 27-02-91 BTS Litoměřice ČOV, PS 28-02-91 BTS Velké Žernoseky PS 29-02-91 BTS Ústí n. L. - Střekov, PS 30-02-91 BTS Svádov, úprava PS 31-02-91 BTS Velké Březno, úprava, PS 32-02-91 BTS Malé Březno PS 33-02-91 BTS Těchlovice, úprava, PS 34-02-91 BTS Boletice n. L. PS 35-02-91 BTS Děčín východ, úprava, PS 36-02-91 BTS Březiny u Děčína PS 36-02-92 BTS Březiny u Děčína přejezd, PS 36-02-93 BTS Malá Veleň PS 37-02-91 BTS Mělník, úprava, PS 38-02-91 BTS Liběchov, úprava PS 39-02-91 BTS Štětí, úprava, PS 40-02-91 BTS Hošťka, úprava PS 41-02-91 BTS Polepy, úprava, PS 42-02-91 BTS Prackovice nad Labem, úprava PS 43-02-91 BTS Brná n. L., úprava, PS 44-02-91 BTS Ústí n. L., úprava PS 44-02-91 BTS Ústí n. L., úprava SO 12-86-01 BTS Velká Bučina, přípojka nn, SO 19-86-01 BTS Sulejovice, přípojka nn SO 23-86-01 BTS Děčín Přípeř, přípojka nn, SO 25-86-01 BTS Třeboutice, přípojka SO 25-86-02 BTS Třeboutice, úprava rozvodu 6kV, SO 27-86-01 BTS Litoměřice ČOV, přípojka nn SO 27-86-02 BTS Litoměřice ČOV, úprava rozvodu 6kV, SO 32-86-02 BTS Malé Březno, úprava rozvodu 6kV SO 32-86-01 BTS Malé Březno, přípojka nn, SO 34-86-01 BTS Boletice n. L., přípojka nn SO 34-86-02 BTS Boletice n. L., úprava rozvodu 6kV, SO 36-86-01 BTS Březiny u Děčína, přípojka nn SO 36-86-02 BTS Březiny u Děčína přejezd, přípojka nn, SO 36-86-03 BTS Malá Veleň, přípojka nn	
CELKEM %		■%

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací


ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt. - úprava GSM-R

Název práce / činnosti	Doba trvání (ve dnech)	Předpokládaný začátek (ve dnech)	Předpokládaný konec (ve dnech)
Podpis smlouvy / zahájení stavby 2Q/2025	1	1	1
Přípravné práce	40	30	70
Zpracování rádiového plánování	142	70	212
Zpracování projektové dokumentace včetně zajištění vydání povolení s nabytím právní moci	289	14	303
PS 11-02-51 Olovnice - Kralupy n. Vlt. předměstí, TK+DOK	290	304	594
PS 12-02-51 Velvary - Kralupy n. Vlt. Předměstí, TK+DOK	290	304	594
PS 20-02-51 BTS Velké Žernoseky - BTS Lovosice ČOV, POK	290	304	594
PS 00-02-81 Přenosový systém, doplnění, levý břeh Labe	90	579	669
PS 00-02-82 Přenosový systém, doplnění, pravý břeh Labe	90	579	669
PS 00-02-83 Přenosový systém, levý břeh Labe	90	579	669
PS 00-02-84 Přenosový systém, pravý břeh Labe	90	579	669
PS 11-02-91 - PS 44-02-91	290	304	594
PS 00-02-91 Doplnění centrálních částí	274	669	943
PS 00-02-92 Optimalizace a uvedení do provozu	274	669	943
PS 00-02-93 Radiovníky	121	822	943
SO 12-86-01 BTS Velká Bučina, přípojka nn	290	304	594
SO 18-86-01 BTS Lovosice Třebeňská, přípojka nn	290	304	594
SO 19-86-01 BTS Sulejovice, přípojka nn	290	304	594
SO 23-86-01 BTS Děčín Přípeř, přípojka nn	290	304	594
SO 25-86-01 BTS Třeboutice, přípojka nn	290	304	594
SO 25-86-02 BTS Třeboutice, úprava rozvodu 6kV	290	304	594
SO 27-86-01 BTS Litoměřice ČOV, přípojka nn	290	304	594
SO 27-86-02 BTS Litoměřice ČOV, úprava rozvodu 6kV	290	304	594
SO 28-86-01 BTS Velké Žernoseky, přípojka nn	290	304	594
SO 28-86-02 BTS Velké Žernoseky, úprava rozvodu 6kV	290	304	594
SO 29-86-01 BTS Ústí n. L. - Střekov, přípojka nn	290	304	594
SO 32-86-01 BTS Malé Březno, přípojka nn	290	304	594
SO 32-86-02 BTS Malé Březno, úprava rozvodu 6kV	290	304	594
SO 34-86-01 BTS Boletice n. L., přípojka nn	290	304	594
SO 34-86-02 BTS Boletice n. L., úprava rozvodu 6kV	290	304	594
SO 36-86-01 BTS Březiny u Děčína, přípojka nn	290	304	594
SO 36-86-02 BTS Březiny u Děčína přejezd, přípojka nn	290	304	594
SO 36-86-03 BTS Malá Veleř, přípojka nn	290	304	594
98-98 Všeobecný objekt	214	760	974
Provedení akceptačního měření	30	944	974
Autorský dozor + rezerva	672	303	975
Dokončení projekční a stavební částí, uvedení do provozu	975	1	335
Vyhotovení a předání dokumentace projektu	90	975	1065
Lhůta pro dokončení projektu			1065

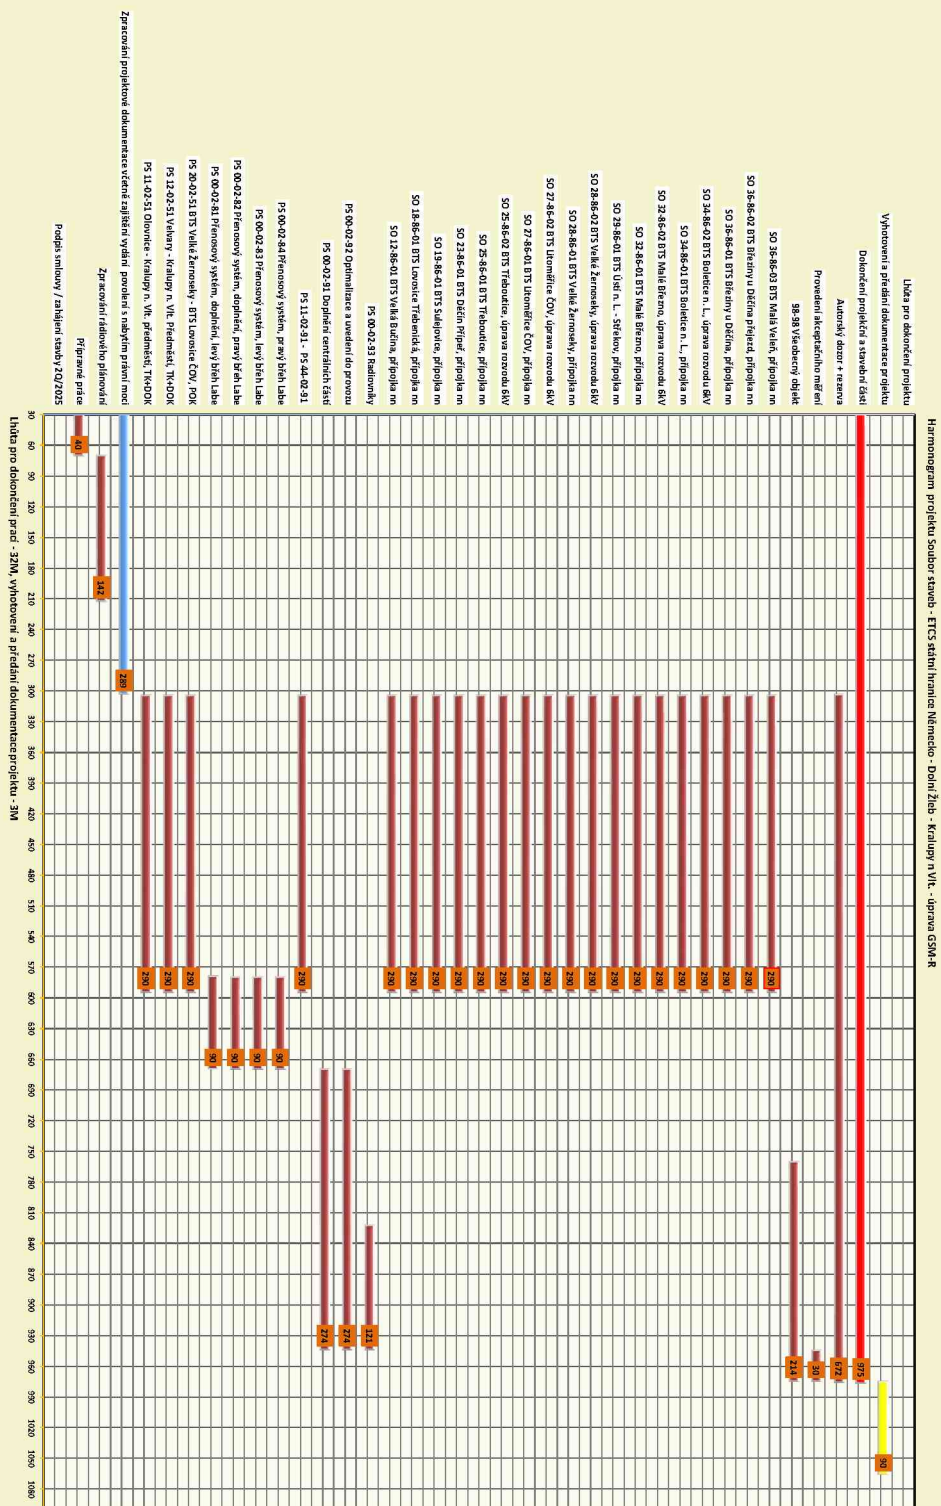

Harmonogram - finanční objemy po měsících

Měsíce	Procenta	Souhrnné částky
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		

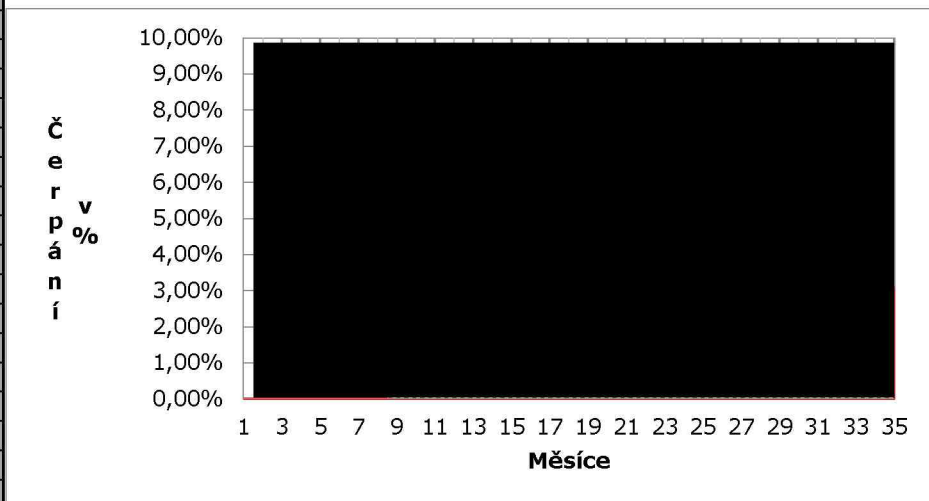

PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Požadavcích objednatel (odst. 2.3.25 Všeobecných technických podmínek).
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovávaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 6

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Neobsazeno

PŘÍLOHA Č. 7

Příloha k nabídce

Příloha je uvedena jako samostatný dokument

PŘÍLOHA Č. 8

Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

č. j.: []

Název zakázky:	
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	
Objednatel:	
Datum zahájení prací:	
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	
Datum dokončení díla (včetně dokumentace):	
Konečná cena díla celkem v Kč bez DPH:	

Zhotovitel díla:	[název dle SOD, sídlo, IČO]
Správce/vedoucí společník:	
Další společník:	
Další společník:	

Identifikace poddodavatele	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky
[obchodní firma, sídlo a IČO]	[označení dle čísel a názvů jednotlivých SO a PS, případně jiným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS např. popis vykonaných činností nebo dodávek]	[v % ze smluvní ceny díla a v konkrétní částka v Kč bez DPH]

Rozsah prací:	[dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ]
Charakter prací:	[oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba]

Délka traťového úseku:	[v km, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ)]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na výhybkách: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a počet výhybek] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na masivních mostních objektech: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na mostních objektech s ocelovou nosnou konstrukcí: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelech: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím zařízení: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na energetickém a elektrotechnickém zařízení: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH, délku traťového úseku a zda se jednalo o silnoproudé zařízení, trakční vedení, případně jiné zařízení – specifikaci] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na budovách:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a typ objektu – budova osobního nádraží, technologická budova, stavba s památkovou ochranou apod.]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce a údržbu na skalních masivech:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou:	[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti]
Popis vyhrazeného plnění dle SOD:	[označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO]
Zhotovitel vyhrazeného plnění:	
Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez DPH:	

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč bez DPH
Správce/vedoucí společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Celkem v Kč bez DPH:	xxx	

Hodnocení objednatele:	Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.
Kontaktní osoba:	[jméno, příjmení] [funkce, odborná správa] tel: e-mail:

Jméno a příjmení vystavitele:	
Funkce:	
Podpis vystavitele a datum vystavení osvědčení:	

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je

možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn., Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět zakázky samostatně, pole zůstane prázdné.

PŘÍLOHA Č. 9

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na projektové dokumentace a zhotovení stavby „ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt. – úprava GSM-R“ žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: **VLOŽÍ ZHOTOVITEL** Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v Souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: **MM/RR – MM/RR VLOŽÍ ZHOTOVITEL** včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č. **VLOŽÍ ZHOTOVITEL**

V dne

.....

Zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 10

NEOBSAZENO

PŘÍLOHA Č. 11

NEOBSAZENO
