

Dílčí smlouva

(dále jen „Smlouva“)

dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací

Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku

č. Objednatele: E618-S-4983/2023

č. Zhotovitele: 23010474000

ISPROFOND/SubISPROFIN: **5003140003 / 5003540042**

uzavřené na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě uvedené Rámcové dohody číslo E618-S-4983/2023, kterou mezi sebou strany uzavřely dne 19.12.2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) a související objednávky číslo 92383/2024-SŽ-GŘ-O13 ze dne 07.02.2024 (dále jen „**Objednávka**“).

Smlouva stanoví pouze zvláštní smluvní podmínky nad rámec Rámcové dohody. Ustanovení Rámcové dohody se aplikují v plném rozsahu, pokud Smlouva daný postup neupravuje.

Pokud to nevylučuje smysl Smlouvy či nestanoví-li Smlouva jinak, použije se na Smlouvu v plné míře rovněž Rámcová dohoda. Kde se Rámcová dohoda zmiňuje o dohodě, bude pro účely Smlouvy rozuměna tato Smlouva, pokud to neodporuje předmětu, účelu, či logice Smlouvy.

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Karel Švejda , MBA**

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: **Mgr. Štěpán Hošna**

(mimo podpis Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: **Ing. Milan Majerčík**

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelna@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování faktur na centrální finanční účtárnu:

- 1) analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
- 2) v elektronické podobě (preferováno), a to výlučně na e-mailovou adresu:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
- 3) datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Společnost INKOSAGE – Diagnostika nestabilních úseků

Zastoupena vedoucím účastníkem INSET s.r.o.

se sídlem Praha 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00

IČO: 03579727; DIČ: CZ03579727

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C 234236

ID datové schránky: 6ccsnfh

zastoupená **Ing. Pavel Šural**, obchodní ředitel, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 90303071/0100

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: **Ing. Pavel Šural**, obchodní ředitel, GSM: +420 602 359 930 e-mail:

obchod@inset.com

b) ve věcech technických: **Ing. Ladislav Minář**, CSc., GSM: +420 602 737 573, e-mail:

minar@kcas.cz

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Lucemburská 1170/7, Praha 3, PSČ 130 00

a

KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.

se sídlem v Brně, Křenová 131/35, Trnitá, PSČ 602 00

zastoupena: Ing. Ladislavem Minářem, CSc., jednatelem společnosti

IČO: 25301110

DIČ: CZ25301110

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 23193

(dále jen „KOLEJCONSULT“ nebo „společník“)

a

GEOSTAR, spol. s r.o.

se sídlem v Brně, Tuřanka 240/111, Slatina, PSČ 627 00

zastoupena: Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem společnosti

IČO: 13690337

DIČ: CZ13690337

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 436

(dále jen „GEOSTAR“ nebo „společník“)

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem v Praze 4, Novohradská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

zastoupena: JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelkou společnosti

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, spisová značka C 250116

(dále jen „SAGASTA“ nebo „společník“)

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“)

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny uvedených údajů, a to prostřednictvím datové schránky.

1. Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dílem se rozumí **zhotovení projektu IGP na nestabilní úsek trati Frenštát pod Radhoštěm -Kunčice v km 88,400 – 88,700**

to vše v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, přílohami této Smlouvy, zadávací dokumentací, Rámcovou dohodou (dále jako „**dílo**“).

2. Termín plnění a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce ihned po uzavření Smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s harmonogramem postupu prací – plnění díla, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy (dále také „**Harmonogram**“).

Místem plnění je bezprostřední okolí stavby **úsek trati Frenštát pod Radhoštěm -Kunčice v km 88,400 – 88,700**

- 2.3. Dokončení díla: 8 týdnů

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Jednotkové ceny dle přílohy č. 2 Smlouvy – výkaz výměr představují maximální nepřekročitelné jednotkové ceny za poskytování realizaci Smlouvy platné po celou dobu trvání Smlouvy. Tímto není jakkoliv dotčena možnost valorizace ceny dle podmínek inflační doložky v Rámcové dohodě.
- 3.2. Objednatel se zavazuje za řádně provedenou Smlouvu zaplatit Zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.
- 3.3. Celková nepřekročitelná cena je určena výkazem výměr a činí:
- **Celková cena díla bez DPH: 641 846.00,- Kč**
 - **Celková cena díla vč. DPH: 776 633.66,- Kč**
 - **Hodnota DPH: 134 787.66,- Kč**
- 3.4. Výše daně z přidané hodnoty (DPH) uvedená u ceny vychází ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prováděné práce v souladu s podmínkami Rámcové dohody. Přílohou daňového dokladu bude podrobný soupis provedených prací potvrzený podpisem odpovědné osoby Objednatele.
- 3.6. Zhotovitel je oprávněn projednat s Objednatelem nutné změny celkového rozsahu díla. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu díla a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně podrobného odůvodnění ze strany Zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo akceptovat odůvodněné objemové změny rozsahu jednotlivých položek, při zachování jednotkové ceny daných položek. Odůvodněnou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou Objednatelem akceptovány skutečně provedené práce a položky, při současném dodržení jednotkových cen.
- 3.7. Plnění Smlouvy se považuje za ukončené předávacím protokolem a v souladu s podmínkami Rámcové dohody.

4. Závazné podklady k provedení díla

- 4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- Objednávka vystavená Objednatelem;
 - tato Smlouva vč. všech příloh;
 - Rámcová dohoda vč. obchodních podmínek a všech dalších příloh;

- zadávací dokumentace;
- 4.2.** Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla, pokud budou tyto změny Objednatelem požadovány. Takové změny budou řešeny písemnými dodatky k této Smlouvě.
- 4.3.** Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, mu byly předány před podpisem této Smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

5. Všeobecné závazky Zhotovitele

- 5.1.** Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla dle této Smlouvy svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
- 5.2.** Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky (vyjma poplatků správcům technických sítí) a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad. Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů.
- 5.4.** Zhotovitel je povinen dodat písemné výstupy případně další plnění dle této Smlouvy ve lhůtách uvedených v závazném Harmonogramu tvořící přílohu č. 4 Smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1.** Tuto Smlouvu je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato Smlouva uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které mohou navrhnout obě Smluvní strany.
- 6.2.** Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi Smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 6.3.** Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní Strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoli. Mezi Smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 6.4.** Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá Zhotovitel podpisem této Smlouvy nebezpečí změny okolností.
- 6.5.** Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 6.6.** Tato Smlouva je uzavřena elektronicky za použití uznávaných elektronických podpisů.
- 6.7.** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Karta nestability úseku

Příloha č. 2 – Výkaz výměr;

Příloha č. 3 – Cena díla;

Příloha č. 4 – Harmonogram postupu prací – plnění díla;

Příloha č. 5 – Zmocnění vedoucího Zhotovitele

V Praze dne.....**19.03.2025**

Za Objednatele:


.....
Ing. Karel Švejda , MBA

Správa železnic, státní organizace

(podepsáno elektronicky)

V Praze dne **12.02.2025**

Za Zhotovitele:



.....
Ing. Pavel Šural

INSET s.r.o.


(podepsáno elektronicky)

Frenštát pod Radhoštěm – Kunčice pod Ondřejníkem			Hodnocení úseku
			3
			Stav řešení
			Místní šetření
Trat':	Frenštát pod Radhoštěm – Kunčice pod Ondřejníkem	OŘ:	OVA
Km od:	88,500	ST:	OVA
Km do:	88,550	Datum prohlídky:	10.10.2024
Charakter tratě:	regionální	Nadmořská výška tratě:	436 mnm
Max. rychlost v koleji:	80 km/h	Tvar území	Hornatina 415-550 mnm
Řád koleje:	5 (2,9 mil.hrt/rok)	Generální sklon terénu (směr, sklon)	SV, 8°
Třída zatížení:	C3/100	Pražcové podloží	ŠD
Projevy poruch:	Krátkce po intenzivních deštích došlo k zátrhu ve stezce na délce cca 20 m. Sesuv bezprostředně přiléhá k mostu v km 88,559		
Příčina poruch:	Morfologie terénu nasvědčuje proudění vody pod náspem. Část vody je svedena podél zemního tělesa k mostu a pak se převádí na druhou stranu, nicméně v podloží nadále může proudit voda		
Přijatá opatření:	PJ 30 km/h Bude zajištěn pIGP a IGP, dále pak monitoring do doby opravy.		
	SVAH VLEVO	SVAH VPRAVO	Poznámky
Tvar zemního tělesa	násep	násep	88,559 most lesní cesta a vodoteč
Výška svahu	12	10	
Sklon svahu	1:1,25	1:1,25	
Konfigurace přilehlého terénu	Svažuje se od trati Lesy a louky	sklon k trati lesy a louky	
Odvodnění	-	Za lesní cestou je nezpevněný příkop, pramen vody z polí v km cca 88,5	
Povrch svahu	Hustě zarostlé keři a mladými stromy	Kamení, místy pár keřů, dále pak hustě zarostlé	
			





Frenštát pod Radhoštěm - Kunčice pod Ondřejníkem km 88,550

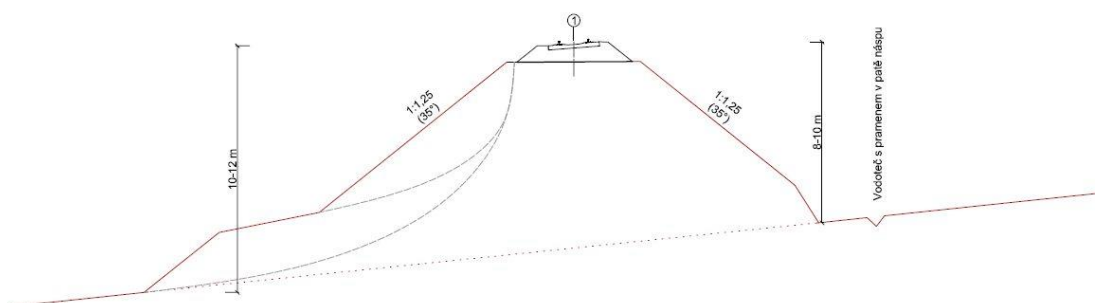

CENOVÁ NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU INŽENÝRSKO GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

pro nestabilní úsek trati

Frenštát pod Radhoštěm – Kunčice v km 88,400 – 88,700

Zadavatel: **Správa železniční dopravní cesty**, státní organizace
Dlážděná 1003 / 7
110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234
DIČ: CZ 709 94 234

Zhotovitel: Společnost
„INKOSAGE – Diagnostika nestabilních úseků“

vedoucí účastník:

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170 / 7
130 00 Praha 3
IČO: 03579727

společník 2:

KOLEJCONSULT & servis, spol. s r. o.
Křenova 131 / 35
602 00 Brno
IČO: 25301110

společník 3:

GEOSTAR, spol. s r. o.
Tuřanka 240 / 111
627 00 Brno
IČO: 13690337

společník 4:

SAGASTA s.r.o.
Novohradská 1010 / 14
142 00 Praha 4
IČO: 04598555

1.0 PŘEDMĚT CENOVÉ NABÍDKY

Cenová nabídka je zpracována na základě výzvy Objednatele, Správy železnic, s.o., v rámci Rámcové dohody,


č. objednatele: E618 – S – 4983 / 2023 a

č. zhotovitele: 23010474000,

dle ustanovení bodu 2.1., k akceptaci plnění z výše uvedené rámcové dohody.

Cenová nabídka je zpracována na zhotovení: „Projektu inženýrsko – geologického průzkumu“, (dále v textu jen: P IGP) pro nestabilní úsek trati

Frenštát pod Radhoštěm – Kunčice, v km 88,400 – 88,700.

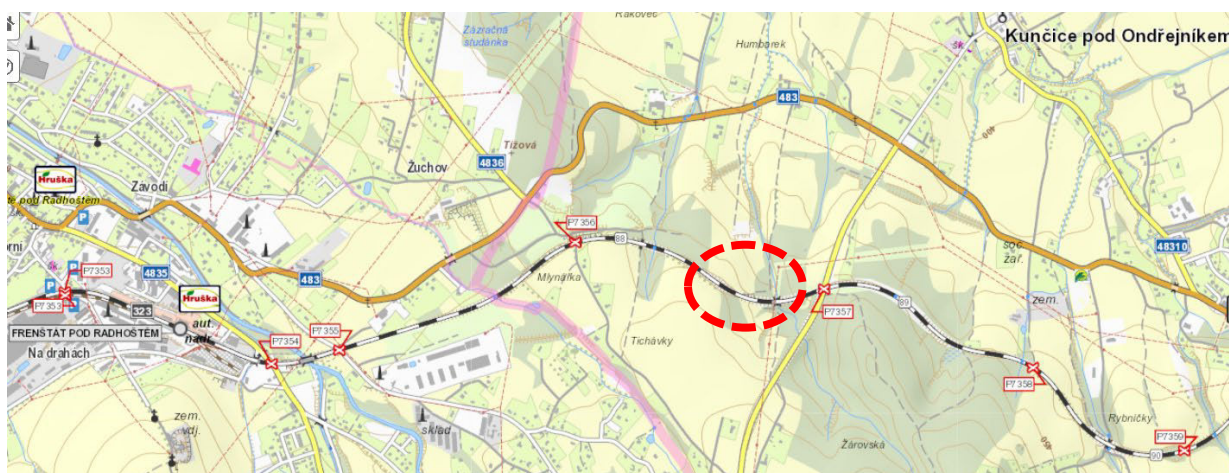

2.0 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

Cenová nabídka je zpracována na základě výzvy Objednatele v souladu s platnými předpisy SŽ a ČSN. Způsob zpracování P IGP bude proveden dle:

předpisu	SŽ S4 Železniční spodek,
	Kapitola I Inženýrskogeologický průzkum
	Příloha 9 Inženýrskogeologický průzkum tělesa železničního spodku

Cenová nabídka je zpracována v cenové hladině, která je součástí Rámcové smlouvy a je sestavena z těchto položek Přílohy č. 3 RS, dle kap. 8 a 9, viz. tab. č. 1..

Tab. č. 1

7.	AKTIVACE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ SITUACE						
7. 1.	Aktivace a přítomnost geologa/geotechnika v případě mimořádné situace do 48 hod	144	hod	1 388	199872		
7. 2.	Dopravní náklady	2640	km	16	42240		
	dílčí mezisoučet - pol. 7. bez DPH				242 112,00		
8.	ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU IGP						
8. 1.	Zpracování projektu IGP Geologem	480	hod.	832 Kč	399360		
9.	VYHODNOCENÍ						
9.	Vyhodnocení geotechnických vlastností zemín a hornin				0		
9.	Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)				0		
9.	Hydrogeologický monitoring - denní měření hladin				0		
9.	Dopravní náklady	0	km	16	0		
9.	Zpracování předběžné zprávy				0		
9.	Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace)				0		
9. 1.	Celkem (45% ze základu položek 1-8)	1	základ	374	374,4		
	dílčí mezisoučet - pol. 7. bez DPH				399 734,40		
	cena celkem bez DPH				641 846,40		
REKAPITULACE							
					Celkem bez DPH		
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE				0		
2.	POLNÍ ZKOUŠKY				0		
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE				0		
4.	LABORATORNÍ PRÁCE				0		
5.	GEODETICKÉ PRÁCE				0		
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE				0		
7.	AKTIVACE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ SITUACE				242 112		
8.	ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU IGP				0		
9.	VYHODNOCENÍ				399 734		
					Celkem:	641 846	
					Celkem bez DPH	641 846	

3.0 TERMÍNY PLNĚNÍ

Časový průběh prací na zpracování „Projektu inženýrsko – geologického průzkumu“ pro nestabilní úsek trati

Frenštát pod Radhoštěm – Kunčice, v km 88,400 – 88,700

navrhujeme plnění předmětu díla provést dle následujícího časového harmonogramu – tab. č. 2:

Tab. č. 2

Časový harmonogram prací zpracování P IGP na akci Frenštát pod Radhoštěm – Kunčice, v km 88,400 – 88,700,			
Položka	Předmět plnění	Termín do:	Poznámka
1	Místní šetření – rekognoskace terénu	21. 02. 2025	resp. dle domluvy se SŽ a klimatických podmínek
2	Zpracování konceptu P IGP	21. 03. 2025	včetně porady s pracovníky OŘ a O13 SŽ
3	Zpracování připomínek k P IGP	04. 04. 2025	předběžně případné konzultace
4	Odevzdání schváleného P IGP	15. 04. 2025	předání a fakturace



*Foto lokality nestabilního úseku tratě TUDU 21 3110
Frenštát pod Radhoštěm – Kunčice, km 88,400 – 88,700*

Cenovou nabídku a časový harmonogram plnění pro zpracování „Projektu inženýrsko – geologického průzkumu“ pro nestabilní úsek trati

Frenštát pod Radhoštěm – Kunčice, v km 88,400 – 88,700

zpracoval v rámci společnosti „INKOSAGE – Diagnostika nestabilních úseků“ dle zadávacích podmínek Ladislav Minář, Ing. CSc..

V Brně dne 02. 01. 2025

.....
Ing. Pavel Šural
za sdružení INKOSAGE



PLNÁ MOC

Společnost "INKOSAGE – Diagnostika nestabilních úseků" vzniklá podle § 2716 a následujících ustanovení zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „Společnost“), za účelem společného postupu při vypracování a předložení společné žádosti o účast, příp. nabídky na veřejnou zakázku:

„Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“

vypsanou Správou železnic, státní organizací, se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha, IČO: 70994234, (dále jen „Veřejný zadavatel“), dne 07.11.2022 pod s evidenčním číslem zakázky VVZ: Z2022-045116 (dále jen „Veřejná zakázka“).

Společníci

KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.

se sídlem v Brně, Křenová 131/35, Trnitá, PSČ 602 00

zastoupena: Ing. Ladislavem Minářem, CSc., jednatelem společnosti

IČO: 25301110

DIČ: CZ25301110

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 23193

(dále jen „KOLEJCONSULT“ nebo „společník“)

GEOSTAR, spol. s r.o.

se sídlem v Brně, Tuřanka 240/111, Slatina, PSČ 627 00

zastoupena: Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem společnosti

IČO: 13690337

DIČ: CZ13690337

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 436

(dále jen „GEOSTAR“ nebo „společník“)

SAGASTA s. r.o.

se sídlem v Praze 4, Novohradská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

zastoupena: Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 250116

(dále jen „SAGASTA“ nebo „společník“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „společníci“)

ZPLNOMOCŇUJÍ

touto plnou mocí společníka a Správce Společnosti:

INSET s.r.o.

se sídlem v Praze 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00

zastoupena: Ing. Pavlem Šuralem, obchodním manažerem, na základě plné moci

IČO: 03579727

DIČ: CZ03579727

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 234236

(dále jen „INSET“ nebo „vedoucí společník“)

k tomu, aby za něj a jeho jménem v souladu se Smlouvou o Společnosti a pro účely v ní definované, činil následující úkony

1. vypracoval společnou žádost o účast, příp. nabídku a podepsal ji jménem všech společníků a jednal v dalších věcech souvisejících s podáním společné žádosti či nabídky na provedení veřejné zakázky,
2. jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky účastníků společnosti na provedení veřejné zakázky (a zejména v rámci účasti na otevírání obálek, žádosti o poskytnutí protokolů a zprávy o hodnocení nabídek, písemného objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů dle § 46 ZZVZ, písemného zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 113 ZZVZ),
3. podal případné námitky proti úkonům Zadavatele, případně učinění podání dalších opravných prostředků ve veřejné soutěži (např. návrh na přezkoumání úkonů Zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže), včetně zastupování v celém navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,
4. v případě, že společná nabídka účastníků společnosti na provedení zakázky bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, k podpisu realizační smlouvy či rámcové smlouvy a jejich případných dodatků, k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace zakázky včetně ústní i písemné komunikace, včetně realizace platebního styku se zadavatelem, včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky společnosti, vše včetně podepisování veškerých dokumentů. Správce společnosti je na základě udělené plné moci oprávněn ke všem právním úkonům, které zavazují další účastníky společnosti, zejména k přijímání závazků a pokynů pro a za každého účastníka společnosti.

Správce je povinen konzultovat se všemi společníky veškeré otázky, ve kterých bude konat rozhodnutí jménem společníků. V případě podání námitek a dalších úkonů, dle bodu 3. této plné moci, je Správce oprávněn jednat pouze po písemném odsouhlasení společníků.

Plná moc se uděluje na dobu určitou, která uplyne zánikem Společnosti podle Smlouvy o Společnosti.

V Brně 16.12.2022
KOLEJCONSULT & servis,
spol. s r.o.

V Brně 16.12.2022
GEOSTAR, spol. s r.o.

V Praze 15.12.2022
SAGASTA s.r.o.

Ing. Ladislav Minář, CSc.
jednatel společnosti

Ing. Martin Hrdlička
jednatel společnosti

Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti

Ladislav Beran
jednatel společnosti 16.12.2022

Plnou moc přijímám v plném rozsahu.

V Praze 10.03.2023
INSET s.r.o.

Ing. Pavel Šural
obchodní manažer
podepsáno na základě plné moci

Nejméně jeden z podpisů není platný.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 10.06.2025 09:40:02.469

Podepsal(a): Ing. Pavel Šural

Čas podepsání: 12.02.2025 10:19:02

✗ Toto je uznávaný elektronický podpis.

✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.

🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 10.06.2025 09:40:02.469

✗ Podpis je neplatný

Podrobnosti o certifikátu

SN: 22992560

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 27.09.2023 16:36:21

Platný do: 16.10.2026 16:36:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5723820

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 792dff56-3ca3-4f03-b186-e59a732c25d8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana BOROVSÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.06.2025 09:40:04

Hash komponenty: 13d1ef8304c9dc2b7a0d3d9b219d527820211a7d6011c8d5c7536ae06ef8a427

Hashovací funkce: sha256Hex



82bb00cb-3a0c-4c21-8854-d63c467b6c0d
