

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

„Revitalizace parteru po bývalé tržnici - Komenského“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo : **Město Moravská Třebová**
zastoupený : nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Osoby oprávněné jednat : Ing. Pavlem Charvátém – starostou města
a) ve věcech smluvních : Ing. Pavel Charvát, starosta města
b) ve věcech technických : Petr Matějka, vedoucí odboru investic a rozvoje města
IČO : 002 77 037
DIČ : CZ00277037
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka : fqtb4bs

1.2 Zhotovitel

Sídlo : ellement architects s.r.o.
Zastoupený : Vysoká 1029, Zlín 76001
Zapsán v obchodním rejstříku : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C 94459/KSBR Krajský soud v Brně

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: office@element.cz

b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: office@element.cz

IČO : 05274885
DIČ : CZ05274885
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka : tzny6df
Tel. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : office@element.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je návrh řešeného území, architektonická studie, projektová dokumentace pro povolení záměru, inženýrská činnost, dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor na revitalizaci prostor po bývalé tržnici s cílem rozvoje veřejné infrastruktury cestovního ruchu sloužící návštěvníkům a rezidentům s důrazem na rekreační a volnočasové využití.
- 2.2. Řešené území - 1. etapa území po bývalé tržnici + pěší propojení s ulicí Cihlářova a 2. etapa území parkoviště a okolí Billy. Vyznačení řešeného území, 1. etapy a 2. etapy, je nedílnou součástí této smlouvy v příloze č. 1.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli:
- Návrh řešeného území, celá plocha řešeného území
 - architektonickou **studii**, celá plocha řešeného území
 - dokumentaci pro vydání **rozhodnutí o povolení záměru (dále jen „dokumentace pro povolení záměru“)**, plocha 1. etapy
 - projektovou dokumentaci pro **provádění stavby**, plocha 1. etapy

Zhotovitel se současně zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy poskytnout objednateli související inženýrskou činnost pro 1. etapu spočívající v:

- zabezpečení rozhodnutí o povolení záměru,
- zabezpečení dalších nezbytných rozhodnutí a povolení či vyjádření.

Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor i na předmětné stavbě 1. etapy, a to po celou dobu realizace stavby a současně případně dále sjednané činnosti specifikované touto smlouvou (dále souhrnně jen „dílo“).

Podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace (za stupeň projektové dokumentace je považována i studie), jsou technické podklady zadavatele předané v rámci výběrového řízení a současně nabídka zhotovitele, kterou v postavení účastníka výběrového řízení podal na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace parteru po bývalé tržnici - Komenského“.

V případě, že objednatel bude pokračovat v 2. etapě spočívající v zadání projektové dokumentace pro povolení záměru, nebo dokumentace pro provádění stavby nebo samotného provádění stavby osloví zhotovitele o nabídku na autorský dozor na příslušnou část díla.

- 2.4. Součástí předmětu plnění je **organizace výrobních výborů** po celou dobu projekční a inženýrské činnosti zhotovitele, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů. Výrobní výbory se budou konat v místě sídla objednatele nebo on-line v pravidelných intervalech, dle domluvy s objednatelem (není-li níže u jednotlivých činností uvedeno jinak); výrobní výbory budou organizovány až do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro provedení stavby a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto výrobních výborech musí být vždy přítomen hlavní inženýr projektu (v případě objektivní příčiny – výjimečně, jím pověřená osoba), který bude oprávněn činit závazné závěry.

- 2.5. **Hlavním inženýrem projektu** (zodpovědným projektantem) je zhotovitelem určen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, které jsou odpovědné za technické řešení stavby a minimálně jedna z nich se musí účastnit všech jednání s objednatelem, jednání komise v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, bude-li požádán, a je rovněž osobou odpovědnou za zhotovitele při řešení případných dotazů účastníků v rámci zadávacího řízení na veřejnou

zakázku na zhotovení stavby. Hlavní inženýr projektu má právo kdykoliv si přizvat jednotlivé odborné poradce. Zhotovitele může zastupovat i další člen týmu MgA. Jan Pavézka.

Rozsah a členění díla:

2.6. Návrh řešeného území

2.4.1. Grafický i textový návrh řešeného území bude předán ve fyzické a elektronické podobě,

2.4.2. Grafická část návrh bude na libovolném počtu stran o velikosti A3 ve formě katalogu včetně textové části návrhu na max 2 stranách A3.

2.4.3. Návrh bude respektovat ekonomické možnosti zadavatele nejen v předpokládané výši pořizovacích, ale v rozumné míře i budoucích provozních nákladů, tedy v logickém a efektivním provozním uspořádání a v přiměřených nákladech na spotřebu energií a údržbu navržených objektů.

2.4.4. Grafická část návrhu bude obsahovat:

- a) Situace širších vztahů zobrazující urbanistické řešení území a jeho vazby na širší zájmové území;
- b) Architektonická situace;
- c) Dopravní situace;
- d) Vizualizace (min. 3 perspektivy exteriéru z pohledu chodce).

Rozmístění doporučeného obsahu v rámci grafické části návrhu je věcí dodavatele. Grafická část může obsahovat další libovolná vyjádření objasňující návrh řešení nad rámec doporučených požadavků na obsah výše. Jejich použití by však nemělo snížit srozumitelnost návrhu.

2.4.5. Textová část návrhu v min. rozsahu:

- a) zdůvodnění základních principů návrhu;
- b) popis urbanistického a dopravního řešení s důrazem na ideové řešení pěších vazeb;
- c) popis konceptu architektonického a krajinářského provozně-funkčního řešení;
- d) popis materiálového konceptu a přístupu k zachování stávajících památkových hodnot;
- e) kalkulace předpokládaných investičních nákladů (odhad investičních nákladů na stavbu - rozdělit na 1. a 2. etapu);
- f) tabulka s vyznačenými plochami a objemy stavby (m^2 , m^3)

2.7. Architektonická studie

Účelem architektonické studie je v tomto případě vzájemné ujasnění záměrů a představ mezi objednatelem a zhotovitelem. K tomu svolá objednatel koordinační schůzku bezodkladně po podpisu smlouvy, v sídle objednatele, které se zhotovitel musí zúčastnit a na níž budou projednány základní parametry řešeného území. Na základě této schůzky (a případných dalších jednání) vypracuje zhotovitel návrh architektonicko-urbanistické studie s obsahem a činnostmi:

- 2.5.1. dopracování předloženého návrhu v nabídce, tj. dopracování návrhu architektonického, urbanistického, dopravního a provozně funkčního řešení řešeného území;
- 2.5.2. projednání návrhu studie s objednatelem a vypořádání jeho připomínek;
- 2.5.3. projednání studie s orgány a subjekty dotčenými v budoucích správních řízeních potřebných pro realizaci akce;
- 2.5.4. specifikace všech potřebných průzkumů, studií, posouzení, analýz atd., potřebných pro zpracování projektové dokumentace,
- 2.5.5. předání konečného řešení objednateli.

- 2.8. **Projektová dokumentace pro povolení záměru v členění a rozsahu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky č. 131/2024., o dokumentaci staveb, včetně:**
- 2.6.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro společné povolení; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce;
 - 2.6.2. vypracování a zapracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro vydání rozhodnutí o povolení záměru (dále jen „žádost o povolení záměru“);
 - 2.6.3. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních;
 - 2.6.4. dalších činností vyplývajících ze studie;
 - 2.6.5. prezentace dokumentace pro povolení záměru v sídle objednatele, bude-li požadována.
- 2.9. **Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání rozhodnutí o povolení záměru, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro realizaci stavby (rozhodnutí o povolení záměru) podle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, včetně:**
- 2.7.1. zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů dotčených v budoucích správních řízeních v souvislosti s realizací akce, která budou sloužit jako přílohy pro podání žádosti o povolení záměru;
 - 2.7.2. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti o povolení záměru;
 - 2.7.3. veškerá činnost nutná v rámci správních řízení vedoucí k podání žádosti o povolení záměru;
 - 2.7.4. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;
 - 2.7.5. vyplnění žádosti o povolení záměru; předložení žádosti včetně příloh k podpisu zástupcům objednatele;
 - 2.7.6. podání žádosti o povolení záměru na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli;
 - 2.7.7. zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění žádosti o povolení záměru a zabezpečení vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, resp. povolení záměru;
 - 2.7.8. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení vedoucí k vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, resp. povolení záměru;
 - 2.7.9. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové dokumentace.
- Pozn.: Správní poplatky spojené s vydáním povolení záměru hradí objednatel.*
- 2.10. **Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky č. 131/2024., o dokumentaci staveb, včetně:**
- 2.8.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
 - 2.8.2. součástí projektové dokumentace budou také vytyčovací a osazovací plány, vč. následné péče o vegetační prvky;
 - 2.8.3. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy pro nacenění (dle RTS či ÚRS) soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před

- zahájením projektových prací;
- 2.8.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických);
 - 2.8.5. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace;
 - 2.8.6. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby;
 - 2.8.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;
 - 2.8.8. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;
 - 2.8.9. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby;
 - 2.8.10. zhotovitel zpracuje koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění jednotlivých profesí a řemesel;
 - 2.8.11. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla;
 - 2.8.12. prezentace projektové dokumentace, bude-li požadováno.

2.11. Autorský dozor (dále jen AD)

V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby budou zajištěny tyto činnosti:

- 2.9.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 pracovních dnů po obdržení takových dotazů;
- 2.9.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li požadována.

V průběhu realizace akce budou zajištěny tyto činnosti:

- 2.9.3. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací v rozsahu min. 1x za 14 dní nebo dle aktuální dohody a potřeby stavby. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vši odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem.
- 2.9.4. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výběrech a jiných souvisejících jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby;
- 2.9.5. kontrola a odsouhlasování souladu výrobní dokumentace s dokumentací pro provádění stavby, spolupráce při výběru dodavatelů a při uvedení díla do provozu;
- 2.9.6. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;
- 2.9.7. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky;
- 2.9.8. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby

- zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby;
- 2.9.9. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;
- 2.9.10. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;
- 2.9.11. AD bude také písemně odsouhlasovat použité materiály, použité výrobky, jejich barevnost a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele a realizaci stavby;
- 2.9.12. autorským dozorem nejsou:
- 2.9.12.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;
- 2.9.12.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.
- 2.9.13. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit.
- 2.12. **Součástí díla je rovněž:**
- 2.10.1 organizace výrobních výborů při zpracování dokumentací v rozsahu této smlouvy v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. však 3 x pro každý stupeň dokumentace, z toho 1x 10 dnů před předáním každého stupně dokumentace, na níž zhotovitel dokumentaci okomentuje a objednatel vyjádří své případné připomínky či návrhy a obě smluvní strany se na tomto jednání dohodnou, co z návrhů objednatele bude do předávaného stupně projektové dokumentace zapracováno, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry;
- 2.10.2 zapracování požadavků všech účastníků správního řízení a požadavků plynoucích z jednání výrobních výborů do projektových dokumentací;
- 2.10.3 součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
- 2.13. Projektová dokumentace musí odpovídat příslušným závazným normám a právním předpisům, platným v době realizace. Zhotovitel je rovněž povinen zapracovat veškeré případné požadavky dotačních titulů, pokud objednatel obdrží či bude usilovat o obdržení dotace a zhotovitel se o nich dozví v přiměřeném časovém předstihu.

3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na postupném plnění smlouvy v níže uvedených lhůtách:
- 3.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že zahájení vlastních projekčních prací bude předcházet koordinační schůzka mezi objednatelem a zhotovitelem, která se uskuteční do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Koordinační schůzku svolává objednatel a bude se konat v místě sídla objednatele.

- 3.1.2. Vlastní projekční práce zhotovitel zahájí bezodkladně po ukončení koordinační schůzky.
- 3.1.3. Termín podání kompletní dokumentace pro povolení záměru na SÚ nejpozději do **03. 11. 2025**.
- 3.1.4. Termín pro dopracování architektonické studie se předpokládá do **40** kalendářních dnů od první koordinační schůzky.
- 3.1.5. **Termín pro odevzdání dokumentace pro povolení záměru se předpokládá do 80 kalendářních dnů** ode dne předání zhotovitelem schválené architektonické studie.
- 3.1.6. **Inženýrskou činnost pro vydání povolení záměru** musí zhotovitel vykonávat tak, aby úplnou a řádně vyhotovenou žádost o povolení záměru předložil (podal) příslušnému orgánu v termínu dle 3.1.3.
- 3.1.7. **Odevzdání dokumentace pro provádění stavby do 90 kalendářních dnů** ode dne vydání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru.
- 3.1.8. **Výkon AD** bude probíhat dle domluvy a s ohledem na potřeby stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sdělovány bez zbytečného odkladu minimálně 5 pracovních dní před termínem.
- 3.2. **K převzetí díla** nebo jeho části vyzve písemně zhotovitel objednatele **alespoň 3 dny předem** na adresu pro elektronickou komunikaci uvedenou v článku 3. 4. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla či jeho části bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 3.3. Zhotovitel je současně povinen před tiskem jednotlivých stupňů PD zaslat jejich finální verzi objednateli k odsouhlasení, přičemž objednatel se zavazuje zaslat své stanovisko nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení dotčeného požadavku a stupně PD.
- 3.4. Adresa pro elektronickou komunikaci je pmatejka@mtrebova.cz.
- 3.5. Prodlení zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD či inženýrské činnosti delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, pokud vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele.
- 3.6. Zhotovitel není v prodlení s žádnou z dílčích lhůt v případě, že toto prodlení prokazatelně nezavinil a ani mu s vynaložením přiměřeného úsilí nemohl zabránit (například prodloužení maximální doby trvání správních řízení z důvodů neležících na straně zhotovitele).
- 3.7. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace objednatelem bez vad a nedodělků. U inženýrské činnosti zhotovitele se za den dokončení považuje den vydání posledního z nezbytných úředních souhlasů, stanovisek či povolení.
- 3.8. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy a kancelář zhotovitele. AD bude vykonáván v místě provádění stavby.
- 3.9. Místem předání jednotlivých stupňů projektové dokumentace je v sídle objednatele.
- 3.10. Smluvní strany sjednávají, že pokud objednatel bude v prodlení s poskytováním součinnosti, příp. pokud třetí osoby budou v prodlení s poskytnutím stanoviska, vyjádření či podkladu, který je

pro provedení díla nezbytný, pak platí, že o dobu tohoto prodlení se automaticky posouvá termín provedení díla dle této smlouvy.

4 CENA DÍLA

- 4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná a činí:

Celkem bez DPH: 1 838 000,- Kč

DPH ve výši 21 %: 385 980,-Kč

Celkem s DPH: 2 223 980,- Kč

(slovy: dva miliony dvěsetdvacet tři tisíc devětsetosmdesát korun)

- 4.2. Rozpis ceny bez DPH v bodě 4.1. je následující:

4.2.1. **Návrh řešeného území bez DPH: 80.000 Kč, celá plocha řešeného území**

4.2.2. dopracování architektonické studie dle odst. 2. 4. bez DPH:

203.600,- Kč, celá plocha řešeného území

4.2.3. vypracování dokumentace pro povolení záměru dle odst. 2. 5. bez DPH:

569.600,- Kč, 1. etapa

4.2.4. inženýrská činnost pro vydání povolení záměru dle odst. 2. 6. bez DPH:

65.000,- Kč, 1. etapa

4.2.5. vypracování dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2. 7. bez DPH:

736.800,- Kč, 1. etapa

4.2.6. výkon autorského dozoru dle odst. 2. 8. bez DPH:

183.000,- Kč, 1. etapa

- 4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

- 4.4. **V ceně je zahrnuto:**

- 4.4.1. vyhotovení návrhu řešeného území 1x v tištěné formě a 1x v digitální formě na DVD (či jiném nosiči)

4.4.2. vyhotovení architektonické studie 2x v tištěné formě a 1x v digitální formě na DVD (či jiném nosiči)

4.4.3. vyhotovení kompletní dokumentace pro povolení záměru 2x v tištěné formě a 1x v digitální formě na DVD (či jiném nosiči) z toho 1x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls, *.bpe, *.kza apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržáním názvu a číslováním výkresů.

1.1.1. 4 vyhotovení kompletní projektové dokumentace DPS v tištěné formě a 1x v digitální formě na DVD (či jiném nosiči) ve formátu *.pdf a v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls, *.bpe, *.kza apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržáním názvu a číslováním výkresů. Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně v elektronické podobě (na CD či jiným obdobným způsobem) ve formátu *.xls, *.xlsx a *.bpe nebo *.kza;

- 4.4.4. výsledky písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o povolení záměru 1 x originál (nebo ověřená kopie) a 1 kopie v tištěné formě a 1x v digitální formě ve formátu *.pdf, předání vyplněné žádosti v digitální formě v editovatelném formátu na DVD (či jiném nosiči) 1x.
- 4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.
- 4.6. Dohodnutá cena dle článku 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. 4.2.5. a 4.2.6. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy.
- 4.7. Dohodnutá cena dle článku 4.2.6 zahrnuje předpokládané náklady na výkon autorského dozoru v rozsahu 42 hodin AD na stavbě, 21x doprava na místo a zpět, 65 hodin zpracování podkladů v místě sídla zhotovitele. Hodinová sazba zhotovitele za výkon autorského dozoru je 950,- Kč bez DPH, doprava ze sídla zhotovitele do místa stavby a zpět je 3.874,- Kč bez DPH.
- 4.8. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Nedílnou přílohu faktury tvoří protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla), případně protokol o ukončení inženýrské činnosti či AD.
- 5.3. Výkon AD bude fakturován maximálně 1x měsíčně dle skutečně provedených prací. Součástí každé faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD a počet provedených cest ze sídla zhotovitele do místa stavby a zpět za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele nebo případně technickým dozorem objednatele. Protokol o ukončení AD bude přiložen k poslední vystavené faktuře.
- 5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele či na určenou elektronickou adresu objednatele.
- 5.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- 5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, nebo protokolu o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.
- 5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí projektové dokumentace, protokol o ukončení inženýrské činnosti, nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.
- 5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit v případě, když:
- 5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje,
 - 5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje,
 - 5.8.3. neobsahuje přílohy.
- 5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností:
- 5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a
 - 5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat
 - 5.9.3. teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že:
- 5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - 5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 5.10.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - 5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
 - 5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - 5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem,
 - 5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost.

6 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a

organizací k rozpracované dokumentaci pro povolení záměru a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

- 6.2. Zhotovitel bere na vědomí, že jednotlivé stupně dokumentace pro povolení záměru musí odpovídat požadavkům zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy včetně jejich prováděcích předpisů a současně jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
- 6.3. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění zadání objednatele a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.
- 6.4. Dokumentace pro povolení záměru bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou dokumentaci pro povolení záměru.
- 6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou uvedeni v článku 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7 PODMÍNKY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ

- 7.1. Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace zpracovávaná zhotovitelem bude podkladem pro zadávací řízení na zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zavazuje se zhotovitel, že při tvorbě projektové dokumentace bude dbát zejména na to, aby navržené řešení bylo zejména zaměřeno na:
 - 7.1.1. udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů (Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena
 - technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:
 - a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
 - b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
 - c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $V_{a3} = (V_{f4} + (3 \times V_{r5})) / 4$);
 - d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.);
 - 7.1.2. přechod na oběhové hospodářství (Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici

- odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.);
- 7.1.3. prevenci a omezování znečištění (Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400. Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.);
- 7.1.4. ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů (Nová budova není postavena na: a) zemědělské půdě zařazené do I. nebo II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s jejím vynětím; b) vymezeném přírodním stanovišti dle přílohy č. I směrnice 92/43/EHS o stanovištích nebo půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na národních červených seznamech 6 ; c) lesní půdě, pokud do doby vydání PA/Rozhodnutí nedojde k souhlasu s vynětím pozemku z pozemků určených k plnění funkce lesa) ;
- Respektování těchto podmínek povede v budoucnu k realizaci stavby zohledňující zásady ochrany životního prostředí.
- 7.2. Pokud se před ukončením prací na projektové dokumentaci vyskytne inovativní řešení, které nebylo známo dříve, je zhotovitel povinen takové řešení projednat s objednatelem, předložit objednateli vliv takového opatření na cenu projektované stavby a na dobu jeho zapracování do dokumentace pro povolení záměru a do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a na základě těchto podkladů rozhodne objednatel o případném využití inovativního řešení.
- 7.3. V zájmu dodržení zásad environmentálního zadávání se obě strany dohodly, že plnění dle této smlouvy bude probíhat zejména elektronickou formou (elektronická pošta).

8 SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 8.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
- 8.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou správné, úplné, pravdivé a bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
- 8.3. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.

9 PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě předání, a to bez vad a nedodělků.

- 9.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo či jeho část i před lhůtou pro její dokončení.
- 9.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí příslušné části díla nebo protokol o ukončení inženýrské činnosti či autorského dozoru (resp. průběžný protokol AD)“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla či jeho části (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.
- 9.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele.
- 9.5. Objednatel je povinen dílo převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Posouzení toho, zda drobné vady a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatel, popř. dohodou smluvních stran.
- 9.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci vypracování dalšího stupně PD a pro realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je součástí sjednané ceny
- 9.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností apod.).
- 9.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatel nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny Smlouvou.
- 9.9. Zhotovitel je povinen 10 dní před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a vypořádat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

- 9.10. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

10 ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, platnými v době předání díla nebo částí díla a popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 10.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 10.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
- 10.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace. Za vadu se nepovažuje navýšení ceny z důvodů inflace a vývoje cen ve stavebnictví.

11 NÁROKY ZA VADY DÍLA

- 11.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu, poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
- 11.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek s tím, že lhůta bude přiměřená povaze vady.
- 11.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 11.2. a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

12 SMLUVNÍ SANKCE

- 12.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle čl. 2 proti lhůtám / termínům uvedeným v čl. 3 Smlouvy, a to ve výši 0,1 % z předávané části ceny díla včetně DPH za každý, a to i započatý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení proti stanoveným termínům či lhůtám, pokud takové prokazatelně vzniklo z důvodů ležících mimo sféru jeho vlivu a zhotovitel nemohl s vynaložením přiměřeného úsilí prodlení zabránit.

- 12.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši 1000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 12.3. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6. 6. je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý konkrétní případ. Současně se jedná o závažné porušení smlouvy, pro které má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
- 12.4. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 10.4 této smlouvy a dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, o více než 5 %, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb maximálně však 100.000 Kč.
- 12.5. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.6. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 12.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

13 POJIŠTĚNÍ

- 13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností číslo pojistné smlouvy č. 8079831314 u Respect, s limitem pojistného plnění 5.000.000,-Kč (min. 1.000.000 Kč). Pojistná smlouva bude objednateli předložena na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.

14 Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
- 14.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět.

Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.

- 14.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje:
- 14.4.1. Prodlení zhotovitele s dodržáním lhůt/termínů stanovených dle čl. 3, delším než 30 dnů či kumulativně delší jak 60 dnů, není-li uvedeno jinak.
 - 14.4.2. Zhotovitel se i přes písemné upozornění objednatele neřídí jeho závaznými pokyny ve věci realizace díla a nedodržuje zadání.
 - 14.4.3. Ohledně zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení, jehož navrhovatelem bude sám Zhotovitel (tj. Zhotovitel na sebe podá insolvenční návrh).
 - 14.4.4. Rozhodnutím soudu bude zjištěn úpadek zhotovitele (i nepravomocně).
- 14.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považují:
- 14.5.1. Objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla, nebo jeho části, po dobu delší než 50 dnů.
- 14.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 14.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 14.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
- 14.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku SPORY této smlouvy.

15 SPORY

- 15.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení

sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu.

16 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17 STYK MEZI STRANAMI

- 17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.
- 17.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
- 17.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho prováděcích předpisů.

18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
- 18.2. Tato Smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 18.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
- 18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.6. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

18.7. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, tak se Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Moravská Třebová dne 14.07.2025 pod číslem usnesení 2424/R/140725.


V Moravské Třebové dne 17.07.2025

V..... dne

Objednatel

Zhotovitel

Příloha č. 1.

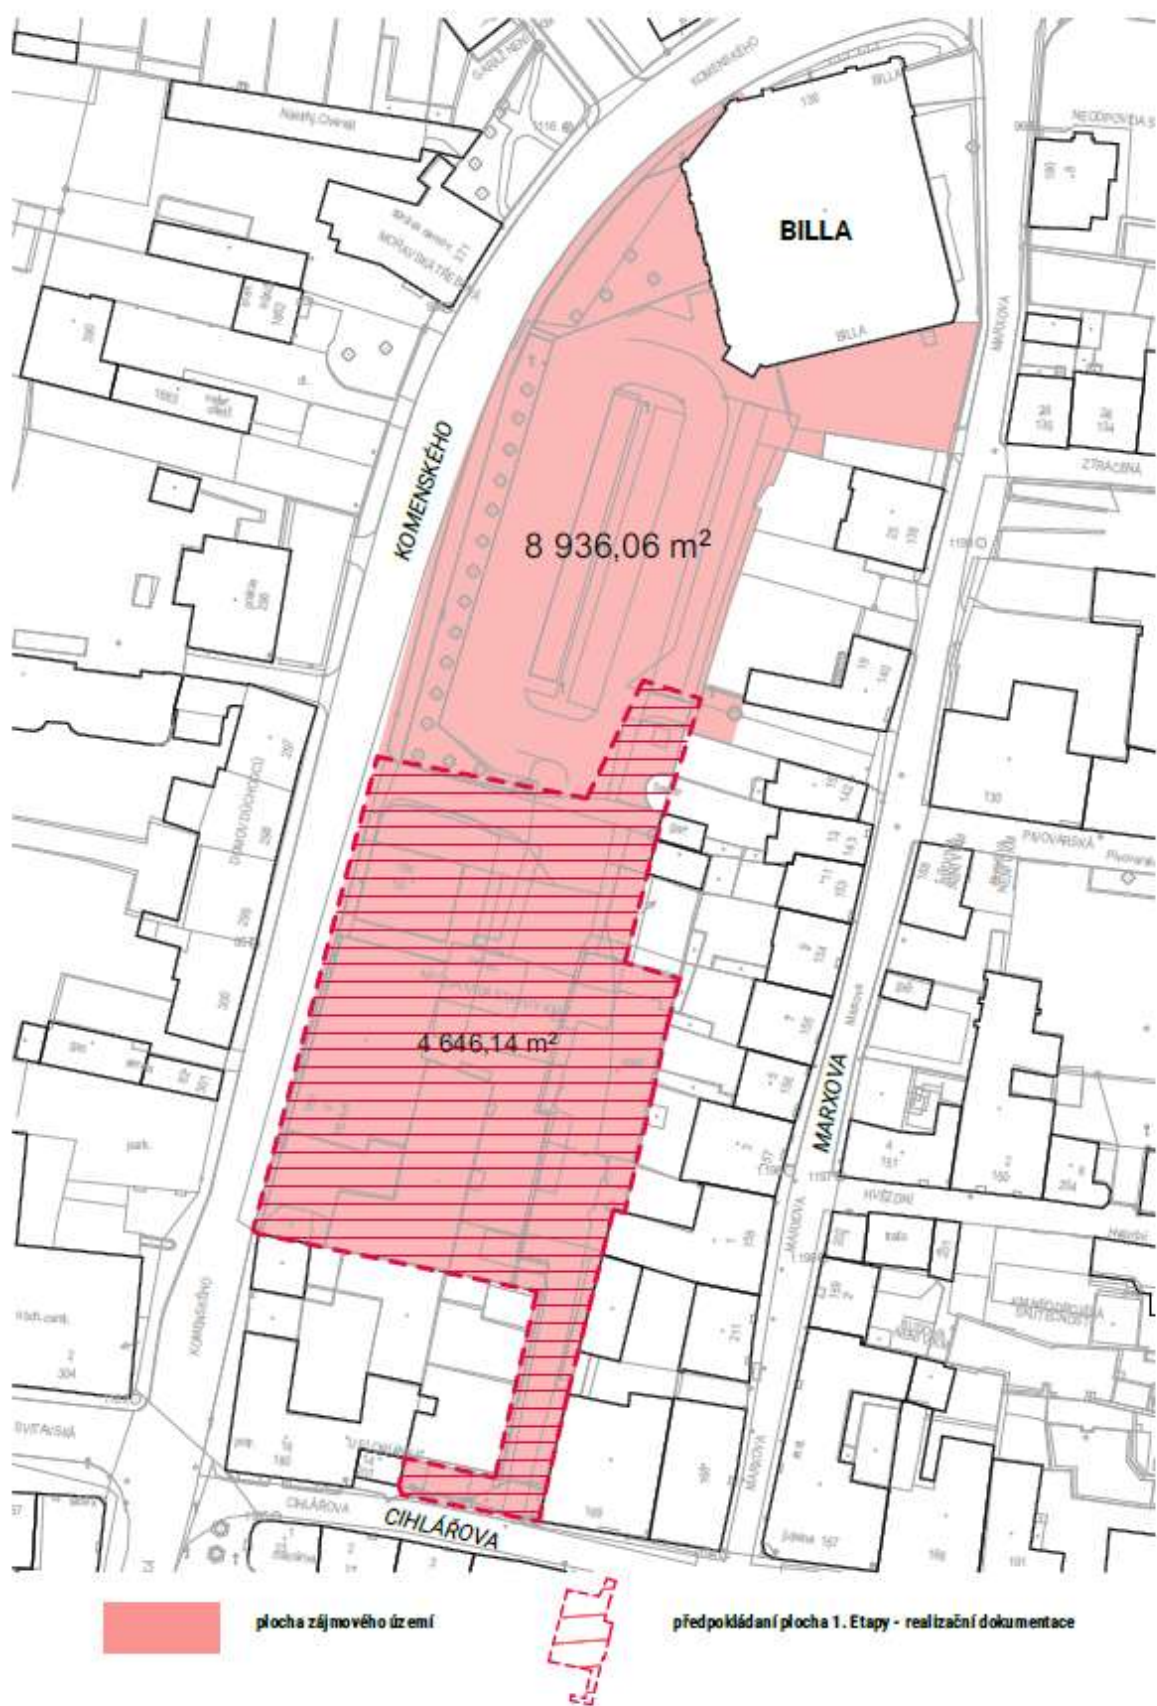

Obrázek 2 hranice řešeného území / navržená etapovitost realizace
