


T

ční



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



MVCRP018SAN7



NAKIT

č. j: MV-151932-81/EKIS-2016

č. j.: 2017/124 NAKIT

Dílčí smlouva č. 6

k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS

(dále jen „Dílčí smlouva“)

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
kontaktní adresa: 
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupena: Ing. Ivo Rosypalem, ředitelem odboru provozu a rozvoje EKIS,
na základě NMV č. 45/2011, o řízení, organizaci a výkonu
ekonomické činnosti
bankovní spojení: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.,

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 04767543
DIČ: CZ04767543
ID datové schránky: hkrkpwn
zastoupen: Alanem Ilcyszynem, ředitelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 77322
bankovní spojení: 

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS ze dne 31. 3. 2017 [č. j. Objednatele MV-151932-10/EKIS-2016; č. j. Poskytovatele 2017/036 NAKIT (dále jen „Smlouva“)].



Preamble

- 1.1 Cílem této Dílčí smlouvy je poskytnutí služeb stěhování systému EKIS MV a následného obnovení jeho plné funkčnosti v nové lokalitě.
- 1.2 Účelem této Dílčí smlouvy je vymezit a určit:
 - a) podmínky a rozsah služeb, které Poskytovatel poskytne Objednateli,
 - b) technickou specifikaci stěhovaných systémů,
 - c) realizační tým,
 - d) stanovení rozsahu a podmínek součinnosti Poskytovatele a Objednatele,
 - e) harmonogram přestěhování systému EKIS MV a dalších systému zařazených do stěhování

2 Předmět Dílčí smlouvy

- 2.1 Předmětem Dílčí smlouvy je realizace přestěhování systému EKIS MV a dalších systému zařazených do stěhování tvořeného zařízením dle technické specifikace v Příloze č. 1 z Datového centra, [REDACTED] do Datového centra [REDACTED] a to v souladu se specifikací postupu přestěhování dle Přílohy č. 2 (dále jen „Služby“).
- 2.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě, ve sjednaném termínu a specifikaci.

3 Dílčí cena a platební podmínky

- 3.1 Dílčí cena za Služby specifikované v čl. 2.1 Dílčí smlouvy činí 735 746,00 Kč bez DPH, kdy DPH činí 154 506,66 Kč a částka včetně DPH činí 890 252,66 Kč.
- 3.2 Poskytovatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena za Služby v sobě zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele spojené s plněním dle této Dílčí smlouvy a je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna.
- 3.3 Objednatel se zavazuje zaplatit za Služby poskytnuté v souladu s touto Dílčí smlouvou sjednanou cenu.
- 3.4 Daňový doklad bude vystaven Poskytovatelem nejdříve po řádném a kompletním poskytnutí Služby dle Dílčí smlouvy a podpisu Akceptačního protokolu odpovědnými zástupci Smluvních stran.



- 3.5 Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu Akceptačního protokolu. Vzor Akceptačního protokolu tvoří Přílohu č. 4 této Dílčí smlouvy.
- 3.6 Ostatní platební podmínky jsou stanoveny ve Smlouvě.

4 Doba, místo a podmínky plnění


- 4.1 Poskytovatel poskytne Služby Objednateli dle čl. 2.1 Dílčí smlouvy do 23. 10. 2017
- 4.2 Místem plnění [REDACTED]
- 4.3 Služby přestěhování budou po technické stránce poskytovány realizačním týmem dle Přílohy č. 3. Práce spojené s realizací samotného fyzického přestěhování hmotných komponent systému budou realizovány prostřednictvím subdodavatele.

5 Platnost a účinnost Dílčí smlouvy

- 5.1 Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinností po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění této povinnosti zajistí Objednatel a o jejím splnění bude Poskytovatele bezodkladně informovat prostřednictvím datové schránky.


6 Součinnost Poskytovatele a Objednatele

- 6.1 Poskytovatel se zavazuje řádně a včas poskytnout dílčí služby nezbytné pro řádné poskytnutí všech Služeb:
- a) zajistit vytvoření konektivity síťové infrastruktury, která zajistí odpovídající přístup všech stávajících uživatelů a externích subjektů k přesunutému prostředí EKIS MV,
 - b) zajistit zálohu dat a odstavení všech systémů, u kterých Poskytovatel poskytuje podporu provozu podle Smlouvy včetně jejich vypnutí, odpojení a následného zprovoznění včetně síťové konektivity.
- 6.2 Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro řádné poskytnutí všech Služeb:
- a) zajistit DC SPCSS – umístění systému, zabezpečení přístupů odpovědných osob Poskytovatele a jeho subdodavatele, úpravy napájecích sítí, zajištění odpovídající kapacity datového centra,
 - b) zajistit, že lokalita DC SPCSS je vybavena odpovídajícími možnostmi pro transport plně osazeného racku,
 - c) zajistit přístupy do DC [REDACTED] pro odpovědné osoby Poskytovatele a jeho subdodavatelů,




- d) zajištění odstávky celého systému EKIS MV a ostatních systémů zařazených do stěhování,
 - e) zajistit v datovém sále DC SPCSS min. 2 volná stání pro racky EKIS MV vybavené odpovídající kapacitou napájecích okruhů a 2 racky pro umístění zbývajících technologií vybavený odpovídajícím počtem napájecích elektrických zásuvek,
 - f) zajistit službu managementu datových pásek s operátorem DC SPCSS (import, export a odnos pásek mimo datový sál a jejich bezpečné uložení),
 - g) zajistit zálohu dat a odstavení všech systémů, u kterých Poskytovatel nedrží záruku ani neposkytuje podporu provozu (Sériová čísla: CZ3347V6LJ, CZ3347V6LN, CZ334V6LL, CZ334V6LK, CN4BFP65J6, KD5L03C, KD6X29W, KD4N85R, KD4N85T, 2C422956PB, CZ324205AE, CZ324205AJ, CZ324205AL, CZ324205AN, CZ324205AR, CZ324205AW, SFOC1614T0AK, FOC1442T0NH, GB874730YY, CN8052A01N, CN8052A02U) včetně jejich vypnutí, odpojení a následného zprovoznění včetně síťové konektivity.
- 6.3 V případě neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany Objednatele v rozsahu dle č. 6 odst. 6.2 Dílčí smlouvy, není Poskytovatel odpovědný za prodlení s poskytnutím Služeb ani nenese odpovědnost za způsobenou újmu.
- 6.4 Kontaktní osoby zastupují Smluvní strany ve věcech obchodních a ve věcech technických, týkajících se plnění Smlouvy. Těmito osobami jsou:

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech obchodních:

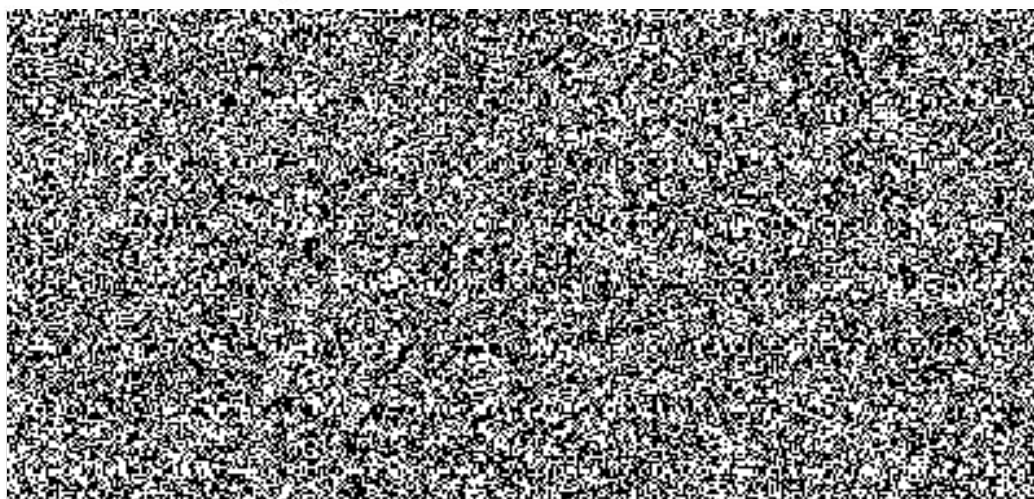

7 Ostatní ujednání

- 7.1 Veškerá ujednání této Dílčí smlouvy navazují na Smlouvu a Smlouvou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí ustanoveními Smlouvy. V případě, že ujednání obsažené v této Dílčí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého ve Smlouvě, má ujednání obsažené v této Dílčí smlouvě



přednost před ustanovením obsaženým ve Smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Dílčí smlouvě.

7.2 Dílčí smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

7.3 Smluvní strany prohlašují, že Dílčí smlouva ve spojení se Smlouvou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu Dílčí smlouvy. Smluvní strany po přečtení Dílčí smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určité a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

7.4 Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace – seznam zařízení

Příloha č. 2 Specifikace postupu stěhování

Příloha č. 3 Realizační tým

Příloha č. 4 Akceptační protokol

Příloha č. 5 Harmonogram

V Praze dne 10. 10. 2017



Ing. Ivo Kósypal
ředitel odboru provozu a rozvoje EKIS
Česká republika – Ministerstvo vnitra

V Praze dne 10. 10. 2017



Alan Ilczyszyn
ředitel
**Národní agentura pro komunikační
informační technologie, s. p.**



Příloha č. 2 - Specifikace postupu stěhování

Předmětem je realizace přestěhování systému Zadavatele – EKIS MV z

Systémy Zadavatele, které budou přestěhovány:

- EKIS MV (EKIS EP, EKIS HR, EKIS SM, EKIS OE, EKIS WEB)
- Související systémy OPR EKIS (např.: SEP, Anonymizace, EKIS info)

Technická specifikace komponent, které tvoří jednotlivé systémy, tvoří Přílohu č. 1 Dílčí smlouvy.

Postup stěhování systému EKIS MV je rozdělen do následujících 3 fází:

- A. Přípravná fáze – ode dne účinnosti Dílčí smlouvy do 18. 10. 2017
- B. Fáze stěhování – od 19. 10. do 21. 10. 2017
- C. Ověření funkčnosti a testování – 22. 10. 2017

A. Přípravná fáze

V přípravné fázi dojde k definici všech potřebných podkladů a informací a vyhodnocení rizik spojených se stěhováním informačního systému, a to v následujícím rozsahu:


- 1) Seznam stěhovaných technologií a jejich parametrů.
- 2) Seznam požadavků na napájení v DC SPCSS.
- 3) Stěhovaných technologií, jejich plná identifikace a návrh způsobu převozu.
- 4) Plán umístění stěhovaných technologií v DC SPCSS.
- 5) Definice uživatelských komunikačních kanálů a návrh způsobu jejich přesměrování do DC SPCSS.
- 6) Identifikace rizik spojených se stěhováním produktivní i neproduktivní části prostředí EKIS v rozsahu seznamu stěhovaných technologií dle bodu 1.
- 7) Ověření stavu připravenosti nového umístění v DC SPCSS (napájení, konektivita, přístupy, ...).
- 8) Sestavení podkladů pro připojení stěhovaných technologií v DC SPCSS dle požadavků SPCSS.

Výstupem fáze bude Poskytovatelem a Objednatelem vzájemně odsouhlasený Akceptační protokol o naplnění fáze.

B. Fáze stěhování

V této fázi dojde k vlastní fyzické aktivitě stěhování a umístění technologií.

- 1) Odstavení systémů pro uživatele.
- 2) Zálohování systémů a dat, zastavení systémů, fyzické vypnutí napájení stěhovaných zařízení.
- 3) Odpojení kabeláže, odpáskování, odpojení mimorackových propojů, demontáž zařízení mimo prostředí EKIS.
- 4) Balení a transport stěhovaných zařízení do DC SPCSS.
- 5) Montáž racků EKIS a technologií mimo EKIS do racků, připojení kabeláže, zapáskování.
- 6) Aktualizace příslušných podkladů vztažených k zařízením v rozsahu technické specifikace v Příloze č. 1 pro připojení k infrastruktuře DC SPCSS.




- 7) Připojení racků a zařízení mimo EKIS a jejich spuštění.
- 8) Zprovoznění všech technologií a programového vybavení.
- 9) Zajištění zprovoznění požadované síťové konektivity.


Výstupem fáze bude Poskytovatelem a Objednatelem vzájemně odsouhlasený Akceptační protokol o naplnění fáze.


C. Fáze ověření funkčnosti a testování

- 1) Ověření funkčností všech zařízení (u zařízení dle odstavce 6.1 písmene b) provede Poskytovatel, u zařízení dle odstavce 6.2 písmene g) provede Objednatel).
- 2) Ověření funkčnosti síťové konektivity (u zařízení dle odstavce 6.1 písmene a) provede Poskytovatel, u zařízení dle odstavce 6.2 písmene g) provede Objednatel). Pokud bude zařízení odpovídat na ping, bude výsledek testu považován za kladný.
- 3) Testy uživatelského přístupu v rozsahu množiny uživatelů definované a zajištěné Objednatelem.
- 4) Aktualizace příslušné dokumentace vztahené k zařízením v rozsahu technické specifikace v Příloze č. 1 pro připojení k infrastruktuře DC SPCSS.



Příloha č. 3 – Základní realizační tým

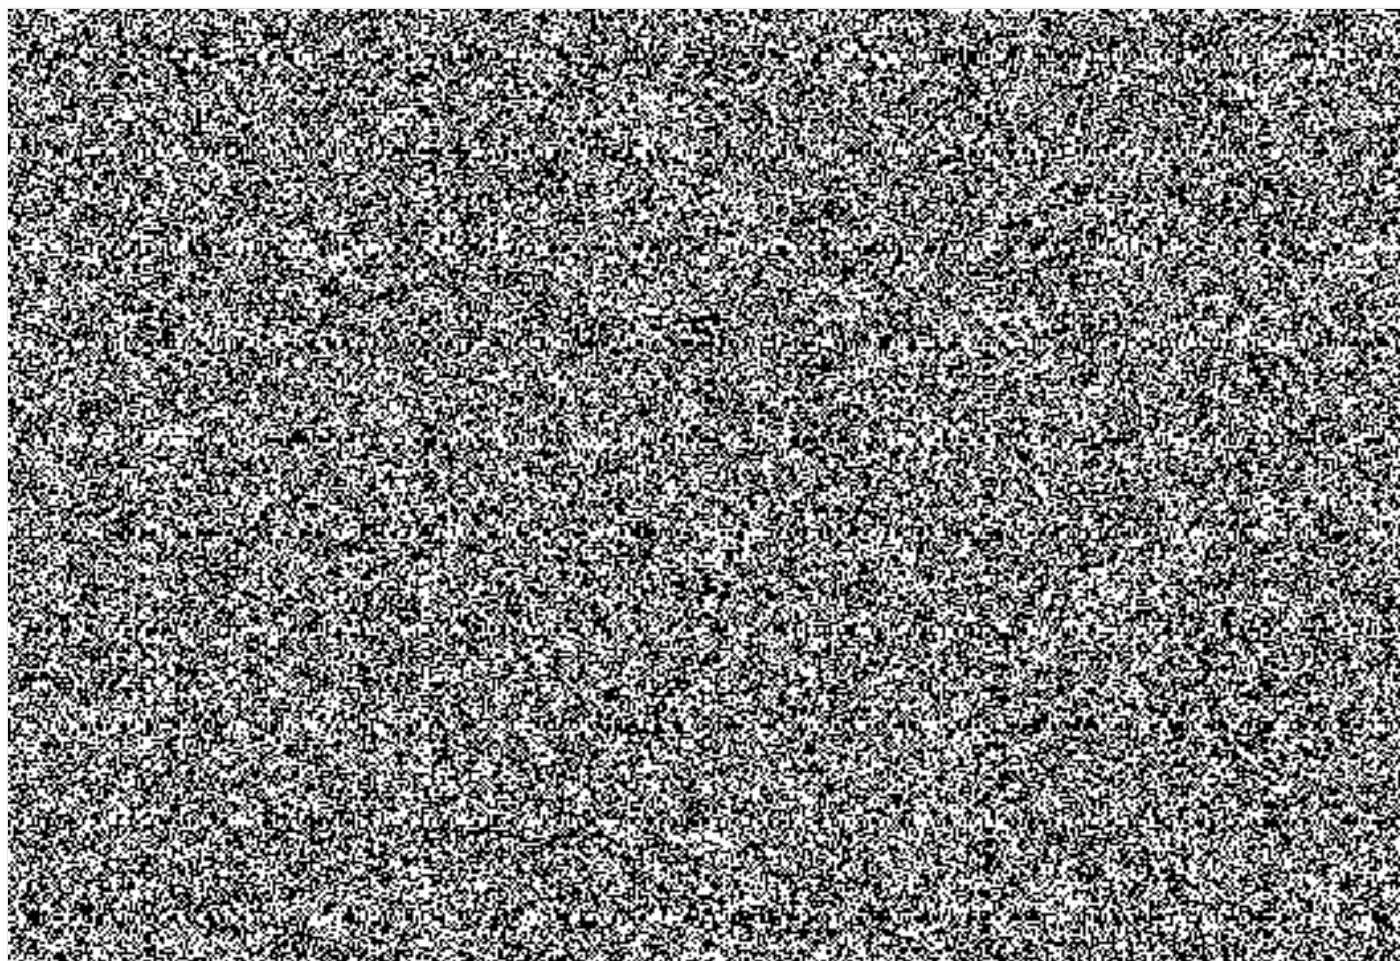



Příloha č. 4 - Akceptační protokol

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL Č. X

Poskytovatel	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Objednatel	Česká republika – Ministerstvo vnitra
Smlouva	Dílčí smlouva č. 6 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS
Datum uzavření Dílčí smlouvy	DD. MM. 2017
Datum	DD. MM. 2017

Předmět akceptace

Číslo	Popis	Akceptováno	Akceptováno s výhradou	Neakceptováno
01	Ověření funkčnosti všech zařízení			
02	Ověření funkčnosti síťové konektivity			
03	Testy uživatelského přístupu			
04	Dokumentace nového stavu			

Výhrady

Číslo	Popis

Poskytovatel a Objednatel svým podpisem stvrzují předání a Akceptaci předmětu plnění dle výše specifikované Dílčí smlouvy.

V Praze dne

Společnost	Jméno	Podpis
Předal za Poskytovatele		
Akceptoval za Objednatele		



Příloha č. 5 - Harmonogram

#	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Provádí		Čt	Pá	So	Ne	Po
	Příprava podmínek pro stěhování	8									
1	Revize seznamu stěhovaných technologií a jejich parametrů (napájení, váha, ...).	1	D-1	D-1	NAKIT; MVČR; subdodavatel						
2	Revize seznamu požadavků na napájení v DC SPCSS.	1	D-2	D-2	NAKIT; MV ČR						
3	Revize stěhovaných technologií, jejich plná identifikace a návrh způsobu převozu.	1	D-3	D-3	NAKIT; MVČR; subdodavatel						
4	Revize plánu umístění stěhovaných technologií v DC SPCSS.	1	D-4	D-4	NAKIT; MV ČR						
5	Revize uživatelských komunikačních kanálů a návrh způsobu jejich přesměrování do DC SPCSS.	1	D-5	D-5	NAKIT; MV ČR	KI					
6	Specifikace rizik spojených se stěhováním produktivní i neproduktivní části prostředí EKIS a ostatních technologií.	1	D-6	D-6	NAKIT; MV ČR						
7	Revize stěhovaných technologií a připravenosti nového umístění v DC SPCSS (napájení, konektivita, přístupy, ...).	1	D-7	D-7	NAKIT; subdodavatel; SPCSS						
8	Příprava podkladů pro připojení stěhovaných technologií v DC SPCSS (revizní zprávy, ...).	1	D-7	D-7	NAKIT; MV ČR						
	Stěhování + instalace, D = 18.10. 2017 20:00	3									
9	Odstavení systémů pro uživatele	1	D	D+3:59	NAKIT; MV ČR						
10	Zálohování systémů a dat, zastavení systémů, fyzické vypnutí napájení stěhovaných zařízení.	1	D+4:01	D+1	NAKIT; MV ČR						
11	Odpojení kabeláže, odpáskování, odpojení mimorackových propojů, demontáž zařízení mimo prostředí EKIS.	1	D+1	D+1	subdodavatel						
12	Balení a transport stěhovaných zařízení do DC SPCSS.	1	D+1	D+1	subdodavatel						
13	Montáž racků EKIS a technologií mimo EKIS do racků, připojení kabeláže, zapáskování.	1	D+1	D+2	subdodavatel						
14	Aktualizace podkladů pro připojení k infrastruktuře DC SPCSS (revizní zpráv atp.).	1	D+2	D+2	subdodavatel; MV ČR						
15	Připojení racků a zařízení mimo EKIS a jejich spuštění.	1	D+2	D+2	subdodavatel; MV ČR						
16	Zprovoznění všech technologií a programového vybavení.	1	D+2	D+2	NAKIT; MVČR; subdodavatel						
17	Zprovoznění síťové konektivity.	1	D+2	D+2	NAKIT	KI					
	Dokončovací práce, zprovoznění	1									
18	Ověření funkčnosti všech zařízení	1	D+3	D+3	NAKIT; subdodavatel						
19	Ověření funkčnosti síťové konektivity	1	D+3	D+3	NAKIT; MV ČR	KI					
20	Testy uživatelského přístupu	1	D+3	D+3	NAKIT; MV ČR						
21	Dokumentace nového stavu	1	D+3	D+3	subdodavatel; MV ČR						

