

## SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 16PU-002025/15

č. dodavatele/zhotovitele: 17Sml00079

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických této zakázky: [REDACTED]

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

**Silverton s.r.o.**, Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy

IČ: 24283410

DIČ: CZ24283410

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192787,

zastoupený [REDACTED]

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

**Protože** si objednatel přeje, aby stavba **Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK, ISPROFOND 500 111 0007** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši dvacetsedmmiliónůpětsetšedesátpěttisícdvěstědevadesátšest korun českých šedesát haléřů bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK	27.565.296,60 Kč	5.788.712,29 Kč	33.354.008,89 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

**dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:**

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **528206** a Smluvními

podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem – Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)<sup>7</sup>
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)<sup>8</sup>
- (e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (g) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)
  - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 7.3.2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

<sup>7</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy o dílo předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>8</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy o dílo předložit na elektronickém datovém nosiči.





V Ostravě dne: 25 -10- 2017

Naše značka: 54300/561/17

Dle rozdělovníku

Číslo zakázky: 16PU-002025

Vyřizuje: [REDACTED]

### Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

#### „Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK“

zadávací řízení zahájeno dne 25. 02. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 528206 / ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 6 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 2, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

**Silverton s.r.o.**, sídlo: Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČO: 24283410.

Celková nabídková cena uchazeče: 27 565 296,60 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 13, podaná uchazečem

**SAFEROAD Czech Republic s.r.o.**, sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČO: 25229761.

Celková nabídková cena uchazeče: 33 999 196,10 Kč (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7, podaná uchazečem

**STRABAG a.s.**, sídlo: Na Bělídle 198/21, 150 00 Praha 5, právní forma: akciová společnost, IČO: 60838744.

Celková nabídková cena uchazeče: 35 889 343,20 Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

**SPEMAX s.r.o.**, sídlo: Rolsberská 1203/90, 779 00 Olomouc - Hodolany, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČO: 27769836.

Celková nabídková cena uchazeče: 38 241 701,10 Kč (bez DPH)

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem

**SILNICE.CZ s.r.o.**, sídlo: Červený dvůr 918/7, 794 01 Krmov - Pod Cvilínem, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČO: 26792711.

Celková nabídková cena uchazeče: 44 981 500,64 Kč (bez DPH)

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 12, podaná uchazečem

**ALPINE Bau CZ a.s.**, sídlo: Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, právní forma: akciová společnost, IČO: 02604795.

Celková nabídková cena uchazeče: 46 686 910,60 Kč (bez DPH)

**Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem Silverton s.r.o. jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.**

#### **Poučení:**

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Ostravě dne 25-10-2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR





Vaše zn.:

Naše zn.: 16PU-002025 DOD.INF.2

V Ostravě dne 21-03-2016

Věc: Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce:

„Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK“, číslo zakázky: 16PU-002025. Oznámení o zakázce zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. 528206 (dále jen „Zakázka“)

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a ustanovením čl. 9 a 10 zadávací dokumentace Zakázky Vám tímto poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné Zakázky.

Číslo dotazu	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
2.	<i>Bez předchozí žádosti</i>
	<b>Dodatečná informace</b>
	Část dokumentace stavby (fotky) uvedená v bodě 1.10.1 Zvláštních technických kvalitativních podmínek díle 3, části 2 zadávací dokumentace zakázky se uchazečům v souladu s § 48 odst. 2 Zákona poskytne jako netextová část zadávací dokumentace. Kontaktní údaje viz. čl. 12 dílu 0 zadávací dokumentace zakázky. <b>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.</b>

Zadavatel vzhledem ke změně zadávací dokumentace v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám zakázky rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek je nově stanovena na **04. 04. 2016, 09:00** hod.

Ve smyslu výše uvedeného se mění články 6.1 a 8.1 dílu 0 zadávací dokumentace předmětné zakázky

Zároveň upozorňujeme, že ve smyslu § 49 odst. 3 Zákona o VZ budou všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění všech žádostí (ale bez určení žadatelů) poskytovány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty. Současně budou též uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRsd>, ID: 9593).

S pozdravem

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY: Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK**  
**PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4**

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy o dílo, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

**Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:**

Název díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK	27.565.296,60 Kč	5.788.712,29 Kč	33.354.008,89 Kč

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (d) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací - Výkaz výměr



- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy o dílo, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno:

funkce **jednatel společnosti**


řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti **Silverton s.r.o.**,

Adresa: Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy

Datum: 31.3.2016

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: **Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK**Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.**

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	<b>Silverton s.r.o.</b> , Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory 
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	30 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.3.10	<b>30</b> měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	60 měsíců s výjimkou těch materiálů / zařízení / technických zařízení / prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba delší
Sekce	1.1.5.6	Nepoužije se
Dílo	1.1.5.8	Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Záruka za odstranění vad	4.25	3% Přijaté smluvní částky
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	<i>Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4</i> 160.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	<i>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29</i> 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním postupného závazného milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 a), b), c) v Příloze k nabídce
	4.28 c)	<i>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31</i> 30.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	<i>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce</i> 310.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	<i>Za nedodržení Doby pro dokončení</i> 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	<i>Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu</i> 60.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	4.28 g)	<i>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4</i> 6.000,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky
	4.29	Nepoužije se
Definice "Jmenovaného podzhotovitele"	5.1	Nepoužije se
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	<i>Použije se pod-článek 13.8.1</i>
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	Nepoužije se
	14.6. c)	<i>Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25</i> 10 % průběžné platby
	14.6 d)	<i>Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7</i> 10 % průběžné platby
	14.6 e)	<i>Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3</i> 10 % průběžné platby
	14.6 f)	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18</i> 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% Přijaté smluvní částky
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

Datum: V Praze dne 31.3.2016

---

Silverton s.r.o.

**Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou následující Technické kvalitativní podmínky („TKP“):**

### **Přehled jednotlivých kapitol TKP**

#### **Kapitola 1 TKP**

##### **Všeobecně**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1

ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007,

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998

a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120

ze dne 21.2.2000.

Praha květen 2007

#### **Kapitola 2 TKP**

##### **Příprava staveniště**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1

ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120

ze dne 30.6.1998

Praha 2006

#### **Kapitola 3 TKP**

##### **Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

#### **Kapitola 4 TKP**

##### **Zemní práce**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1

ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010



se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1  
Praha, prosinec 2009

## **Kapitola 5 TKP**

### **Podkladní vrstvy**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací  
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,  
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015  
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP  
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1  
ze dne 12.3.2008  
Praha, leden 2015

## **Kapitola 6 TKP**

### **Cementobetonový kryt**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací  
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3  
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015  
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP  
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1 ze dne 3.8.2006  
Praha, leden 2015

## **Kapitola 7 TKP**

### **Hutněné asfaltové vrstvy**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1  
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120  
ze dne 19.3.1999  
Praha, duben 2008

## **Kapitola 8 TKP**

### **Litý asfalt**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1  
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1  
ze dne 15.12.2003  
Praha, duben 2008

### **Kapitola 9 TKP** **Kryty z dlažeb a dílců**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor silniční infrastruktury  
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1  
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010  
se současným zrušením znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1  
ze dne 20.12.2002  
Praha, srpen 2010

### **Kapitola 10 TKP** **Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor silniční infrastruktury  
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1  
ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010  
se současným zrušením znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1  
ze dne 20.12.2002  
Praha, srpen 2010

### **Kapitola 11** **Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor silniční infrastruktury  
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1  
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010  
se současným zrušením pátého znění této kapitoly  
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1  
ze dne 29.8.2005  
Praha, leden 2010

### **Kapitola 12 TKP** **Trvalé oplocení**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1  
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120  
ze dne 21.2.2000  
Praha, březen 2008

### **Kapitola 13 TKP** **Vegetační úpravy**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací  
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1  
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006  
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120  
ze dne 27.10.1997  
Praha, srpen 2006

### **Kapitola 14 TKP** **Dopravní značky a dopravní zařízení**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,  
s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP  
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015  
Praha, březen 2015

### **Kapitola 15 TKP** **Osvětlení pozemních komunikací**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací  
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,  
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. 1  
schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013  
Praha, únor 2015

### **Kapitola 16 TKP** **Piloty a podzemní stěny**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor silniční infrastruktury  
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1  
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011  
se současným zrušením znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1  
ze dne 20.12.2002

Praha, prosinec 2010

**Kapitola 18 TKP**  
**Beton pro konstrukce**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2  
ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016,  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005  
Praha, leden 2016

**Kapitola 19 TKP**  
**ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce**  
**ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A  
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3  
ze dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015,  
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A  
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008  
Praha, duben 2015

ČÁST B  
Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/1 ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014,  
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-910-  
IPK/1 ze dne 12. 3. 2008  
Praha, prosinec 2013

**Kapitola 20 TKP**  
**Pylony a mostní závěsy**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1  
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008  
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120  
ze dne 21.2.2000  
Praha, duben 2008

**Kapitola 21 TKP**  
**Izolace proti vodě**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1

ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003

Praha, leden 2010

**Kapitola 22 TKP**

**Mostní ložiska**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD - OI, č.j. 653/07-910-IPK/1

ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120

ze dne 21. 2. 2000.

Praha, duben 2007

**Kapitola 23 TKP**

**Mostní závěry**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/1

ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007.

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120

ze dne 21. 2. 2000

Praha, květen 2007

**Kapitola 24 TKP**

**Tunely**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1

ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007.

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120

ze dne 19.3.1999

Praha, prosinec 2006

**Kapitola 25 TKP**

**Protihlukové clony**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1

ze dne 20.12.2002

Praha, únor 2009

**Kapitola 26 TKP**

**Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek**

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015,

s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008

Praha, únor 2015

**Kapitola 27 TKP**

**Emulzní kalové vrstvy**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015,

s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008 a zrušením čtvrtého znění

kapitoly 28 TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008

Praha, únor 2015

**Kapitola 29 TKP**

**Zvláštní zakládání**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1

ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003

Praha, prosinec 2010

**Kapitola 30 TKP**

**Speciální zemní konstrukce**



MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1

ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120

Praha, prosinec 2009

**Kapitola 31 TKP**

**Opravy betonových konstrukcí**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1

Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP

Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120

Ze dne 19.3.1999

Praha, květen 2009

Při stavbě bude aplikováno nejnovější vydání TKP s datem účinnosti k Základnímu datu podle VOP ve znění ZOP.

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

## **Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)**

pro opravu

### **„Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK“**

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňují a doplňují jejich obecná ustanovení. Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak byly schváleny MDS-OPK.

## **KAPITOLA 1**

### **VŠEOBECNĚ**

#### **1.6 STAVENIŠTĚ**

Stavba je situována na silničním pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu stavby, jeho překročení je možné jen z vážných technologických důvodů a po předchozím odsouhlasení stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo staveniště hradí zhotovitel.

##### **1.8.1 Předání staveniště se doplňuje:**

Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a zajistí zhotovitel sám. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům podél celé stavby.

##### **1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje:**

Práce budou prováděny za omezeného silničního provozu (provizorní dopravní značení, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR a rozhodnutí KÚ o povolení uzavírky zajistí zhotovitel).

Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu zůstává během stavby majetkem zhotovitele.

##### **1.8.10 Základní podmínky pro užívání staveniště**

**čl. 8** se doplňuje:

Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem neustále čištěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

#### **1.9 PROVÁDĚNÍ PRACÍ**

##### **1.9.4 Ochranná pásma se doplňuje:**

Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů a respektovat ochranná pásma inženýrských sítí.

#### **1.10 DOKUMENTACE STAVBY**

##### **1.10.1 Všeobecně se doplňuje:**

V rámci zadání zakázky nepředáváme některé části dokumentace stavby (viz. níže), které nejsou potřebné k ocenění nabídky. Kompletní dokumentaci stavby obdrží vítězný dodavatel/zhotovitel.

I.část

- Foto
- 11
- 56

II.část

- Foto
- 35
- 45
- 46
- 47
- 48
- 57
- 58
- 59
- 67
- 68

**1.11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ** se doplňuje:

Zhotovitel zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek do toku nebo kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli.

**1.11.5 Ochrana povrchových a podzemních vod**

**1. věta** se upřesňuje:

V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

**1.11.6 Odpady**

Podmínkou je, že nepotřebný materiál - vyzískané ocelové konstrukce (svodidla apod.) dodavatel odkoupí – min. 5.000 Kč/t. Pro odkoupení materiálu bude uzavřena zvláštní smlouva o prodeji.

**1.11.6.4 Zařazení odpadů** se doplňuje:

Zhotovitel povede evidenci odpadů vzniklých při provádění stavby. S odpady a nebezpečnými látkami bude nakládat dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

## KAPITOLA 2

### PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

**2.10. EKOLOGIE**

**2.10.2 Skládky, mezideponie** se doplňuje:

Skládování sutin na veřejných prostranstvích mimo obvod staveniště je zakázáno.

**Dále se doplňuje:**

Doba pro dokončení stavby je 30 měsíců.

Práce mohou být realizovány také v období zimní údržby od 1. 11. do 29. 2., pokud to meteorologické podmínky umožní a nebude stanoveno jinak Ministerstvem dopravy České republiky.

Práce zhotovitele mohou být podle potřeb objednatele na nezbytně nutnou dobu přerušené, v tomto případě se tato doba nebude počítat do doby provádění prací, kterou uchazeč uvede ve své nabídce. Toto případné přerušení prací nebude mít vliv na cenu prací, ani na uložení případných sankcí zhotoviteli.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat před uzavřením smlouvy předložení těchto dokladů ke všem nabízeným svodidlům:

- ES certifikát shody – EC Certificate of Conformity v souladu se směrnicí Rady č. 89/106/EHS (datum vydání do 30. 6. 2013)/ Prohlášení o vlastnostech – Certificate of constancy of performance ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (datum vydání od 1. 7. 2013).
- ES prohlášení o shodě (datum vydání do 30. 6. 2013)/Osvědčení o stálosti vlastností (datum vydání od 1. 7. 2013)

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.2**  
**ZÁVAZEK INTEGRITY**

Pro: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4**

Od: **Silverton s.r.o., IČ 24283410, Za zastávkou 373, Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00**

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **528206** (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky

nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 31.3.2016

---

Silverton s.r.o.



**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.5**  
**ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**

Název veřejné zakázky: **Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK**

Společnost **Silverton s.r.o.**,

se sídlem: Za zastávkou 373, Praha 10 – Dolní Měcholupy 109 00

IČ: 24283410,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192787,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **528206** (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace zakázky budou vytěžené ocelové konstrukce (svodidla apod.) od zadavatele odkoupen ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena se sjednává ve výši 5.000 Kč/t. Zhotovitel se současně zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Pro odkoupení vytěženého materiálu bude uzavřena zvláštní smlouva o prodeji.

Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně shora uvedené. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. její subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Praze dne 31.3.2016

\_\_\_\_\_  
Silverton s.r.o.

**DÍL 1, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 4.4.6  
ROZDĚLENÍ PRACÍ**

Společnost **Silverton s.r.o.**,

se sídlem: Za zastávkou 373, Praha 10 – Dolní Měcholupy 109 00

IČ: 24283410,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192787,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **528206** (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavatelí	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvest detaily)
Montáž svodidel	Značky Morava, a.s., IČ 25865871, Čsl. Armády 1112/27a, 794 01 Krnov	40%	Viz doklady referenčních staveb
CELKEM %		40%	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 31.3.2016

\_\_\_\_\_  
Silverton s.r.o.

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.11**  
**PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A**  
**PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ**

**Společnost Silverton s.r.o.,**

se sídlem: Za zastávkou 373, Praha 10 – Dolní Měcholupy 109 00

IČ: 24283410,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192787,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **528206** (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

*prohlašuje, že*

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	<b>Uchazeč nezná žádné patenty s ohledem na předmět zakázky.</b>			

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	<b>Uchazeč nezná žádné užité vzory a průmyslové vzory s ohledem na předmět zakázky.</b>			

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelům ve znění Zvláštních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 31.3.2016

\_\_\_\_\_  
Silverton s.r.o.

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.12**  
**SEZNAM SUBDODAVATELŮ**

Společnost **Silverton s.r.o.**,

se sídlem: Za zastávkou 373, Praha 10 – Dolní Měcholupy 109 00

IČ: 24283410,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192787,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **528206** (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele</b>	<b>IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele</b>	<b>Údaj v %, kolik bylo subdodavatelům uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]</b>
Značky Morava, a.s.,	IČ 25865871, Čsl. Armády 1112/27a, 794 01 Krnov	bude doplněno po skončení zakázky, nebo po konci kalendářního roku

**alternativa B**

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

<b>Identifikační údaje subdodavatele</b>	<b>Identifikační údaje akcionáře</b>
Značky Morava, a.s., IČ 25865871, Čsl. Armády 1112/27a, 794 01 Krnov	[redacted] - jediný akcionář [redacted]




Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.

V Praze dne 31.3.2016

---

Silverton s.r.o.



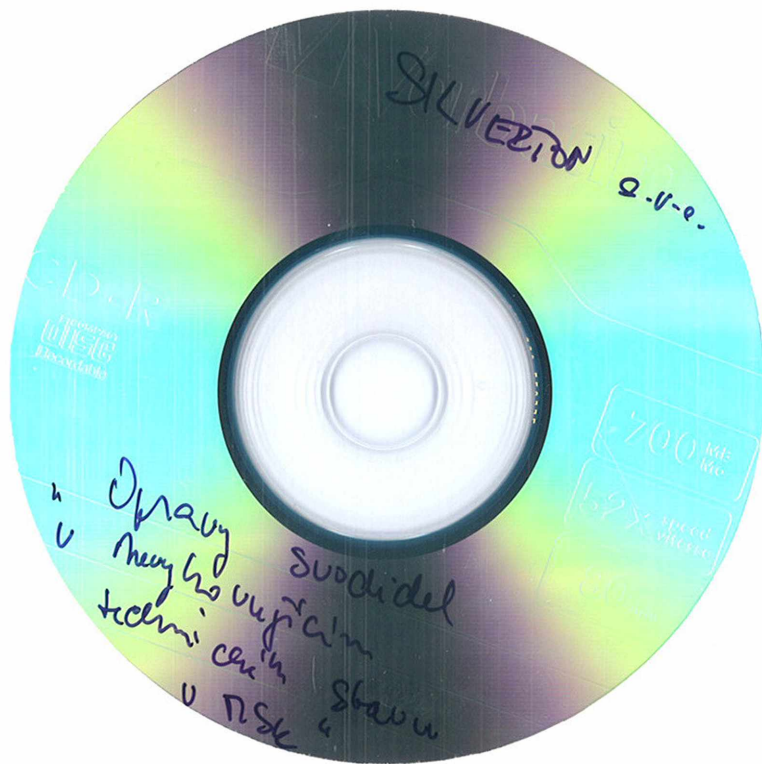

SILVERTON  
Q.11-e.

u Opravy  
u Muzho vyjicim  
u technickim  
u disk  
suocidel  
u  
stavu

700 MB

52x speed

500 MB
