

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

2. Název firmy	Psychiatrická nemocnice Bohnice
IČO	00064220
DIČ	CZ00064220
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., č.ú. 16434081/0100
Sídlo	Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice
Statutární zástupce	MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel
dále jen „objednatel“	

a

2. Název firmy	Firstpower a.s.
IČO	28386191
DIČ	CZ28386191
Bankovní spojení	43-7020430237/0100
Sídlo	Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3
Statutární zástupce	Ing. Jáchym Dvořák, předseda představenstva
dále jen „zhotovitel“	

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

Tato smlouva je uzavřena mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „PN Bohnice – Záložní zdroj elektrické energie“, protože nabídka zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Veřejná zakázka byla zrealizována v rámci projektu „PN Bohnice – záložní zdroje elektrické energie“, který financuje Ministerstvo zdravotnictví a je registrován pod číslem SMVS: 235V132001211.

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je kompletní předrealizační příprava, dodávka a instalace záložního zdroje elektrické energie (dále jen „dílo“), který bude v případě výpadku elektrické energie v PN Bohnice nahrazovat její dodávku.
- 1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

II. Specifikace díla

- 2.1. Objednatel požaduje dodání záložního zdroje elektrické energie - motorgenerátoru včetně všech souvisejících činností, prací a dodávek, které zahrnují především:
 - a) vyhotovení projektové dokumentace pro spojené stavební a územní řízení, zajištění vyjádření dotčených orgánů a organizací k PD, zajištění územního souhlasu a stavebního povolení, kolaudačního souhlasu;
 - b) dodávku a montáž **nově vyrobeného** kapotovaného záložního zdroje el. energie s **min.** elektrickým trvalým výkonem podle ČSN ISO 8528-1, (prime power) PRP 669 kVA / 535 kW, min. elektrický záložní výkon (limited time power) LTP 721 kVA / 577 kW, napětí generátoru 400/230 V, 50 Hz s příslušenstvím pro automatický start;
 - c) napojení generátoru záložního zdroje do rozvodny nízkého napětí (NN);
 - d) úpravu NN rozvodny (rozšíření a přezbrojení),(výměna jističů na přívodu od transformátorů T1 a T2, za elektricky ovládané);
 - e) úpravu ovládání (výměna a doplnění deonů za elektricky ovladatelné) vybraných vývodů z rozvodny NN na řídicí systém (připojování a odepínání v závislosti na okamžitém zatížení MG)(při přetížení)
 - Výměník – pole č.7 rozvaděče
 - Vývod P 30-34 a vývod P17-21 – pole č.3 rozvaděče;
 - f) zpracování PD skutečného provedení (2x v tištěné, 1x v elektronické podobě CD-formát pdf.);
 - g) zajištění potřebných měření (hlučnost, chvění, znečištění ovzduší), předání protokolů;
 - h) dodání revizní zprávy EZ, požárně bezpečnostní řešení stavby, návodu na obsluhu a údržbu zařízení, provozní řád;
 - i) zaškolení personálu objednavatele;
 - j) provádění záručního a pozáručního servisu, profylaktických zkoušek 2x ročně (včetně dopravy);
 - k) dodávku a instalaci SW (v českém jazyce) na monitoring stavu záložního zdroje s dálkovým přenosem do PC.
- 2.2. Požadavky na záložní zdroj elektrické energie:
 - a) součástí dodávky bude zásobní nádrž na PHM pro zajištění nepřetržitého provozu na dobu min. 10 hodin v dvouplášťovém vyhotovení při jmenovitém výkonu generátoru;
 - b) automatický start při výpadku dodávky elektrické energie ze sítě do 20 vteřin;
 - c) zařízení bude splňovat normy EU, zařízení bude vyrobeno na území EU;
 - d) zařízení musí umožňovat automatickou změnu el. výkonu podle okamžitého zatížení;

- e) obsah monitoringu: napětí sítě, frekvence a hodnota napětí MG, zatížení MG, napětí startovací baterie, tlak oleje, teplota motoru, stav paliva, zaznamenání všech výše uvedených hodnot s možností exportu do grafické podoby, reporting poruch – sms (vše v českém jazyce);
- f) systém bude opatřen akustickým alarmem v případě překročení rozpětí nastavených hodnot;
- g) bude instalováno rozhraní pro sběr dat a HW vybavení na další dvě pracoviště;
- h) součástí řídicí jednotky MG musí být synchronizace s pevnou sítí (dopředná i zpětná).

Zpětná synchronizace se uplatňuje v režimu AMF, kdy po obnovení dodávky proudu z pevné sítě automaticky detekuje napětí na síti, synchronizuje se spolu se sítí a bez výpadku se odpojí.

Dopředná synchronizace se v režimu PMS použije k automatickému zvýšení výkonu v závislosti na okamžité zátěži.

Objednatel požaduje i aplikaci - odstávky vlastního zdroje (transformátoru) nebo ohlášené odstávky ze strany distributora, při kterých nesmí dojít k výpadku dodávky el. energie do vnitřní sítě. Agregát bude tedy možno připojit na síť, převzít zátěž při přerušení dodávky proudu během odstávky a odpojit po obnovení dodávky z pevné sítě, a to vše bez výpadku!

2.3. Požadavky na montáž:

- a) přerušení dodávky elektrické energie ze sítě možné pouze ve dnech pracovního volna (v sobotu, v neděli) na dobu max. 1 hod. Přerušení oznámit minimálně 3 dny předem.

2.4. Realizace díla zahrnuje i tyto dodávky, služby a stavební práce:

- a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, zaměření v průběhu provádění, zpracování veškerých dokladů,
- b) zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců,
- c) zajištění zařízení staveniště, včetně jeho údržby, odstranění a likvidaci;
- d) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených pracemi do původního stavu,
- e) provedení opatření při realizaci:
 - komunikace a plochy v okolí místa provádění prací lze využít jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem,
 - místa provádění prací nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele,
- f) dodání podkladů pro zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení v tištěné podobě a na datovém nosiči v elektronické podobě včetně veškeré související fotodokumentace;
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- h) splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb;
- i) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- j) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru,
- k) zřízení a odstranění zabran a oplocení, zajištění ostrahy staveniště, včetně uvedení do původního stavu po dokončení,

- l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného prostranství včetně úhrady poplatků a nájemného s tím spojených;
- m) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci a v souvislosti s realizací, provedení závěrečného úklidu a uvedení všech dotčených ploch do původního stavu,
- n) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel v okolí realizace dodání, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- o) případná dopravní omezení včetně jejich projednání, zajištění stanoveného dopravního značení včetně jeho umístění,
- p) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění;
- q) zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání,
- r) zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení prací,
- s) geodetické zaměření skutečného provedení díla,
- t) zajištění přejímajícího řízení a převímky díla;
- u) zajištění certifikátů použitých výrobků a materiálů vč. návodů k užívání v českém jazyce,
- v) pořízení průběžné fotodokumentace, její uložení na datovém nosiči, předání objednateli;

2.5. Vypracovanou projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli ke schválení. Následně při provádění prací a dodávek bude zhotovitel postupovat v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů.

2.6. Dílo bude způsobilé ke sjednanému účelu, bude-li rovněž zahrnovat provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, obsažených buď v nabídce zhotovitele (příloha č. 1 smlouvy) nebo v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, nebo v této smlouvě a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

2.7. Provedení díla se považuje za dokončené úspěšným provedením ujednaných zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele přizve písemně, a to 5 kalendářních dní předem. Výsledek zkoušky bude zachycen v zápise. Strany této smlouvy výslovně sjednávají provedení zkoušek dle obecně závazných předpisů.

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) touto smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací,
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, tj. řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 90 kalendářních dní od podpisu smlouvy.

- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a nedodělků, a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 3.3 Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle týdenního časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění veřejné zakázky je areál Psychiatrické nemocnice Bohnice nacházející se na adrese Ústavní 91, Praha 8.

Záložní zdroj elektrické energie bude umístěn na parcele č. 482/9 vedle rozvodny nízkého napětí.

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH:	3 394 000,00 Kč
DPH (základní sazba):	712 740,00 Kč
Celková kupní cena včetně DPH:	4 106 740,00 Kč

Cena za dílo byla stranami sjednána na částku 4 106 740,00 Kč (slovy čtyřmilionyjednostošesttisícsemsetčtyřicetkorun českých) včetně DPH.

- 5.2 Cena za dílo je cenou pevnou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace díla a je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.
- 5.3. Cena za dílo obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému splnění předmětu smlouvy, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména nákladů na pořízení jednotlivých položek předmětu plnění, nákladů na dopravu předmětu plnění na místo plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, nákladů na pojištění předmětu plnění, ostrahu do jeho předání a převzetí, nákladů na průvodní dokumentaci, nákladů na instalaci a uvedení zařízení do provozu.
- V ceně za dílo nejsou zahrnuty náklady zhotovitele na pozáruční servis.
- 5.4. **Objednatel nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.** Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených a oceněných v souladu se smlouvou a odsouhlasených technickým dozorem stavebníka.
- 5.6. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Daňový doklad musí také obsahovat text:

Projekt: PN Bohnice – Záložní zdroj elektrické energie
č. SMVS: 235V132001211T

Text bude uveden nad předmětem fakturace.

- 5.7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli
- 5.8. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
- 5.10. Pokud objednatel uplatní a vyznačí na dodacím listě resp. na soupisu provedených prací a dodávek reklamaci, může objednatel zadržet 10 % sjednané ceny za dílo do doby odstranění všech vad a nedodělků ze strany zhotovitele. Zhotovitel může vystavit fakturu až po vyřešení reklamace.

Zádržné bude uvolněno následovně: 100% zádržného bude zaplaceno po odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v předávacím protokolu dle ust. odst. 12.3. této smlouvy

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla, měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že

s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi příkazů nebo věcí.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby budoucího zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.
- c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich porušení.
- d) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- e) Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušování prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

7.4. Technický dozor stavebníka nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním jakkoli propojená.

7.5. Kontrolní dny

- a) Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně), v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor stavebníka. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
- b) Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor stavebníka, a další přizvané osoby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:
 - stavební deník,
 - doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
- c) Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.

7.6. Kontrola provádění díla

- a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
- b) Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel předal projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě, a to buď technickému dozoru stavebníka, nebo objednatelem pověřené osobě.
- c) Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření provede technický dozor stavebníka, nebo jím pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně 3 pracovních dnů před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli

osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.

- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísľují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

- 9.4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.8. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

X. Podmínky a způsob provádění díla

- 10.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli příkaz ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.
- 10.2. Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro vlastní rozvaděč opatřený vlastním měřením a objednatel zhotoviteli vyúčtuje skutečně odebrané množství el. proudu.
- 10.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal.
- 10.4. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.
- 10.5. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 10.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené subdodavatelem třetí osobě.
 - 10.8. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla žádného dalšího subdodavatele, než ty, které jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením smlouvy.
 - 10.9. Dochází-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval objednatel v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů.
 - 10.10. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
 - 10.11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli.
 - 10.12. Zhotovitel je povinen splnit podmínky uvedené v závazných stanoviskách dotčených orgánů ve smyslu stavebního povolení a územního souhlasu.
 - 10.13. Zhotovitel je povinen dodržovat ust. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 346/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů nebo jiných obecně závazných předpisů upravujících předcházení vzniku škod hradí zhotovitel.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost

- a) provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem;

b) výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má objednatel právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění

b) na odstranění vady opravou věci

c) na přiměřenou slevu z ceny

d) na odstoupení od smlouvy.

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady (v případě havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání díla se zhotovitel zavazuje provést do 24 hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět díla provizorně nebo omezeně užívat od doby odstranění závady).

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušeni běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že:

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojitým vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatel. Dle dohody smluvních stran je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dvě objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4. Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení, že předal technickému dozoru stavebníka nebo objednatel pověřené osobě projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

XIII. Úrok z prodlení, Smluvní pokuta

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za provedení díla, a to za každý i započatý den prodlení.

- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.
- 13.5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
- 13.6. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinností uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.7. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 1000,- Kč za každý zjištěný případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit zhotoviteli krom objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP.
- 13.8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XIV. Odstoupení od smlouvy, výpověď

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo
 - b) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
 - c) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy, nebo
 - d) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v termínech dle této smlouvy (včetně časového harmonogramu uvedeného v této smlouvě).
- 14.2. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
 - a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
 - b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy.

- 14.3 Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na:
- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
 - plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 15.4. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy použil.
- 15.5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.
- 15.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Pojištění

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši minimálně 3 mil. Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění díla není přípustné.
- 16.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy předloží objednateli stavebně – montážní pojištění díla „PN Bohnice –Záložní zdroj elektrické energie“, s limitem pojištění min. ve výši cena za provedení díla včetně DPH.

- 16.3. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. a 16.2 této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XVII. Společná ustanovení

Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

- 17.1. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
- 17.2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 17.3. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 17.4. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného zákona.
- 17.5. Objednatel se řídí, v průběhu celé zakázky i po jejím ukončení ustanoveními Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak § 146, § 147 a § 147a o uveřejňování a způsobech uveřejňování veškerých informací, podkladů i dokumentů spojených s veřejnými zakázkami.
- 17.6. Dojde-li k porušení povinnosti uveřejnění stanovené objednateli podle zákona o veřejných zakázkách v důsledku nesplnění povinnosti zhotovitele podle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu vzniklou v této souvislosti v plné výši.
- 17.7. Smluvní strany prohlašují, vědomy si znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, že souhlasí s případným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zveřejnění tuto smlouvu na svém profilu zadavatele.
- 17.8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 17.9. Pohledávky vzniklé na základě této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, není možné postoupit třetí straně bez předchozího souhlasu dlužné strany.
- 17.10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že podle ust. § 140 odst. 1 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí právnícká nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a že za toto porušení bude uložena příslušná pokuta podle zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu dle § 141b odst. 1 písm. a) a c) citovaného zákona.

XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele k předání staveniště.
- 18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 18.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele včetně výkazu_výmeru a podrobně specifikované cenové nabídky
 - Příloha č. 2: Časový harmonogram prací
 - Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů
 - Příloha č. 4: Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám
- 19.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze, dne 24.10.2016.....

V Praze, dne 24.10.2016.....



Ing. Jáchym Dvořák
předseda představenstva

 **FIRSTPOWER**
Firstpower a.s.
Koněvova 141
130 00 Praha 3 -2-



MUDr. Martin Hollý, MBA
ředitel PNB

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91
181 02 Praha 8 – Bohnice ①

**Nabídka č. OZA-16-0007
pro veřejnou zakázku
„PN Bohnice – záložní zdroj elektrické
energie“**

Vlastní nabídka dodavatele - uchazeče

Předmětem této nabídky je kompletní předrealizační příprava a vlastní realizace vybudování záložního zdroje elektrické energie (dále jen ZZEE) s diesel motorgenerátorem (dále jen MG) včetně všech souvisejících činností, prací a dodávek tzv. „na klíč“ (zaměření, projekt, projednání, vyjádření a povolení dotčených orgánů a institucí, dodávka a instalace MG včetně souvisejícího technického vybavení a materiálů, veškeré související stavební, elektro a další práce, zprovoznění, zkoušky a revize, ohlášení, zaškolení obsluhy a další), s umístěním v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 – Bohnice.

Typ navrhovaného MG:	TJ721SC5A
Výrobce motoru:	Scania – Švédsko
Výrobce generátoru:	Marelli - Itálie
Provedení:	MG s automatickým elektrostartem
Elektrický výkon – standby (LTP):	721kVA/577kW
Napětí:	3x400V/230V
Frekvence:	50Hz
Princip motoru:	kapalinou chlazený, dieselový
Počet válců:	8 ve tvaru V
Počet otáček:	1500 ot./min.
Spotřeba nafty:	140 litrů / hodinu při 100% výkonu
Nádrž:	1400 litrů
Alternátor:	Marelli
Systém buzení:	AVR
Rozměry MG v krytu (šxdxv):	1650 x 5360 x 2250 mm
Hmotnost MG v krytu:	5260 kg

- automatika zabezpečuje start a připojení MG do 20 vteřin po přerušení dodávky elektrické energie ze sítě PRE, nebo při poklesu napětí o více než 20%,
- při obnoven. dodávky el. energie ze sítě systém realizuje zpětné fázování na síť a postupný převod výkonu z MG na síť, odpojení generátoru (stříhem jističů) a odstavení MG,
- systém umožní pro účely testování MG v zátěži paralelní provoz MG a sítě a zatěžování MG v rozsahu 0-100% výkonu ovládaného i dálkově. Přitom bude zajištěno, že do sítě nebude exportován žádný výkon (osazena zpětná wattová ochrana). Generátor bude od sítě spolehlivě odpojen v případě poruchy sítě (osazena síťová ochrana akceptovaná PRE – provozovatelem distribuční sítě).
- záložní zdroj bude připojen přes intranetovou síť zadavatele a dohledáván ze vzdáleného pracoviště. Součástí dodávky je vybavení dvou pracovišť výpočetní technikou (přenosnou) včetně softwaru. Systém zajistí informovanost obsluhy o stavu systému i prostřednictvím SMS zpráv zasílaných na zvolená telefonní čísla.
- dostupné informace o stavu MG na vzdáleném pracovišti zobrazené na displeji PC a taky na displeji MG.

Síť :

- fázové napětí
- frekvence sítě
- odebíraný výkon z transformátoru T1 a T2
- účinník

Generátor :

- fázové napětí

- frekvence generátoru
- proud jednotlivých fází
- dodávaný výkon
- účinník

Motor :

- otáčky
- teplota chladicí vody
- tlak oleje
- napětí akumulátorové baterie
- množství paliva
- diagnostika motoru

NN rozvaděč :

- polohy jističů
- režim a stav systému
- stav vypínaných vývodů (odepínání při přetížení MG)
- chybová hlášení

- Ovládání MG bude volitelné místní (z NN rozvodny anebo strojovny MG) anebo ze vzdáleného pracoviště.

- Motor Scania, generátor Marelli i řídicí jednotka DeepSea jsou vyrobeny v EU

Další parametry dohledového SW PowerControl

- začlenění dohledu náhradního zdroje v objektu (1x MG + ATS)
- začlenění dohledu příslušných prvků rozvaděčů (stykače ATS, stav jističe MG, stav jističe sítě napájení ATS, hlavní jističe rozvodny s možností rozšíření dohledu na další prvky rozvodny)
- zaznamenání všech výše uvedených hodnot s možností exportu do grafické podoby v nastavitelném režimu (5, 10 sek...)
- akustický alarm v případě překročení rozpětí nastavených hodnot
- poskytování monitoringu SNMP protokolem, komunikace a SW vybaven češtinou
- veškerá zaznamenaná data s možností exportu do grafu v nastavitelném cyklu
- realizace pomocí jednoho SW
- vícevrstvé zobrazení lokalita - místnost - zařízení
- logování předem navolených dat u všech monitorovacích zařízení
- příprava na reporting poruch - sms

Řízení dieselagregátu


- řady **DeepSea 8620** umožňuje vstřícné a zpětné fázování na síť, řízené odpojování a připojování zátěží. Bude provedeno s komunikačním prostředím – v **českém jazyce**. Monitorované stavy budou dále přenášeny do monitorovacího PC.

Obsah monitoringu: napětí sítě, frekvence a hodnota napětí MG, zatížení MG, napětí startovací baterie, tlak oleje, teplota motoru, stav paliva, zaznamenání všech výše uvedených hodnot s možností exportu do grafické podoby, reporting poruch – sms (**vše v českém jazyce**)




DeepSea 8620

Náhledy obrazovky monitorovacího SW PowerControl instalovaného na vzdáleném PC:

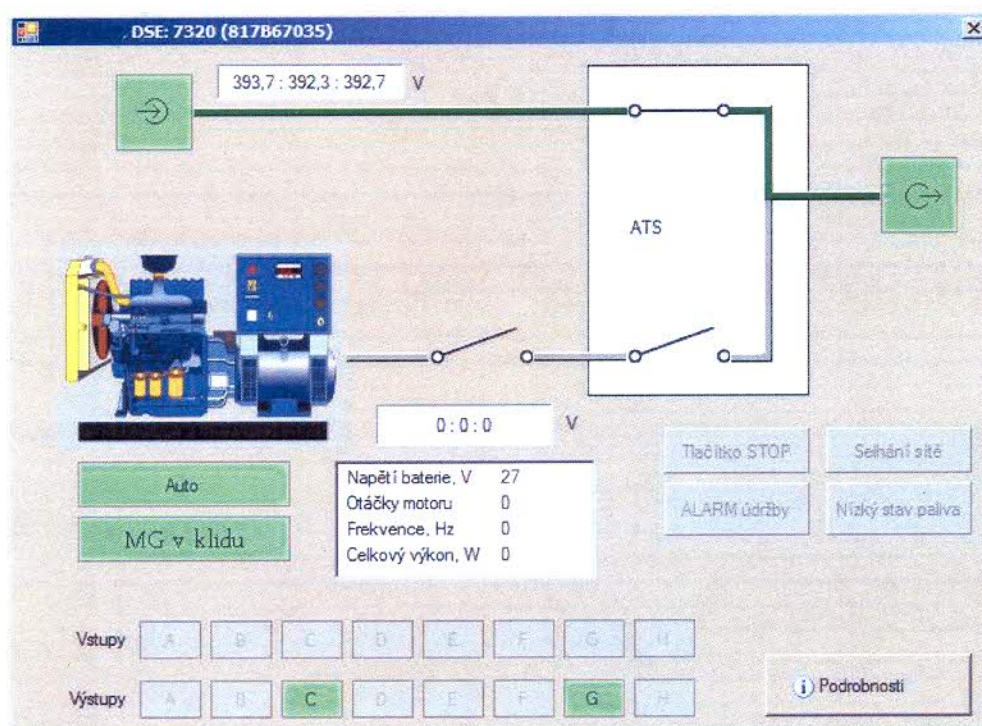


DA DSE: 7320 (615306520)




Identifikace	Stav	Souhrnné informace	Generátor	Sítě	Poruchy
Tlak oleje	0				
Teplota chladiva, °C	UnderRange				
Úroveň paliva	High				
Nabíjecí napětí	0				
Napětí baterie, V	13,2				
otáčky motoru	0				
Frekvence, Hz	0				
L1-N, Napětí, V	0				
L2-N, Napětí, V	0				
L3-N, Napětí, V	0				
L1-L2, Napětí, V	0				
L2-L3, Napětí, V	0				
L3-L1, Napětí, V	0				
L1, Proud, A	0				
L2, Proud, A	0				
L3, Proud, A	0				
Zemní proud, A	0				
L1, Činný výkon, Wt	0				
L2, Činný výkon, Wt	0				
L3, Činný výkon, Wt	0				
Celkový výkon, Wt	0				
Cur Lag-Lead	Unimplemented				
Sled fází	Indeterminate				

DA DSE: 7320 (615306520)




Identifikace	Stav	Souhrnné informace	Generátor	Sítě	Poruchy
Model	7320 (615306520)				
Výrobce	Deep Sea				
Module ID	615306520				
Module Emb SW	7.00				
Module App SW	6.01				
SlaveID	10				
Baud Rate	19200				
Úroveň přístupu	ControlPassword				

Zobrazení rozvodny a důležitých prvků – příklad zobrazení

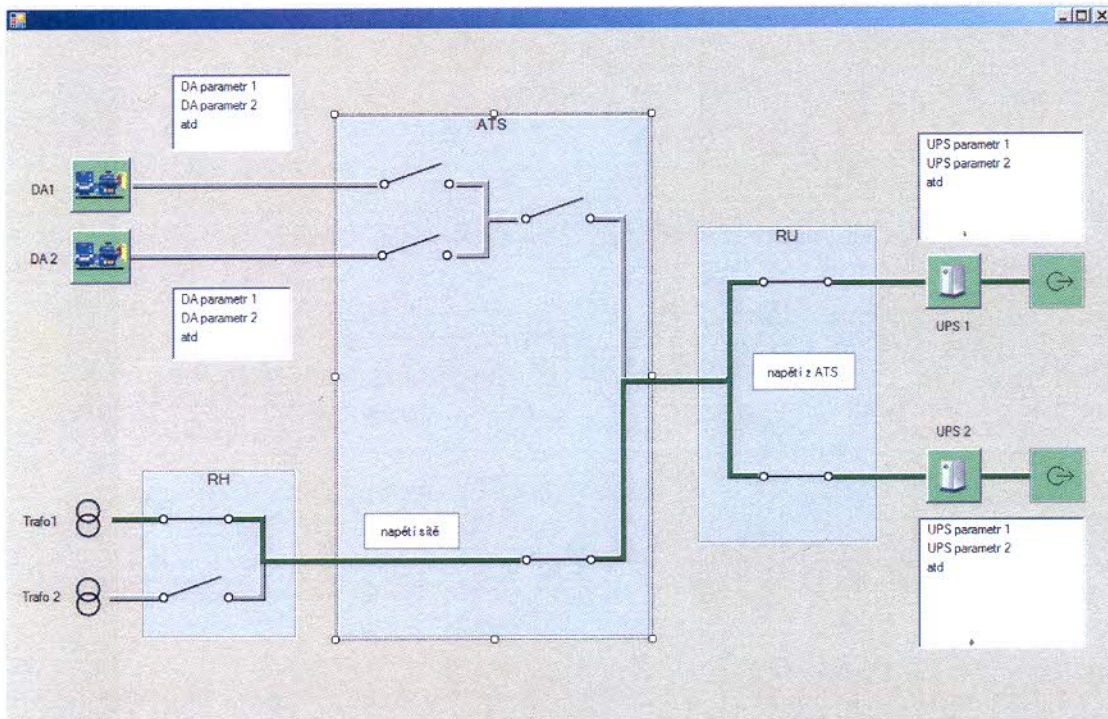

Nákres řešení – instalace MG u rozvodny NN:

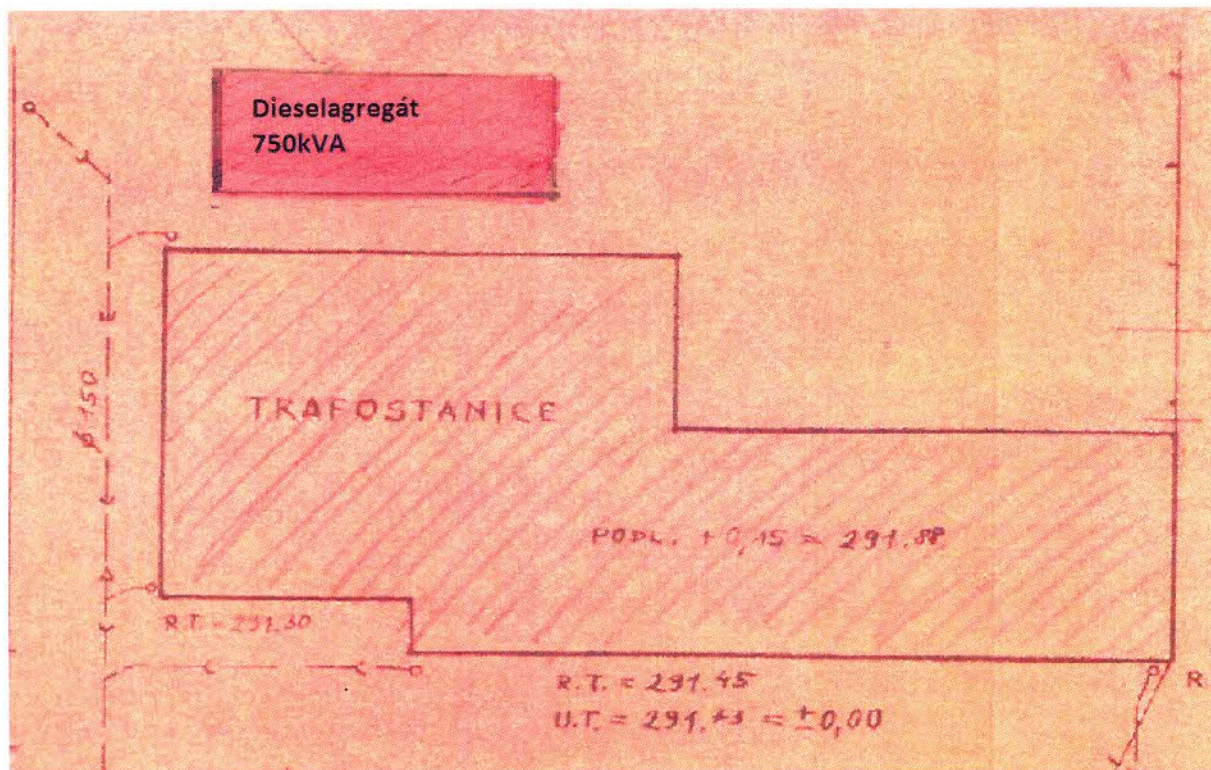

Platnost cenové nabídky: do 1. 12. 2016 včetně

Vypracoval:
Roman Horák, key account manager

Horák Roman

Schválil:
Václav Strnad, předseda představenstva


FIRSTPOWER
Firstpower a.s.
Koněvova 141
130 00 Praha 3

V Praze dne 05. 04. 2016

Výkaz výměr
k VZ s názvem „PN Bohnice – Záložní zdroj elektrické energie“

Položka	Měrná jednotka	počet	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Dieselagregát			1 972 500,00	2 386 725,00
DA (typ)	ks	1	1 520 000,00	1 839 200,00
Kontejner + vana	ks	1	298 600,00	361 306,00
Instalace DA	ks	1	64 000,00	77 440,00
Základ	kpl*	1	51 900,00	62 799,00
Jeřáb + doprava	kpl	1	38 000,00	45 980,00
Kabeláže			331 600,00	401 236,00
Výkopové práce	kpl	1	15 000,00	18 150,00
Prostupy, zednické práce	kpl	1	6 000,00	7 260,00
Kabeláž k NN rozvaděči				
Silové	kpl	1	281 000,00	340 010,00
Ovládací	kpl	1	29 600,00	35 816,00
Úprava rozvaděče NN			864 900,00	1 046 529,00
Náhrada přívodního vypínače T1 s el. pohonem	kpl	1	121 300,00	146 773,00
Náhrada přívodního vypínače T2 s el. pohonem	kpl	1	121 300,00	146 773,00
Dodávka a montáž ATS - vypínače generátoru 1600A a sítě 2000A	kpl	1	389 000,00	470 690,00
Dodávka a výměna deonů v poli č.3 a 7 za el. ovládat.	kpl	1	114 000,00	137 940,00
Související činnosti – úprava NN rozvaděče	kpl	1	98 000,00	118 580,00
Revize el.zařízení	kpl	1	21 300,00	25 773,00
Ostatní			225 000,00	272 250,00
Realizační dokumentace, skutečné provedení	kpl	1	65 000,00	78 650,00
Projekt pro stav. povolení	kpl	1	115 000,00	139 150,00
HW a SW pro dálkový monitoring	kpl	1	40 000,00	48 400,00
Nespecifikované náklady		1	5 000,00	6 050,00
Cena celkem			3 394 000,00	4 106 740,00

Vysvětlivky:

1. kpl* - komplet
2. Uchazeč vyplňuje pouze žlutě označené políčka.

FIRSTPOWER
Firstpower a.s.
 Koněvova 141
 130 00 Praha 3 - 2

V Praze dne 5.4.2016

.....
 Podpis, razítko uchazeče

Příloha č. 1 - Podrobně specifikovaná cenová nabídka

Položka	Měrná jednotka	počet	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Dieselagregát			1 972 500,00	2 386 725,00
DA (typ) TJ 721SC5A	ks	1	1 520 000,00	1 839 200,00
Kontejner	ks	1	280 600,00	339 526,00
Ekologická vana	Ks	1	18 000,00	21 780,00
Instalace DA	ks	1	64 000,00	77 440,00
Základ	kpl*	1	51 900,00	62 799,00
jeřáb - uložení DA	kpl	1	16 000,00	19 360,00
Doprava	kpl	1	22 000,00	26 620,00
Kabeláže			331 600,00	401 236,00
Výkopové práce	kpl	1	15 000,00	18 150,00
Prostupy, zednické práce	kpl	1	6 000,00	7 260,00
Kabeláž k NN rozvaděči				
Silové	kpl	1	281 000,00	340 010,00
Ovládací	kpl	1	29 600,00	35 816,00
Úprava rozvaděče NN			869 900,00	1 052 579,00
Náhrada přívodního vypínače T1 s el. pohonem	kpl	1	121 300,00	146 773,00
Náhrada přívodního vypínače T2 s el. pohonem	kpl	1	121 300,00	146 773,00
Dodávka a montáž ATS - vypínače generátoru 1600A a sítě 2000A	kpl	1	389 000,00	470 690,00
Dodávka a výměna deonů v poli č.3 a 7 za el. ovládat.	kpl	1	119 000,00	143 990,00
Související činnosti - úprava NN rozvaděče	kpl	1	98 000,00	118 580,00
Revize el.zařízení	kpl	1	21 300,00	25 773,00
Ostatní			220 000,00	266 200,00
Realizační dokumentace, skutečné provedení	kpl	1	65 000,00	78 650,00
Projekt pro stav. povolení	kpl	1	115 000,00	139 150,00
HW a SW pro dálkový monitoring	kpl	1	40 000,00	48 400,00
Cena celkem			3 394 000,00	4 106 740,00

Vysvětlivky:

I. kpl* - komplet

FIRSTPOWER

Firstpower a.s.

Koněvova 141

130 00 Praha 3

-2-

V Praze dne 1.9.2016

Podpis, razítko uchazeče

PN Bohnice - záložní zdroj

Tyden	Podpis SoD																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Podpis SoD zahájení prací	X						X															
Projektční práce	X																					
Zahájení stavebního řízení			X																			
Kabelová trasa				X																		
Kabeláže venkovní					X																	
Úprava rozvodny				X																		
Dodávka DA						X																
Připojení DA										X												
Oživení systému řízení										X												
Zahájení převíjemek technologie											X											
Předání díla												X										

Vypracoval: Horák Roman

Dne: 05.04.2016



Firstpower a.s. ■ Koněvova 2660/141 ■ 130 00 Praha 3 – Žižkov ■ Tel: +420 222 369 660 ■ Fax: +420 267 108 235
 Společnost je registrována u OR vedeného MS v Praze, spisová značka: B 14255 ■ IČO: 283 861 91 ■ DIČ: CZ28386191

www.firstpower.cz



Firstpower a.s.

Koněvova 141
130 00 Praha 3

-2-



SEZNAM SUBDODAVATELŮ

ATICO s.r.o.
Hlubočepská 16/12
152 00 Praha 5

IČ: 49712624

Část zakázky: výroba rozvaděče ATS, propojení DA – rozvodna

Finanční rozsah plnění: cca. 20% z objemu zakázky


Firstpower a.s.
Koněvova 141
130 00 Praha 3 -2-



V Praze dne 4.4.2016

.....
podpis

Firstpower a.s., Václav Strnad, předseda představenstva
Název uchazeče, jméno a příjmení oprávněného zástupce uchazeče, funkce, razítko



CERTIFIKÁT O POJISTNÉM KRYTÍ K POJISTNÉ SMLOUVĚ č. 200 08060 16

Pojistitel: AIG Europe Limited, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zapsaná v Rejstříku společností pod číslem 01486260, jednající prostřednictvím
AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 242 32 777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75864

se sídlem: Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, Česká republika

POTVRZUJE, že

Pojištěný: Firstpower a.s. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14255, IČ 283 86 191.

se sídlem: Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3

Je kryt pojištěním v následujícím rozsahu

1. Pojistná doba

Pojištění vznikne dnem	01/ 05/ 2016	a je sjednáno na pojistnou dobu, která skončí dnem	30/ 04/ 2017
------------------------	--------------	--	--------------

2. Rozsah a limity pojistného plnění

Celkový limit pojistného plnění pro POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU VČ. ÚJMY ZPŮSOBENÉ VADNÝM VÝROBKEM	
30 000 000 Kč	pro jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události v průběhu pojistné doby

Sublimity	
30 000 000 Kč	OBECNÁ ODPOVĚDNOST za věcné škody a újmu na zdraví vůči třetí osobě
30 000 000 Kč	ODPOVĚDNOST za újmu vůči třetí osobě způsobené VÝROBKEM
30 000 000 Kč	ODPOVĚDNOST ZA FINANČNÍ ŠKODY

Základní spoluúčast pro POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU VČ. ÚJMY ZPŮSOBENÉ VADNÝM VÝROBKEM	
80 000 Kč	základní spoluúčast z každé pojistné události

3. Územní rozsah pojištění

ČR + SR

Další podmínky pojištění, sublimity pojistného plnění a spoluúčasti jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

V Praze dne 2.5.2016

Podpis:

Jméno:
Funkce:


Ing. Jiří Kamarád



AIG Europe Limited,
organizační složka pro Českou republiku
IČ: 24232777
V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
