

SMLOUVA O DÍLO

st Praha 1
681/18, 115 68 Praha 1

DIČ: CZ00063410
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
Zastoupená:

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **INPROS PRAHA a.s.**
Se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
IČ: 47114444
DIČ: CZ47114444
Zastoupený: Ing. Tomášem Přitasilem, na základě plné moci ze dne 20.10.2014
Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20074
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen "zhotovitel")

Preambule

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Slovanský ostrov - rekonstrukce parteru etapa 4, 2B, 2C**“ realizovaného v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v užším řízení (dále jen „**veřejná zakázka**“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto:

Smlouvu o dílo:
(dále jen „**smlouva**“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.
2. Zhotovitel je povinen do 10 dní od podpisu této smlouvy prostudovat projektovou dokumentaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy a upozornit objednatele v případě, že tato projektová dokumentace obsahuje chyby. Zhotovitel nemá nárok na uhrazení zvýšených výdajů na realizaci díla v případě, že takové zvýšené výdaje budou mít příčinu v chybách projektové dokumentace, na které zhotovitel objednatele ve stanovené lhůtě neupozornil.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr (zpracovaná společností Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3, ze dne 13. 4. 2017), která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.
2. Dílo bude realizováno na území hlavního města Prahy, Slovanský ostrov, Praha 1 – Nové Město, parc..č. 2408, 2528, 2529 v k.ú. Nové Město.
3. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy.

III.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši **15.987.829,63** Kč bez DPH (slovy: **patnáctmilionůdevětsetosmdesátsedmtisícosmsetdvacetdevět 63/100** korun českých bez daně z přidané hodnoty).

DPH 21%

3.357.444,22 Kč

Cena celkem včetně DPH

19.345.273,85 Kč

(dále jen „cena díla“).

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „**položkový rozpočet**“).
3. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH v zákonné výši.
4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.
5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla a zhotovitel se zavazuje, že pokud nedojde ke změně rozsahu díla, nebude po objednateli požadovat žádné úhrady nad rámec ceny uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
6. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla snižuje.

7. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatel.

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur (dále jen „**faktura**“) a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury.
2. Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 kalendářních dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k nimž se dílí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu. Do doby než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, delším než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.

4. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
7. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře.
9. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.
10. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

V. Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatel stanoveném termínu; termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště.
3. Dílo bude dokončeno nejpozději do 6 kalendářních měsíců od předání staveniště.
4. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 dnů od předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „**časový harmonogram**“). Časový harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke schválení do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Časový harmonogram bude obsahovat zejména převzetí staveniště, důležité uzlové body, termín dokončení díla, přehled plateb objednatele zhotoviteli v jednotlivých fázích realizace díla, označení předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran.
2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
3. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.
4. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
5. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle odst. 1 se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit

podle předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlužují se termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést. V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, k čemuž je objednatel povinen poskytnout svou součinnost.

6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje především
 - na vlastní náklady zajistit zřízení staveniště včetně zařízení staveniště ve shodě s platnými předpisy,
 - zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady s těmito odběry spojené,
 - staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob,
 - provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné; zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány,
 - označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy,
 - neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele,
 - vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů od podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími zhotoviteli objednatele, kteří budou na staveništi pracovat na základě samostatné smlouvy s objednatelem, či jim poskytne součinnost; koordinace prací bude řešena na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až do doby předání díla bezplatně.
5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště,

cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).

6. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
7. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
8. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělků, odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDO), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy.
3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
5. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.
2. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou podílet tyto osoby (realizační tým):

- (i) Manažer projektu ([REDACTED])
- (ii) Zástupce stavbyved [REDACTED]
- (iii) Odborný pracovník [REDACTED]

jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku.

3. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 4 smlouvy, a to v uvedeném rozsahu.

Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany poddodavatele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
7. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případně dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
9. Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
11. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

12. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.
14. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici měřící přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.
15. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním potřebných technicko-měřičských prací včetně údržby potřebných zařízení v souvislosti se stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby.
16. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to relevantní, bude zajišťovat vytyčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správci sítí.
17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
18. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, není-li v příloze této smlouvy uvedeno jinak.
19. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění díla. V případě pozastavení prací bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. V. odst. 6 této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou v důsledku pozastavení prací.
20. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení. Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady

řídít.

21. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.
22. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objednatele ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.

IX.

Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
3. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných stavebních prací.
4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály proti napadení škůdci.
5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení o veřejnou zakázku.
6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez ohrožení plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a hmot odpovídá zhotovitel.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky

kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách předepsanými projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam zařízení, které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu), stavební/montážní deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady o likvidaci odpadů, provozní dokumentaci, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, projektovou dokumentaci skutečného provedení.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.
4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.
7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přijímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.
9. Zhotovitel provede pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději 2 týdny ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky.
10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně

spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelém požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.

11. Dílo se považuje za předané, resp. dokončené oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

XI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce 60 měsíců a pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list v délce stanovené výrobcem, nejméně však v délce 36 měsíců (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků. Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání.
3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady.
5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,
 - (i) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů, od oznámení reklamace vady objednatelem,
 - (ii) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,
 - (iii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění objednatelem,nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.
7. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
8. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

9. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
10. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.

XII.

Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XIII.

Pojištění, certifikace a bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu, resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědností za škodu způsobenou objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši 15.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla.
2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 6 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě 7 pracovních dní od uzavření této smlouvy.
5. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí dle čl. X této smlouvy v případě, že dílo při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, že-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, bude bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla.
6. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „**bankovní záruka**“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X této smlouvy.

7. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby.
8. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit nejméně 5 % z ceny díla včetně DPH („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období její platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do deseti dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. Výše zajištění bude vždy počítána z ceny díla v době uzavření smlouvy; pozdější změny výše ceny díla nejsou pro výpočet výše zajištění relevantní.
9. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.
10. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
11. Zhotovitel, po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
12. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní částky na účet objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho žádost (dále jen „jistota“). Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedené bankovní záruky platí v takovém případě obdobně. Zhotovitel po ukončení období poskytnutí jistoty vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. uvedení č. ú., na který má být jistota zhotoviteli vrácena. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.
13. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty jsou zahrnuty v ceně díla.

XIV.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, resp. vyklizením staveniště dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky

včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

5. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, vyjma porušení povinnosti doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění. V případě prodlení s doplněním bankovní záruky, resp. jistoty do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1 této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu objednatele užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původního poddodavatele, resp. osoby, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak.
7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.
8. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.
9. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
10. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění smluvní stranou.
11. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.

XV.

Technický dozor objednatele (TDO)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele.
2. TDO je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
3. TDO je oprávněn nařídít zhotoviteli přerušit práci zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé

náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDO není oprávněn měnit tuto smlouvu.
6. TDO nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XVI.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:
 - a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání staveniště, nebo prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu označen jako uzlový bod) nebo dokončením díla podle této smlouvy delším než 15 kalendářních dnů, nebo
 - c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
 - d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, nebo
 - e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodětku díla podle této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo
 - f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo
 - g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo
 - h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo
 - i) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo
 - j) v případě, kdy objednatel neobdrží dotaci určenou k financování díla, nebo mu bude tato dotace odebrána a zároveň v případech, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebo jiný kompetentní kontrolní orgán rozhodne, že zadávací řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno v rozporu s platnými právními předpisy,
 - k) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo

- l) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z důvodu prodlení objednatele s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
 4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.
 5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
 6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
 7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.
 8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.
 9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelům již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
 10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
 11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

Další ujednání

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.
2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně.
3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávněný zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.
4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen odpovědný stavbyvedoucí.
6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XVI. této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany objednatele.
9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.
10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XVIII.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů.
3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.
5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránící povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná

strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo která vznikla z jejích hospodářských poměrů.
7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně.
9. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 7 a 8 tohoto článku, nemůže se ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv provede objednatel.
6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
7. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.
8. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u

příslušného obecného soudu v ČR.

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace s výkazem výměr (zpracovaná společností Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3, ze dne 13. 4. 2017) - doloženo samostatně mimo tuto smlouvu o dílo

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)


Příloha č. 3 - Časový harmonogram provádění díla s finančním plněním

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - Plná moc ze dne 20. 10. 2014


10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 09.04.2018 usnesením č. UR18_0395.

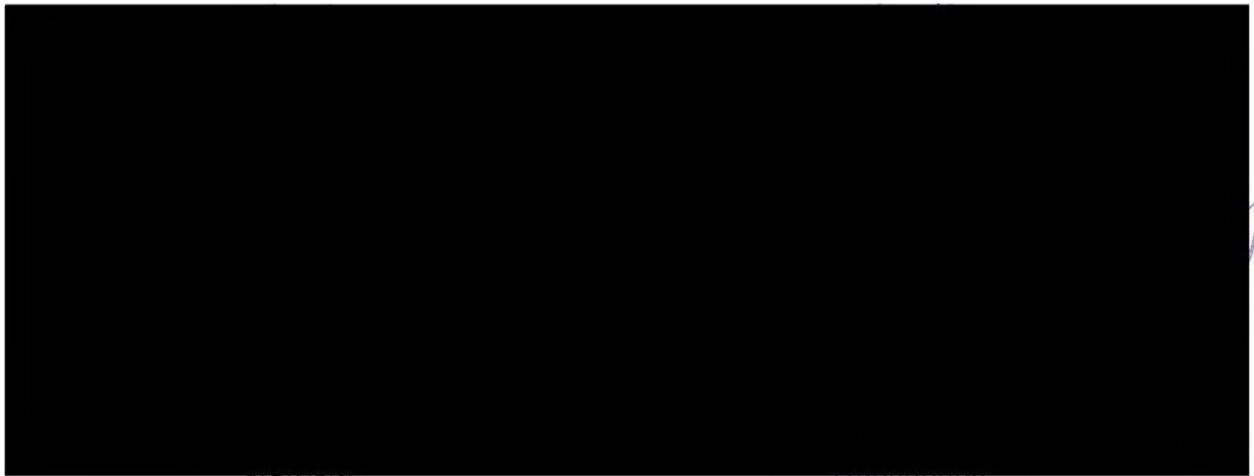

Starosta

zastupitelka



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 329
Stavba: Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

KSO:
Místo: Slovanský ostrov

CC-CZ:
Datum: 27. 4. 2017

Zadavatel:
Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

IČ: 26511886
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

IČ: 26511886
DIČ:

Poznámka:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností ÚRS Praha, a.s., pro rok 2017 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy ÚRS Praha, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.urspraha.cz

Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového a barevného řešení, včetně způsobu provádění

Nabídková cena zahrnuje též podmínky daného staveniště, včetně vlivu požadovaných termínů realizace a smluvních podmínek

Zhotovitel prověří soulad výkazu výměr s projektovou dokumentací a na případné nesrovnalosti upozorní před podpisem smlouvy o dílo, resp. před zahájením stavby

Cena bez DPH

829,63

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	15 987 829,63
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně
37 444,22
0,00

Cena s DPH

v

CZK

23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 329

Stavba: Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Místo: Slovanský ostrov

Datum: 27. 4. 2017

Zadavatel: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Projektant: Tichý & Kolářová s.r.o., Holč

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 987 829,63	19 345 273,85	
329a	VRN	1 022 000,00	1 236 620,00	VON
329b	SO 01 - Komunikace	7 648 175,08	9 254 291,85	STA
329c	SO 02 - Závlaha	364 957,00	441 597,97	STA
329d	SO 03 - Sadové úpravy	4 014 291,78	4 857 293,05	STA
329e	Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy	2 938 405,77	3 555 470,98	STA
01	Opěrná stěna - část a	417 168,77	504 774,21	Soupis
02	Opěrná stěna - část b	540 050,20	653 460,74	Soupis
03	Opěrná stěna - část c	477 400,00	577 654,00	Soupis
04	Slovanka	894 456,80	1 082 292,73	Soupis
05	U Kotvy	86 500,00	104 665,00	Soupis
06	S.P.L.A.V.	135 300,00	163 713,00	Soupis
07	Na řece	81 530,00	98 651,30	Soupis
08	Informační systém	306 000,00	370 260,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329a - VRN

KSO:

Místo:

Slovanský ostrov

Zadavatel:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Uchazeč:

Projektant:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2017

IČ:

26511886

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

26511886

DIČ:

Poznámka:

Celková cena díla musí
požadováno zadavatelem
územním rozhodnutím
veškerých zařízení a
realizaci předmětu díla
uvedeno jinak, cenou
kotevních materiálů,
jména konkrétních vý
zařízení musí být s uv

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329a - VRN

Místo:

Slovanský ostrov

Datum: 27. 4. 2017

Zadavatel:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Projektant: Tichý & Kolářová

Uchazeč:

s.r.o., Hollarovo nám.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 022 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 022 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

80 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

322 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

60 000,00

VRN5 - Finanční náklady

15 000,00

VRN6 - Územní vlivy

260 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

285 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt: 329a - VRN

Místo: Slovanský ostrov

Datum: 27. 4. 2017

Zadavatel: Tichý & Kolařová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Projektant: Tichý & Kolařová s.r.o., Hollarovo nám.

Uchazeč:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenná lávka
Náklady soupisu celkem							
D		VRN	V				
D		VRN1	Pr				
1	K	012002000	Ge				
2	K	013002000	Pr				
D		VRN3	Za				
3	K	032002000	Vy				
4	K	032903000	Ka				
5	K	033002000	Pr				
6	K	034002000	Za				
7	K	039002000	Zr				
D		VRN4	In				
8	K	041002000	Do				
9	K	045002000	Ko				
D		VRN5	Ft				
10	K	051002000	Pe				
11	K	059002000	Os				
D		VRN6	Ú				
12	K	062002000	Zu				
D		VRN7	Pr				
13	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00 CS ÚRS 2016 01
14	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	1,000	260 000,00	260 000,00 CS ÚRS 2016 01
						285 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329b - SO 01 - Komunikace

KSO:

Místo: Slovanský ostrov

Zadavatel:

Tichý & Kotářová s.r.o., Holčarovo nám. 2, Praha 3

Uchazeč:

Projektant:

Tichý & Kotářová s.r.o., Holčarovo nám. 2, Praha 3

Poznámka:

Celková cena díla musí obsahovat veškeré náklady nutné k provedení a předání funkčního díla tak, jak je požadováno zadavatelem v zadávacích podmínkách výběrového řízení, a musí splňovat podmínky vymezené územním rozhodnutím a stavebním povolením. Při zpracování nabídky musí nabízející předpokládat použití veškerých zařízení a materiálů, které bude považovat za účelné nebo nezbytné, tak aby zajistil dokonalou realizaci předmětu díla vyplývající z jeho účelu a požadované funkce při zajištění potřeb. Pokud není výslovně uvedeno jinak, cenou se rozumí cena za dodávku a montáž včetně všech nezbytných pomocných, montážních a kotevnicích materiálů, stejně jako veškerých funkčních souvisejících prvků. Pokud jsou v této dokumentaci uvedena jména konkrétních výrobců či výrobků, znamená to specifikaci požadovaného technického standardu. Nabízené zařízení musí být s uvedeným standardem minimálně srovnatelné

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2017

IČ:

26511886

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

26511886

DIČ:

Cena bez DPH

7 648 175,08

DPH základní
snižená

Základ daně

7 648 175,08

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 606 116,77

0,00

Cena s DPH

v CZK

9 254 291,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329b - SO 01 - Komunikace

Místo:

Slovanský ostrov

Datum: 27. 4. 2017

Zadavatel:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Projektant: Tichý & Kolářová

Uchazeč:

s.r.o., Hollarovo nám.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 648 175,08

HSV - Práce a dodávky HSV

7 648 175,08

1 - Zemní práce

513 438,17

2 - Zakládání

145 222,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

751 409,10

5 - Komunikace pozemní

4 480 758,43

8 - Trubní vedení

120 990,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

520 809,00

96 - Bourání konstrukcí

478 914,80

997 - Přesun sutě

427 986,80

998 - Přesun hmot

208 646,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329b - SO 01 - Komunikace

Místo:

Slovanský ostrov

Datum: 27. 4. 2017

Zadavatel:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Projektant: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 648 175,08	
D HSV Práce a dodávky HSV							7 648 175,08	
D 1 Zemní práce							513 438,17	
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů "IV/2" 25,0	m	25,000	150,00	3 750,00	CS ÚRS 2016 01
	VV						25,000	
2	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů "IV/2" 25,0+8,0+6,0+6,0	m	45,000	185,00	8 325,00	CS ÚRS 2016 01
	VV						45,000	
3	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů "IV/2" 18,0+10,0	m	28,000	210,00	5 880,00	CS ÚRS 2016 01
	VV						28,000	
4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m "IV/1, pruh š. 1,5 m kolem obrubníků" 252*1,5*0,15 "IV/2, pruh š. 1,5 m kolem obrubníků" 322,7*1,5*0,15	m3	129,308	30,00	3 879,24	CS ÚRS 2016 01
	VV						56,700	
	VV						72,608	
5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 "IV/1, pro pojízdný chodník" 395,0 (565*0,35) "IV/2, pro chodník" (115,2+490,6)*0,25 "IV/2, pro parking" 96,5*0,25 "IV/2, pro drenáž" 123,0*0,17 "IV/2, kolem obrubníků" 322,7*0,15	m3	442,140	125,00	55 267,50	CS ÚRS 2016 01
	VV						197,250	
	VV						151,450	
	VV						24,125	
	VV						20,910	
	VV						48,405	
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	442,140	29,00	12 822,06	CS ÚRS 2016 01
7	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "jamy pro osazení plotů" 187*0,08	m3	14,960	636,00	9 514,56	CS ÚRS 2016 01
	VV						14,960	
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypáníny z horniny tř. 1 až 4 "IV/1" 197,25*37,8 "IV/2" 244,89*48,405	m3	355,935	245,00	87 204,08	CS ÚRS 2016 01
	VV						159,450	
	VV						196,485	
9	K	171201201	Uložení sypáníny na skládky "IV/1" 159,45 "IV/2" 196,485	m3	355,935	15,00	5 339,03	CS ÚRS 2016 01
	VV						159,450	
	VV						196,485	
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypáníny na skládce (skládkovné) "IV/1" 159,45 159,45*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"	t	287,010	190,00	54 531,90	CS ÚRS 2016 01
	VV						159,450	
	VV						287,010	
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypánínou se zhuťněním "IV/1, dosypání kolem obrubníků" 252*0,15 "IV/2, dosypání kolem obrubníků" 322,7*0,15	m3	86,205	80,00	6 896,40	CS ÚRS 2016 01
	VV						37,800	
	VV						48,405	
12	K	181301112	Rozprostření ornice tl. vstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "IV/1, pruh š. 1,5 m kolem obrubníků" 252*1,5 "IV/2, pruh š. 1,5 m kolem obrubníků" 322,7*1,5	m2	862,050	12,00	10 344,60	CS ÚRS 2016 01
	VV						378,000	
	VV						484,050	
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním "IV/1, na požadovanou hodnotu Edef 2 = 45MPa" 629,0 "IV/2, na požadovanou hodnotu Edef 2 = 45MPa" 788,7 "IV/1, 2 - pod obrubníky" 574,7*0,4	m2	1 647,580	10,00	16 475,80	CS ÚRS 2016 01
	VV						629,000	
	VV						788,700	
	VV						229,880	
14	K	1-R01	Výměna podloží v tl. 30 cm - odkopávka, naložení a odvoz zeminy na skládku včetně poplatku za skládku (skládkovného), dovoz, složení a rozprostření vhodného náhradního materiálu vč. nákladů na jeho získání a zhuťnění - BUDE UPŘESNĚNO PODLE SKUTEČNOSTI "IV/1, bude provedeno v případě nutnosti" 220,0 "IV/2, bude provedeno v případě nutnosti" 230,0	m3	450,000	325,00	146 250,00	
	VV						220,000	
	VV						230,000	
15	K	1-R02	Doplnění zeminy v mocnosti 20 cm po provedení zhuťnění stávající zeminy, dle geofyzikálního průzkumu - BUDE UPŘESNĚNO PODLE SKUTEČNOSTI Sanace hlubších oslabených zón (dutiny) - výplňová, popř. nízkotlaká injektáž	m3	283,500	148,00	41 958,00	
16	K	1-R03	(spotřeba 1 m3 na injekt. vrt při jejich rozteči 2 x 2m), dle doporučení geofyzikálním průzkumu - BUDE UPŘESNĚNO PODLE SKUTEČNOSTI	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	
D 2 Zakládání							145 222,09	
17	K	211571121	Výplň odvodňovacích žebor nebo tratí vodů kamenivem drobným těžným "IV/1, silniční drenáž, obsyp nad 0,15 m3/m" 138,0*0,05 "IV/2, silniční drenáž, obsyp nad 0,15 m3/m" 123,0*0,05	m3	13,050	320,00	4 176,00	CS ÚRS 2016 01
	VV						6,900	
	VV						6,150	
18	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezy sklonu přes 1:2 š do 2,5 m "IV/1, silniční drenáž" 138,0*2,15 "IV/2, silniční drenáž" 123,0*2,15	m2	561,150	52,00	29 179,80	CS ÚRS 2016 01
	VV						296,700	
	VV						264,450	
19	M	693111460	textilie např. GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m 561,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	617,265	27,00	16 666,16	CS ÚRS 2016 01
	VV						617,265	
20	K	212752213	Tratvod z dřevěných trubek plastových flexibilních Ø do 160 mm včetně lože otevřený výkop "IV/1, silniční drenáž" 138,0 "IV/2, silniční drenáž" 123,0	m	261,000	110,00	28 710,00	CS ÚRS 2016 01
	VV						138,000	
	VV						123,000	
21	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m "IV/1, v případě výměny zeminy v podloží" 629,0 "IV/2, v případě výměny zeminy v podloží" 788,7	m2	1 417,700	17,00	24 100,90	CS ÚRS 2016 01
	VV						629,000	
	VV						788,700	
22	M	693-R01	separační geotextilie s min. pevností 50 kN/m2 v podélném i příčném směru 1417,7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	1 630,355	26,00	42 389,23	
	VV						1 630,355	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							751 409,10	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	187,200	458,00	85 737,60	CS ÚRS 2016 01
	vv		ozdobný plot v.45cm 90,5		90,500			
	vv		ozdobný plot v.60cm 96,7		96,700			
24	M	553mat01	parkový plot ozdobný v.60cm	m	89,900	4 785,00	430 171,50	
25	M	553mat02	parkový plot ozdobný v.45cm	m	50,000	4 710,00	235 500,00	
	D	5	Komunikace pozemní				4 480 758,43	
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 513,680	126,00	190 723,68	CS ÚRS 2016 01
	vv		IV/1 575,0		575,000			
	vv		IV/2 708,8		708,800			
	vv		IV/1, 2 - pod obrubníky 574,7*0,4		229,880			
27	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1 168,600	298,00	348 242,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		IV/1, 2 1168,6		1 168,600			
28	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1 168,600	468,00	546 904,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		IV/1 575		575,000			
	vv		IV/2 593,6		593,600			
29	M	583801100a	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm, řezaná žlutá	t	312,669	7 500,00	2 345 017,50	
	vv		IV/1 865/5,2		166,346			
	vv		IV/2 729/5,2		140,192			
	vv		306,538*1,02 Přepočtené koeficientem množství		312,669			
30	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	115,200	631,00	72 691,20	CS ÚRS 2016 01
	vv		IV/2 115,2		115,200			
31	M	583801100a	mozaika dlažební, žula 6/6 cm žlutá, řezaná	t	13,824	9 200,00	127 180,80	
	vv		IV/2 115,2/8,5		13,553			
	vv		13,553*1,02 Přepočtené koeficientem množství		13,824			
32	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	424,200	125,00	53 025,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		IV/1 145,0		145,000			
	vv		IV/2 279,2		279,200			
33	M	583801100a	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm, řezaná žlutá	t	9,152	7 500,00	68 640,00	
	vv		IV/1 (145*0,11)/5,2		3,067			
	vv		IV/2 (279,2*0,11)/5,2		5,906			
	vv		8,973*1,02 Přepočtené koeficientem množství		9,152			
34	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	505,400	135,00	68 229,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		IV/1 145,0		145,000			
	vv		IV/2 279,2+81,2		360,400			
35	M	583801100a	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm, řezaná žlutá	t	10,905	7 500,00	81 787,50	
	vv		IV/1 (145*0,11)/5,2		3,067			
	vv		IV/2 (360,4*0,11)/5,2		7,624			
	vv		10,691*1,02 Přepočtené koeficientem množství		10,905			
36	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	574,700	230,00	132 181,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		IV/1 252,0		252,000			
	vv		IV/2 322,7		322,700			
37	M	583802140	krajník silniční kamenný, žula, KS3 13x20 x 30-80	m	586,194	650,00	381 026,10	CS ÚRS 2016 01
	vv		IV/1 252,0		252,000			
	vv		IV/2 322,7		322,700			
	vv		574,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		586,194			
38	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,870	2 815,00	41 859,05	CS ÚRS 2016 01
	vv		IV/1, krajníky 252*0,15*0,05		1,890			
	vv		IV/1, obruby 145*0,45*0,05		3,263			
	vv		IV/2, krajníky 322,7*0,15*0,05		2,420			
	vv		IV/2, obruby 81,2*0,25*0,05+279,2*0,45*0,05		7,297			
39	K	5-R01	Stávající plocha z kamenných kostek - rozebrání, srovnání a doplnění podkladu včetně zhutnění, zpětná montáž rozebranych kostek, včetně přesunu materiálů, nového kladečního lože a přesypu dlažby drti D/4	m2	37,500	620,00	23 250,00	
	vv		IV/2 37,5		37,500			
	D	8	Trubní vedení				120 990,00	
40	K	8-R01	Vybourání stávajících uličních vpustí včetně mříží, zhutněný zásep šachet zemínou, odvoz a uložení vybouraných hmot na skládce včetně poplatku za skládku (skládkového)	kus	3,000	6 000,00	18 000,00	
41	K	8-R02	Dopojení stávajícího kanalizačního potrubí po vybourání uličních vpustí	kpl	3,000	8 760,00	26 280,00	
42	K	8-R03	Zřízení nových uličních vpustí z prefa betonových dílů a litinového rámu s mříží, včetně dodávký dílců	kpl	3,000	18 450,00	55 350,00	
43	K	8-R04	Napojení nových uličních vpustí na stávající potrubní vedení potrubím DN 150 mm	kpl	3,000	7 120,00	21 360,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				520 809,00	
44	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	20,000	975,00	19 500,00	CS ÚRS 2016 01
45	M	749mat01	koš odpadkový ARTUR (litina, ocel), výška 100 cm, průměr 30 cm, obsah 40 l	kus	20,000	7 535,00	150 700,00	CS ÚRS 2016 01
46	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	1,000	1 344,00	1 344,00	CS ÚRS 2016 01
47	M	749mat03	lavička s opěradlem (kotvená) konstrukce - litina, sedák - dřevo včetně kotveního materiálů	kus	1,000	7 320,00	7 320,00	
48	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	20,000	290,00	5 800,00	CS ÚRS 2016 01
49	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	157,000	160,00	25 120,00	CS ÚRS 2016 01
50	K	9-R01	Vytčení průběhu stávajících inženýrských sítí na staveništi	KČ	1,000	45 000,00	45 000,00	
51	K	9-R02	Chráničky inženýrských sítí - prodloužení stávajících (dle typu stávajících - PVC, ocelové, příp. beton, žitaby) - BUDE UPŘESNĚNO PODLE SKUTEČNOSTI	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00	
52	K	9-R03	Demontáž stávajícího litinového zahrazovacího sloupku, pro další použití, včetně vybourání základu	kus	4,000	290,00	1 160,00	
53	K	9-R04	Montáž litinového zahrazovacího sloupku, s použitím stávajícího, včetně betonového základu	kus	3,000	975,00	2 925,00	
54	K	9-R05	Úvedení ploch dotčených výstavbou do původního stavu	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00	
55	K	9-R06	Vybourání a opětovná montáž uliční lampy včetně kabelového napojení	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
56	K	9-R07	Výškově upravení pozice lampy veřejného osvětlení	kus	4,000	8 720,00	34 880,00	
57	K	9-R08	Výškově upravení poklopů	kus	9,000	1 840,00	16 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	9-R09	Celková repase laviček, nový nátěr včetně přípravy a výměny vadných částí	kus	30,000	4 950,00	148 500,00	
59	K	9-R10	Celková repase stojanu na pítiky pro psy, nový nátěr včetně přípravy a osazení stoupu	kus	4,000	4 000,00	16 000,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				478 914,80	
60	K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva tóněného tl 100 mm	m2	1 270,500	96,00	121 968,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		IV/1 565,0		565,000			
	vv		IV/2 705,5		705,500			
61	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	1 270,500	97,00	123 238,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		IV/1 565,0		565,000			
	vv		IV/2 705,5		705,500			
62	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 žvičných tl 150 mm	m2	1 270,500	155,00	196 927,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		IV/1 565,0		565,000			
	vv		IV/2 705,5		705,500			
63	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	574,700	64,60	36 780,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		IV/1 252,0		252,000			
	vv		IV/2 322,7		322,700			
	D	997	Přesun sutě					
64	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km					
65	K	997221559	Příplatek 2KD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů					
	vv		899,791*9 Přepočtené koeficientem množství					
66	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládka)					
67	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce					
68	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládka)					
	D	998	Přesun hmot					
69	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329c - SO 02 - Závlaha

KSO:

Místo: Slovanský ostrov

Zadavatel:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Uchazeč:

Projektant:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2017

IČ:

26511886

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

26511886

DIČ:

Poznámka:

Celková cena díla musí obsahovat veškeré náklady nutné k provedení a předání funkčního díla tak, jak je požadováno zadavatelem v zadávacích podmínkách výběrového řízení, a musí splňovat podmínky vymezené územním rozhodnutím a stavebním povolením. Při zpracování nabídky musí nabízející předpokládat použití veškerých zařízení a materiálů, které bude považovat za účelné nebo nezbytné, tak aby zajistil dokonalou realizaci předmětu díla vyplývající z jeho účelu a požadované funkce při zajištění potřeb. Pokud není výslovně uvedeno jinak, cenou se rozumí cena za dodávku a montáž včetně všech nezbytných pomocných, montážních a kotevnicích materiálů, stejně jako veškerých funkčních souvisejících prvků. Pokud jsou v této dokumentaci uvedena jména konkrétních výrobců či výrobků, znamená to specifikací požadovaného technického standardu. Nabízené zařízení musí být s uvedeným standardem minimálně srovnatelné

Cena bez DPH

364 957,00

DPH základní
snížená

Základ daně

364 957,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

76 640,97

0,00

Cena s DPH

v CZK

441 597,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stav

Objekt


Míst

Zadá

Uchaze

Kód

Název

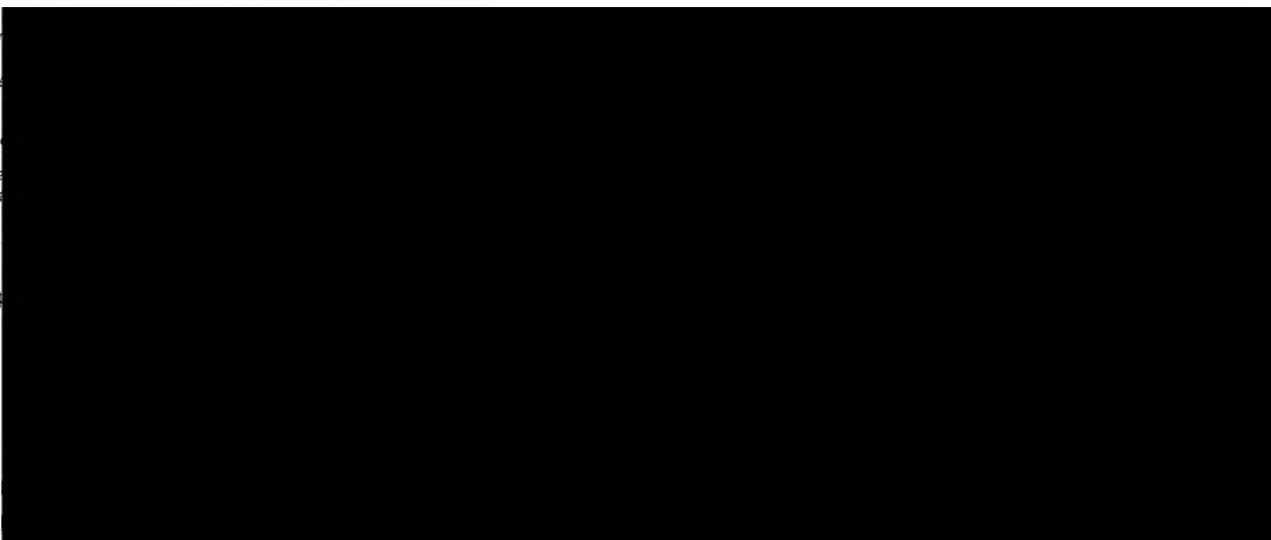

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329c - SO 02 - Závlaha

Místo:

Slovanský ostrov

Datum: 27. 4. 2017

Zadavatel:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám, 2, Praha 3

Projektant: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								364 957,00

D D1 OVLÁDACÍ SYSTÉM, OVLÁDACÍ KABELY: 71 592,00

1	K	Pol1	TBOS II vysílací modul (infračervený a radiový) TBOS II FT EU	ks	1,000	15 564,00	15 564,00	
2	K	Pol2	TBOS II ovládací modul 1 sekce TBOS II CM 1	ks	2,000	5 454,00	10 908,00	
3	K	Pol3	TBOS II ovládací modul 4 sekce TBOS II CM 4	ks	2,000	9 282,00	18 564,00	
4	K	Pol4	TBOS II Radio modul pro TBOS CM a TBOS II CM TBOS II RA EU (RADIO)	ks	4,000	6 174,00	24 696,00	
5	K	Pol5	čidlo srážek Rain Sensor RSD-Bex	ks	1,000	1 428,00	1 428,00	
6	K	Pol6	9V alkalická baterie Varta Industrial ALKBATTERY 9V	ks	8,000	54,00	432,00	

D D2 OVLÁDACÍ VENTILY, ŠACHTICE 44 050,00

7	K	Pol7	elmag. ventil 1", 9V solenoid 100-PGA-9V	ks	7,000	2 328,00	16 296,00	
8	K	Pol8	elmag. ventil 6/4", 9V solenoid 150-PGA-9V	ks	7,000	2 808,00	19 656,00	
9	K	Pol9	PVC T-kus MTT-100	ks	5,000	116,00	580,00	
10	K	Pol10	vodotěsné konektory RAIN BIRD, max. 3x4,0 mm ² DBRY-6	ks	12,000	78,00	936,00	
11	K	Pol11	R-QCV rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz R-QCV 3/4"	ks	2,000	786,00	1 572,00	
12	K	Pol12	klíč pro R-QCV 3/4", mosaz R-QCV 3/4 KEY	ks	1,000	396,00	396,00	
13	K	Pol13	otočná koncovka hadice pro klíč R-QCV 3/4", mosaz R-QCV 3/4" ELL	ks	1,000	426,00	426,00	
14	K	Pol14	ventilová šachtice kulatá VB-10RND-H	ks	2,000	696,00	1 392,00	
15	K	Pol15	ventilová šachtice, 50,5 x 37 x 30,5 cm VB-STD-H	ks	2,000	1 398,00	2 796,00	

D D3 POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 32 801,00

16	K	Pol16	vys. postř. s převod.mech výšeč. s tryskou 3.0 5004-PC/SAM 3.0	ks	24,000	530,00	12 720,00	
17	K	Pol17	sada MPR trysek s dostřikem 7,62m MPR Nozz 25'	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
18	K	Pol18	sada MPR trysek s dostřikem 9,14m MPR Nozz 30'	ks	5,000	1 600,00	8 000,00	
19	K	Pol19	sada MPR trysek s dostřikem 10,67m MPR Nozz 35'	ks	5,000	1 680,00	8 400,00	
20	K	Pol20	šroubovák 5000 šroubovák 5000	ks	1,000	115,00	115,00	
21	K	Pol21	hadicová spojka, 3/4" SBE-075	ks	50,000	19,00	950,00	
22	K	Pol22	SPX Flex Tubing 30m role SPX FLEX30	ks	1,000	1 116,00	1 116,00	

D D4 MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 63 038,00

23	K	Pol23	regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m ³ /hod) PSI M50	ks	3,000	612,00	1 836,00	
24	K	Pol24	kapk. potrubí 16mm, 2.2l/h, 33cm, s komp. tlaku, 100m role RAIN BIRD DRIP LINE 16-2L-33	m	1 900,000	24,00	45 600,00	
25	K	Pol25	Nástrčná spojka (17mm) pro XF Dripline a SDI XFF-COUP	ks	40,000	12,00	480,00	
26	K	Pol26	Kolínko (17mm) pro XF Dripline a SDI XFF ELBOW	ks	40,000	18,00	720,00	
27	K	Pol27	T-kus (17mm) pro XF Dripline a SDI XFF TEE	ks	80,000	22,00	1 760,00	
28	K	Pol28	Tvarovka 17mm x 3/4" AG pro XF Dripline a SDI XFF-MA-075	ks	10,000	22,00	220,00	
29	K	Pol29	RAIN BIRD koncovka pro 16mm potrubí END PLUG / BF-TOP	ks	50,000	14,00	700,00	
30	K	Pol30	zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí CLAMP16-18	ks	50,000	13,00	650,00	
31	K	Pol31	zajišť. bod. pro 16mm DripLine EURODRIP 15cm černý EUROHOOK 15cm	ks	1 000,000	11,00	11 000,00	
32	K	Pol32	Nástroj na instalaci Rain Bird XFF tvarovek FITINSTOOL	ks	1,000	72,00	72,00	

D D5 POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ 36 318,00

33	K	Pol33	32, 40, 50x3/4" navrtávací pas/PN16 Pas 32, 40, 50x3/4"	ks	40,000	86,00	3 440,00	
34	K	Pol34	KOPOFLEX 110	m	10,000	82,00	820,00	
35	K	Pol35	PE80, PE-MD SOFT potrubí, PN 8, SDR17, role 100m 32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT	m	200,000	38,00	7 600,00	
36	K	Pol36	tvarovky k PE 32 x 2,0	kpl	1,000	4 080,00	4 080,00	
37	K	Pol37	PE80, PE-MD SOFT potrubí, PN 8, SDR17, role 100m 40 x 2,4 PE80, PE-MD SOFT	m	50,000	50,00	2 500,00	
38	K	Pol38	tvarovky k PE 40 x 2,4	kpl	1,000	1 632,00	1 632,00	
39	K	Pol39	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100m 50 x 3,0 PE100, PE-HD	m	200,000	70,00	14 000,00	
40	K	Pol40	tvarovky k PE 50 x 3,0	kpl	1,000	2 246,00	2 246,00	

D D6 ZEMNÍ PRÁCE 117 158,00

41	K	Pol41	Výkop a zásep ryhy hl. 350mm	m	250,000	66,00	16 500,00	
42	K	Pol42	Montáž zavlažovacího systému rozsahu dle projektu	kpl	1,000	55 404,00	55 404,00	
43	K	Pol43	Podružný montážní materiál	kpl	1,000	10 140,00	10 140,00	
44	K	Pol44	Komplexní vyzkoušení	kpl	1,000	1 495,00	1 495,00	
45	K	Pol45	Vypracování manuálu údržby	kpl	1,000	703,00	703,00	
46	K	Pol46	Zaškolení obsluhy na zařízení	hod	2,000	342,00	684,00	
47	K	Pol47	Bourání stávající závlahy včetně výkopu a zpětného zásepů ryh a odstranění veškerých koncových prvků a šachet	kpl	1,000	32 232,00	32 232,00	

Poznámka k položce:
předpokládána délka potrubí cca 190 m, počet koncových prvků - Bks, šachet - 2 ks

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329d - SO 03 - Sadové úpravy

KSO:

Místo: Slovanský ostrov

Zadavatel:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Uchazeč:

Projektant:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Poznámka:

Celková cena díla musí obsahovat veškeré náklady nutné k provedení a předání funkčního díla tak, jak je požadováno zadavatelem v zadávacích podmínkách výběrového řízení, a musí splňovat podmínky vymezené územním rozhodnutím a stavebním povolením. Při zpracování nabídky musí nabízející předpokládat použití veškerých zařízení a materiálů, které bude považovat za účelné nebo nezbytné, tak aby zajistil dokonalou realizaci předmětu díla vyplývající z jeho účelu a požadované funkce při zajištění potřeb. Pokud není výslovně uvedeno jinak, cenou se rozumí cena za dodávku a montáž včetně všech nezbytných pomocných, montážních a kotevnicích materiálů, stejně jako veškerých funkčních souvisejících prvků. Pokud jsou v této dokumentaci uvedena jména konkrétních výrobců či výrobků, znamená to specifikaci požadovaného technického standardu. Nabízené zařízení musí být s uvedeným standardem minimálně srovnatelné

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2017

IČ: 26511886

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 26511886

DIČ:

Cena bez DPH

4 014 291,78

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

4 014 291,78

21,00%

843 001,27

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 857 293,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parku Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329d - SO 03

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu ce

D1 - PRAHA 1

D2 - Kácení a odst

D3 - Příprava stan

D4 - Výsadby

D5 - Mlat - 406 m²

D6 - MATERIÁL

D7 - POVODÍ VLT

D2 - Kácení a odst

D3 - Příprava stan

D4 - Výsadby

D6 - MATERIÁL

D10 - SEZNAM NA

D11 - Stromy

D12 - Keře, půdop

D13 - Trvalky

D14 - Cibuloviny

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329d - SO 03 - Sadové úpravy

Místo:

Slovanský ostrov

Datum: 27. 4. 2017

Zadavatel:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Projektant: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 014 291,78	
D	D1		PRAHA 1				2 627 462,22	
D	D2		Kácení a odstranění dřevin, péstební opatření				174 102,80	
1	K	112 15-1354	Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu do 500 mm	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	
2	K	112 21-1215	Odstranění pařezu ručně, v rovině, o průměru pařezu na řezné ploše do 600 mm	ks	1,000	4 260,00	4 260,00	
3	K	111 21-2211	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1m, s odstraněním pařezu, do 100m2, v rovině či svahu do 1:5	m2	43,000	26,00	1 118,00	
4	K	111 21-2351	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100mm výšky přes 1m, s odstraněním pařezu, do 100m2, v rovině či svahu do 1:5	m2	2,000	222,00	444,00	
5	K	111 21-2316	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100mm výšky přes 1m, bez odstranění pařezu, do 500m2, na svahu do 1:2	m2	187,000	80,00	14 960,00	
6	K	R-položka	Řez keřů - odstranění zlomených nebo poškozených větví, upravení tvaru a průchodného profilu u cest	m2	177,000	125,00	22 125,00	
7	K	R-položka.1	Nátěr výmládků pařezů po odstranění dřevinách totálním herbicidem na svahu do 1:2	m2	187,000	14,40	2 692,80	
8	K	184 85-2112	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, bezpečnostní, plocha koruny do 60m2	ks	1,000	1 740,00	1 740,00	
9	K	184 85-2114	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, bezpečnostní, plocha koruny do 120 m2	ks	1,000	2 844,00	2 844,00	
10	K	184 85-2115	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, bezpečnostní, plocha koruny do 150 m2	ks	1,000	3 540,00	3 540,00	
11	K	184 85-2116	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, bezpečnostní, plocha koruny do 180 m2	ks	3,000	4 248,00	12 744,00	
12	K	184 85-2117	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, bezpečnostní, plocha koruny do 210 m2	ks	1,000	4 788,00	4 788,00	
13	K	184 85-2123	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, bezpečnostní, plocha koruny do 360 m2	ks	1,000	7 668,00	7 668,00	
14	K	184 85-2212	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, zdravotní, plocha koruny do 60 m2	ks	1,000	2 736,00	2 736,00	
15	K	184 85-2213	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, zdravotní, plocha koruny do 90 m2	ks	3,000	4 116,00	12 348,00	
16	K	184 85-2214	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, zdravotní, plocha koruny do 120m2	ks	2,000	4 224,00	8 448,00	
17	K	184 85-2215	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, zdravotní, plocha koruny do 150 m2	ks	2,000	5 256,00	10 512,00	
18	K	184 85-2217	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, zdravotní, plocha koruny do 210 m2	ks	1,000	6 864,00	6 864,00	
19	K	184 85-2218	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, zdravotní, plocha koruny do 240 m2	ks	2,000	7 848,00	15 696,00	
20	K	184 85-2221	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, zdravotní, plocha koruny do 300 m2	ks	1,000	9 816,00	9 816,00	
21	K	184 85-2223	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, zdravotní, plocha koruny do 360 m2	ks	1,000	10 932,00	10 932,00	
22	K	184 85-2814	Příplatek za ztížené podmínky při řezu bezpečnostním, plocha koruny do 120 m2	ks	1,000	364,00	364,00	
23	K	184 85-2815	Příplatek za ztížené podmínky při řezu bezpečnostním, plocha koruny do 150 m2	ks	1,000	452,00	452,00	
24	K	184 85-2816	Příplatek za ztížené podmínky při řezu bezpečnostním, plocha koruny do 180 m2	ks	1,000	540,00	540,00	
25	K	184 85-2817	Příplatek za ztížené podmínky při řezu bezpečnostním, plocha koruny do 210 m2	ks	1,000	608,00	608,00	
26	K	184 85-2915	Příplatek za ztížené podmínky při řezu zdravotním, plocha koruny do 150 m2	ks	1,000	666,00	666,00	
27	K	185 85-2923	Příplatek za ztížené podmínky při řezu zdravotním, plocha koruny do 360 m2	ks	1,000	965,00	965,00	
28	K	R-položka.2	Likvidace biodpadu (kmene, větve)	t	5,000	660,00	3 300,00	
29	K	R-položka.3	Likvidace biodpadu (pařezy)	t	1,000	1 800,00	1 800,00	
30	K	998 23-1311	Přesun hmot pro sadové úpravy	t	6,000	222,00	1 332,00	
D	D3		Příprava stanoviště				553 013,00	
31	K	184 81-3212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině do 2000 mm	m	252,000	102,00	25 704,00	
32	K	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy postřikem v rovině (trávník)	m2	2 642,000	2,40	6 340,80	
33	K	111 30-1111	Sejmutí dřvu (mocnost cca 5 cm)	m2	2 642,000	28,00	73 976,00	
34	K	R-položka.4	Naložení odkopaného dřvu	m3	132,000	192,00	25 344,00	
35	K	R-položka.5	Sejmutí mulče z kůry ve vrstvě 10 cm a naložení na dopravní prostředek	m2	321,000	24,00	7 704,00	
36	K	R-položka.6	Likvidace biodpadu	t	386,000	550,00	212 300,00	
37	K	998 23-1311	Přesun hmot pro sadové úpravy	t	386,000	185,00	71 410,00	
38	K	181 95-1101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů bez zhutnění	m2	2 642,000	6,10	16 116,20	
39	K	183 40-3114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině (v plochách pro trávník)	m2	2 292,000	1,00	2 292,00	
40	K	183 40-3131	Obdělání půdy rytím v rovině (ve výsadbách a plochách pro trávník pod stromy)	m2	1 798,000	13,00	23 374,00	
41	K	183 40-3231	Obdělání půdy rytím na svahu do 1:2	m2	185,000	19,80	3 663,00	
42	K	181 30-1111	Rozprostření a urovnání substrátu v rovině (vrstva 5 cm) při souvislé ploše přes 500 m2	m2	4 090,000	8,80	35 992,00	
43	K	182 30-1121	Rozprostření a urovnání substrátu na svahu do 1:2 - vrstva 5 cm	m2	185,000	52,00	9 620,00	
44	K	183 20-5111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin	m2	1 498,000	15,50	23 219,00	
45	K	183 20-5131	Založení záhonu pro výsadbu rostlin na svahu do 1:2	m2	185,000	28,00	5 180,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	183 40-1353	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m ²	4 080,000	7,40	30 192,00	
47	K	183 40-3253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2					
D D4			Výsadby					
48	K	181 45-1151	Založení trávniku travním koberecem v rovině					
49	K	185 80-4312	Zálivka bez dodání vody 20l/m ² (travní koberec)					
50	K	185 80-2113	Hnojení půdy umělým hnojivem na šířku v rovině					
51	K	183 10-1321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy do 0,002 m ³ v rovině	ks	7 037,000	7,90	55 592,30	
52	K	184 10-2115	Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky při průměru bař, do 100 mm v rovině se zalitím	ks	7 037,000	28,00	197 036,00	
53	K	184 50-1141	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině	m ²	996,000	49,00	48 804,00	
54	K	184 80-1121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině					
55	K	185 80-2114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině	t	0,070	25 200,00	1 764,00	
56	K	184 21-5132	Ukotvení dřeviny třemi kůly délky do 2 m					
57	K	R-položka.7	Instalace závlahové sondy - u stromů v mlátě					
58	K	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin					
59	K	R-položka.8	Výroba ohrádky proti psům ze 3 pútek					
60	K	183 10-2321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy do 0,002 m ³ na svahu do 1:2	ks	1 288,000	17,70	16 357,60	
61	K	184 10-2125	Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky při průměru bař, do 100 mm na svahu do 1:2 se zalitím	ks	1 288,000	51,20	65 945,60	
62	K	184 50-1142	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině	m ²	185,000	85,00	15 725,00	
63	K	184 80-1122	Ošetření vysazených dřevin solitérních na svahu do 1:2					
64	K	185 80-2124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám na svahu do 1:2	t	0,013	25 200,00	327,60	
65	K	184 21-5132	Ukotvení dřeviny třemi kůly délky do 2 m					
66	K	184 21-5422	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin					
67	K	R-položka.8	Výroba ohrádky proti psům ze 3 pútek					
68	K	183 10-1113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy do 0,002 m ³ v rovině	ks	14 346,000	6,60	94 683,60	
69	K	184 10-2112	Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky při průměru bař, do 100 mm v rovině se zalitím	ks	4 026,000	18,50	74 481,00	
70	K	185 80-2114.1	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině	t	0,001	25 200,00	25,20	
71	K	183 11-1111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy do 0,002 m ³ v rovině	ks	7 037,000	7,90	55 592,30	
72	K	184 10-2110	Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky při průměru bař, do 100 mm v rovině se zalitím	ks	7 037,000	28,00	197 036,00	
73	K	184 80-1131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině					
74	K	185 80-2114.1	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině	t	0,070	25 200,00	1 764,00	
75	K	183 11-5111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy do 0,002 m ³ na svahu do 1:2	ks	1 288,000	17,70	16 357,60	
76	K	184 10-2120	Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky při průměru bař, do 100 mm na svahu do 1:2 se zalitím	ks	1 288,000	51,20	65 945,60	
77	K	184 80 1132	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách na svahu do 1:2					
78	K	185 80-2124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám na svahu do 1:2	t	0,013	25 200,00	327,60	
79	K	183 11-1111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy do 0,002 m ³ v rovině	ks	14 346,000	6,60	94 683,60	
80	K	183 21-1322	Výsadba trvalek hrnkovaných o průměru květináčů do 120 mm se zalitím	ks	4 026,000	18,50	74 481,00	
81	K	183 21-1313	Výsadba cibulovin se zalitím	ks	10 320,000	5,40	55 728,00	
82	K	185 80-4111	Ošetření vysazených květin	m ²	572,000	6,00	3 432,00	
83	K	184 91-1421	Mulčování záhonů kůrou, tl. do 100 mm v rovině	m ²	1 498,000	33,60	50 332,80	
84	K	182 11-1112	Zpevnění svahu kokosovou rohoží na svahu do 1:1	m ²	185,000	174,00	32 190,00	
85	K	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku	m ³	35,260	365,00	12 869,90	
86	K	185 85-1129	Příplatek za každých započatých 1000 m - 5x	m ³	176,300	21,40	3 772,82	
87	K	998 23-1311	Přesun hmot pro sadové úpravy	t	510,000	185,00	94 350,00	
D D5			Mlát - 406 m², mocnost souvrství 30 cm *pozn.				304 293,20	
88	K	122 10-1101	Odkopávky a prokopávky	m ³	121,800	91,00	11 083,80	
89	K	167 10-1101	Nakládání výkopku	m ³	121,800	170,00	20 706,00	
90	K	162 20-1211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem - případný výkopek bude použit, na dorovnání terénu, zácpy apod.	m ³	121,800	88,00	10 718,40	
91	K	R-položka.9	Úprava pláně se zhuštěním	m ²	406,000	57,00	23 142,00	
92	K	564 75-1114	Podklad z kameniva 32/63 - tl. 18 cm	m ²	406,000	130,00	52 780,00	
93	K	564 82-1111	Podklad ze šterkodrti D-32 - 8 cm	m ²	406,000	108,00	43 848,00	
94	K	R-položka.10	Kryt z lomové výsivky - 4 cm (zaválení a prolévání vodou)	m ²	406,000	105,00	42 630,00	
95	K	R-položka.11	Instalace ocelové pásoviny na rozorech do betonových patek	bm	106,000	510,00	54 060,00	
96	K	998 23-1311	Přesun hmot pro sadové úpravy	t	245,000	185,00	45 325,00	
D D6			MATERIÁL				581 532,20	
97	M	MAT	Totální herbicid	l	5,000	198,00	990,00	
98	M	MAT.1	Substrát	t	278,000	252,00	70 056,00	
99	M	MAT.2	Substrát B - vrchní	t	8,300	560,00	4 648,00	
100	M	MAT.3	Substrát A - spodní	t	12,500	210,00	2 625,00	
101	M	MAT.4	Travní koberec (směs do polostinu), vč 5% ztrátě	m ²	2 648,000	100,00	264 800,00	
102	M	MAT.5	Mulčovací kůra jemná frakce 8-15 mm	t	100,000	936,00	93 600,00	
103	M	MAT.6	Kokosová rohož 400g/m ² včetně kotvicího materiálu (4 ks/m ²)	m ²	185,000	101,00	18 685,00	
104	M	MAT.7	Rákosová rohož	m ²	16,000	102,00	1 632,00	
105	M	MAT.8	Tabuletové hnojivo s postupným uvolňováním živin	ks	14 202,000	2,40	34 084,80	
106	M	MAT.9	Kůly (3 ks/strom), 4 příčky, úvazky	ks	16,000	300,00	4 800,00	
107	M	MAT.10	Závlahová sonda - perforovaná hadice průměru 19 cm, délka 80 cm, zasypaná šterkem, fr. 8-16 mm	ks	3,000	102,00	306,00	
108	M	MAT.11	Mlatová prasinka fr. 0-4 mm okrové barvy	t	32,500	1 188,00	38 610,00	
109	M	MAT.12	Ocelová pásovin (tl. 5 mm, šířka 80 mm) s navařenými ocelovými rozory po 1,5 m	m	106,000	355,00	37 630,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	M	MAT.13	Voda	m3	35,260	90,00	3 173,40	
111	M	MAT.14	Beton prostý	m3	0,200	3 000,00	600,00	
112	M	MAT.15	NPK (50g/m2) v plochách trávníku	kg	126,000	42,00	5 292,00	
D D7							442 827,56	
D D2							375 232,00	
113	K	112 15-1315	Kácení a odstranění dřevin, pěstební opatření Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu do 600 mm	ks	1,000	7 716,00	7 716,00	
114	K	112 15-1351	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu do 200 mm	ks	1,000	2 256,00	2 256,00	
115	K	112 15-1352	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu do 300 mm	ks	1,000	2 964,00	2 964,00	
116	K	112 15-1353	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu do 400 mm	ks	1,000	4 776,00	4 776,00	
117	K	112 15-1354	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu do 500 mm	ks	2,000	9 720,00	19 440,00	
118	K	112 15-1356	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu do 700 mm	ks	1,000	21 840,00	21 840,00	
119	K	112 15-1363	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu do 1400 mm	ks	1,000	64 800,00	64 800,00	
120	K	112 21-1231	Odstranění pařezu ručně, na svahu do 1:2, o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	ks	1,000	1 045,00	1 045,00	
121	K	112 21-1212	Odstranění pařezu ručně, v rovině, o průměru pařezu na řezné ploše do 300 mm	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
122	K	112 21-1233	Odstranění pařezu ručně, na svahu do 1:2, o průměru pařezu na řezné ploše do 400 mm	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	
123	K	112 21-1214	Odstranění pařezu ručně, v rovině, o průměru pařezu na řezné ploše do 500 mm	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	
124	K	112 21-1234	Odstranění pařezu ručně, na svahu do 1:2, o průměru pařezu na řezné ploše do 500 mm	ks	2,000	6 240,00	12 480,00	
125	K	112 21-1236	Odstranění pařezu ručně, na svahu 1:2, o průměru pařezu na řezné ploše do 700 mm	ks	1,000	8 160,00	8 160,00	
126	K	112 21-1243	Odstranění pařezu ručně, na svahu do 1:2, o průměru pařezu na řezné ploše do 1400 mm	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	
127	K	111 21-2316.1	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1m, bez odstranění pařezu, do 500 m2, na svahu do 1:2	m2	490,000	80,00	39 200,00	
128	K	R-položka.1	Náběr výmladků pařezů po odstraněných dřevinách totálním herbicidem na svahu do 1:2	m2	490,000	30,00	14 700,00	
129	K	184 85-2112	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, bezpečnostní, plocha koruny do 60m2	ks	1,000	1 740,00	1 740,00	
130	K	184 85-2113	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, bezpečnostní, plocha koruny do 90m2	ks	2,000	2 616,00	5 232,00	
131	K	184 85-2114	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, bezpečnostní, plocha koruny do 120 m2	ks	5,000	2 844,00	14 220,00	
132	K	184 85-2115	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, bezpečnostní, plocha koruny do 150 m2	ks	1,000	3 540,00	3 540,00	
133	K	184 85-2116	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, bezpečnostní, plocha koruny do 180 m2	ks	3,000	4 248,00	12 744,00	
134	K	184 85-2117	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, bezpečnostní, plocha koruny do 210 m2	ks	1,000	4 788,00	4 788,00	
135	K	184 85-2212	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, zdravotní, plocha koruny do 60 m2	ks	2,000	2 736,00	5 472,00	
136	K	184 85-2213	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, zdravotní, plocha koruny do 90 m2	ks	2,000	4 116,00	8 232,00	
137	K	184 85-2214	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, zdravotní, plocha koruny do 120m2	ks	2,000	4 212,00	8 424,00	
138	K	184 85-2215	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, zdravotní, plocha koruny do 150 m2	ks	1,000	5 256,00	5 256,00	
139	K	184 85-2216	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, zdravotní, plocha koruny do 180 m2	ks	2,000	6 300,00	12 600,00	
140	K	184 85-2218	Řez stromů prováděných lezeckou technikou, zdravotní, plocha koruny do 240 m2	ks	2,000	7 848,00	15 696,00	
141	K	184 85-2812	Příplatek za ztížené podmínky při řezu bezpečnostním, plocha koruny do 60 m2	ks	1,000	227,00	227,00	
142	K	184 85-2813	Příplatek za ztížené podmínky při řezu bezpečnostním, plocha koruny do 90 m2	ks	2,000	335,00	670,00	
143	K	184 85-2814	Příplatek za ztížené podmínky při řezu bezpečnostním, plocha koruny do 120 m2	ks	5,000	364,00	1 820,00	
144	K	184 85-2815	Příplatek za ztížené podmínky při řezu bezpečnostním, plocha koruny do 150 m2	ks	1,000	452,00	452,00	
145	K	184 85-2816	Příplatek za ztížené podmínky při řezu bezpečnostním, plocha koruny do 180 m2	ks	3,000	540,00	1 620,00	
146	K	184 85-2817	Příplatek za ztížené podmínky při řezu bezpečnostním, plocha koruny do 210 m2	ks	1,000	608,00	608,00	
147	K	184 85-2912	Příplatek za ztížené podmínky při řezu zdravotním, plocha koruny do 60 m2	ks	2,000	352,00	704,00	
148	K	184 85-2913	Příplatek za ztížené podmínky při řezu zdravotním, plocha koruny do 90 m2	ks	2,000	522,00	1 044,00	
149	K	184 85-2914	Příplatek za ztížené podmínky při řezu zdravotním, plocha koruny do 120 m2	ks	2,000	534,00	1 068,00	
150	K	184 85-2915	Příplatek za ztížené podmínky při řezu zdravotním, plocha koruny do 150 m2	ks	1,000	666,00	666,00	
151	K	185 85-2916	Příplatek za ztížené podmínky při řezu zdravotním, plocha koruny do 180 m2	ks	2,000	798,00	1 596,00	
152	K	185 85-2917	Příplatek za ztížené podmínky při řezu zdravotním, plocha koruny do 210 m2	ks	2,000	868,00	1 736,00	
153	K	R-položka.2	Likvidace biopadu (kmeny, větve)	t	32,000	660,00	21 120,00	
154	K	R-položka.3	Likvidace biopadu (pařezy)	t	8,000	1 800,00	14 400,00	
155	K	998 23-1311	Přesun hmot pro sadové úpravy	t	40,000	222,00	8 880,00	
D D3							4 628,00	
156	K	183 40-3231	Obdělání půdy rytím na svahu do 1:2	m2	52,000	22,00	1 144,00	
157	K	R-položka.12	Rozprostření a urovnění substrátu na svahu do 1:2 - vrstva 5 cm	m2	52,000	36,00	1 872,00	
158	K	183 20-5131	Založení záhonu pro výsadbu rostlin na svahu do 1:2	m2	52,000	26,00	1 352,00	
159	K	183 40-3253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	52,000	5,00	260,00	
D D4							51 382,30	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
160	K	183 10-2321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy z 100% do 1 m3, na svahu do 1:2	ks	3,000	2 304,00	6 912,00		
161	K	184 10-2125	Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky při průměru bařu do 600 mm na svahu do 1:2 se zalitím	ks	3,000	688,00	2 064,00		
162	K	184 50-1142	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	m2	3,000	118,00	354,00		
163	K	184 80-1122	Ošetření vysazených dřevin solitérních na svahu do 1:2	ks	3,000	140,00	420,00		
164	K	185 80-2124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám na svahu do 1:2	t	0,000	25 200,00	0,00		
165	K	184 21-5132	Ukotvení dřeviny třemi kůly délky do 2 m	ks	3,000	184,00	552,00		
166	K	R-položka.8	Výroba ohrádky proti psům ze 3 pútek	ks	3,000	90,00	270,00		
167	K	184 21-5422	Zhotovení závlahové misky u solitérních dřevin na svahu do 1:2, o průměru misky do 1 m	ks	3,000	54,00	162,00		
168	K	183 11-5111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy do 0,002 m3 na svahu do 1:2	ks	360,000	13,00	4 680,00		
169	K	184 10-2120	Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky při průměru bařu . do 100 mm na svahu do 1:2 se zalitím	ks	360,000	51,00	18 360,00		
170	K	184 80-1132	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách na svahu do 1:2	m2	52,000	85,00	4 420,00		
171	K	185 80-2124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám na svahu do 1:2	t	0,004	25 200,00	100,80		
172	K	182 11-1112	Zpevnění svahu kokosovou rohoží na svahu do 1:1	m2	52,000	204,00	10 608,00		
173	K	185 05-1121	Dovoz vody pro závlahu	m3	1,340	420,00	562,80		
174	K	185 05-1129	Příplatek za každých započatých 1000 m - 5x	m3	6,700	21,00	140,70		
175	K	998 23-1311	Přesun hmot pro sadové úpravy	t	8,000	222,00	1 776,00		
							11 585,26		
D	D6	MATERIÁL							
176	M	MAT	Totální herbicid	l	2,000	198,00	396,00		
177	M	MAT.1	Substrát	t	3,500	300,00	1 050,00		
178	M	MAT.16	Substrát B - vrchní	t	1,600	660,00	1 056,00		
179	M	MAT.3	Substrát A - spodní	t	2,300	300,00	690,00		
180	M	MAT.6	kokosová rohož 400g/m2 včetně kotvícího materiálu (4 ks/m2)	m2	52,000	102,00	5 304,00		
181	M	MAT.7	Rákosová rohož	m2	3,000	102,00	306,00		
182	M	MAT.8	Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin	ks	735,000	2,40	1 764,00		
183	M	MAT.9	Kůly (3 ks/strom), 4 příčky, úvazky	ks	3,000	300,00	900,00		
184	M	MAT.13	Voda	m3	1,340	89,00	119,26		
							944 002,00		
D	D10	SEZNAM NAVRHOVANÝCH ROSTLIN							
D	D11	Stromy						58 689,00	
185	M	S1	Acer platanoides javor mléč B14/16	ks	6,000	2 288,00	13 728,00		
186	M	S2	Aesculus hippocastanum jirovec madal B 16/18	ks	5,000	3 467,00	17 335,00		
187	M	S3	Liriodendron tulipifera lyrovník tulipánokvětý B 16/18	ks	2,000	4 224,00	8 448,00		
188	M	S4	Sophora japonica jerlín japonský B 16/18	ks	1,000	3 828,00	3 828,00		
189	M	S5	Tilia cordata lípa srdčitá B14/16	ks	5,000	3 070,00	15 350,00		
D	D12	Keře, půdopokryvné rostliny a rúže						696 729,00	
190	M	K1	Hydrangea arborescens 'Incrediball' hortenzie stromekovitá K 120	ks	18,000	660,00	11 880,00		
191	M	K2	Viburnum x burkwoodii kalina Burkwoodova K150	ks	1,000	1 008,00	1 008,00		
192	M	K3	Viburnum farreri kalina vonná K150	ks	7,000	1 008,00	7 056,00		
193	M	K4	Taxus baccata - řízkovance tis červený K100	ks	7,000	570,00	3 990,00		
194	M	K5	Hedera helix břečtan paplnavý K9	ks	8 685,000	77,00	668 745,00		
195	M	K6	Rosa 'Boscobel' rúže Austinova K100	ks	27,000	150,00	4 050,00		
D	D13	Trvalky						130 360,00	
196	M	T1	Alchemilla mollis kontryhel měkký K9	ks	493,000	19,00	9 367,00		
197	M	T2	Brunnera macrophylla 'Betty Bowring' pomněnkovec velkolistý K9	ks	485,000	29,00	14 065,00		
198	M	T3	Hosta plantaginea 'Grandiflora' bohýška K9	ks	433,000	72,00	31 176,00		
199	M	T4	Heuchera villosa dluzička K9	ks	433,000	22,00	9 526,00		
200	M	T5	Matteucia struthiopteris pérovník pútroší K9	ks	713,000	28,00	19 964,00		
201	M	T6	Helleborus niger čemerice černá K9	ks	650,000	42,00	27 300,00		
202	M	T7	Aruncus dioicus udatná lesní Zl	ks	21,000	20,00	420,00		
203	M	T8	Anemone x hybrida 'Honorine Jobert' sasanka Zl	ks	55,000	28,00	1 540,00		
204	M	T9	Digitalis purpurea náprstník K11	ks	90,000	19,00	1 710,00		
205	M	T10	Thymus citriodorus 'Silver Queen' tymián K9	ks	140,000	20,00	2 800,00		
206	M	T11	Salvia officinalis 'Purpurascens' šalvěj lékařská K9	ks	90,000	26,00	2 340,00		
207	M	T12	Salvia nemorosa 'Caradonna' šalvěj hajní K9	ks	90,000	24,00	2 160,00		
208	M	T13	Gaura lindheimeri svižkovec K11	ks	30,000	24,00	720,00		
209	M	T14	Geranium macrorrhizum 'Spessart' kakost K9	ks	303,000	24,00	7 272,00		
D	D14	Cibuloviny						58 224,00	
210	M	C1	Galanthus nivalis sněžěnka	ks	1 450,000	6,00	8 700,00		
211	M	C2	Leucojum aestivum 'Gravetye Giant' bleďule letní	ks	380,000	6,00	2 280,00		
212	M	C3	Leucojum vernum bleďule jarní	ks	830,000	6,00	4 980,00		
213	M	C4	Camassia leichtlinii 'Alba' ladoník	ks	210,000	6,00	1 260,00		
214	M	C5	Anemone blanda 'Charmer' sasanka	ks	830,000	6,00	4 980,00		
215	M	C6	Anemone blanda 'White Splendour' sasanka	ks	830,000	6,00	4 980,00		
216	M	C7	Galanthus elwesii sněžěnka	ks	830,000	6,00	4 980,00		
217	M	C8	Galanthus woronowii sněžěnka	ks	830,000	6,00	4 980,00		
218	M	C9	Allium nigrum 'Pink Jewel' česnek černý	ks	50,000	6,00	300,00		
219	M	C10	Allium giganteum 'Twinkling Stars' česnek	ks	50,000	12,00	600,00		
220	M	C11	Allium cernuum česnek	ks	70,000	12,00	840,00		
221	M	C12	Tulipa 'Elegant Lady' tulipán	ks	460,000	12,00	5 520,00		
222	M	C13	Ornithogalum balansae snědek	ks	620,000	4,80	2 976,00		
223	M	C14	Ornithogalum umbellatum snědek	ks	620,000	3,60	2 232,00		
224	M	C15	Puschkinia libanotica puškinie	ks	620,000	3,60	2 232,00		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	M	C16	Scilla sibirica lodička	ks	620,000	3,60	2 232,00	
226	M	C17	Chionodoxa 'Pink Giant' lodička	ks	620,000	3,60	2 232,00	
227	M	C18	Narcissus 'Thalia' narcis	ks	400,000	4,80	1 920,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy

Soupis:

01 - Opěrná stěna - část a

KSO:

Místo: Slovanský ostrov

Zadavatel:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám.

Uchazeč:

Projektant:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám.

Poznámka:

Celková cena díla musí obsahovat veškeré požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách, včetně všech územních rozhodnutí a stavebním povolení, veškerých zařízení a materiálů, které budou potřebné pro realizaci předmětu díla vyplývající z jeho specifikace. Pokud není uvedeno jinak, cenou se rozumí cena za kotevních materiálů, stejně jako veškerých materiálů, včetně jmen konkrétních výrobců či výrobků, z kterých budou zařízení musí být s uvedeným standardem.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy

Soupis:

01 - Opěrná stěna - část a

Místo:

Slovanský ostrov

Datum: 27. 4. 2017

Zadavatel:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Projektant: Tichý & Kolářová

Uchazeč:

s.r.o., Hollarovo nám.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

417 168,77

HSV - Práce a dodávky HSV

417 168,77

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

286 585,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 726,24

94 - Lešení a stavební výtahy

8 750,00

997 - Přesun sutě

14 793,76

998 - Přesun hmot

2 892,61

N00 - HSV - nutno upřesnit

95 420,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy

Soupis:

01 - Opěrná stěna - část a

Místo:

Slovanský ostrov

Datum: 27. 4. 2017

Zadavatel:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Projektant: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							417 168,77	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				417 168,77	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				286 585,56	
1	K	622125111	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárníc nebo kamene	m ²	159,480	383,00	61 080,84	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: vnitřní strana zdiva 19,82 vnější strana zdiva 139,66</i>					
2	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m ²	159,480	214,00	34 128,72	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: vnitřní strana zdiva 19,82 vnější strana zdiva 139,66</i>					
3	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m ²	159,480	680,00	108 446,40	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: vnitřní strana zdiva 19,82 vnější strana zdiva 139,66</i>					
4	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m ²	159,480	195,00	31 098,60	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: vnitřní strana zdiva 19,82 vnější strana zdiva 139,66</i>					
VV			79,74*2 Přepočtené koeficientem množství		159,480			
5	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m ²	159,480	325,00	51 831,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: vnitřní strana zdiva 19,82 vnější strana zdiva 139,66</i>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 726,24	
6	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m ²	19,820	95,00	1 882,90	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: vnitřní strana zdiva 19,82</i>					
7	K	978023251	Vykrabání spár zdiva kamenného režného	m ²	139,660	49,00	6 843,34	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: vnější strana zdiva 139,66</i>					
D	94		Lešení a stavební výtahy				8 750,00	
8	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	50,000	175,00	8 750,00	CS ÚRS 2017 01
D	997		Přesun sutě				14 793,76	
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,125	385,00	1 203,13	CS ÚRS 2017 01
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,000	164,00	12 300,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: do 25 km</i>					
VV			3,125*24 Přepočtené koeficientem množství		75,000			
11	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,125	413,00	1 290,63	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				2 892,61	
12	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	9,331	310,00	2 892,61	CS ÚRS 2017 01
D	N00		HSV - nutno upřesnit				95 420,60	
13	K	N00-R01	Vyspravení zvětralého zdiva v celém rozsahu opěrné stěny s výměnou materiálu	m ²	159,480	345,00	55 020,60	
	P		<i>Poznámka k položce: výměra je celá pohledová plocha opěrné stěny, rozsah bude upřesněn projektantem vnitřní strana zdiva 19,82 vnější strana zdiva 139,66 odbourání původního smíšeného zdiva, naložení, odvoz a uložení sutí na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkovné) doplnění smíšeného zdiva včetně dodání hmot a zacího materiálu včetně provedení sanačního opatření ozn. 0.02.a (kompletní přeskládání) a vyspravení rohu zdiva v místě napojení dvou opěrných stěn včetně mímstaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
14	K	N00-R02	Výměna poškozených cihel (Klinker cihla plná licová RF 250/120/65 do lepicího cementového tmele)	kpl	4,000	3 850,00	15 400,00	

PČ Ťy Kód Pop

Poznámkou k položce:
výměra je množství událostí (viz pasport), rozsah
1.01.a 1kpl
1.02.a 1kpl
1.03.a 2kpl
odbourání poškozených cíhef, naložení, odvoz a ul
skládku (skládkového)
doplňn: zdíva včetně dodání limof a zděního mate
včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništní

15 K NCO-R03

Stážení praskliny zdíva

Poznámkou k položce:
výměra je množství událostí (viz pasport), rozsah
2.01.a 1kpl
vysokání a vyřtění drážek, račžení, odvoz a uloc
skládku (skládkového)
provedení statického opatření včetně dodání mate
včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy

Soupis:

02 - Opěrná stěna - část b

KSO:

Místo: Slovanský ostrov

Zadavatel:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Úchazeč:

Projektant:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Poznámka:

Celková cena díla musí obsahovat veškeré náklady nutné k provedení a předání funkčního díla tak, jak je požadováno zadavatelem v zadávacích podmínkách výběrového řízení, a musí splňovat podmínky vymezené územním rozhodnutím a stavebním povolením. Při zpracování nabídky musí nabízející předpokládat použití veškerých zařízení a materiálů, které bude považovat za účelné nebo nezbytné, tak aby zajistil dokonalou realizaci předmětu díla vyplývající z jeho účelu a požadované funkce při zajištění potřeb. Pokud není výstavně uvedeno jinak, cenou se rozumí cena za dodávku a montáž včetně všech nezbytných pomocných, montážních a kotevnických materiálů, stejně jako veškerých funkčních souvisejících prvků. Pokud jsou v této dokumentaci uvedena jména konkrétních výrobců či výrobků, znamená to specifikaci požadovaného technického standardu. Nabízené zařízení musí být s uvedeným standardem minimálně srovnatelné

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2017

IČ:

26511886

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

26511886

DIČ:

Cena bez DPH

540 050,20

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

540 050,20

21,00%

113 410,54

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

653 460,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever
Objekt: 329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy
Soupis: 02 - Opěrná stěna - část b

Místo: Slovanský ostrov
Zadavatel: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3
Uchazeč:

Datum: 27. 4. 2017
Projektant: Tichý & Kolářová
s.r.o., Hollarovo nám.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 540 050,20

HSV - Práce a dodávky HSV	540 050,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	169 464,34
4 - Vodorovné konstrukce	24 101,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 589,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 047,93
94 - Lešení a stavební výtahy	14 740,00
997 - Přesun sutě	92 361,37
998 - Přesun hmot	5 435,54
N00 - HSV - nutno upřesnit	195 309,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever
 Objekt: 329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy
 Soupis: 02 - Opěrná stěna - část b

Místo: Slovanský ostrov
 Zadavatel: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3
 Uchazeč:

Datum: 27. 4. 2017
 Projektant: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám.

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							540 050,20	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				540 050,20	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				169 464,34	
1	K	310901113	Úprava lící rezného zdiva prováděného bez líců bez spárování <i>Poznámka k položce: nová koruna zdiva</i>	m ²	55,663	95,00	5 287,99	CS ÚRS 2017 01
	P							
2	K	316231221	Úkončení vrstvy z cihel plných klinker dí 250 mm pevností P 60 naplocho na MVC včetně spárování <i>Poznámka k položce: nová koruna zdiva</i>	m ²	55,653	2 950,00	164 176,35	CS ÚRS 2017 01
	P							
D	4		Vodorovné konstrukce				24 101,83	
3	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tří. C 20/25 <i>Poznámka k položce: nové zhlaví ve spádu tl. 50 - 100 mm</i>	m ³	3,367	3 235,00	10 892,25	CS ÚRS 2017 01
	P							
4	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců <i>Poznámka k položce: nové zhlaví ve spádu tl. 50 - 100 mm</i>	m ²	25,302	252,00	6 376,10	CS ÚRS 2017 01
	P							
5	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců <i>Poznámka k položce: nové zhlaví ve spádu tl. 50 - 100 mm</i>	m ²	25,302	89,00	2 251,88	CS ÚRS 2017 01
	P							
6	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari <i>Poznámka k položce: nové zhlaví ve spádu tl. 50 - 100 mm</i>	t	0,166	27 600,00	4 581,60	CS ÚRS 2017 01
	P							
	VV		0,138*1,2 Přepočtené koeficientem množství		0,166			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 589,90	
7	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou <i>Poznámka k položce: nové zhlaví ve spádu tl. 50 - 100 mm</i>	m ²	44,892	325,00	14 589,90	CS ÚRS 2017 01
	P							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 047,93	
8	K	964052111	Bourání ŽB trámů, prvků nebo pásů průřezu do 0,16 m ² <i>Poznámka k položce: betonové zhlaví průřez 0,74 x 0,15 m</i>	m ³	8,024	2 997,00	24 047,93	CS ÚRS 2017 01
	P							
D	94		Lešení a stavební výtahy				14 740,00	
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	110,000	134,00	14 740,00	CS ÚRS 2017 01
	P							
D	997		Přesun sutě				92 361,37	
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,258	385,00	7 414,33	CS ÚRS 2017 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Poznámka k položce: do 25 km</i>	t	462,192	164,00	75 799,49	CS ÚRS 2017 01
	P							
	VV		19,258*24 Přepočtené koeficientem množství		462,192			
12	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	19,258	475,00	9 147,55	CS ÚRS 2017 01
	P							
D	998		Přesun hmot				5 435,54	
13	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	17,534	310,00	5 435,54	CS ÚRS 2017 01
	P							
D	N00		HSV - nutno upřesnit				195 309,29	
14	K	N00-R01	Případně vyspravení spár zdiva opěrné stěny <i>Poznámka k položce: výměra je celá pohledová plocha opěrné stěny, rozsah bude upřesněn projektantem vnější strana zdiva 26,92 vnější strana zdiva 167,71 vykrabání původního spárování kyklopského zdiva, natožení, odvoz a uložení sutí na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkovně) vyčištění spár a provedení nového spárování včetně dodání hmot včetně mlmostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>	m ²	196,630	383,00	75 309,29	
	P							
15	K	N00-R02	Úprava soklové vnitřní části zdiva a koruny zhlaví	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<p><i>Poznámka k položce: výměra je množství události (viz pasport), rozsah bude upřesněn projektantem 4.01.b 1kpl odbourání betonové dozajivky a zhlaví, naložení, odvoz a uložení sutí na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkovného) doplnění zdiva a provedení nové VPC omítky tl. 25 mm včetně dodání hmot a zdivého materiálu včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i></p>					
16	K	N00-R03	<p>Stážení praskliny zdiva</p> <p><i>Poznámka k položce: výměra je množství události (viz pasport), rozsah bude upřesněn projektantem 2.08.b 1kpl vysekání a vyčištění drážek, naložení, odvoz a uložení sutí na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkovného) provedení statického opatření včetně dodání materiálu včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i></p>	kpl	1,000	92 000,00	92 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever
Objekt:
329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy
Soupis:

03 - Opěrná stěna - část c

KSO:
Místo: Slovanský ostrov
Zadavatel:
Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3
Uchazeč:
Projektant:
Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

CC-CZ:
Datum: 27. 4. 2017
IČ: 26511886
DIČ:
IČ: 26511886
DIČ:

Poznámka:

Celková cena díla musí obsahovat veškeré náklady nutné k provedení a předání funkčního díla tak, jak je požadováno zadavatelem v zadávacích podmínkách výběrového řízení, a musí splňovat podmínky vymezené územním rozhodnutím a stavebním povolením. Při zpracování nabídky musí nabízející předpokládat použití veškerých zařízení a materiálů, které bude považovat za účelné nebo nezbytné, tak aby zajistil dokonalou realizaci předmětu díla vyplývající z jeho účelu a požadované funkce při zajištění potřeb. Pokud není výslovně uvedeno jinak, cenou se rozumí cena za dodávku a montáž včetně všech nezbytných pomocných, montážních a kotevních materiálů, stejně jako veškerých funkčních souvisejících prvků. Pokud jsou v této dokumentaci uvedena jména konkrétních výrobců či výrobků, znamená to specifikaci požadovaného technického standardu. Nabízené zařízení musí být s uvedeným standardem minimálně srovnatelné

Cena bez DPH				477 400,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	477 400,00	21,00%	100 254,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		577 654,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever
Objekt: 329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy
Soupis: **03 - Opěrná stěna - část c**
Místo: Slovanský ostrov
Zadavatel: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3
Uchazeč:

Datum: 27. 4. 2017
Projektant: Tichý & Kolářová
s.r.o., Hollarovo nám.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	477 400,00
HSV - Práce a dodávky HSV	477 400,00
N00 - HSV - nutno upřesnit	477 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever
 Objekt: 329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy
 Soupis: 03 - Opěrná stěna - část c

Místo: Slovanský ostrov
 Zadavatel: Tichý & Kolářová s.r.o., Holčarovo nám. 2, Praha 3
 Uchazeč:

Datum: 27. 4. 2017
 Projektant: Tichý & Kolářová s.r.o., Holčarovo nám.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							477 400,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				477 400,00	
D	N00		HSV - nutno upřesnit				477 400,00	
1	K	N00-R01	Vyspravení spár kamenného zdiva	kpl	2,000	34 500,00	69 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: výměra je množství událostí (viz pasport), rozsah bude upřesněn projektantem 0.01.c 1kpl 0.02.c 1kpl vyzkoušení původního spárování kamenného zdiva, naložení, odvoz a uložení sutí na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkovného) vyčištění spár a provedení nového spárování včetně dodání hmot včetně pracovního lešení včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
2	K	N00-R02	Vyspravení koruny betonového zhlaví opěrných stěn	kpl	2,000	22 400,00	44 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce: výměra je množství událostí (viz pasport), rozsah bude upřesněn projektantem 2.01.c 1kpl 2.02.c 1kpl odbourání poškozených částí, naložení, odvoz a uložení sutí na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkovného) očistění, doplnění/vyspravení zhlaví včetně dodání hmot a záčichového materiálu včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
3	K	N00-R03	Výměna kamenných schodišťových stupňů	kpl	1,000	152 000,00	152 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: výměra je množství událostí (viz pasport), rozsah bude upřesněn projektantem 2.01.c 1kpl vybourání stávajících stupňů ze zdiva, naložení, odvoz a uložení sutí na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkovného) výroba, dodávka a montáž nových schodišťových stupňů včetně dodání materiálu (materiál I tvar nových prvků bude stejný jako u stávajících) zednické začištění po osazení včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
4	K	N00-R04	Vyspravení omítky sloupků zábradlí	kpl	6,000	27 000,00	162 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: výměra je množství událostí (viz pasport), rozsah bude upřesněn projektantem 5.01.c 1kpl 5.02.c 1kpl 5.03.c 1kpl 5.04.c 1kpl 5.05.c 1kpl 5.06.c 1kpl atlužení poškozené omítky, naložení, odvoz a uložení sutí na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkovného) vyčištění a vyspravení zdiva, provedení nové VPC omítky včetně dodání hmot včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
5	K	N00-R05	Nahrazení ocelových vrat dle návrhu architekta	kpl	1,000	49 600,00	49 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce: výměra je množství událostí (viz pasport), rozsah bude upřesněn projektantem 6.01.c 1kpl vybourání stávajících vrat ze zdiva, naložení, odvoz a uložení vyb. hmot na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkovného) výroba, dodávka a montáž nových ocelových vrat včetně povrchové úpravy dle návrhu architekta zednické začištění po osazení včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy

Soupis:

04 - Slovanka

KSO:

Místo: Slovanský ostrov

Zadavatel:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Uchazeč:

Projektant:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2017

IČ:

26511886

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

26511886

DIČ:

Poznámka:

Celková cena díla musí obsahovat veškeré náklady nutné k provedení a předání funkčního díla tak, jak je požadováno zadavatelem v zadávacích podmínkách výběrového řízení, a musí splňovat podmínky vymezené územním rozhodnutím a stavebním povolením. Při zpracování nabídky musí nabízející předpokládat použití veškerých zařízení a materiálů, které bude považovat za účelné nebo nezbytné, tak aby zajistil dokonalou realizaci předmětu díla vyplývající z jeho účelu a požadované funkce při zajištění potřeb. Pokud není výstavně uvedeno jinak, cenou se rozumí cena za dodávku a montáž včetně všech nezbytných pomocných, montážních a kotevnicích materiálů, stejně jako veškerých funkčních souvisejících prvků. Pokud jsou v této dokumentaci uvedena jména konkrétních výrobců či výrobků, znamená to specifikaci požadovaného technického standardu. Nabízené zařízení musí být s uvedeným standardem minimálně srovnatelné

Cena bez DPH

894 456,80

DPH základní
snížená

Základ daně

894 456,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

187 835,93

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 082 292,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever
Objekt: 329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy
Soupis: 04 - Slovanka

Místo: Slovanský ostrov
Zadavatel: Tichý & Kolářová s.r.o., Holčarovo nám. 2, Praha 3
Uchazeč:


Datum: 27. 4. 2017

Projektant: Tichý & Kolářová

Kód dílu · Popis

Náklady soupisu celkem

- N01 - Bourací práce
- N02 - Opláštění fasády
- N03 - Střešní krytina
- N04 - Vstupní branka
- N05 - Pracovní lešení
- N06 - Skříně elektro



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever
 Objekt: 329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy
 Soupis: 04 - Slovanka

Místo: Slovanský ostrov
 Zadavatel: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3
 Uchazeč:

Datum: 27. 4. 2017
 Projektant: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							894 456,80	
D		N01	Bourací práce				4 888,00	
1	K	N01-R01	Odstránění stávající krytiny střechy včetně reklamních poutačů	m2	12,000	274,00	3 288,00	
	P		<i>Poznámka k položce: výměra je půdorysná plocha odstraňované krytiny sejmuti krytiny včetně podkladních vrstev a navazujících prvků, naložení, odvoz a uložení vyb. hmot na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkového) včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
2	K	N01-R02	Odstránění stávající ocelové vstupní brány	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce: demontáž brány včetně kotvení, naložení, odvoz a uložení vyb. hmot na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkového) včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
D		N02	Opláštění fasády				375 172,50	
3	K	N02-R01	Opláštění fasády exteriérovými kompaktními deskami včetně podkladního kovového roštu a kotvení	m2	55,500	5 895,00	327 172,50	
	P		<i>Poznámka k položce: výměra je pohledová plocha obkladu včetně dvířek a dveří kompletní systémové řešení obkladu fasády ref. výrobek desky Fundermax 0026 Prado Alu Grey povrch NT Istr. dekor tl. 10 mm ref. výrobce roštu ETANCO včetně všech spojovacích a kotevních prostředků, pomocného montážního materiálu, výrabcem desek a roštu doporučených doplňků apod. včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
4	K	N02-R02	Příplatek za zhotovení dvířek a dveří v obkladu fasády	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: otevíravá dvířka na panelech bez uzamykání: rozměr 690 x 975 mm 1ks rozměr 1330 x 970 mm 1ks rozměr 1535 x 970 mm 1ks rozměr 1560 x 1500 mm 1ks skládací dveře: rozměr 900 x 2000 mm 2ks</i>					
5	K	N02-R03	Ocelová/dřevěná konstrukce doplňující objekty na tvar požadovaný architektem	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně všech spojovacích a kotevních prostředků, pomocného montážního materiálu apod. včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
D		N03	Střešní krytina				82 596,30	
6	K	N03-R01	Podkladní konstrukce pod krytinu	m2	12,500	1 764,00	22 050,00	
	P		<i>Poznámka k položce: výměra je půdorysná plocha střechy dřevěné impregnované trámy výšky 100 mm kladené a 625 mm včetně podstájkované pozednice pro vytvoření spádu bednění z OSB desek pro exteriér tl. 25 mm včetně všech spojovacích a kotevních prostředků, pomocného montážního materiálu apod. včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
7	K	N03-R02	Falcovaná střešní krytina z měděného plechu včetně návazností na konstrukci atiky	m2	12,500	2 963,00	37 037,50	
	P		<i>Poznámka k položce: výměra je půdorysná plocha střechy včetně podkladní smyčkové rohože, spojovacích a kotevních prostředků, pomocného montážního materiálu apod. včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
8	K	N03-R03	Oplechování atiky z měděného plechu sS 250 mm včetně podkladní konstrukce	m	14,600	1 045,00	15 257,00	
	P		<i>Poznámka k položce: výměra je celková délka atiky včetně spojovacích a kotevních prostředků, pomocného montážního materiálu apod. včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
9	K	N03-R04	Žlab z měděného plechu půlkruhový včetně háků a čel	m	5,200	734,00	3 816,80	
	P		<i>Poznámka k položce: výměra je celková délka žlabu včetně spojovacích a kotevních prostředků, pomocného montážního materiálu apod. včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
10	K	N03-R05	Švod z měděného plechu kruhový včetně objímek, kolen a odskoků	m	5,000	887,00	4 435,00	

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: výměna je celková délka svodu včetně spojovacích a kotevních prostředků, pomocného montážního materiálu apod. včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
	D	N04	Vstupní branka				378 000,00	
11	K	N04-R01	Branka z nerezového prořezávaného plechu 3800 x 2480 mm, 4dílná skládací, včetně nerez sloupků s kotvením k základovým patkám	kus	1,000	375 000,00	375 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: tvar viz v.č. D1.1B4 - Slávanka hákový zámek s cylindrickou vložkou a krytkou včetně všech spojovacích a kotevních prostředků a pomocného montážního materiálu včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
12	K	N04-R02	Výkop a betonáž základové patky 60 x 60 x 70 cm z betonu C 20/25	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
	D	N05	Pracovní lešení				1 800,00	
13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních stávek s leškovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	30,000	60,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
	D	N06	Skříňe elektro				52 000,00	
14	K	N06-R01	Revize skříní elektro: rekonstrukce vč. výměny poškozených a nebezpečných částí, mechanické ukotvení a výměna dvířek	soub	1,000	52 000,00	52 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy

Soupis:

05 - U Kotvy

KSO:

Místo: Slovanský ostrov

Zadavatel:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Uchazeč:

Projektant:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Poznámka:

Celková cena díla musí obsahovat veškeré náklady nutné k provedení a předání funkčního díla tak, jak je požadováno zadavatelem v zadávacích podmínkách výběrového řízení, a musí splňovat podmínky vymezené územním rozhodnutím a stavebním povolením. Při zpracování nabídky musí nabízející předpokládat použití veškerých zařízení a materiálů, které bude považovat za účelné nebo nezbytné, tak aby zajistil dokonalou realizaci předmětu díla vyplývající z jeho účelu a požadované funkce při zajištění potřeb. Pokud není výslovně uvedeno jinak, cenou se rozumí cena za dodávku a montáž včetně všech nezbytných pomocných, montážních a kotevních materiálů, stejně jako veškerých funkčních souvisejících prvků. Pokud jsou v této dokumentaci uvedena jména konkrétních výrobců či výrobků, znamená to specifikaci požadovaného technického standardu. Nabízené zařízení musí být s uvedeným standardem minimálně srovnatelné

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2017

IČ:

26511886

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

26511886

DIČ:

Cena bez DPH				86 500,00
DPH základní		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená		86 500,00	21,00%	18 165,00
		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	104 665,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever
Objekt: 329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy
Soupis: 05 - U Kotvy

Místo: Slovanský ostrov

Datum: 27. 4. 2017

Zadavatel: Tichý & Kolářová s.r.o. - Malástruská nám. 2, Praha 2

Projektant: Tichý & Kolářová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

N01 - Bourací práce

N02 - Vstupní branka

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever
 Objekt: 329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy
 Soupis: 05 - U Kotvy

Místo: Slovanský ostrov
 Zadavatel: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3
 Uchazeč:

Datum: 27. 4. 2017
 Projektant: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							86 500,00	
D		N01	Bourací práce				2 310,00	
1	K	N01-R01	Odstranění stávajících konstrukcí pro reklamní poutače	kus	1,000	450,00	450,00	
	P		<i>Poznámka k položce: demontáž konstrukcí včetně kotvení, naložení, odvoz a uložení vyb. hmot na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkovného) včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
2	K	N01-R02	Odstranění stávající ocelodřevěné vstupní branky	kus	1,000	860,00	860,00	
	P		<i>Poznámka k položce: demontáž branky včetně kotvení, naložení, odvoz a uložení vyb. hmot na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkovného) včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
3	K	N01-R03	Zařízení stávajícího zábradlí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: úprava dle potřeby - odříznutí u sloupku branky, odstranění sloupků včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
D		N02	Vstupní branka				84 190,00	
4	K	N02-R01	Branka z nerezového prořezávaného plechu 1630 x 850 mm, 2dílná otevíravá, včetně nerez sloupků 60 x 40 x 3 mm s kotvením k základovým patkám	kus	1,000	69 870,00	69 870,00	
	P		<i>Poznámka k položce: tvor viz v.č. D1.1B5 - Branky k půjčovným lodičkám zámek s cylindrickou vložkou a krytkou, nerez posuvná západka včetně všech spojovacích a kotevních prostředků a pomocného montážního materiálu včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
5	K	N02-R02	Opláštění čela stávajícího sloupku nerezovým plechem navazujícím na nový nerezový sloupek branky	kus	2,000	5 660,00	11 320,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně všech spojovacích a kotevních prostředků a pomocného montážního materiálu včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
6	K	N02-R03	Výkop a betonáž základové patky 40 x 42 x 65 cm z betonu C 20/25	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy

Soupis:

06 - S.P.L.A.V.

KSO:

Místo: Slovanský ostrov

Zadavatel:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Uchazeč:

Projektant:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2017

IČ:

26511886

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

26511886

DIČ:

Poznámka:

Celková cena díla musí obsahovat veškeré náklady nutné k provedení a předání funkčního díla tak, jak je požadováno zadavatelem v zadávacích podmínkách výběrového řízení, a musí splňovat podmínky vymezené územním rozhodnutím a stavebním povolením. Při zpracování nabídky musí nabízející předpokládat použití veškerých zařízení a materiálů, které bude považovat za účelné nebo nezbytné, tak aby zajistil dokonalou realizaci předmětu díla vyplývající z jeho účelu a požadované funkce při zajištění potřeb. Pokud není výslovně uvedeno jinak, cenou se rozumí cena za dodávku a montáž včetně všech nezbytných pomocných, montážních a kotevnicích materiálů, stejně jako veškerých funkčních souvisejících prvků. Pokud jsou v této dokumentaci uvedena jména konkrétních výrobců či výrobků, znamená to specifikaci požadovaného technického standardu. Nabízené zařízení musí být s uvedeným standardem minimálně srovnatelné

Cena bez DPH

135 300,00

DPH základní
snižena

Základ daně

135 300,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

28 413,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

163 713,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt: 329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy

Soupis: 06 - S.P.L.A.V.

Místo: Slovanský ostrov

Zadavatel: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Uchazeč:

Datum: 27. 4. 2017

Projektant: Tichý & Kolářová
s.r.o., Hollarovo nám.

Kód dílu · Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

135 300,00

N01 - Bourací práce

4 580,00

N02 - Vstupní branka

130 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever
 Objekt: 329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy
 Soupis: 06 - S.P.L.A.V.

Místo: Slovanský ostrov
 Zadavatel: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3
 Uchazeč:

Datum: 27. 4. 2017
 Projektant: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							135 300,00	
	D	N01	Bourací práce				4 580,00	
1	K	N01-R01	Odstranění stávajících konstrukcí pro reklamní poutače <i>Poznámka k položce: demontáž konstrukcí včetně kotvení, naložení, odvoz a uložení vyb. hmot na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkovného) včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>	kus	2,000	450,00	900,00	
2	K	N01-R02	Odstranění stávající ocelové vstupní branky <i>Poznámka k položce: demontáž branky včetně kotvení, naložení, odvoz a uložení vyb. hmot na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkovného) včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>	kus	2,000	860,00	1 720,00	
3	K	N01-R03	Odstranění stávajícího trubkového zábradlí <i>Poznámka k položce: demontáž zábradlí včetně kotvení, naložení, odvoz a uložení vyb. hmot na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkovného) včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>	kus	1,000	1 960,00	1 960,00	
	D	N02	Vstupní branka				130 720,00	
4	K	N02-R01	Branka z nerezového prořezávaného plechu 1450 x 830 mm, 1dílná otevíravá, včetně nerez sloupků 30 x 30 x 3 mm s kotvením ke zděným sloupkům zábradlí <i>Poznámka k položce: tvar viz v.č. D1.1B5 - Branky k půjčovněm lodiček zámek s cylindrickou vložkou a krytkou, nerez posuvná západka včetně všech spojovacích a kotevních prostředků a pomocného montážního materiálu včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>	kus	2,000	65 360,00	130 720,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy

Soupis:

07 - Na řece

KSO:

Místo: Slovanský ostrov

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2017

Zadavatel:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3

Uchazeč:

Projektant:

Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3


Poznámka:

Celková cena díla musí obsahovat veškeré náklady nutné k provedení díla požadováno zadavatelem v zadávacích podmínkách výběrového řízení v územním rozhodnutí a stavebním povolením. Při zpracování nabídky musí být uvedeny veškerých zařízení a materiálů, které bude považovat za účelné na realizaci předmětu díla vyplývající z jeho účelu a požadované funkce. Pokud je uvedeno jinak, cenou se rozumí cena za dodávku a montáž včetně kotevnic materiálů, stejně jako veškerých funkčních souvisejících materiálů. Jména konkrétních výrobců či výrobků, znamená to specifikací požadovaných zařízení musí být s uvedeným standardem minimálně srovnatelné.

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

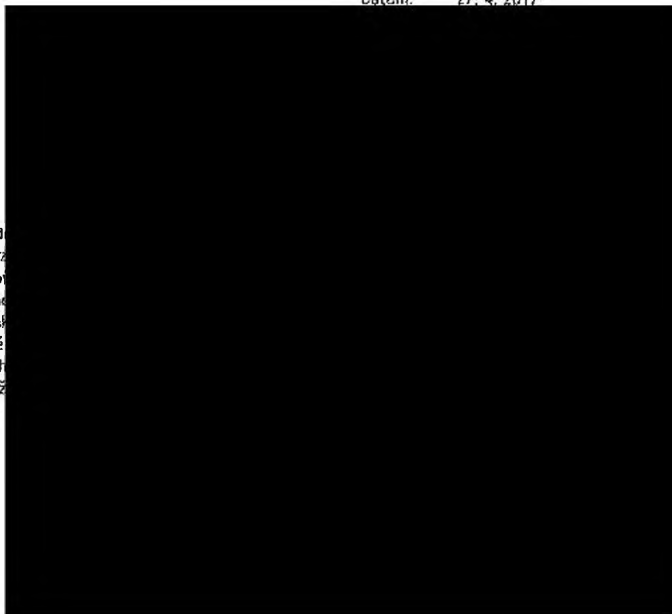

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever
Objekt: 329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy

Soupis: **07 - Na řece**

Místo: Slovanský ostrov
Zadavatel: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3
Uchazeč:

Datum: 27. 4. 2017
Projektant: Tichý & Kolářová
s.r.o., Hollarovo nám.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	81 530,00
N01 - Bourací práce	3 210,00
N02 - Vstupní branka	78 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever
 Objekt: 329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy
 Soupis: 07 - Na řece

Místo: Slovanský ostrov
 Zadavatel: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3
 Uchazeč:

Datum: 27. 4. 2017
 Projektant: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám.

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							81 530,00	
D		N01	Bourací práce				3 210,00	
1	K	N01-R01	Odstranění stávajících konstrukcí pro reklamní poutače	kus	3,000	450,00	1 350,00	
	P		<i>Poznámka k položce: demontaž konstrukcí včetně kotvení, naložení, odvoz o uložení vyb. hmot na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkového) včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
2	K	N01-R02	Odstranění stávající ocelové vstupní branky	kus	1,000	860,00	860,00	
	P		<i>Poznámka k položce: demontaž branky včetně kotvení, naložení, odvoz o uložení vyb. hmot na skládce, včetně poplatku za skládku (skládkového) včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
3	K	N01-R03	Zařízení stávajícího zábradlí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: úprava dle potřeby - odříznutí žstí ocelového zábradlí přesahující přes opěrnou zeď včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
D		N02	Vstupní branka				78 320,00	
4	K	N02-R01	Branka z nerezového prořezávaného plechu 1180 x 1220 mm, 2dílná otevíravá, včetně nerez sloupků 60 x 40 x 3 mm s kotvením ke stávající opěrné stěně	kus	1,000	78 320,00	78 320,00	
	P		<i>Poznámka k položce: tvar viz v.č. D1.1B5 - Branky k půjčovnám lodíček zámek s cylindrickou vložkou a krytkou, nerez posuvná západka včetně všech spojovacích a kotvicích prostředků a pomocného montážního materiálu včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt:

329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy

Soupis:

OB - Informační systém

KSO:

Místo: Slovanský ostrov

Zadavatel:

Tichý & Kolářová s.r.o., Holčarovo nám. 2, Praha 3

Uchazeč:

Projektant:

Tichý & Kolářová s.r.o., Holčarovo nám. 2, Praha 3

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2017

IČ:

26511886

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

26511886

DIČ:

Poznámka:

Celková cena díla musí obsahovat veškeré náklady nutné k provedení a předání funkčního díla tak, jak je požadováno zadavatelem v zadávacích podmínkách výběrového řízení, včetně všech potřebných územních rozhodnutí a stavebních povolení. Při zpracování návrhu musí být uvedeny všechny funkční zařízení a materiály, které bude považovat za účelné a nezbytné pro realizaci předmětu díla vyptývajících z jeho účelu a požadované funkčnosti. Pokud bude uvedeno jinak, cenou se rozumí cena za dodávku a montáž včetně všech potřebných kotevnicích materiálů, stejně jako veškerých funkčních souvisejících materiálů. Jména konkrétních výrobců či výrobků, znamená to specifikaci a výběr konkrétního zařízení musí být s uvedeným standardem minimálně srovnatelný.

Cena bez DPH

DPH základní
snížení

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever

Objekt: 329e Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy

Soupis: **08 - Informační systém**

Místo: Slovanský ostrov

Zadávatel: Tichý & Kolářová s.r.o., Holčarovo nám. 2, Praha 3

Uchazeč:

Datum: 27. 4. 2017

Projektant: Tichý & Kolářová
s.r.o., Holčarovo nám.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

306 000,00

N01 - Informační systém

306 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever
 Objekt: 329e - Severozápadní a severní opěrné stěny a vstupy
 Soupis: 08 - Informační systém

Místo: Slovanský ostrov
 Zadavatel: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3
 Uchazeč:


Datum: 27. 4. 2017
 Projektant: Tichý & Kolářová s.r.o., Hollarovo nám.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							306 000,00	
D		N01	Informační systém				306 000,00	
1	K	N01-R01	Panel infosystému "SLOVANSKÝ OSTROV NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD"	kus	1,000	119 600,00	119 600,00	
	P		<i>poznámka k položce: rozměry a provedení viz v.č. D1.186 - INFOSYSTÉM nosná konstrukce je tvořena dvěma L profily katvenými přes patní piech k betonovému základu mezi ně je vevázaná nerezová deska s gravitovanou a dobarvovanou infografikou a texty. sloupky dluž desku na dvě části, vlevo od sloupku je v úřim pruhu vyřinuté logo Prah 1 a pod ním jsou umístěné piloty, vpravo je hlavní informační plocha výroba, dodávka a montáž prvku včetně výkopu a betonáže základové patky včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
2	K	N01-R02	Panel infosystému "SLOVANKA"	kus	1,000	46 600,00	46 600,00	
	P		<i>poznámka k položce: rozměry a provedení viz v.č. D1.186 - INFOSYSTÉM konstrukční princip dle jako panel "SLOVANSKÝ OSTROV NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD" výroba, dodávka a montáž prvku včetně výkopu a betonáže základové patky včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
3	K	N01-R03	Panel infosystému "U KOTVY"	kus	1,000	46 600,00	46 600,00	
	P		<i>poznámka k položce: rozměry a provedení viz v.č. D1.186 - INFOSYSTÉM konstrukční princip dle jako panel "SLOVANSKÝ OSTROV NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD" výroba, dodávka a montáž prvku včetně výkopu a betonáže základové patky včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
4	K	N01-R04	Panel infosystému "S.P.L.A.V."	kus	1,000	46 600,00	46 600,00	
	P		<i>poznámka k položce: rozměry a provedení viz v.č. D1.186 - INFOSYSTÉM konstrukční princip dle jako panel "SLOVANSKÝ OSTROV NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD" výroba, dodávka a montáž prvku včetně výkopu a betonáže základové patky včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					
5	K	N01-R05	Panel infosystému "NA ŘECE"	kus	1,000	46 600,00	46 600,00	
	P		<i>poznámka k položce: rozměry a provedení viz v.č. D1.186 - INFOSYSTÉM konstrukční princip dle jako panel "SLOVANSKÝ OSTROV NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD" výroba, dodávka a montáž prvku včetně výkopu a betonáže základové patky včetně mimostaveništní dopravy, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace</i>					

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka na poskytnutí služeb podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách		VZ, kterou zadavatel zadal, resp. část, kterou zadavatel tímto prokazuje
„Slovanský ostrov“		
1.	<p>Obchodní firma nebo název obchodní firmy nebo jméno a příjmení:</p> <p>Sídlo / Místo podnikání, místo trvalého pobytu:</p> <p>IČO:</p> <p>Osoba oprávněná jednat jménem obchodní firmy nebo jméno a příjmení:</p> <p>Spisová značka v obchodním rejstříku:</p> <p>Tel./fax:</p> <p>E-mail:</p>	<p>úpravy</p>
2.	<p>Obchodní firma nebo název obchodní firmy nebo jméno a příjmení:</p> <p>Sídlo / Místo podnikání, místo trvalého pobytu:</p> <p>IČO:</p> <p>Osoba oprávněná jednat jménem obchodní firmy nebo jméno a příjmení:</p> <p>Spisová značka v obchodním rejstříku:</p> <p>Tel./fax:</p> <p>E-mail:</p>	<p>erné stěny</p>

Dodavatelé a poddodavatelé a z jejich části vlastními jmény a jmény svých poddodavatelů a z jejich části budou zodpovědní za plnění této veřejné zakázky bude odsouhlasena zadavatelem.

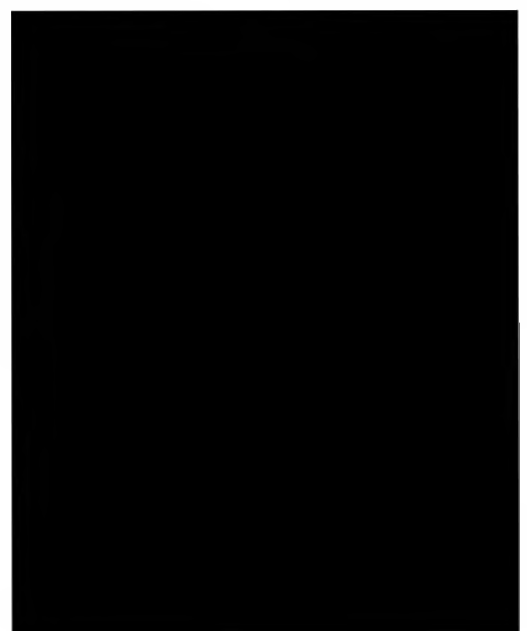

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná,

Firma: **INPROS PRAHA a.s.**
 se sídlem: **Praha 4, Braník, Ke Krči 28/735, PSČ 147 00**
 IČ: **47114444**
 zapsaná v OR **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20074**

zastoupena Josefem Přitasilem, statutárním ředitelem,


z m o c ň u j i

Jméno a příjmení: **Ing. Tomáš Přitasil**
 datum narození: **7. října 1972**
 bytem: **Štětkova 1624/1, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00**
 člen správní rady INPROS PRAHA a.s.,

aby společnost ve všech záležitostech zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, žádosti a stížnosti, uzavíral smlouvy, smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námítky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, a to včetně zastupování v řízení před soudy a jinými orgány státní správy a místní samosprávy, bez omezení.

Touto plnou mocí společnost zmocňuje zmocněnce též jako svého zaměstnance v rozsahu ustanovení §166 Občanského zákoníku a též jako smluvního zástupce v rozsahu ustanovení §443 Občanského zákoníku. Veškeré zmocnění je bez omezení a nevztahuje se ke konkrétnímu právnímu jednání.

V Praze dne 20. října 2014


 INPROS PRAHA a.s.
 Josef Přitasil, statutární ředitel

Zmocnění přijímám:


 Ing. Tomáš Přitasil

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
 poř.č. legalizace VIII/2741/2014
 vlastnoručně podepsal/a

Josef Přitasil, 14.12.1949, Praha

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Praha 4, Nusle, Štětkova 1624/1

adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz 203123101

druh a číslo dokladu na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této

ověřovací doložce

V Praze 4 dne 20.10.2014

Legalizaci provedl/a
 Boris Poláček



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
 poř.č. legalizace VIII/2751/2014
 vlastnoručně podepsal/a

Tomáš Přitasil, 7.10.1972, Praha

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Praha 4, Nusle, Štětkova 1624/1

adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz 201306632

druh a číslo dokladu na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této

ověřovací doložce

V Praze 4 dne 20.10.2014

Legalizaci provedl/a
 Boris Poláček

