

Smlouva o dílo

uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci

„Průchod územím Lysolajského potoka – 4. úsek“

ČL.I .	SMLUVNÍ STRANY	2
ČL.II .	PŘEDMĚT DÍLA	2
ČL.III .	TERMÍNY PLNĚNÍ	3
ČL.IV .	CENA DÍLA	4
ČL.V .	PLATEBNÍ PODMÍNKY	4
ČL.VI .	MÍSTO PLNĚNÍ	5
ČL.VII .	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	5
ČL.VIII .	SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY	6
ČL.IX .	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	6
ČL.X .	ZÁRUKY	7
ČL.XI .	OSTATNÍ UJEDNÁNÍ	7
ČL.XII .	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	8

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LYSOLAJE**

se sídlem: Kovářenská 8/5, 165 00 Praha-Lysolaje

IČ: 00231207

DIČ: CZ00231207

zastoupená: Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty

2. Zhotovitel: **JAPS TEN, s.r.o.**

IČ: 290 40 582 DIČ: CZ29040582

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 162073

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2136283379/0800

zastoupená: Petr Shejbal, jednatel

PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje provést na své náklady a riziko dílo, kterým je **Průchod územím Lysolajského potoka - 4. úsek**, v rozsahu daném zadávacími podklady, kterými jsou:
 - a) projektová dokumentace, která tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy
 - b) specifikace ceny, která tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům. Zhotovitel se dále zavazuje, že podklady uvedené v bodě 1. neposkytne žádnému dalšímu subjektu pro jiný účel než zhotovení díla, nebude vytvářet kopie takových podkladů, veškeré poskytnuté originály vrátí do termínu dokončení díla uvedeného v této smlouvě, pokud nebudou prokazatelně spotřebovány, a zároveň zničí veškeré případné kopie.

2. Zhotovitel zadávací podklady zkontroloval a odsouhlasil a potvrzuje, že jim plně porozuměl a že jsou úplným podkladem pro kompletní zhotovení díla. V případě, že zhotovitel po podpisu této smlouvy a v průběhu provádění díla zjistí eventuální rozdíly mezi jednotlivými částmi zadávacích podkladů, nebudou tyto rozdíly důvodem pro změnu ceny díla. Zhotovitel se rovněž seznámil s místem, kde bude dílo realizováno a všemi okolnostmi realizace díla. Objednatel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje dílo převzít a zaplatit.

Místem plnění je: Břeh Lysolajského potoka na pozemcích parc .č. 554/1, 13/3 a 10 k. ú. Lysolaje

3. Součástí díla jsou dále:
 - i) veškeré nutné pomocné a přidružené činnosti a práce, zkoušky a revize spojené s komplexním a bezvadným provedením díla, jeho předáním a zprovozněním,
 - ii) předání 3 paré tištěné a 1 CD s digitální verzí dokumentace skutečného provedení díla v souladu s vyhláškou 499/2006, Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby, v platném znění. Všechny části a přílohy projektu skutečného provedení díla budou označeny razítkem a podpisem odpovědného pracovníka zhotovitele,
 - iii) předání všech návodů, záručních listů, atestů, revizních zpráv atd, vše v českém jazyce, které objednatel upřesní v průběhu realizace díla,
4. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavky objednatele na změny díla (zvětšení nebo zmenšení rozsahu díla, změna standardu výrobků a materiálů). Změny díla budou řešeny výhradně v souladu s prováděcí přílohou této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako **příloha č. 4.**
5. Zhotovitel provede a dokončí dílo v souladu s veškerými platnými právními, technologickými a technickými předpisy a normami. Za jakékoliv porušení právních předpisů v souvislosti s provedením díla (včetně předpisů požární ochrany a BOZP) nese zhotovitel bezvýhradnou odpovědnost. Zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi zadávacími podklady, nebo požadavky objednatele na straně jedné a právními nebo technickými předpisy a normami na straně druhé, je povinen na toto okamžitě písemně upozornit objednatele.
6. Zhotovitel je dále povinen a zavazuje se zhotovit dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených touto smlouvou a předat jej Objednateli ve sjednaném termínu.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provádění díla v místě plnění: **od 1.7.2018**
2. Dílo bude dokončeno a předáno: **do 15. 9. 2018**
3. Zhotovitel se zavazuje upravit termínový postup provádění díla dle pokynů objednatele, uvedených v zápisech ve stavebním deníku, v zápisech z jednání a z kontrolních dnů.

CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednaly dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění pevnou a nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	1.382.703,72 Kč
Základna pro DPH 15 %	0,- Kč
Základna pro DPH 21 %	1.382.703,72 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
DPH 21 %	290.367,78,- Kč
Celkem cena díla v Kč včetně DPH	1.673.071,50 Kč

2. Cena je rozepsána do položek prací a dodávek v **příloze č. 2**. Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je uvedena orientačně a bude zhotovitelem účtována dle předpisů, platných v den zdanitelného plnění. Zhotovitel zaručuje úplnost položek a prací uvedených v **příloze č. 2** ve smyslu ust. § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným provedením díla, jeho předáním a zprovozněním. Do ceny díla zakalkuloval zhotovitel veškeré inflační a kursovní vlivy a rizika pro celou dobu provádění díla.
5. Prodloužení termínu dokončení díla z důvodu na straně objednatele, uvedeného v **článku Termíny plnění, odst. 1** o dobu kratší než 1 měsíce není důvodem pro změnu ceny díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul všechny podmínky místa plnění a realizace díla, které má zkušený zhotovitel odůvodněně předvídat.
7. Na cenu díla nemají vliv eventuální, později zjištěné rozdíly mezi zadávacími podklady.
8. Cena díla dle **odst. 1** tohoto článku, může být zvýšena, pouze pokud objednatel písemně požádá o zvětšení rozsahu prací nad rámec této smlouvy a dojde k uzavření dodatku k této smlouvě obsahující dohodu o nové výši ceny díla. Objednatel není povinen uhradit vícepráce, které písemně neobjednal a nevyžádal.
9. Cena díla bude snížena, pokud dílo z jakéhokoliv důvodu nebude provedeno v celém rozsahu. Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny, uvedené v **příloze č. 2**. Pokud **příloha č. 2** neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude zhotovitelem navržena objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Po konečném převzetí díla objednatelem, vystaví zhotovitel SPPD, v kterém zhotovitel vyúčtuje celkovou cenu díla. Na základě odsouhlaseného SPPD, podepsaného oprávněným

zástupcem objednatele, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, jejíž přílohou bude odsouhlasený SPPD a odešle ji poštou na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví smlouvy. Objednatel uhradí konečnou fakturu zhotovitele do výše 90ti % částky, na kterou bude vystavena, zbylých 10 % částky bude objednatelem zadrženo do odstranění případných vad a nedodělků.

2. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele ve lhůtě do 15 kalendářních dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se rozumí datum odepsání úhrady z účtu objednatele. V případě prodlení s úhradou faktury nebo její části, může zhotovitel účtovat úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení je stanovena nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
3. Zádržné dle **odst. 1 a 2** tohoto článku bude uhrazeno následovně:
 - a) 10 % bude uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla a to na základě písemné žádosti zhotovitele,
 - b) Zádržné bude poukázáno zhotoviteli do 30ti dnů po obdržení jeho písemné žádosti.
4. Veškeré faktury zhotovitele musí splňovat a obsahovat náležitosti, dané příslušnými daňovými předpisy a musí obsahovat jako přílohu SPPD, potvrzený pověřeným pracovníkem objednatele. V opačném případě má objednatel právo fakturu vrátit zhotoviteli. Splatnost opravené faktury počíná běžet dnem jejího opětovného doručení objednateli.
5. Objednatel má právo provést zápočet svých pohledávek za zhotovitelem proti kterémukoliv závazku vůči zhotoviteli.
6. Eventuální vícepráce má zhotovitel právo fakturovat samostatnými fakturami až po podpisu dodatku smlouvy, po převzetí díla objednatelem a po vystavení a schválení soupisu provedených prací.
7. Splatnost oprávněně vystavených faktur, kterými budou smluvní strany eventuálně účtovat smluvní pokuty, úroky z prodlení, škody, služby a přeúčtování nákladů je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.

MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění (pracoviště) v termínu do 1. 7. 2018.
2. Zhotovitel bude udržovat místo plnění čisté a v náležitém pořádku a bude průběžně odstraňovat na své náklady veškeré odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla. V případě neplnění této povinnosti, zajistí úklid objednatel. Náklady spojené s úklidem vyúčtuje objednatel zhotoviteli.
3. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a požární ochranu v místě plnění.
5. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání místa plnění je povinen dodržovat veškeré právní, bezpečnostní a hygienické předpisy a opatření.
6. Objednatel nenese zodpovědnost za zhotovitelův dosud nezabudovaný materiál a dodávky, uskladněné na místě plnění.
7. Zhotovitel vyklidí místo plnění v den převzetí díla objednatelem.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Podmínkou pro převzetí díla je, že dílo je řádně dokončeno a provedeno podle projektové dokumentace a jejich eventuálních změn a dodatků, podle platných technických norem a této smlouvy a jejich eventuálních dodatků.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které má vady a/nebo nedodělky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a/nebo nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne nahlášení vady a/nebo nedodělku zhotoviteli objednatelem.
3. Dílo se považuje za dokončené a objednatelem převzaté podpisem protokolu o předání a převzetí díla pověřenými pracovníky obou smluvních stran.

SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY

1. Za nesplnění termínu dokončení díla dle této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny díla za každý den prodlení.
2. Za nesplnění termínu předání místa plnění zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,-Kč** za každý den prodlení.
3. Za nesplnění termínu odstranění vad z protokolu o předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel smluvní pokutu **1.000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
4. Pokud vznikne objednateli škoda v souvislosti s porušením jakýchkoliv právních předpisů zhotovitelem, je zhotovitel povinen takovou škodu objednateli nahradit.
5. Zhotovitel nese od doby předání místa plnění do doby protokolárního předání díla jako celku, nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných a uskladňovaných částech,
6. Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po dohodě od výše uvedených smluvních pokut ustoupit.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Pokud zhotovitel poté, co obdržel písemnou výzvu objednatele ke zjednání nápravy v plnění smlouvy, tuto nápravu do **3 dnů** od převzetí výzvy neprovede, může objednatel odstoupit od smlouvy, zejména pak v následujících případech:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, pokyny objednatele, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy,
 - b) zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně nedodržuje některý ze svých závazků podle smlouvy,
 - c) bylo rozhodnuto o vstupu zhotovitele do likvidace,
 - d) na zhotovitele byl podán návrh na zahájení insolventního řízení.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy:
 - a) je zhotovitel povinen do **2 dnů** vyklidit místo plnění,
 - b) je zhotovitel povinen do **5ti dnů** předložit objednateli vyúčtování skutečně provedených prací a poskytnutých plateb,
 - c) je zhotovitel povinen do **2 dnů** předat objednateli doklady za dosud provedenou část díla,
 - d) je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním závazku zhotovitele.

ZÁRUKY

1. Zhotovitel poskytne na předané dílo záruku v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. To platí i pro kusové dodávky. Zhotovitel ručí po celou dobu záruky za to, že dílo a jeho jednotlivé části budou mít funkčnost, vlastnosti, kvalitu a parametry dané projektovou dokumentací, touto smlouvou a technickými normami.
2. Pokud se v průběhu záruční doby vyskytnou na díle vady, na které se dle této smlouvy vztahuje záruka, zavazuje se zhotovitel na své náklady tyto vady odstranit v termínu, stanoveném objednatelem.
3. Objednatel uplatní vady v záruční lhůtě reklamačním dopisem, ve kterém specifikuje vadu a stanoví termín jejího odstranění.
4. V případě, že objednatel svolá k řešení reklamace jednání, je zhotovitel povinen dostavit se k reklamačnímu jednání na místo a v termínu, určeném objednatelem.
5. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z ustanovení **odst. 2. a odst. 3.** tohoto článku, má objednatel právo sjednat na odstranění vady jiného zhotovitele a náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit.
6. Ode dne doručení oprávněné reklamace se přerušuje běh záruční doby, týkající se reklamované části díla a pokračuje až dnem řádného odstranění vady.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci dle **přílohy č. 1** v jednom vyhotovení v den podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele a ve stanoveném termínu předložit bezplatně vzorky materiálů, výrobků nebo příslušné katalogy a technické specifikace, a to v cenovém standardu, uvedeném v zadávacích podkladech.
3. V případě, že zhotovitel bude:
 - a) v prodlení s prováděním nebo s dokončením díla oproti termínům, uvedeným v této smlouvě a ani na písemnou výzvu objednatele nesjedná nápravu,
 - b) provádět dílo v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo platnými technickými normami,

má objednatel právo sjednat na dokončení díla nebo jeho části jiného zhotovitele.
Náklady s tím spojené vyúčtuje objednatel zhotoviteli.
4. Zhotovitel je při provádění díla zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) svých zaměstnanců, požární ochranu (PO) na montážním pracovišti, dodržování veškerých předpisů **BOZP, PO** a je povinen proškolit své pracovníky v oblasti **BOZP** a **PO** na konkrétní podmínky místa plnění.
5. Zhotovitel je po celou dobu provádění díla v plném rozsahu odpovědný za:
 - a) způsobení škody na nemovitém nebo movitém majetku odlišném od díla, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla,
 - b) vznik škody na díle a materiálu v místě plnění způsobené požárem, nebo v souvislosti s prováděním díla,
 - c) újmu na zdraví způsobenou osobám, ke které by mohlo dojít v souvislosti s prováděním díla;

6. zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou adekvátní pojistnou smlouvy pro případ způsobení škody třetím stranám, a to v rozsahu odpovídajícímu výši možné škody, kterou by mohl zhotovitel svou činností dle této smlouvy způsobit.
7. Oprávněným zástupcem objednatele je ve věcech technických: Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty, která je oprávněná zastupovat objednatele v tomto rozsahu:
 - kontrolou provádění díla a vydáváním pokynů k jeho provádění
 - jednáním se zhotovitelem stran plnění této smlouvy
 - potvrzením soupisu provedených prací, kontrolou faktur
 - převzetím díla
8. Oprávněným zástupcem zhotovitele je Petr Shejbal, jednatel, který je oprávněn zastupovat zhotovitele v tomto rozsahu:
 - řízením provádění prací a jejich kontrolou
 - jednáním s objednatelem stran plnění této smlouvy
 - vystavování podkladů pro fakturaci
 - odsouhlasením změn předmětu, ceny a termínu díla
 - předáním díla.
9. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí své pohledávky za objednatelem vzniklé z tohoto smluvního vztahu třetím osobám.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatních souvisejících právních předpisů České republiky.
2. Pokud při plnění této smlouvy vznikne mezi smluvními stranami spor, bude řešen následovně:
 - a) smířčím jednáním smluvních stran,
 - b) respektováním rozhodnutí společně stanoveného experta,
 - c) rozhodnutím příslušného soudu.
3. Smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího souhlasu protistrany poskytovat jakékoliv informace stran tohoto smluvního vztahu třetím osobám. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele je považováno za podstatné porušení smluvních povinností.
4. Smlouvu je možno změnit pouze písemnými číslovanými dodatky smlouvy, oboustranně podepsanými statutárními zástupci smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve **2 výtiscích** s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po **1 výtisku**.
6. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti eventuální předchozí ujednání a dokumenty stran předmětu plnění a tato smlouva je jediným platným dokumentem, kterým se řídí vztah smluvních stran.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
 - č.1 – Projektová dokumentace** (není pevně spojena se smlouvou)
 - č.2 – Specifikace ceny**
 - č.3 – Harmonogram prací**
 - č.4 – Metodika projektového řízení**

- V případě rozporu mezi zněním smlouvy a zněním výše uvedených příloh má přednost smlouva.

Podpisem této smlouvy potvrzují smluvní strany i platnost těchto příloh.

V Praze dne 29. 06. 2018

V Praze dne 29. 06. 2018

za zhotovitele

za objednatele


JAPS TEN
Lysolajské údolí 18/35
165 00 Praha 6
DIČ: CZ29040582

Petr Shejbal
jednatel



Ing. Dana Malečková
zástupkyně starosty

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (není pevně spojena se smlouvou)



**Veřejná zakázka
„Chodník při komunikaci Štěpnice“
Smlouva o dílo**

Příloha č. 2 - Specifikace ceny (výkaz výměr)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 180522
PRŮCHOD ÚZEMÍM LYSOLAJSKÉHO POTOKA 4. ÚSEK

Město: Lysolaje

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2018

Městská část Praha - Lysolaje

IČ:
DIČ:

JAPS TEN s.r.o.

IČ:
DIČ:

EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o.

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 382 703,72
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	1 382 703,72

1 382 703,72 1 382 703,72
0,00 0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 673 071,50
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

180522

Stavba: PRŮCHOD ÚZEMÍM LYSOLAJSKÉHO POTOKA 4. ÚSEK

Lysolaje

Datum: 22. 5. 2018

Městská část Praha - Lysolaje
JAPS TEN s.r.o.

Projektant: EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 382 703,72	1 673 071,50
180522	PRŮCHOD ÚZEMÍM LYSOLAJSKÉHO POTOKA 4. ÚSEK	1 382 703,72	1 673 071,50
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 382 703,72	1 673 071,50

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PRŮCHOD ÚZEMÍM LYSOLAJSKÉHO POTOKA 4. ÚSEK

Místo: Lysolaje
Městská část Praha - Lysolaje
JAPS TEN s.r.o.

Datum: 22. 5. 2018
Projektant: EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o.
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem:[CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 382 703,72

HSV - Práce a dodávky HSV

1 329 522,81

1 - Zemní práce	609 783,72
4 - Vodorovné konstrukce	45 946,10
5 - Komunikace pozemní	133 647,57
5.1 - Cesta z kačírku	127 408,38
5.2 - Zámková dlažba	6 239,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	194 300,91
998 - Přesun hmot	345 844,51

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

53 180,91

VRN3 - Zařízení staveniště

53 180,91

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 382 703,72

ROZPOČET

Stavba: PRŮCHOD ÚZEMÍM LYSOLAJSKÉHO POTOKA 4. ÚSEK

Lysolaje

Datum: 22. 5. 2018

Městská část Praha - Lysolaje
JAPS TEN s.r.o.

Projektant: EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 382 703,72

HSV - Práce a dodávky HSV

1 329 522,81

1 - Zemní práce

609 783,72

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	289,850	120,00	34 782,00
2	K	122107R.01	Odkopávky nezapažené terénní, ve svahu a pro zámkovou dlažbu	m3	111,399	760,00	84 663,24
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	169,369	280,00	47 423,32
4	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	677,476	120,00	81 297,12
5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	164,203	184,32	30 265,24
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	164,203	72,05	11 830,83
7	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	5,166	115,87	598,61
8	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	82,000	45,63	3 741,50
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	164,203	19,46	3 195,23
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	295,565	290,00	85 715,03
11	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	82,000	38,67	3 170,53
12	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,230	127,47	156,79
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	243,970	32,22	7 860,47
14	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	82,000	54,13	4 438,74
15	K	18230311R.02	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách rovina ve svahu do 1:1	m2	30,000	63,93	1 917,96
16	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	10,500	675,38	7 091,47
17	K	18260111R.03	Obrovnávka svahů násypů a obrubníků z kamene tl do 500 mm	m2	105,420	621,25	65 491,86
18	M	583PC.01	kámen lomový - terasa, obruby a stabilizační prahy	t	63,252	1 933,35	122 288,19
19	K	184103R.04	Výsadba keřů s balem	kus	11,000	322,22	3 544,45
20	K	184R.05	Ochrana stromů	kus	16,000	644,45	10 311,14

4 - Vodorovné konstrukce

45 946,10

21	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	373,740	52,71	19 700,58
22	M	69311083	geotextilie netkaná PP 600g/m2	m2	448,488	58,52	26 245,52

5 - Komunikace pozemní

133 647,57

5.1 - Cesta z kačírku

127 408,38

23	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	161,970	324,80	52 607,37
24	K	57190811R.06	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 50 mm	m2	161,970	127,60	20 667,37
25	K	59691111R.07	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	644,45	12 888,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	583PC.02	šlapáčky ds=80-50cm (do 100kg)	kus	20,000	2 062,24	41 244,72
5.2 - Zámková dlažba							6 239,19
27	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 150 mm	m2	7,400	206,23	1 526,09
28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,400	364,76	2 699,22
29	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	7,622	264,22	2 013,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							194 300,91
30	K	9R.08	Vybourání části zídek u napojení cesty vč. odvozu na skládku a likvidace	m	6,500	1 933,35	12 566,77
31	K	936124R.09	Přesunutí lavičky	kus	1,000	1 288,89	1 288,89
32	K	9R.10	Vyčištění svahu od odpadů	kpl	1,000	64 444,60	64 444,60
33	K	9R.11	Vyčištění koryta od odpadů	kpl	1,000	116 000,65	116 000,65
998 - Přesun hmot							345 844,51
34	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	238,021	1 453,00	345 844,51
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							53 180,91
VRN3 - Zařízení staveniště							53 180,91
35	K	030001000	Zařízení staveniště	%	4,000	13 295,23	53 180,91



**Veřejná zakázka
„Chodník při komunikaci Štěpnice“
Smlouva o dílo**


Příloha č. 3 – Harmonogram prací (doplň uchazeč)

Harmonogram stavby: „Přechod územím Lysolajského potoka – 4. úsek“

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE

Uchazeč: JAPS TEN, s.r.o.

Zahájení 02. 07. 2018 ukončení nejpozději do 31. 08. 2018

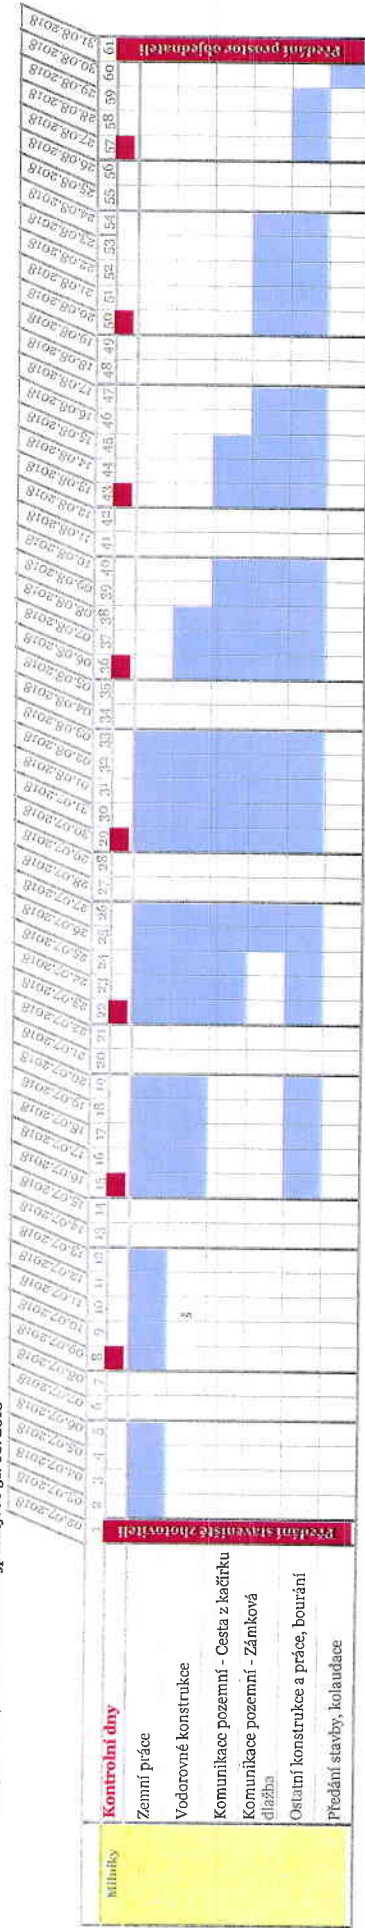

Harmonogram může být upraven v závislosti na počasí a aktuálních klimatických podmínkách s výhledem na stavební práce a jejich technologické postupy.



Příloha č. 4 - Metodika projektového řízení

Zúčastněné strany definice

Název & adresa

Osoby

Telefon&fax

OBJEDNATEL (stavebník, investor)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE

územně samosprávný celek

se sídlem Praha – Lysolaje, Kovářenská 8/5, PSČ 165 00

IČ: 00 231 207

Telefon: 220 921 959

E-mail: umc@praha-lysolaje.cz

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

Ing. Petr Hlubuček, starosta; email: petr.hlubucek@praha-lysolaje.cz, tel: [REDACTED]

Ing. Dana Malečková, místostarostka; email: danamaleckova@seznam.cz tel: [REDACTED]
[REDACTED]

ZHOTOVITEL: Petr Shejbal, jednatel; email: shejbal@japsten.cz, tel: [REDACTED]
[REDACTED]



**OZNÁMENÍ ZMĚNY
OCENĚNÍ ZMĚNY
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ**

4.0

1. Veškeré změny rozsahu, kvality či materiálové skladby díla nebo jakékoliv další změny díla, mající vliv na cenu či lhůtu provádění, budou prováděny pouze po vydání **Příkazu ke změně D 4.3** tento příkaz ke změně bude vydáván Objednatel
2. Změna, která bude navržena Projektantem akce, Zástupcem objednatele či Objednatel, bude Zhotoviteli oznámena prostřednictvím formuláře **Oznámení změny D 4.1**.
3. Během 3 dnů po vydání **Oznámení změny D 4.1** Zhotovitel zpracuje **Ocenění změny D 4.2**, které by mělo obsahovat zejména následující údaje:
 - a. soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr dotčených prací zpracovaných obdobným způsobem jako Rozpočtová dokumentace pro smlouvu.
 - b. ocenění položek soupisu prací a dodávek dle cenové úrovně Rozpočtové dokumentace
 - c. pro práce nezahrnuté v Rozpočtové dokumentaci zhotovitel poskytne podklady dohodnutým způsobem dle smlouvy
 - d. režijní náklady a zisk dle dohodnutého způsobu ve smlouvě.
 - e. vliv na lhůtu provádění, pokud by se měl změnit termín dokončení díla. Pokud nebude výslovně uvedeno, má se za to, že lhůta dokončení není dotčena.
4. Pokud některý z údajů v **Ocenění změny D 4.2** změn bude chybný, či neúplný, bude tento návrh vrácen pro doplnění, s uvedením důvodů.
5. Zástupce objednatele projedná se Zhotovitelem **Ocenění změny D 4.2**
6. Zástupce objednatele připraví návrh **Příkazu ke změně D 4.3** a vydá jej spolu s **Oceněním změny D 4.2** pro posouzení Objednateli.
7. Zástupce objednatele a Objednatel potvrdí podpisem **Příkaz ke změně D 4.3** tímto okamžikem nabývá **Příkaz ke změně D 4.3** platnosti. Objednatel není povinen potvrdit příkaz ke změně. Příkaz ke změně je dodatkem smlouvy o dílo, který mění dílo, cenu a může měnit i časové milníky. Pokud předmět změny díla upravené návrhem Příkazu ke změně zakládá povinnost postupu dle zákona o zadávání veřejných zakázek, Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
8. Všechny vydaná **Oznámení změny D 4.1** a **Příkazů ke změnám D 4.3** budou uchovávány a jejich seznam bude aktualizován Zástupcem objednatele a objednatelem.



ŽÁDOSTI O PLATBU, OSVĚDČENÍ PRO PLATBU

13.0

1. Zhotovitelova žádost o platbu bude ve shodném členění (agregovaném rozpisu), v jakém byla odsouhlasena smluvní Rozpočtová dokumentace včetně její aktualizace v souladu se seznamem vydaných Příkazů ke změnám.
2. Žádost o platbu, včetně veškerých podkladů, musí být Zástupci objednatele akce doručena na prvním kontrolní dni následujícího kalendářního měsíce nebo písemně dle platné Smlouvy o Dílo.
3. Pro každou položku rozpisu ceny bude uvedena následující informace:
 - a. celková aktualizovaná cena
 - b. hodnota prací dokončených do minulého vyúčtování (Kč i %)
 - c. hodnota prací dokončených v daném měsíci (Kč i %)
4. Všechny žádosti o platbu s výjimkou první musí obsahovat následující prohlášení:

"Potvrzujeme, že veškeré splatné závazky vůči subdodavatelům, vlastním pracovníkům a jiným věřitelům za práce, materiály a výrobky zahrnuté do předchozího Osvědčení pro platbu byly vyrovnány."
5. Upozornění:
 - a. Do žádosti o platbu mohou být zahrnuty pouze výrobky a materiály bezpečně zabudované do stavby. Zhotovitel poskytne kopie příslušných faktur, pokud to bude požadováno.
 - c. Do žádosti budou zahrnuty pouze přípočty, na které byl vydán příslušný Příkaz ke změně.
6. Zástupce objednatele zkontroluje žádost o platbu, projedná ji se Zhotovitelem a provede nezbytné úpravy.
7. Zástupce objednatele vydá **Osvědčení pro platbu P 13.1** na standardním formuláři nejpozději do 7-mi kalendářních dnů po obdržení žádosti o platbu. V případě, že nebude žádost Zástupcem objednatele akceptována bude osvědčení pro platbu vydáno do 7 dnů po obdržení opravené žádosti o platbu.
8. Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) na Objednatele na celkovou částku (po uplatnění pozastávky) shodnou s částkou uvedenou na **Osvědčení pro platbu P 13.1**.



**Veřejná zakázka
„Chodník při komunikaci Štěpnice“
Smlouva o dílo**

9. Objednatel uskuteční platbu Zhotoviteli ve splatnosti dle příslušného ustanovení smlouvy o dílo po obdržení **Osvědčení pro platbu P 13.1** a doručení daňového dokladu - faktury.



Veřejná zakázka
„Chodník při komunikaci Štěpnice“
Smlouva o dílo

Jméno projektu		D 4.1
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ č.:
Komu:	Od:	Datum:
Odesláno: Poštou: Kurýr:	Fax:	Osobně: E-mail:
Předmět změny: Dotčené místo: Odkaz na výkresy: Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Odkaz na jinou část smlouvy:		
POPIS ZMĚNY: Text:		
Oznámil: _____	Datum: _____	
Toto <i>Oznámení</i> nesmí být považováno za <i>Příkaz ke změně</i> potvrzující pokyn k provedení prací, ale pouze jako podklad pro zpracování <i>Návrhu na ocenění změny</i> . Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží <i>Příkaz ke změně</i> pokrývající tyto položky.		



Veřejná zakázka
„Chodník při komunikaci Štěpnice“
Smlouva o dílo

Jméno projektu		D 4.2
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č.: 0
Komu:	Od:	Datum:
Odesláno: Poštou: Kurýr:	Fax:	Osobně: E-mail:
Předmět změny:	0	
Dotčené místo:	0	
Odkaz na výkresy:	0	
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:	0	
Odkaz na jinou část smlouvy:	0	
NÁVRH:		
Text:		
Celkem bez DPH	-	Kč
sazba DPH	21	%
DPH	-	Kč
Celkem s DPH	-	Kč
Vliv na cenu díla:	- Kč	Vliv na dobu trvání díla: -
Vydal:	_____	Datum: _____

