

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 08PU-002149

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČO, DIČ: 104 42 481, CZ 104 42 481
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/27 Velemyšleves - průtah, oprava silnice, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši nabídkové ceny stavby **17.792.500,00 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/27 Velemyšleves - průtah, oprava silnice	17.792.500,00 Kč	3.736.425,00 Kč	21.528.925,00 Kč

kteřážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **I/27 Velemyšleves - průtah, oprava silnice**, číslo veřejné zakázky **08PU-002149**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace⁴
- g) Výkresy⁵ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon

1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem Smlouvy.

2 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

3 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

4 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

5 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

[Pozn. pro účastníka: Přílohy Smlouvy o dílo uvedené pod písm. d) – g) je účastník oprávněn předložit na datovém nosiči. Pokud tak učiní, bude u příslušných poznámek pod čarou odstraněno modré podbarvení a poznámky ponechány, v opačném případě budou poznámky pod čarou účastníkem vymazány a příslušné přílohy Smlouvy o dílo budou předloženy v listinné podobě.]

o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena **ve čtyřech** stejnopisech, z nichž **dva** obdrží objednatel a **dva** obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 29 -06- 2018

Datum: v Lounech, dne 22 -06- 2018

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

EKOSTAVBY Louny s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

EKOSTAVBY LOUNY s.r.o.	
recepce	
07-06-2018	
PŘÍLOHY:	SPIS

Naše zn.: 5031/35300/2018

Číslo zakázky: 08PU-002149

ISPROFOND: 500 111 0007

Vyřizuje:

Dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„I/27 Velemyšleves - průtah, oprava silnice“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek Z2018-010710 (dále jen „Zakázka“) Vám v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny

IČO: 10442481

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

V Chomutově dne 06-06-2018



ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	08PU-002149
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	Z2018-010710
Název veřejné zakázky	I/27 Velemyšleves - průtah, oprava silnice
Druh řízení	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND	500 111 0007

2. Seznam hodnocených nabídek

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka
1.	COLAS CZ, a.s.	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	26177005
2.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	Václava Majera 573, 440 01 Louny	10442481
3.	HERKUL a.s.	Obrnice 228, 435 21 Obrnice	25004638
4.	SILNICE GROUP a.s.	Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město	62242105
5.	ČNES dopravní stavby, a.s.	Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy	47781734

3. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

3.1. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Pořadové číslo nabídky	Název / obchodní firma / jméno a příjmení účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)
1.	2	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	17 792 500,00 Kč
2.	3	HERKUL a.s.	17 818 416,42 Kč
3.	1	COLAS CZ, a.s.	21 669 224,43 Kč
4.	5	ČNES dopravní stavby, a.s.	21 793 037,63 Kč
5.	4	SILNICE GROUP a.s.	21 889 923,78 Kč

3.2. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

3.3. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
1	21 669 224,43 Kč	3.
2	17 792 500,00 Kč	1.
3	17 818 416,42 Kč	2.
4	21 889 923,78 Kč	5.
5	21 793 037,63 Kč	4.

3.4. Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Obchodní firma/název/jméno, příjmení účastníka
1.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.
2.	HERKUL a.s.
3.	COLAS CZ, a.s.
4.	ČNES dopravní stavby, a.s.
5.	SILNICE GROUP a.s.

4. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis	

V Chomutově dne 16. 5. 2018



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	08PU-002149
Název veřejné zakázky	I/27 Velemyšleves - průtah, oprava silnice
Druh řízení	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND	500 111 0007

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
EKOSTAVBY Louny s.r.o.	se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny IČO: 10442481

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro: Fyzické osoby: [REDAKCE] [REDAKCE] Právníkové osoby: EKOSTAVBY Louny s.r.o. ze dne 2. 5. 2018
Potvrzení Finančního úřadu Předloženo potvrzením Finančního úřadu pro Ústecký kraj o neexistenci daňových nedoplatků ze dne 25. 4. 2018 (EKOSTAVBY Louny s.r.o.)
Písemné čestné prohlášení týkající se základní způsobilosti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (§74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb.:

Předloženo čestným prohlášením dodavatele na formuláři 2.1.1. ze dne 15. 5. 2018, podepsané [REDAKCE]

Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení

Předloženo potvrzením Okresní správy sociálního zabezpečení Louny o stavu nedoplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému ze dne 24. 4. 2018 (EKOSTAVBY Louny s.r.o.)

Výpis z obchodního rejstříku

vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455 ze dne 30. července 1990.

Předložen úřední výtisk z rejstříkového listu ze dne 2. 5. 2018, ověřený 29. 5. 2018.

2.2. Profesionální způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

Výpis z obchodního rejstříku

vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455 ze dne 30. července 1990.

Předložen úřední výtisk z rejstříkového listu ze dne 2. 5. 2018, ověřený 29. 5. 2018.

Písemné čestné prohlášení týkající se profesionální způsobilosti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (§77 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.:

Předloženo čestným prohlášením dodavatele na formuláři 2.1.1. ze dne 15. 5. 2018, podepsané [REDAKCE]

Výpis ze živnostenského rejstříku

Prokázáno předložením výpisu z živnostenského rejstříku pro obor:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování ze dne 3. 4. 2018, ověřený dne 29. 5. 2018.

Doklad o členství v ČKA

Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor **dopravní stavby:**

Prokázáno předložením dokladu o tom, že dodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru **dopravní stavby:**

Osvědčení o autorizaci číslo 24759 ze dne 9. 6. 2004 – [REDAKCE] pro obor dopravní stavby.

Osvědčení o autorizaci číslo 24199 ze dne 27. 11. 2003 – [REDAKCE] pro obor pozemní stavby.

Osvědčení o autorizaci číslo 31671 ze dne 23. 6. 2009 – [REDAKCE] pro obor dopravní stavby, specializace nekolejová doprava.

Prokázáno předložením dokladu o tom, že dodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru **zeměměřičské činnosti:**

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c).

Prokázáno předložením úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) ze dne 19. 2. 2003 – [REDAKCE].

2.3. Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 15. 5. 2018 vydaný dodavatelem EKOSTAVBY Louny s.r.o. podepsáno [REDAKCE], včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

Osvědčení o realizovaných stavebních pracích

Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce – Referenční dopis ze dne 1.10.2014 –

Stavba „R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice“, objednatel Metrostav, a.s., termín realizace červenec 2010 – červen 2014, fin. objem 127 161 486,00 Kč bez DPH, výstavba nové čtyřpruhové komunikace v délce 4,700 km.

- Osvědčení o provedení stavebních prací firmou EKOSTAVBY Louny s.r.o., jako členem sdružení „Sdružení SGxESxPORR_Knovíz“ ze dne 30. 9. 2014

Stavba „R7 Praha – Knovíz LS (II.etapa)“, objednatel ŘSD ČR, termín realizace březen 2014 – červen 2014), fin. objem 53 134 556,89 Kč bez DPH – (rozsah prací realizovaný členem sdružení EKOSTAVBY Louny s.r.o.), kompletní rekonstrukce rychlostní komunikace R7 v délce 4 km - (rozsah prací realizovaný členem sdružení EKOSTAVBY Louny s.r.o.)

Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce –

Stavba „R7 Praha – Knovíz PS I. a II. etapa“, objednatel ŘSD ČR, termín realizace 4.9.2015 - 4.12.2015, fin. objem 34 208 768,60 Kč bez DPH, kompletní rekonstrukce rychlostní komunikace R7 (dělený čtyřpruh) v délce 2,5 km.

Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce – Referenční dopis ze dne 2.10.2017 –

Stavba „Oprava živičného povrchu silnice II/246 Černčice; Obora - Orasice“, objednatel Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, termín realizace srpen 2017, fin. objem 14 628 097,00 Kč bez DPH, celoplošná pokládka obrusné asfaltové vrstvy, délka úseku 5000 m.

Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce – Referenční dopis ze dne 15.9.2015 –

Stavba „Oprava živičného povrchu silnice II/237 hr. Okr. KL – Telce; Peruc – hr. Okr. LT“, objednatel Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, termín realizace červen 2015, fin. objem 10 934 606,20 Kč bez DPH, celoplošná pokládka obrusné asfaltové vrstvy, délka úseku 5024 m.

Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu za osobu:

[REDAKCE] – stavbyvedoucí; autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, osvědčení o autorizaci vydané ČKAIT č. 0401508 ze dne 9. 6. 2004. Diplom ze dne 13. července 1994.

[REDAKCE] – zástupce stavbyvedoucího; autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava; osvědčení o autorizaci vydané ČKAIT č. 0401916 ze dne 23. 6. 2009. Vysvědčení o maturitní zkoušce ze dne 8. června 1978.

[REDAKCE] – hlavní geodet; Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností ze dne 19. 2. 2003, vydané Českým úřadem zeměměřickým a

katastrálním, pod číslem položky v seznamu fyzických osob 572/95. Diplom ze dne 4. července 1983.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Předložení dokladu potvrzující vlastnictví obalovny asfaltových směsí (Obalovna živičných směsí Benninghoven BA 160) s výkonem 180 t/hod. – umístění zařízení: EKOSTAVBY Louny s.r.o., dopravní vzdálenost z výroby asfaltových směsí do místa realizace zaručuje v souladu s ČSN a TKP, ze dne 28. 5. 2018, podepsané [REDAKCE]

Předloženo výpisem z majetkové evidence – obalovna.

Předložení dokladu – čestného prohlášení o tom, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů ze dne 28. 5. 2018, podepsané [REDAKCE]

[REDAKCE] a to:

1 kus finisheru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku vozovky (tj. min. 3 m);

1 kus frézy, s minimální účinností do hloubky 5 cm;

2 kusy silničních válců nad 3,5 t, s minimálním výkonem 250 m²/hod;

10 kusů sklápěčů, s minimálním výkonem 10 t.

V Chomutově dne 1. 6. 2018

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: I/27 Velemyšleves - průtah, oprava silnice

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	EKOSTAVBY Louny s.r.o. Václava Majera 573, 440 01 Louny
Doba pro dokončení	1.1.9	2 měsíce od Data zahájení prací
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	2 měsíce od Data zahájení prací
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	████████████████████ ████████
Zástupce objednatele	3.2	████████████████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	a)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		<p>Minimální záruční doba požadovaná Objednatelem činí 60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou:</p> <p>(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ.</p>
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,00 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 55 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		11 000,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze Nepoužije se.
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1 2 200,00 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: V Lounech, dne 15. 05. 2018

V Lounech, dne 15. 05. 2018


PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 7.0, 2, 3, 4 a 5											
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplněte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplněte]													
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[doplněte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplněte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
[doplněte dle potřeby]													
Iniciátor změny: [doplněte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] Popis Změny: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>													
Údaje v Kč bez DPH:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00					
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem											
		0,00											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:													
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis										
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplněte dle potřeby]	jméno	datum	podpis										
Supervize	jméno	datum	podpis										
Správce stavby	jméno	datum	podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.													
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	datum	podpis										
Zhotovitel	jméno	datum	podpis										
			Číslo paré:										

17/11

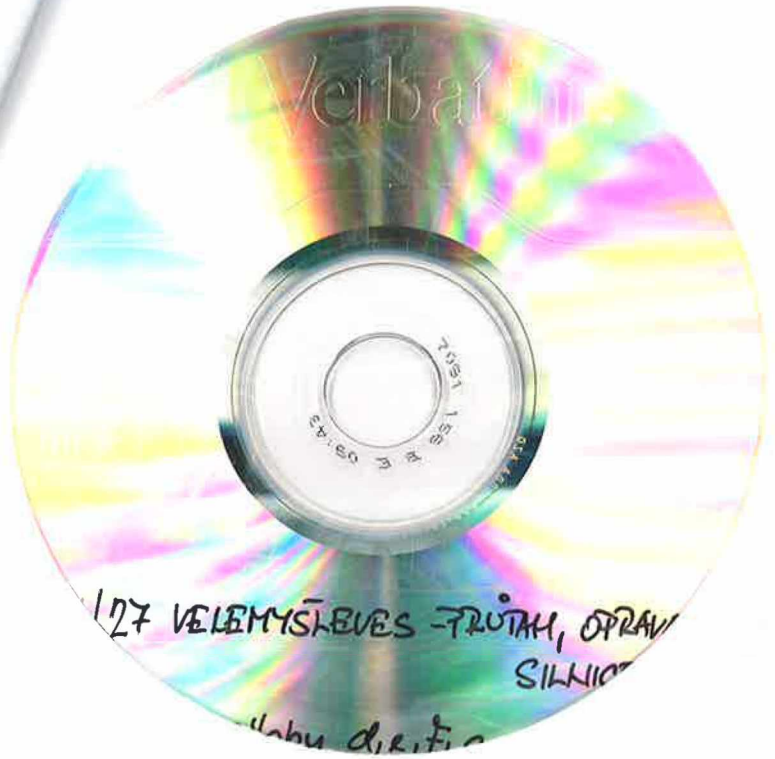

Verbatim
17 VELEMYSĚVES -TRŮTAN, OPRAV
SILNICE
Habu dicitio

FORMULÁŘ 2.3.1.
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**,
se sídlem: **Václava Majera 573, 440 01 Louny**,
IČO: **104 42 481**,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Ústí nad Labem**, oddíl C,
vložka **19 455**,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce **I/27 Velemyšleves - průtah, oprava silnice**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **Z2018-010710** (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez / vč. DPH
Asfaltové směsi frézované a vybourané	7 376,94 t	██████████
Svodidlo ocel. silniční jednostranné, úroveň zadrž. N1, N2	472,50 m	za cenu šrotu
Svodnice samostatná H2	173,40 ks	za cenu šrotu
Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 1	35 ks	za cenu šrotu
Stálá dopravní zařízení Z3 ocel. fólie tř. 1	23 ks	za cenu šrotu
Sloupky a stojky dopravního značení z ocel. trubek	41 ks	za cenu šrotu
Evidenční číslo mostu ocel.s fólií tř. 1	4 ks	za cenu šrotu

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Datum: V Lounech, dne 15. 05. 2018

V Lounech, dne 15. 05. 2018

FORMULÁŘ 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**,
se sídlem: **Václava Majera 573, 440 01 Louny**,
IČO: **104 42 481**,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Ústí nad Labem**, oddíl C,
vložka **19 455**,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/27 **Velemyšleves - průtah, oprava silnice**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **Z2018-010710** (dále jen „dodavatel“),

I)

██████████
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů:

Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé
„ Netýká se “
„ Netýká se “

nebo

██████████
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
HRADIL CZ s.r.o.	IČO 629 57 953 Kostomlaty nad Labem, Hronětice 55 289 21 Nymburk	svodidla silniční
Quo s.r.o.	IČO 264 87 985 Křižíkova 2158 256 01 Benešov	dopravní značení

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby	Část kvalifikace, kterou prokazuje dodavatel prostřednictvím jiné osoby
██████████	██████████	██████████
„ Netýká se “	██████████	„ Netýká se “
██████████	██████████	██████████

Čestně prohlašujeme, že neprokazujeme žádnou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele.

Datum: V Lounech, dne 15. 05. 2018

V Lounech, dne 15. 05. 2018
