

Smlouva o dílo

(dále jen „*smlouva*“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „*občanský zákoník*“)

Evidenční číslo objednatele: D952210063
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 229150009

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „*objednatel*“)

1.2. Zhotovitel:

Název: ROSSETA s.r.o.

Adresa sídla: Školská 144/58, 013 06 Terchová, Slovenská republika

Statutární orgán: Jaroslav Michalek, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Jaroslav Michalek, jednatel

Zástupce pro věci technické: Jaroslav Michalek, jednatel

IČ: 36284475

DIČ: CZ36284475

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: obchodný register vedený Okresním soudem v Žilině, oddíl Sro,
vložka 19139/L

(dále jen jako „*zhotovitel*“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4. 10. 2021 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř. km 0,0-11,7**“ (dále jen „*zakázka*“).
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) vypracovanou v roce 2020 společností MULTIAQUA s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, Hradec Králové, zodpovědný projektant XXX (dále jen „*projektová dokumentace*“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř. km 0,0-11,7

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky uvedených v čl. 2. smlouvy.

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením stavebních prací zajistí odborně způsobilou osobu, která bude vykonávat biologický dozor do doby dokončení díla. Zhotovitel prostřednictvím odborně způsobilé osoby zajistí dohled nad dodržováním podmínek správních rozhodnutí orgánů ochrany přírody a zákonných požadavků na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů. V rámci odborného biologického dozoru bude monitorován aktuální výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v místě realizace a bezprostředním okolí a budou prováděny záchranné transfery ohrožených exemplářů. O průběhu odborného biologického dohledu a o záchranném transferu budou vedeny záznamy, ve kterých bude uveden druh, počet jedinců a místo, kam byli přeneseni a tyto záznamy budou v písemné formě předloženy Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
- 3.3. Kácení dřevin bude probíhat v době vegetačního klidu, tj. od 10. 08. - 15. 03. kalendářního roku.
- 3.4. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“. V případě, že poskytovatel dotace změnil v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“ nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této smlouvy podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s časovým a finančním harmonogramem stavby v členění po jednotlivých stavebních objektech v měsících, který byl součástí nabídky zhotovitele na realizaci veřejné zakázky uvedené v odstavci 2.1 této smlouvy a který je přílohou této smlouvy (dále jen „*harmonogram*“).

- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: listopad 2021, avšak v každém případě nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. listopadu 2023.**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná (s výjimkou uvedenou níže v tomto odstavci 5.1 a v odstavci 8.1 této smlouvy), pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 4. 10. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **62.244.741,43 Kč**,

slovy: *šedesát dva milionů dvě stě čtyřicet čtyři tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých bez DPH.*

Výše uvedená celková cena díla se sníží za každý další zpětně využitý m³ kamene z kamenné dlažby nad objem uvedený a oceněný ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem v rámci nabídky na plnění zakázky, a to dle skutečnosti a na základě jednotkových cen adekvátních položek uvedených v tomto výkazu výměr.

Výše uvedená celková cena díla se zvýší za každý m³ kamene z kamenné dlažby z objemu uvedeného a oceněného ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem v rámci nabídky na plnění zakázky, který nebylo prokazatelně možno zpětně využít pro realizaci zakázky, a to dle skutečnosti a na základě jednotkových cen adekvátních položek uvedených v tomto výkazu výměr.

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí průběžné plnění předmětu díla a fakturaci prací tak, aby minimálně splnil roční finanční objemy stanovené harmonogramem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro daný kalendářní rok. Roční finanční objemy budou závazné a za jejich nesplnění je objednatel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 5.4. Zhotovitel je povinen se při nakládání s odpady, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty řídit příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZO"), jakož i prováděcími právními předpisy, a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se ZO, a v souladu s touto smlouvou.
- 5.5. Zhotovitel se tímto zavazuje, že zajistí zpětné využití kamene z rozebrané kamenné dlažby na sucho na nové opevnění, a to u SO 02 Choteč - Dolní Ředice, ř.km 5,621 - 5,775 a u SO 03 Dolní Ředice - Horní Ředice, ř.km 5,775 - 11,700, a to v maximálně možném rozsahu. Rozsah zpětného využití kamene z rozebrané kamenné dlažby bude průběžně v rámci realizace díla posuzován a vyhodnocován. Kámen z rozebrané kamenné dlažby, který nebude možné zpětně využít bude po dohodě s objednatelům buď předán správci vodního toku k dalšímu využití anebo předán zhotovitelem provozovateli zařízení dle § 14 odst. 1 ZO.

- 5.6. Skutečný rozsah zpětného využití kamene z kamenné dlažby bude vyhodnocen na základě dokladů předložených zhotovitelem (tj. potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 ZO, obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu) nebo potvrzením o převzetí vedlejšího produktu (materiál vhodný k využití při jiných činnostech) správcem vodního toku k dalšímu využití, obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství materiálu a dále doklady o nákupu nového kamene pro obnovu kamenné dlažby, kterým bude nutné nahradit kámen z rozebrané kamenné dlažby, u něhož nebylo zpětné využití možné. Tyto doklady musí být zhotovitelem předloženy objednateli před předáním díla v souladu s bodem 12 obchodních podmínek a případné snížení či zvýšení ceny díla bude zohledněno v poslední faktuře vystavené zhotovitelem.

6. Bankovní záruka

- 6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
- Souhlas s provedením udržovacích prací akce vydaný dne 23. 06. 2020 Městským úřadem Holice, odborem životního prostředí a stavební úřad pod č. j.: MUHO/12687/2020.
 - Souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP vydané dne 04. 09. 2017 Magistrátem města Pardubic, odborem životního prostředí pod č.j.: ŽP/52679/2017.
 - Rozhodnutí o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydané dne 31. 08. 2017 Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 58849/2017/OŽPZ, nabytí právní moci 23. 09. 2017.
 - Povolení ke kácení vydané dne 27. 07. 2020 Obecním úřadem Dolní Ředice.
 - Povolení ke kácení vydané dne 31. 07. 2020 Městským úřadem Sezemice, odborem správy majetku a životního prostředí pod č. j.: SEZ-4452/2020/SM/Li.
- 7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. V případě prodeje smýcené dřevní hmoty třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré daňové doklady o prodeji dřevní hmoty. O takto doložené částky bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.2. této smlouvy.
- 8.2. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.1. článku 8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.
- 8.3. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na stavenišť a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.
- 8.4. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body 4. a 5.
- Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c) a l).

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Příloha:

1) Harmonogram

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno
Jaroslav Michalek
jednatel

Příloha 1
Harmonogram

Stavba : Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0 - 11,7

Dodávateľ: ROSSETA s.r.o., Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

IČO: 36284475

DIČ: 2022194944


IČ DPH: SK2022194944

Zahájenie výstavby : 01.11.2021

Ukončenie výstavby: 30.11.2023

Finančný objem prác realizovaných v jednotlivých mesiacoch SO 01:

76



2021

November 2021	December 2021
405 224,00 Kč	34 811,00 Kč

Spolu 2021 : 440 035,00 Kč


2022

April 2022	Máj 2022
854 923,58 Kč	1 067 130,93 Kč

Spolu 2022 : 1 922 054,51 Kč

Finančný objem prác realizovaných v jednotlivých mesiacoch SO 02:

22



2021

November 2021	December 2021
254 385,92 Kč	122 564,08 Kč

Spolu 2021 : 376 950,00 Kč

2022


April 2022	Máj 2022
650 566,22 Kč	849 977,94 Kč

Spolu 2022 : 1 500 544,16 Kč

Finančný objem prác realizovaných v jednotlivých mesiacoch SO 03:

78

- 1 - ZEMNĚ PRÁCE
- 9 - OSTATNĚ KONSTRUKCE A PRÁCE
- 4 - VODOROVNĚ KONSTRUKCE
- 6 - ÚPRAVY PŮVCHOV, PODLAHY, VÝPLNĚ
- 1 - ZEMNĚ PRÁCE
- 4 - VODOROVNĚ KONSTRUKCE
- 8 - RŮROVĚ VEDĚNIA

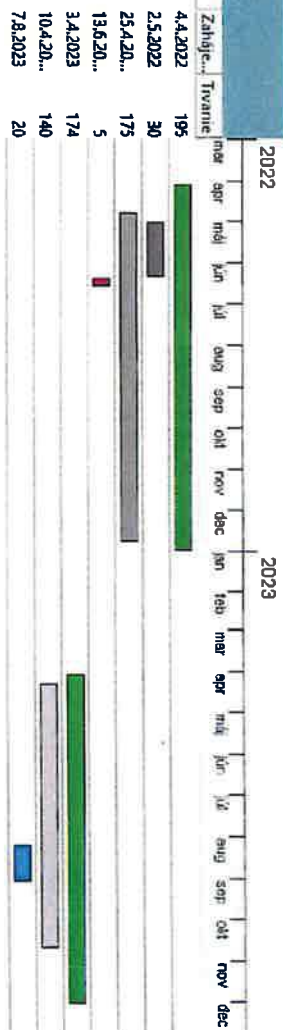

2022

April 2022	Máj 2022	Jún 2022	Júl 2022	August 2022	September 2022	Október 2022	November 2022	December 2022
948 225,84 Kč	4 755 284,67 Kč	4 207 058,87 Kč	4 784 563,12 Kč	4 615 208,05 Kč	4 493 225,48 Kč	4 055 926,38 Kč	4 073 466,44 Kč	3 922 996,11 Kč

Spolu 2022 : 35 855 954,96 Kč


2023

April 2023	Máj 2023	Jún 2023	Júl 2023	August 2023	September 2023	Október 2023	November 2023
2 505 445,19 Kč	2 936 787,37 Kč	2 950 259,76 Kč	2 878 936,41 Kč	2 922 564,73 Kč	2 815 722,38 Kč	2 795 389,27 Kč	2 344 097,69 Kč

Spolu 2023 : 22 149 202,80 Kč

Finančný objem prác realizovaných v jednotlivých mesiacoch, celá stavba:

29



2021

November 2021	December 2021
659 609,92 Kč	157 375,08 Kč

Spolu 2021 : 816 985,00 Kč

2022

April 2022	Máj 2022	Jún 2022	Júl 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	December 2022
2 453 715,64 Kč	6 672 393,54 Kč	4 207 058,87 Kč	4 784 563,12 Kč	4 615 208,05 Kč	4 493 225,48 Kč	4 055 926,38 Kč	4 073 466,44 Kč	3 922 996,11 Kč

Spolu 2022 : 39 278 553,63 Kč

2023

April 2023	Máj 2023	Jún 2023	Júl 2023	August 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023
2 505 445,19 Kč	2 936 787,37 Kč	2 950 259,76 Kč	2 878 936,41 Kč	2 922 564,73 Kč	2 815 722,38 Kč	2 795 389,27 Kč	2 344 097,69 Kč

Spolu 2023 : 22 149 202,80 Kč

80

