

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
. smlouvy: SMLD-0560/00066001/2024

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**STRABAG Silnice a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice  
IČO: 453 59 041  
DIČ: CZ45359041  
zástupce: Ing. Martina Olexová, v zastoupení dle plné moci ze dne 8.2.2024  
David Müller, v zastoupení dle plné moci ze dne 8.2.2024  
bankovní spojení:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp.zn. B 24650  
. smlouvy: 856/TB/DA/2024/005/DAMC

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

**smlouvu o dílo**

(dále jen „**Smlouva**“):

**lánek 1.****Předmět Díla**

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**III/2429 Chvatěruby + III/2429 Zlončice + III/24219 Măslovice**“, a to v rozsahu stanoveném technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.  
(dále společně jen „**Dílo**“)

- 1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „**Zakázka**“ a „**Závazná dokumentace**“). Pokud dojde k rozdílu mezi závaznou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „**ZZVZ**“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel.
- 1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 1.6. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.

## **Článek 2.**

### **Stavební dozor**

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „**SD**“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.

## **Článek 3.**

### **Staveniště, stavební deník**

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „**Staveniště**“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD, a to do 7 dnů od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud Zhotovitel

- nepřevzme Staveniště do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1 Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
  - 3.3. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, další osoby označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
  - 3.4. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
  - 3.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD.
  - 3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od technické specifikace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

## Článek 4.

### Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit jednání o DIO na příslušných úřadech **do 5 pracovních dnů** od účinnosti smlouvy a informovat Objednatele o vydání DIO do 3 pracovních dnů od této skutečnosti. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 11 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.
- 4.2. Ustanovení se nepoužije.
- 4.3. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 4.4. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že:
  - a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto

skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s SD; nebo

- b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
- c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
- d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
- e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.

Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.4. této Smlouvy jsou uvedeny v resortních normách dostupných na [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).

- 4.5. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.7. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

## **Článek 5.**

### **Práva a povinnosti Zhotovitele**

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> Směrnice R-Sm-16 je k dispozici na profilu zadavatele:

[https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_155981.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155981.html) včetně příloh: [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_155982.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155982.html)

Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. přírodninu a demoliční a stavební materiál, recyklovat v souladu se Směrnicí R-Sm-42<sup>2</sup> a dále v souladu s rozpočtem (soupisem prací) Objednatele, a to na svou odpovědnost. Odpovědnost za nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem. Vlastnické právo k odpadu přechází na zhotovitele v okamžiku vytěžení/vybourání, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli doklad o uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42 pro potřeby Objednatele bez zbytečného odkladu. V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, nestanoví-li projektová dokumentace jinak; v takovém případě je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem.

- 5.3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz). Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatel schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.6. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkově tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatel již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.

---

<sup>2</sup> Směrnice R-Sm-42 je k dispozici na profilu zadavatele:

[https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_154139.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154139.html)

včetně příloh:

[https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_154250.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154250.html)

- 5.8. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.10. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.11. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.12. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.13. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této Smlouvy.
- 5.14. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace).

- 5.16. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.

## **Článek 6.**

### **Práva a povinnosti Objednatele**

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.
- 6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.6. Pokud Zhotovitel nezhájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle ZZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), která je dostupná jako veřejný dokument organizace na profilu zadavatele viz odkaz: [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_140287.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html) s přílohami [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_140288.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
  - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla

stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

## Článek 7.

### Předání Díla, zkoušky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přijímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přijímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami. Objednatel nemá právo vymezené dle § 2628 občanského zákoníku odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatel provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 pracovních dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatel navrhout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkouškou zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 3 pracovní dny předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii)

zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

- 7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zařídění nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

## **Článek 8.**

### **Cena Díla**

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Cena Díla bez DPH    | 8 513 586,30 Kč  |
| DPH 21 %             | 1 787 853,12 Kč  |
| Cena Díla včetně DPH | 10 301 439,42 Kč |

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

- 8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ.
- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírůžek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

## **Článek 9.**

### **Platební podmínky**

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí

Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělků Díla.

- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznesl své připomínky nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, název Díla“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatелеm poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy
- 9.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

- 9.10. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele.
- 9.11. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx  
nebo e-mailem na adresu: [podatelna@ksus.cz](mailto:podatelna@ksus.cz)  
a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle.

## **Článek 10.**

### **Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- **36 měsíců**
- Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dní od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

## **Článek 11.**

### **Pojištění**

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši **2 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.
- 11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

## **Článek 12.**

### **Smluvní sankce**

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
  - b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;
  - c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
  - d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.15 této Smlouvy, tj. povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,00 Kč za každé porušení této povinnosti;
  - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 10.000,00 Kč za každé porušení takové povinnosti.
- 12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve Směrnici (viz též odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud

Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.

- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručení písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy.

### Článek 13.

#### Bankovní záruka za vady Díla

- 13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v minimální výši **3,5 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele.
- 13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že:
  - v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
  - právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
  - nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla.
- 13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

## **Článek 14.**

### **Odstoupení od Smlouvy**

- 14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mimo jiné (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
  - a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
  - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
  - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činností, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

## **Článek 15.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 ZZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.

- 15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je [Netýká se], za nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8 Smlouvy.
- 15.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

[redacted]

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

[redacted]

ve věcech technických:

Michal Novák, provozní cestmistr, tel: [redacted]

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: [redacted] email:

[redacted]

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: [redacted] email:

[redacted]

Bc. Pavel Zabilka, provozní cestmistr, tel: [redacted], email: [redacted]

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: [redacted], email:

[redacted]

ve věcech ekonomických a finančních:

ekonomický náměstek

Ing. Jaroslava Jurková,

[redacted]

- 15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

[redacted]

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

[redacted]

- 15.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:  
ve věcech smluvních:

jméno: Ing. Martina Olexová

email: [redacted]

tel.: [redacted]

jméno: David Müller

email: [redacted]

tel.: [redacted]

ve věcech technických:

jméno: Ing. Milan Plachý

email: [redacted]

tel.: [redacted]

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno: Iveta Pátková

email: [redacted]

[redacted]

jméno: Ing. Martina Olexová

email: [redacted]

tel.: [redacted]

- 15.9. Realizační tým, jmenný seznam:

Stavbyvedoucí: Ing. Michal Hroch

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených v čl. 15.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do 5 pracovních od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatel.

- 15.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.
- 15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/nebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

- 15.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 15.15. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupně číselné řadě.
- 15.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 15.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 15.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 15.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 15.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
  - Příloha č. 2 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
  - Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram
  - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
  - Příloha č. 5 – Technická specifikace pro provedení díla

Za zhotovitele smlouvu prověřil:



V Praze dne elektronického podpisu



---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace

STRABAG Silnice a.s.

Ing. Martina Olexová

v zast. dle plné moci ze dne 8.2.2024



STRABAG Silnice a.s.

David Müller

v zast. dle plné moci ze dne 8.2.2024

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

# Krycí list rozpočtu

|                     |                            |              |                                                     |            |                     |
|---------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Název stavby:       | III/2429 Chvatěruby        | Objednatel:  | KSUS Středočeského kraje,<br>příspěvková organizace | IČ/DIČ:    |                     |
| Druh stavby:        | oprava povrchu vozovky     | Projektant:  |                                                     | IČ/DIČ:    |                     |
| Lokalita:           | staničení km 2,197 - 2,947 | Zhotovitel:  | STRABAG Silnice a.s.                                | IČ/DIČ:    | 45359041/CZ45359041 |
| Termín výstavby:    |                            | ZO za KSUSSK | Ing. Jiří Toman                                     | PODPIS ZO: |                     |
| Zdroj financování : |                            | Zpracoval:   | Ing. Jiří Toman                                     | Datum:     |                     |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |              | B                | Doplňkové náklady |                     | C            | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--|
| HSV                | Dodávky                     | 2 312 143,10 | Práce přesčas    | 0,00              | Zařízení staveniště | 0,00         |                                  |  |
|                    | Montáž                      | 0,00         | Bez pevné podl.  | 0,00              | Mimostav. doprava   | 0,00         |                                  |  |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00         | Kulturní památka | 0,00              | Územní vlivy        | 0,00         |                                  |  |
|                    | Montáž                      | 0,00         |                  |                   | Provozní vlivy      | 0,00         |                                  |  |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00         |                  |                   | Ostatní             | 0,00         |                                  |  |
|                    | Montáž                      | 0,00         |                  |                   | NUS z rozpočtu      | 0,00         |                                  |  |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00         |                  |                   |                     |              |                                  |  |
| Přesun hmot a sutí |                             | 0,00         |                  |                   |                     |              |                                  |  |
| ZRN celkem         |                             | 2 312 143,10 | DN celkem        | 0,00              | NUS celkem          | 0,00         |                                  |  |
|                    |                             |              |                  |                   |                     |              |                                  |  |
| Základ 0%          |                             | 0,00         |                  |                   |                     |              |                                  |  |
| Základ 15%         |                             | 0,00         | DPH 15%          | 0,00              | Celkem bez DPH      | 2 312 143,10 |                                  |  |
| Základ 21%         |                             | 2 312 143,10 | DPH 21%          | 485 550,05        | Celkem včetně DPH   | 2 797 693,15 |                                  |  |

|                                                                                    |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
|  |  | Zhotovitel |  |
|                                                                                    |  |            |  |

**Stavba:** III/2429 Chvatěruby  
**Objekt:** sil. III/2429 staničení km 2,197 - 2,947

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel:**  
rozpočet: OTSKP 2023

**Zpracoval:** Ing. Jiří Toman  
**Datum:** 05.03.2024

| Číslo položky OTSKP | Popis položky                                                                                                             | MJ  | Výměra  | Kč/MJ     | Celkem Kč    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|--------------|
| R položka           | DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby                                             | kpl | 1,00    | 52 524,58 | 52 524,58    |
| 113728              | frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km - tl 90.mm                                                                         | m3  | 442,64  | 546,36    | 241 842,16   |
| 919111              | řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm                                                                                  | bm  | 78,00   | 45,69     | 3 563,82     |
| 93818               | čištění vozovek samosběrem                                                                                                | m2  | 9836,50 | 1,78      | 17 508,97    |
| 574C06              | vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S                                                                                     | m3  | 196,73  | 3 578,43  | 703 984,53   |
| 572223              | spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2                                                                              | m2  | 9836,50 | 4,82      | 47 411,93    |
| 89921               | výšková úprava poklopů                                                                                                    | ks  | 4,00    | 2 061,90  | 8 247,60     |
| 89923               | výšková úprava krycích hrnců                                                                                              | ks  | 15,00   | 1 257,88  | 18 868,20    |
| 574A44              | asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm,                                                                               | m2  | 4918,25 | 231,82    | 1 140 148,72 |
| 113761              | frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce                                                                    | m   | 78,00   | 37,57     | 2 930,46     |
| 931311              | těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2                                                                    | m   | 78,00   | 37,57     | 2 930,46     |
| 12922               | čištění krajnic od nánosů tl. do 100mm                                                                                    | m2  | 700,00  | 21,52     | 15 064,00    |
| 56962               | zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm                                                                   | m2  | 700,00  | 42,02     | 29 414,00    |
| 014103.R            | uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko - materiál z čištění krajnic | t   | 98,00   | 70,03     | 6 862,94     |
| 91551               | VDZ - předem připravené symboly                                                                                           | ks  | 2,00    | 571,93    | 1 143,86     |
| 915111              | VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka                                                                                  | m2  | 187,50  | 105,05    | 19 696,88    |
|                     | Celkem bez DPH                                                                                                            |     |         |           | 2 312 143,10 |
|                     | DPH 21%                                                                                                                   |     |         |           | 485 550,05   |
|                     | Celkem vč. DPH                                                                                                            |     |         |           | 2 797 693,15 |

# Krycí list rozpočtu

|                     |                                |             |                                                     |            |                     |
|---------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Název stavby:       | III/2429 Zlončice              | Objednatel: | KSUS Středočeského kraje,<br>příspěvková organizace | IČ/DIČ:    |                     |
| Druh stavby:        | oprava povrchu vozovky         | Projektant: |                                                     | IČ/DIČ:    |                     |
| Lokalita:           | staničení km 0,000 km do 1,064 | Zhotovitel: | STRABAG Silnice a.s.                                | IČ/DIČ:    | 45359041/CZ45359041 |
| Termín výstavby:    |                                | ZO za KSUSK | Tomáš Pecka                                         | PODPIS ZO: |                     |
| Zdroj financování : |                                | Zpracoval:  | Tomáš Pecka                                         | Datum:     |                     |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A Základní rozpočtové náklady |         |              | B Doplnkové náklady |            | C Náklady na umístění stavby (NUS) |              |
|-------------------------------|---------|--------------|---------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| HSV                           | Dodávky | 2 935 228,24 | Práce přesčas       | 0,00       | Zařízení staveniště                | 0,00         |
|                               | Montáž  | 0,00         | Bez pevné podl.     | 0,00       | Mimostav. doprava                  | 0,00         |
| PSV                           | Dodávky | 0,00         | Kulturní památka    | 0,00       | Územní vlivy                       | 0,00         |
|                               | Montáž  | 0,00         |                     |            | Provozní vlivy                     | 0,00         |
| "M"                           | Dodávky | 0,00         |                     |            | Ostatní                            | 0,00         |
|                               | Montáž  | 0,00         |                     |            | NUS z rozpočtu                     | 0,00         |
| Ostatní materiál              |         | 0,00         |                     |            |                                    |              |
| Přesun hmot a sutí            |         | 0,00         |                     |            |                                    |              |
| ZRN celkem                    |         | 2 935 228,24 | DN celkem           | 0,00       | NUS celkem                         | 0,00         |
|                               |         |              |                     |            |                                    |              |
| Základ 0%                     |         | 0,00         |                     |            |                                    |              |
| Základ 15%                    |         | 0,00         | DPH 15%             | 0,00       | Celkem bez DPH                     | 2 935 228,24 |
| Základ 21%                    |         | 2 935 228,24 | DPH 21%             | 616 397,93 | Celkem včetně DPH                  | 3 551 626,17 |

|                                                                                    |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
|  |  | Zhotovitel |  |
|                                                                                    |  |            |  |

Stavba: III/2429 Zlončice

Objekt: sil. III/2429 km 0,000 km do 1,064

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel:

rozpočet: OTSKP 2023

Zpracoval: Tomáš Pecka

Datum: 27.2.2024

| Číslo položky OTSKP | Popis položky                                                                              | MJ  | Výměra   | Kč/MJ     | Celkem Kč    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------------|
| R položka           | DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby              | kpl | 1,00     | 52 524,58 | 52 524,58    |
| 113728              | frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km                                                     | m3  | 213,78   | 546,36    | 116 800,84   |
| 919111              | řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm                                                   | bm  | 37,00    | 45,69     | 1 690,53     |
| 93818               | čištění vozovek samosběrem                                                                 | m2  | 13710,80 | 1,78      | 24 405,22    |
| 574C06              | vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S                                                      | m3  | 274,21   | 3 578,43  | 981 241,29   |
| 572223              | spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2                                               | m2  | 13710,80 | 4,82      | 66 086,06    |
| 574A44              | asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm,                                                | m2  | 6855,40  | 231,82    | 1 589 218,83 |
| 113761              | frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce                                     | m   | 37,00    | 37,57     | 1 390,09     |
| 931311              | těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2                                     | m   | 37,00    | 37,57     | 1 390,09     |
| 12922               | čištění krajnic od nánosů tl. do 100mm                                                     | m2  | 989,00   | 21,52     | 21 283,28    |
| 56962               | zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm                                    | m2  | 989,00   | 42,02     | 41 557,78    |
| 014103.R            | uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středis | t   | 138,46   | 70,03     | 9 696,35     |
| 915111              | VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka                                                   | m2  | 266,00   | 105,05    | 27 943,30    |
|                     | Celkem bez DPH                                                                             |     |          |           | 2 935 228,24 |
|                     | DPH 21%                                                                                    |     |          |           | 616 397,93   |
|                     | Celkem vč. DPH                                                                             |     |          |           | 3 551 626,17 |

# Krycí list rozpočtu

|                     |                            |              |                                                     |            |                     |
|---------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Název stavby:       | III/24219 Máslovice        | Objednatel:  | KSUS Středočeského kraje,<br>příspěvková organizace | IČ/DIČ:    |                     |
| Druh stavby:        | oprava povrchu vozovky     | Projektant:  |                                                     | IČ/DIČ:    |                     |
| Lokalita:           | staničení km 8,477 - 9,727 | Zhotovitel:  | STRABAG Silnice a.s.                                | IČ/DIČ:    | 45359041/CZ45359041 |
| Termín výstavby:    |                            | ZO za KSUSSK | Ing. Jiří Toman                                     | PODPIS ZO: |                     |
| Zdroj financování : |                            | Zpracoval:   | Ing. Jiří Toman                                     | Datum:     |                     |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A Základní rozpočtové náklady |         |              | B Doplnkové náklady |            | C Náklady na umístění stavby (NUS) |              |
|-------------------------------|---------|--------------|---------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| HSV                           | Dodávky | 3 266 214,96 | Práce přesčas       | 0,00       | Zařízení staveniště                | 0,00         |
|                               | Montáž  | 0,00         | Bez pevné podl.     | 0,00       | Mimostav. doprava                  | 0,00         |
| PSV                           | Dodávky | 0,00         | Kulturní památka    | 0,00       | Územní vlivy                       | 0,00         |
|                               | Montáž  | 0,00         |                     |            | Provozní vlivy                     | 0,00         |
| "M"                           | Dodávky | 0,00         |                     |            | Ostatní                            | 0,00         |
|                               | Montáž  | 0,00         |                     |            | NUS z rozpočtu                     | 0,00         |
| Ostatní materiál              |         | 0,00         |                     |            |                                    |              |
| Přesun hmot a sutí            |         | 0,00         |                     |            |                                    |              |
| ZRN celkem                    |         | 3 266 214,96 | DN celkem           | 0,00       | NUS celkem                         | 0,00         |
|                               |         |              |                     |            |                                    |              |
| Základ 0%                     |         | 0,00         |                     |            |                                    |              |
| Základ 15%                    |         | 0,00         | DPH 15%             | 0,00       | Celkem bez DPH                     | 3 266 214,96 |
| Základ 21%                    |         | 3 266 214,96 | DPH 21%             | 685 905,14 | Celkem včetně DPH                  | 3 952 120,10 |

|                                                                                    |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
|  |  | Zhotovitel |  |
|                                                                                    |  |            |  |

Stavba: III/24219 Máslovice

Objekt: sil. III/24219 km 8,477 – 9,727

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:

rozpočet: OTSKP 2023

Zpracoval: Ing. Jiří Toman

Datum: 27.2.2024

| Číslo položky OTSKP | Popis položky                                                                              | MJ  | Výměra   | Kč/MJ     | Celkem Kč    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------------|
| R položka           | DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby              | kpl | 1,00     | 52 524,58 | 52 524,58    |
| 113728              | frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km (ZAS-T3,T4)                                         | m3  | 1,02     | 546,36    | 557,29       |
| 113728              | frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km (ZAS-T1,T2)                                         | m3  | 1,02     | 546,36    | 557,29       |
| 15670               | poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontaminovaných (recyklát)                      | t   | 2,45     | 6 054,92  | 14 822,44    |
| 919111              | řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm                                                   | bm  | 10,20    | 45,69     | 466,04       |
| 93818               | čištění vozovek samosběrem                                                                 | m2  | 12750,00 | 1,78      | 22 695,00    |
| 574C06              | vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S                                                      | m3  | 255,00   | 3 578,43  | 912 499,65   |
| R položka           | sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)                         | m2  | 400,00   | 881,78    | 352 713,12   |
| 572223              | spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2                                               | m2  | 12750,00 | 4,82      | 61 455,00    |
| 574A44              | asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm,                                                | m2  | 6375,00  | 231,82    | 1 477 852,50 |
| 113761              | frézování drážky pružezu do 100mm2 v asfaltové vozovce                                     | m   | 10,20    | 37,57     | 383,21       |
| 931311              | těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2                                     | m   | 10,20    | 37,57     | 383,21       |
| 12922               | čištění krajnic od nánosů tl. do 100mm                                                     | m2  | 1250,00  | 21,52     | 26 900,00    |
| 56962               | zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm                                    | m2  | 1250,00  | 42,02     | 52 525,00    |
| 12932               | čištění příkopů od nánosů do 0,5m3/m                                                       | m   | 2500,00  | 53,80     | 134 500,00   |
| 014103.R            | uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středis | t   | 1750,00  | 70,03     | 122 552,50   |
| 915111              | VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka                                                   | m2  | 312,50   | 105,05    | 32 828,13    |
|                     | Celkem bez DPH                                                                             |     |          |           | 3 266 214,96 |
|                     | DPH 21%                                                                                    |     |          |           | 685 905,14   |
|                     | Celkem vč. DPH                                                                             |     |          |           | 3 952 120,10 |

**Sanace hl. 35cm - agregovaná položka**

| Číslo položky OTSKP | Popis položky                                            | MJ        | Výměra   | Kč/MJ    | Celkem Kč     |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------|
| 21461               | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE                                    | m2        | 1,00     | 50,89    | 50,89         |
| 015130              | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17      | t         | 0,92     | 116,72   | 107,38        |
| 122938              | 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU                | m3        | 0,35     | 348,67   | 122,03        |
| 56333               | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III. ODVOZ DO 20KM     | m2        | 1,00     | 172,83   | 172,83        |
| 567104              | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM                 | m3        | 0,13     | 289,08   | 37,58         |
| 572123              | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM      | m2        | 1,00     | 15,33    | 15,33         |
| 574C06              | INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                 | m3        | 0,07     | 5 367,65 | 375,74        |
|                     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S - TL. 70MM | m2        | 1        |          | 881,78        |
|                     | <b>Celkem sanace</b>                                     | <b>m2</b> | <b>1</b> |          | <b>881,78</b> |


|                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ</b><br><b>budovy nebo stavby</b><br><b>nebo její dokončené části</b>                                                                       |                                                                                                  |
| <b>Přejímací organizace (Objednatel)</b><br><b>název a sídlo (razítko)</b><br><br>Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o.<br>Zborovská 11<br>150 21 Praha 5 | <b>č. zápisu:</b>                                                                                |
| <b>Datum zahájení přejímacího řízení</b>                                                                                                                                   | <b>Název budovy nebo stavby</b><br><b>(nebo její dokončené části)</b><br><br><b>„název akce“</b> |
| <b>Místo realizace akce:</b><br><br><b>Popis:</b>                                                                                                                          |                                                                                                  |
| <b>Odpovědný stavbyvedoucí</b>                                                                                                                                             | <b>Generální projektant</b>                                                                      |
| <b>Stavební dozor Objednatele</b>                                                                                                                                          | <b>Zhotovitel:</b>                                                                               |
| <b>Stavební povolení:</b>                                                                                                                                                  | <b>vydal:</b>                                                                                    |
| <b>Smlouva o dílo č.</b><br><br><b>ze dne</b> <span style="margin-left: 150px;"><b>včetně</b></span>                                                                       |                                                                                                  |
| <b>Datum zahájení prací</b><br><b>podle smlouvy o dílo</b>                                                                                                                 | <b>Datum dokončení prací</b><br><b>podle smlouvy o dílo</b>                                      |
| <b>Skutečný termín zahájení:</b>                                                                                                                                           | <b>Skutečný termín dokončení prací:</b>                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody</b></p> <p>Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.</p> |
| <p><b>Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí</b></p> <p>ne</p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad</b></p> <p>ne</p>                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad</b></p> <p>ne</p>                                                                                                                                      |
| <p><b>Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění</b></p> <p>ne</p>                                                                                                                                                               |
| <p><b>Termín úplného vyklizení staveniště:</b></p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků</b></p> <p><i>administrativní převímka dokladů bude dokončena do .....</i></p>                                                                                              |
| <p><b>Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:</b></p> <p>ne</p>                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby</b></p> <p><b>Samostatná příloha</b></p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu</b>                      <b>Kč</b></p> <p><b>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD</b>                      <b>Kč</b></p> <p><b>Celková cena s DPH</b></p>                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Záruční doba (konečné datum):</b>                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| <b>Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu</b>                                                                                                                                                                |                         |                |
| Samostatná příloha                                                                                                                                                                                                              |                         |                |
| <b>Vyjádření účastníků řízení:</b><br>ne                                                                                                                                                                                        |                         |                |
| <b>Datum skončení přejímacího řízení:</b>                                                                                                                                                                                       |                         |                |
| <b>Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.</b> |                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Jméno a příjmení</b> | <b>podpisy</b> |
| <b>Zástupci zhotovitele</b>                                                                                                                                                                                                     |                         |                |
| <b>Zástupci přejímací organizace</b>                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| <b>Zástupci budoucího uživatele</b>                                                                                                                                                                                             |                         |                |
| <b>Ostatní účastníci řízení</b>                                                                                                                                                                                                 |                         |                |

Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

Harmonogram prací

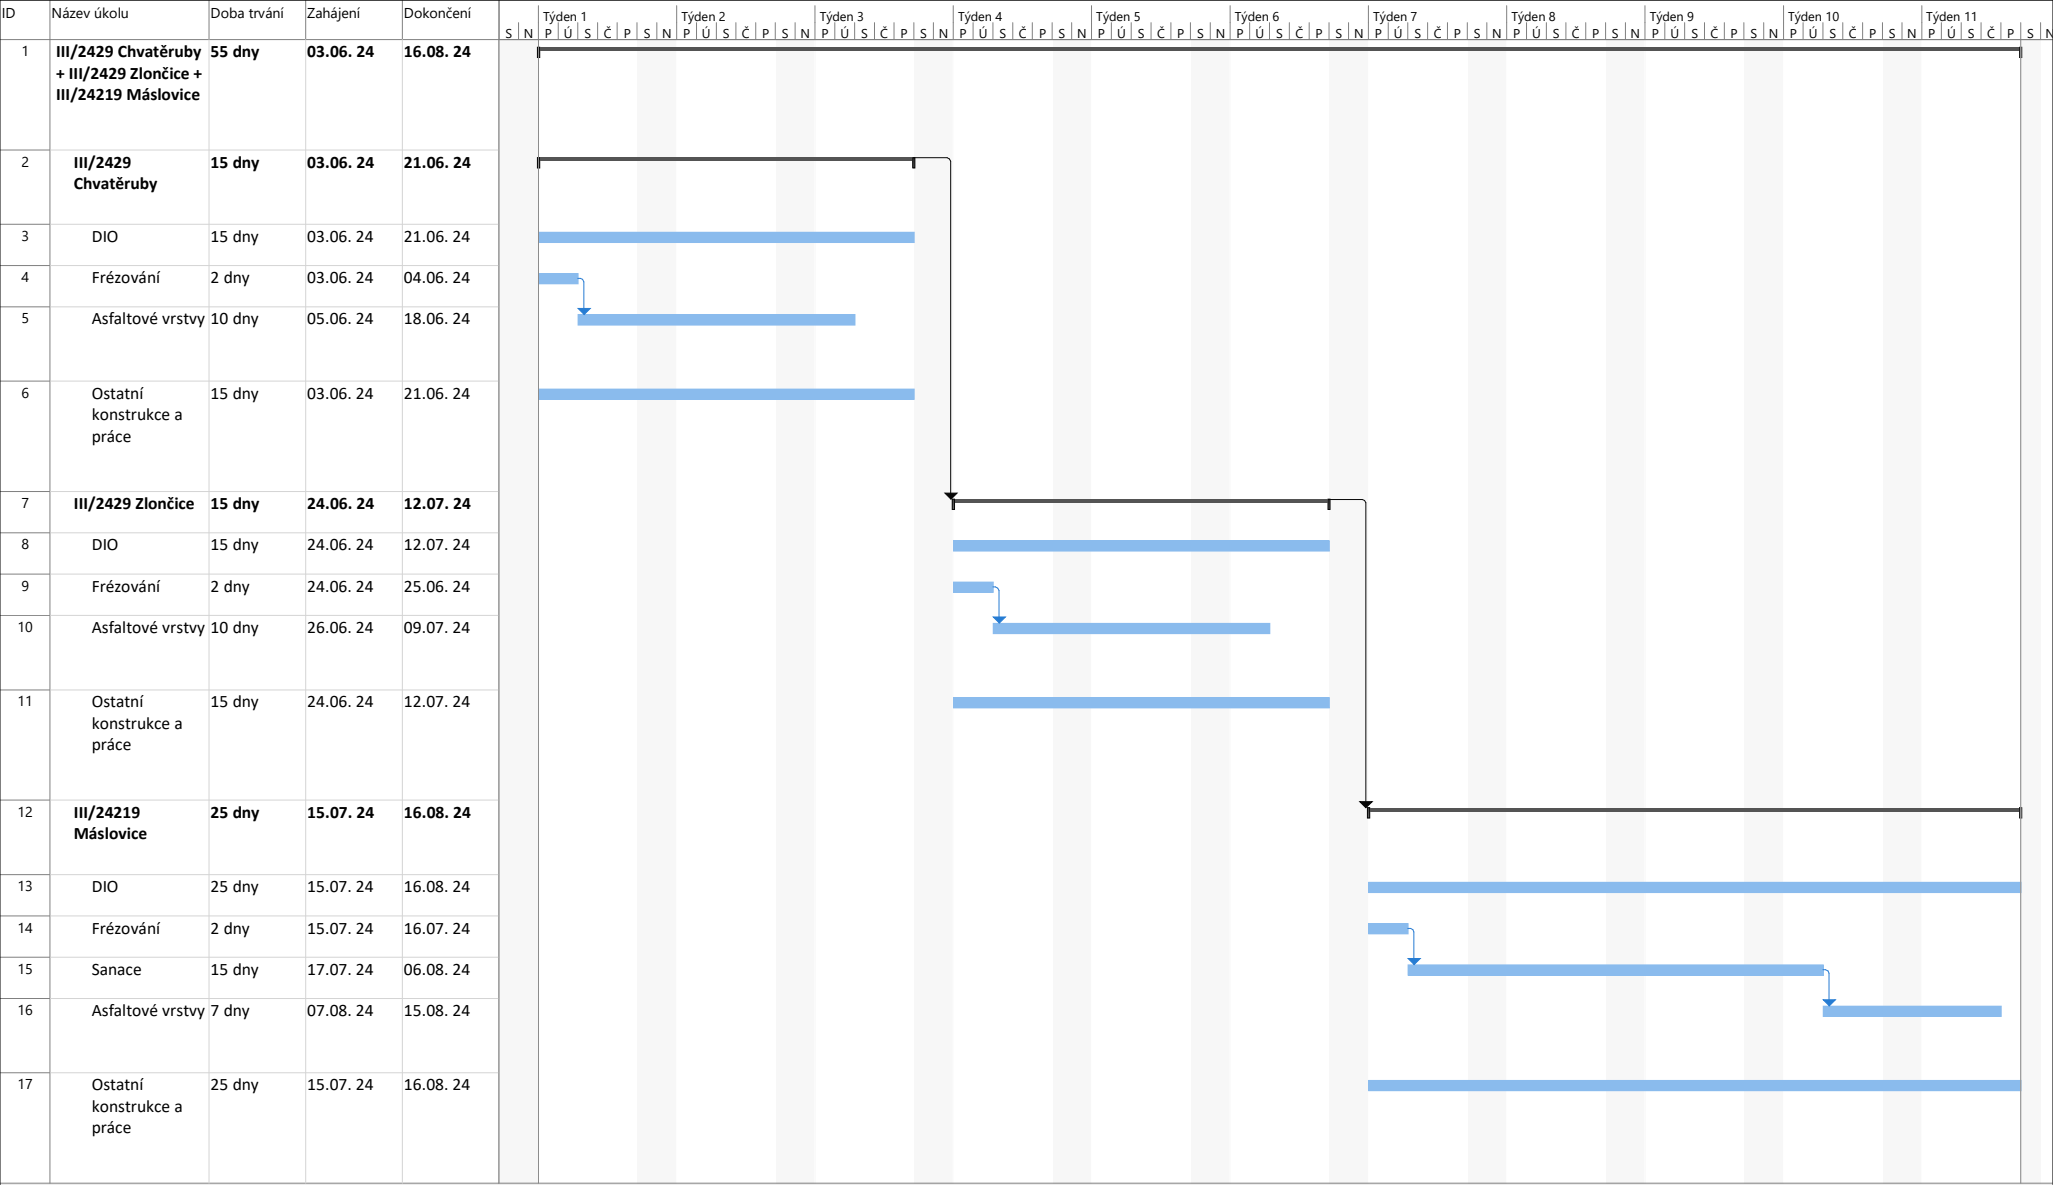

Projekt: HMG  
Datum: 16.04. 24

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termin

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

**SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ**  
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

|    | <b>Identifikační údaje<br/>poddodavatele</b><br><i>(název/obchodní firma,<br/>sídlo, IČO)</i> | <b>Identifikace části veřejné<br/>zakázky, kterou bude<br/>poddodavatel plnit<sup>3</sup></b><br><i>(popis části veřejné<br/>zakázky/prací realizovaných<br/>poddodavatelem)</i> | <b>Podíl poddodavatele<br/>na plnění veřejné<br/>zakázky vyjádření v<br/>%, příp. finanční<br/>hodnotou v Kč bez<br/>DPH</b> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ADSUM spol. s r.o.<br>Havlíčkova 923,<br>27351 Unhošť<br>IČ: 45144991                         | Dopravní značení                                                                                                                                                                 | 0,96 %                                                                                                                       |
| 2. | STRABAG a.s.<br>Kačírkova 982/4,<br>158 00 Praha 5,<br>IČO: 608 38 744                        | Provedení asfaltových<br>hutněných vrstev                                                                                                                                        | 81,70 %                                                                                                                      |
| 3. |                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
| 4. |                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
| 5. |                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |

V Praze dne elektronického podpisu

---

**Ing. Martina Olexová**  
zmocněnec

---

**David Müller**  
zmocněnec

---

<sup>3</sup> Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění veřejné zakázky.

## Příloha č. 5 – Technická specifikace

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

## **Technická specifikace pro zadání stavebních prací**

**Název akce:** III/2429 Chvatěruby

**Místo realizace:** III/2429 Chvatěruby – od začátku obce ve směru od Zlončic (od domu čp. 141) až ke křižovatce s III/00811

**Staničení:** od 2,197km do 2,947 km, (CleveRA verze síť 2107)  
(mezi uzlovými body 1222A103 a 1222A107)  
délka úseku 0,750 km, prům. šířka 6,2m, plocha 4650 m<sup>2</sup> + plocha napojení  
místních komunikací 268,25m<sup>2</sup>



**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy v intravilánu Chvatěrub, od začátku obce Chvatěruby (od domu čp. 141) ve směru od Zlončic až ke křižovatce s komunikací č. III/00811. Tento úsek dlouhý 750 m je značně nerovný po častých opravách, vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikro textury, výtluky apod. Jedná se o silnici s velkou intenzitou dopravy (autobusové i osobní).

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2429

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je frézování obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 90 mm, vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků, seřez navýšené krajnice, výšková úprava povrchových znaků, zřízení krajnic, frézování a zalití dilatačních spár a obnova vodorovného dopravního značení vodící proužky 12,5 cm v celé délce, dále plošné VDZ označ. zastávku BUS.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk)

**Termín realizace:** r. 2024 - předpoklad 3 týdny

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2024 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**FOTODOKUMENTACE:**





**Kontakty:**

Michal Novák, provozní cestmistr, tel: 736 623 735, email: [michal.novak@ksus.cz](mailto:michal.novak@ksus.cz)

Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel: 736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email:

[karel.sulek@ksus.cz](mailto:karel.sulek@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**


---

## **Technická specifikace** pro zadání stavebních prací

**Název akce:** III/2429 Zlončice

**Místo realizace:** silnice č. III/2429 Zlončice - od křižovatky s III/24219 (směr Máslovice) až do obce Zlončice ke křižovatce s III/0082

**Staničení:** od 0,000 km do 1,064 km, (CleveRA verze sítě 2107)  
(mezi uzlovými body 1222A115 a 1222A103)  
délka úseku 1 064 m, prům. šířka 5,6 m, plocha 5958,4 m<sup>2</sup> (plus plocha křižovatky s komunikací III/24219 – 897 m<sup>2</sup>). Celkem **6 855,4 m<sup>2</sup>**.

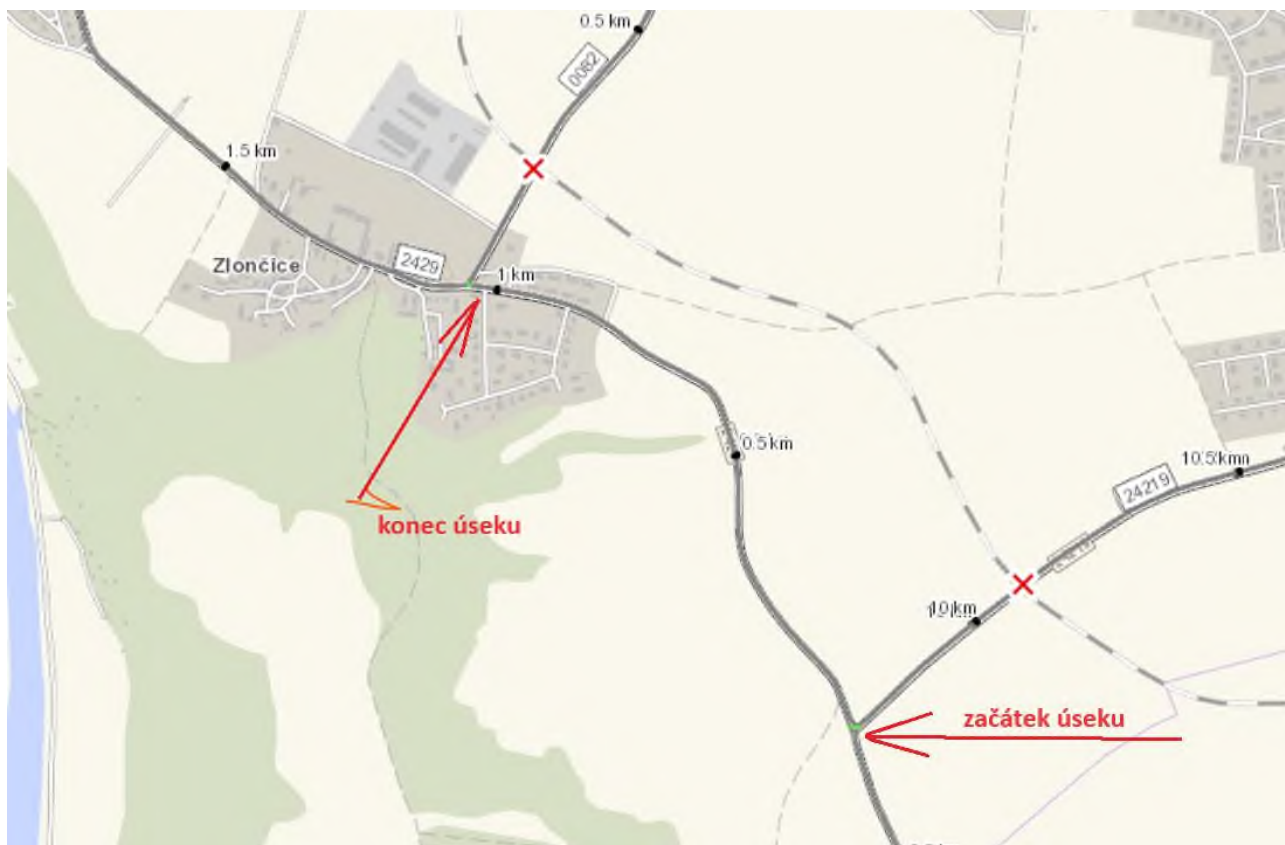

### **Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, část v extravilánu a část v intravilánu obce Zlončice, od křižovatky s komunikací č. III/24219 (směr Máslovice) až ke křižovatce s komunikací č. III/0082 v obci Zlončice. Tento úsek dlouhý 1064 m je značně nerovný po častých opravách, vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikro textury, výtluky apod. Jedná se o silnici s velkou intenzitou dopravy (autobusové i osobní).

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/2429.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku, frézování obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 90 mm v určeném úseku (křižovatka s komunikací č. III/24219 – 897m<sup>2</sup> a od začátku obce až ke křižovatce s komunikací č. III/0082 – km 0,800 – 1,064), vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, spojovací postřiky, odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z R-materiálu, frézování a zalití dilatačních spar a obnova vodorovného dopravního značení barva (vodící čáry 12,5 cm). Předpokládá se úplná uzavírka.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2024 – předpoklad 4 týdny

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2024 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

## Fotodokumentace:



## Kontakty:

Michal Novák, provozní cestmistr, tel: 736 623 735, email: [michal.novak@ksus.cz](mailto:michal.novak@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel: 736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**


---

## Technická specifikace pro zadání stavebních prací

**Název akce:** III/24219 Máslovice

**Místo realizace:** silnice III/24219 Máslovice, okres Praha-východ a Mělník

**Staničení :** od 8,477 km do 9,727 km (CleveRa verze sítě 2107)  
(mezi uzlovými body 1224A160 – 1222A115)  
délka úseku 1 250 m, prům. šířka 5,1 m, plocha 6 375 m<sup>2</sup>

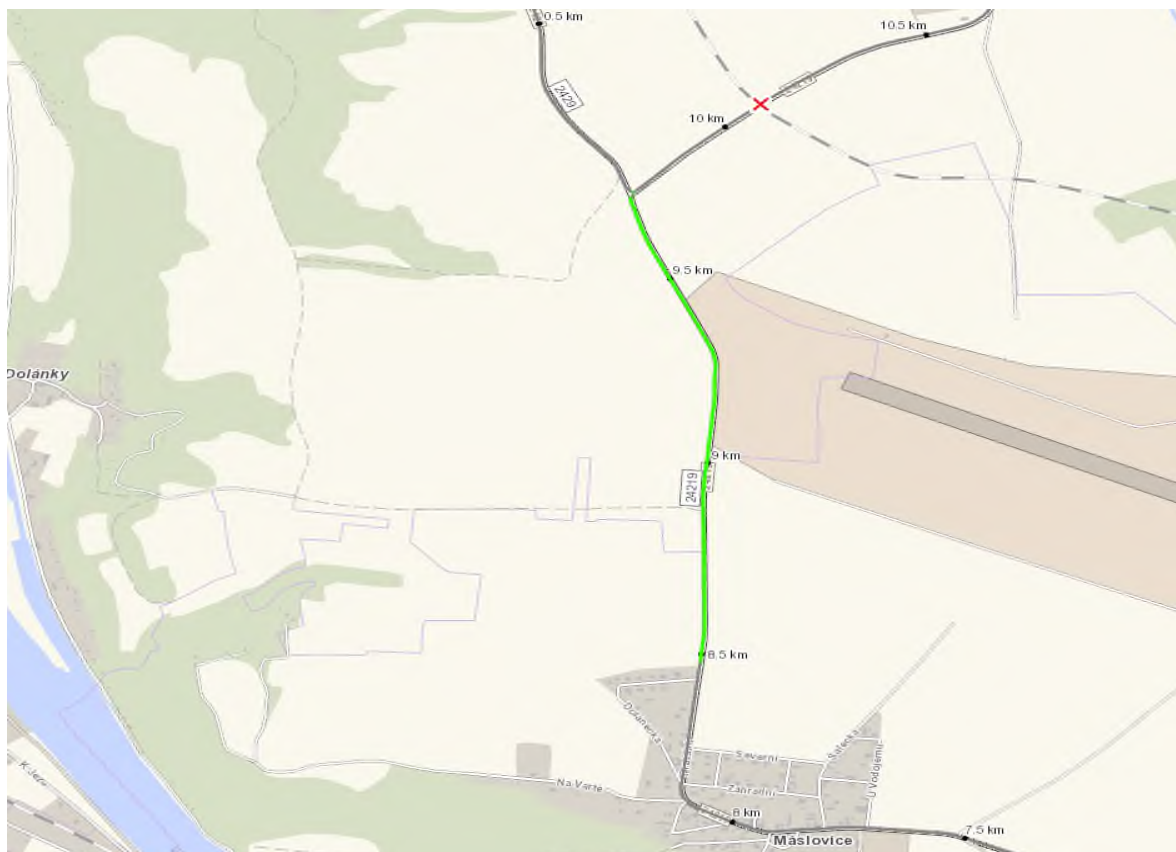

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, od konce obce Máslovice až ke křižovatce III/2429 směrem k obci Zlončice. Úsek je dlouhý 1 250 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici III. třídy se střední intenzitou dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/24219.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v délce 1 250 bm. Bude provedeno částečné frézování živičných vrstev, sanace okrajů vozovky v ploše 400 m<sup>2</sup> (bude upřesněno na místě), pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy a pokládka ohrusné vrstvy ACO 11+ v mocnosti 50mm, to vše vč. spojovacích postřiků. V místě napojení ohrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic, hloubení příkopů (tvar viz. příloha) vč. odvozu na skládku, zřízení nových krajnic a zřízení VDZ (vodící proužky). Předpokládá se úplná uzavírka.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk)

**Termín realizace:** r. 2024 - předpoklad 4 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2024 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

## FOTODOKUMENTACE:





**Kontakty:**

Bc. Pavel Zabilka, provozní cestmistr, tel: [redacted] email: [redacted]

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: [redacted] email: [redacted]

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: [redacted] email:

[redacted]

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: [redacted]

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,  
150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman
