

Číslo smlouvy CETIN:
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv:

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**

č. CETIN 639/2023

č. VUT 11186/2024/00

mezi

CETIN a.s.

a

Vysoké učení technické v Brně

Číslo smlouvy CETIN:
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv:

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená xxx
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: xxx
datová schránka: qa7425t
(dále jen „**CETIN**“)

a

Vysoké učení technické v Brně

veřejná vysoká škola zřízená dle zák. č.111/1998 Sb., nezapisuje se do OR
se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno
IČ 00216305
DIČ CZ00216305
zastoupené Mgr. Ing. Danielou Němcovou, kvestorkou
datová schránka: yb9j9by
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Stránice, Obec Brno, spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky označená za etapu v této Smlouvě, vymezená a co do rozsahu určená položkami v Příloze č. 2 Smlouvy; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním; Překládka bude rozdělena do dvou etap označených v CTN jako První etapa Překládky a Druhá etapa Překládky;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Číslo smlouvy CETIN:
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv:

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 28.6.2023 vydané pod čj. 188260/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

Stavba SMB je stavba Statutárního města Brna „Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz“, se kterou má Stavebník povinnost koordinace záměru „Rekonstrukce a dostavba areálu Údolní 53 – Nové přípojky kanalizace a přesun kabelové trasy CETIN“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**639/2023 redislokace TR1 VUT Brno Údolní**“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty

Číslo smlouvy CETIN:
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv:

ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvu výslovně sjednáno jinak.

3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
- (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

3.7 Společnost CETIN bere na vědomí, že s ohledem na závazek Stavebníka koordinovat svou stavební činnost se stavbou Statutárního města Brně (SMB) bude překládka realizována ve dvou etapách, a to

- (a) První etapa Překládky – Multikanál venkovní dle Přílohy 3 z KK37 po 2ks univerzálních koncovek multikanálu v místě před komorou č.1 – trasa prochází územím stavby SMB (předpokládané zahájení stavby SMB 6/24 s realizací postupně od ulice Husova);

- (b) Druhá etapa Překládky – Multikanál vnitřní dle Přílohy 3 od 2ks univerzálních koncovek multikanálu v místě před komorou č.1 – realizace po získání stavebního povolení VUT pro vnitřní trasu přeložky (předpoklad 11/24 až 5/25).

Společnost CETIN se za předpokladu splnění Předpokladů pro realizaci dle čl. 3.2 Smlouvy zavazuje při realizaci respektovat výše uvedenou potřebu koordinace stavby se stavbou SMB.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) učinit veškeré nezbytné kroky směřující k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy a jednat s nimi tak, aby bylo dosaženo uzavření takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací

Číslo smlouvy CETIN:
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv:

skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;

- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však 6 měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
- (iii) písemně vyzvat společnost CETIN k převzetí staveniště, včetně určení termínu, kdy staveniště má být převzato, a to na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v odst. 8.1 Smlouvy
- (iv) Kvalifikovanou výzvu a písemnou výzvu k převzetí staveniště učinit pro každou Etapu Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva k příslušné etapě Překládky;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) a zálohovou platbu dle odst. 6.1 písm. (b) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením. Stavebník nese nezbytné náklady na úpravy na úrovni stávajícího technického řešení SEK.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu

Číslo smlouvy CETIN:
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv:

vedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy Oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **4.600.000,- Kč** (slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Úhrada nákladů Překládky vzniklých společnosti CETIN (provozovateli SEK) a refundovaná Stavebníkem není předmětem DPH.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do [6] ([šesti]) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu. K proplacení nákladů dle tohoto ustanovení je CETIN povinen Stavebníkovi předložit doklad o úhradě a účelnosti takto vynaložených nákladů spolu s výstupem (posudek, nález, záznam o průzkumu atd.), který z činnosti, na níž byl náklad vynaložen vznikl.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,

Číslo smlouvy CETIN:
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv:

- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

CETIN nemá nárok na úhradu nákladů dle odst. 5.4 Smlouvy, které vzniknou před zasláním Kvalifikované výzvy Stavebníkem, pokud tyto náklady nebyly Stavebníkovi předem oznámeny a odsouhlaseny.

- 5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady Překládky ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit následovně:
- (a) úhradou nákladů na Přípravu Překládky ve výši **104.404,- Kč** (slovy: sto čtyři tisíc čtyři sta čtyři korun českých) na základě faktury; fakturu vystaví společnost CETIN do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;
 - (b) zálohovou platbou na realizaci Překládky ve výši **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých) (dále jen „**Záloha**“); výzva k úhradě Zálohy bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů ode dne, kdy je společnosti CETIN doručena první Kvalifikovaná výzva;
 - (c) úhradou doplatku za realizaci Překládky na základě faktury na celkovou výši nákladů Překládky; fakturu vystaví společnost CETIN do třiceti (30) dnů ode dne dokončení Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. Faktura bude obsahovat zúčtování Zálohy; v případě, že výsledkem vyúčtování Zálohy bude přeplatek, společnost CETIN vrátí přeplatek do třiceti (30) kalendářních dní od vystavení vyúčtování podle písmene (c) tohoto odstavce 6.1 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Faktury či výzva k úhradě Zálohy budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.

Číslo smlouvy CETIN:
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv:

- 6.4 Jakoukoliv platbu dle faktury či dle výzvy k úhradě Zálohy v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury či výzvy k úhradě Zálohy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na účet společnosti CETIN určený na fakturu či ve výzvě k úhradě Zálohy.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením faktury či výzvy k úhradě Zálohy, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka není nejpozději poslední den splatnosti připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

ve věcech organizačních a technických: xxx
- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Daniela Němcová
funkce: kvestorka VUT

ve věcech technických: xxx

ve věcech technických: xxx

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

Číslo smlouvy CETIN:
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv:

- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva (výzva k etapě, která bude realizovaná poslední) musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do tří (3) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí tří (3) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva (výzva k etapě, která bude realizovaná poslední) učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti

Číslo smlouvy CETIN:
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv:

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

Číslo smlouvy CETIN:
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu contract_termination@cetin.cz.

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

Číslo smlouvy CETIN:
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv:

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky. Pokud by byla Smlouva vyhotovena v listinné podobě, bude vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Cenový a technický návrh (CTN)

Příloha č. 2 - Příloha 2_SoRP_CTN_Rozdělení prací

Příloha č. 3 - Trasy KK37 až P1.04 CETIN TR1 (GP CETIN)

Příloha č. 4 - Územní rozhodnutí Úřadu městské části města Brně, Brno-střed, Stavební úřad – o umístění stavby č.j. MCBS/2023/0147963/SMIK ze dne 29.9.2023, právní moc ke dni 25.10.2023

Číslo smlouvy CETIN:
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv:

CETIN:

Stavebník:

V Praze dne 27. 06. 2024

V Brně dne 28. 06. 2024

CETIN a.s.
xxx

Vysoké učení technické v Brně
Mgr. Ing. Daniela Němcová
kvestorka


Redislokace TR1 CETIN v budově U1 areálu VUT

Údolní 244/53, BO:BS 993

Záměr

V rámci záměru stavebníka VUT „Rekonstrukce a dostavba a areálu Údolní 53“ (Stavba VUT) je stavebníkem vyvoláno přemístění stávajícího traťového rozvaděče TR1 s telekomunikační technologií CETIN a.s. (CETIN) ze stávající lokace v budově U1 areálu VUT:

- Dle stávající pasportizace jde o místnost č. 001, 13,07m² s přístupem z křižovatky ulic Úvoz a Údolní, do místnosti nově navrhované v dokumentaci pro stavební povolení (DSP) VUT *Rekonstrukce a dostavba areálu Údolní 53* v budově U1:
- dle stávající pasportizace jde o jižní část místnosti 019 v 1PP budovy U1,
- dle DSP VUT jde o nově navrženou místnost 13,82m² ozn. P1.04 v 1PP budovy U1 areálu VUT (ZPS 639/2023), s přístupem chodbou U1, dvorní částí areálu a areálovým vjezdem.

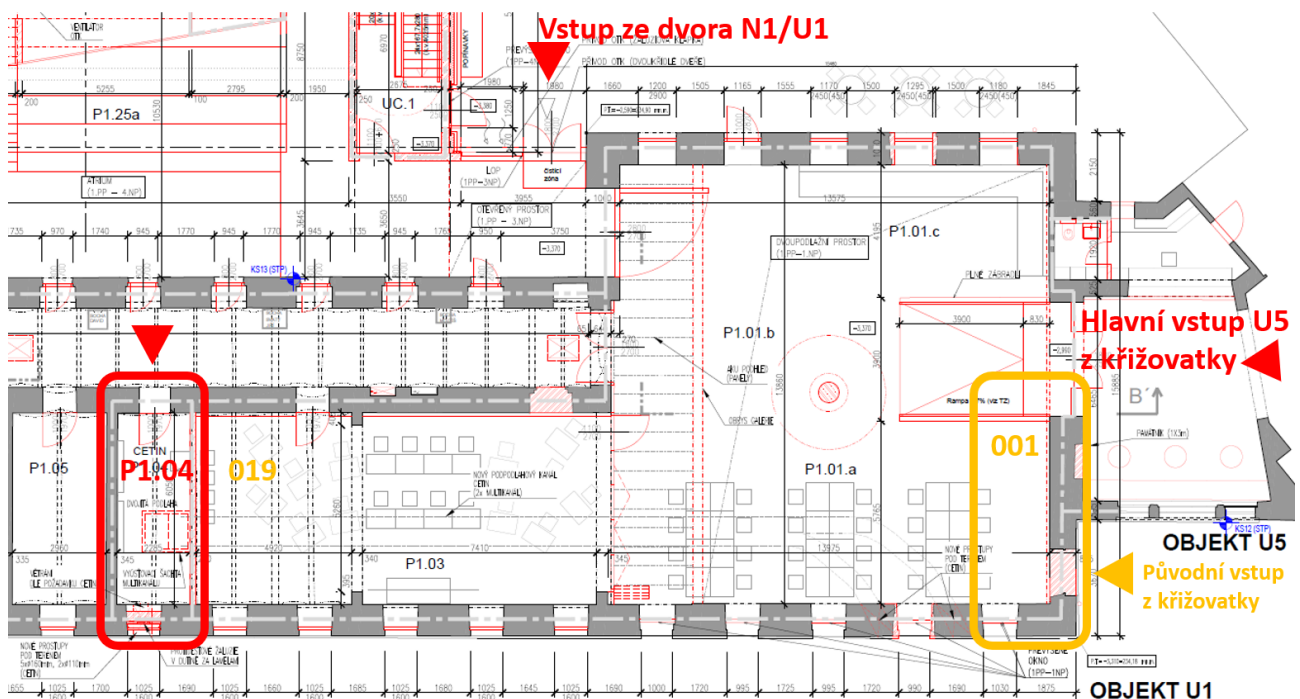

Červeně – navrhovaný stav realizace nové místnosti CETIN TR1

Žlutě – stávající stav CETIN TR1 před realizací

Součástí přesunu je i nová venkovní kabelová trasa z KK 37 do budovy U1, SO 890 – Kabelová trasa CETIN s platným pravomocným Územním rozhodnutím č. 187, ze dne 25.10.2023, a vnitřní kabelovody v multikanálech vedoucích budovou U1 pod podlahou na terénu 1PP do místnosti P1.04 vybavené otvory pro ventilaci ve fasádě Úvoz a prostupem obvodovou stěnou přilehlou k terénu pro kolmé napojení na trasu Úvoz. Zobrazení venkovní a vnitřní trasy viz Příloha 3, které budou součástí stavebního povolení Stavby VUT.

Záměr stavebníka VUT je v doteku se záměrem stavebníka Statutární město Brno „Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz“ (Stavba města). Venkovní práce na KK37 a části kabelové trasy z KK37 směrem k budově U1 se nacházejí v místě Stavby města. Stavebník VUT má povinnost přípravné i realizační práce na Stavbě VUT koordinovat s přípravnými i realizačními pracemi Stavby města.

Odhad časového rámce přípravy a realizace

Stavba města:

- zahájení Stavby města – 06/2024 s dokončením 06/2026, postupem od ul. Husova směr Úvoz.

Stavba VUT – stavební připravenost pro přeložku CETIN:

- zpracování DPS Přeložky CETIN pro koordinaci se Stavbou města 05/2024,
- vydání stavebního povolení s DSP Areálu (prostupy základy a vnitřní trasy přeložky) – 11/2024,
- uvedení DPS Přeložky CETIN do souladu s pravomocným stavebním povolením 01/2025
- zahájení výběru zhotovitele VUT stavební připravenosti dle DPS Přeložky CETIN – 02/2025,
- zahájení prací dle DPS VUT – stavební připravenost pro CETIN: 04/2025 s dokončením 06/2025.

Přeložka CETIN:

- realizace venkovní trasy s ohledem na termíny vhodné pro výkopy v koordinaci se Stavbou města do 4 měsíců dle podmínek smlouvy,
- vnitřní práce po získání stavebního povolení a dosažení stavební připravenosti ze strany VUT do 4 měsíců – nejdříve 01/2026.

Je doporučeno vypracování a průběžná aktualizace společného harmonogramu prací zhotovitele stavební připravenosti za VUT a zhotovitele přeložky za CETIN.

Náklady na zajištění prací a dodávek přeložky TR1 CETIN

Rozdělení prací přípravných, projekčních i realizačních mezi VUT a CETIN je podrobněji popsáno v Příloze 2. Práce jsou rozděleny na stavební připravenost pro Přeložku CETIN (Stavební připravenost VUT) a na přeložku kabelových tras a TR1 CETIN (Přeložka CETIN).

Práce na Stavební připravenosti VUT projektuje, povoluje, realizuje a financuje VUT.

Práce na Přeložce CETIN projektuje, realizuje a financuje CETIN.

Veškeré náklady na realizaci Přeložky CETIN provedenou CETIN uhradí stavebník VUT, který přeložku vyvolal.

Po ukončení realizace Přeložky CETIN budou vyfakturovány skutečně vynaložené náklady. Nepočítá se zde DPH. Přílohou faktury bude za VUT předem schválený oceněný položkový soupis provedených výkonů a dodávek a předávací protokol dokumentace skutečného provedení přeložky (realizační PD CETIN se zaznačením změn z průběhu realizace).

Náklady na realizaci (metalika, optika, technologie, elektropráce, ventilace, DN, deinstalace) jsou odhadovány na částku 4 600 000,- Kč (čtyři miliony šest set tisíc korun).

Tato částka stanovená v cenových hladinách 1.Q 2024 nezahrnuje práce určené k realizaci stranou VUT, tj. práce a činnosti související se se zajištěním stavební připravenosti místnosti P1.04.

Kontakty VUT:


- xxx

Kontakty CETIN:


- xxx

Rozdělení prací - přeložka TR1 CETIN		VUT	CETIN	Stav
Projekční část, příprava				
1	Venkovní trasa - SO 890 povolení nové kabelové trasy z šachty KK37 do budovy U1 (DUR) - PD a povolovací proces zajišťuje a financuje VUT	X		povoleno SÚ k 25.10.2023
2	Projekt vnitřní trasy, prostupů a místnosti 1.04 TR1 CETIN - stavební část včetně statiky, EPS, PBR - požární ucpávky, napájení v místnosti (DSP, DPS) - PD a povolovací proces zajišťuje VUT	X		k 21.12.2023 e-DSP hrubopis pro fázi projednávání PD
3	Projednání trasy pro napojení místnosti 1.04 TR1 CETIN na trasu kabeláže CETIN v chodníku Úvoz, přes obvodovou stěnu budovy U1 při ul. Úvoz - PD a projednání přípojky kratší než 100m, zajišťuje a financuje CETIN		X	projednání s SÚ k 27.7.2023
4	Realizační PD přeložky CETIN - úprava KK37, kabelové trasy venkovní i vnitřní, určení velikosti prostupů, multikanálů, vnitřní rozvody ventilace místnosti 1.04 TR1 CETIN, PZTS (EZS) a EKV - bez projednání SÚ, s projednáním na straně VUT - zajišťuje a financuje CETIN		X	
Zasmluvnění				
5	Smlouva o realizaci překládky (SoRP)	X	X	
6	Smlouva na VBR (SoSB VBR) na kabelové trasy a místnost nového TR	X	X	
Montáže				
1	Úprava horní výšky a zřízení otvorů do KK37 pro multikanály a chráničky (před realizací Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz)		X	
2	Výkop pro venkovní část kabelovodu s napojením do kabelové komory KK37 (před/v průběhu realizace Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz)		X	
3	Výkop pro komory 1 a 2 (před/v průběhu realizace Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz)		X	
4	Výkop pro napojení místnosti P1.04 na trasu kabeláže CETIN v chodníku Úvoz, obvodovou stěnou budovy U1 při ul. Úvoz		X	
5	Výkop s prostupy základy pro vnitřní kabelovod v budově U1 pod podlahou 1PP na terénu včetně pískového lože, zapravení, zabetonování v budově U1	X		
6	Prostupy základy pro kabelovod	X		
7	Pokládka multikanálů ve venkovních i vnitřních trasách		X	
8	Zatěsnění multikanálů v obvodové konstrukci a v šachtě	X		
9	Provětrávání místnosti CETIN - Napojení místnosti bude zajištěno prostřednictvím dvou kruhových prostupů pro potrubí o průměru 200mm v nové vyzdívané stávajícího okenního otvoru zakončených protidešťovými žaluziemi. Jeden otvor se bude nacházet těsně nad výškovou úroveň parapetu, druhý ve výškové úrovni těsně pod nadpražím). Z exteriéru bude plocha vyzdívky krytá pevnou venkovní žaluzií.	X		
10	Výstavba betonové šachty - místnost CETINu	X		
11	Montáž konstrukce pro HD180 a SID C pásky		X	
12	Zatažení HDPE, kabelů, přepojení služeb		X	
13	Stavební připravenost místnosti, obnova podlahy podél vnitřní trasy, šachta a zdvojená podlaha v místnosti P1.04. Podlaha, stěny a strop jako bezprašné povrchy, vstupní dveře vybavené zámek (bez vložky), volné konce SLP kabelů pro rozvodnu CETIN s poměrným měřením, EPS čidlo (VUT EPS s napojením na HZS), požární ucpávky - po odsouhlasení stavebně technické připravenosti zástupci CETIN bude možné ze strany VUT převzít místnost P1.04 od generálního zhotovitele, následně předat CETIN do užívání k technickému dovybavení a k samotné instalaci a zprovoznění technologie TR1. VUT určí místo parkování a venkovní zásuvky propojovací kabelové trasy do P1.04 pro CETIN mobilní náhradní zdroj DA + přístup pro CETIN vjezdem z ul. Tvrdého. Propojovací kabelovou trasu zrealizuje od venkovní zásuvky po volný konec kabelové trasy v P1.04. Elektrický kabelový přívod z místnosti do rozvodnice + uzemnění, z podružného rozvaděče - měřený odběr; (vybudování podružného měření a dovedení kabelu zakončeného v nové místnosti elektroskřínkou LUCA 2x12 pozic, dimenzovaný na 3x16 Amp) Přivedení zemnicí sběrnice do místnosti a propojení s centrální zemnicí sběrnici budovy a to buď v rámci budování nového multikanálu a nového průchodu do ulice Úvoz; bude nutné připojit zemnicí pásovnu a dodržet maximální odpor uzemnění menší než 15 Ohm.	X		
14	Instalace kabelové telekomunikační sítě - do místnosti P1.04 budou zataženy: Metalické kabely: 14 kabelů z KK37 ze severní strany a 7 kabelů z jižní strany. HDPE chráničky: 2x HDPE chráničky ze severní strany 4x HDPE chráničky z Jižní strany. Ze severní strany z KK37 bude v jedné HDPE chráničce zaveden trubičkový systém a optický kabel zakončený v datovém rozvaděči jako náhrada za původní. Po instalaci metalických kabelů budou kabely přepojovány – ukončeny na nových páscích v místnosti CETINu a postupně napojovány na původní kabely na severní a jižní straně v KK37 a v chodníku dle vypracovaného plánu přepojení. Přepojování bude probíhat několik dní – denně je předpokládáno přepojení 1-2 kabelů dle počtu přepojovaných párů. Optický kabel bude přepojen ve spojce v KK37. Do úplného přepojení budou místnosti fungovat souběžně. Dodávka a osazení vnitřní zásuvky v P1.04 na přivedenou propojovací kabelovou trasu z venkovní zásuvky pro mobilní náhradní zdroj DA CETIN.		X	
15	CETIN - Security - PZTS (EZS) - Vnitřní slaboproudé rozvody a technologie v místnosti jako zabezpečení vstupu EKV, připojení zámku do řídicí jednotky a naprogramování, přesun klíčového trezoru Abloy (Karta/klíč bude umístěna pro nouzové využití HZS na vrátnici U4a při vjezdu z Údolní). Elektrické rozvody v místnosti (osvětlení, zásuvka pro kabelový propoj k mobilnímu DA, ventilace), rozvody ventilace, instalaci konstrukce metalického rozvodu na stěnu, instalaci drátěných žlabů ke stropu. AC rozvaděč + elektrické rozvody v místnosti zásuvka + osvětlení (mechanické přepínání dieselu, jistič pro Usměrňovač) Zdroj + AKU (samostatná dodávka, zajistí se při výstavbě Dslamu)		X	ke zvážení na straně CETIN, kvůli poplachům
16	Po dokončení přepojení TR1 ze stávající v místnosti č.001 na novou v místnosti P1.04, dojde k odstranění kovových částí a vnitřního vybavení místnosti č.001 vč. jejich ekologické likvidace. Místnost č.001 s bude předána do užívání VUT.			
Materiál				
1	Multikanály		X	
2	Komory		X	
3	Vstupní protipožární dveře do m. CETINu dle PBR - s přípravou pro elektrický ZÁMEK ABLOY EL560/55/20; Bezpečnostní třída dveří by měla být alespoň RC3	X		
4	Zámek ABLOY EL560/55/20	X		
5	Cylindrická ložka do zámku ABLOY EL560/55/20		X	
6	Stojan - datový rozvaděč - v části Metalika/Optika		X	
7	Konstrukce pro pásky HD180+SID C		X	
8	Telekomunikační instalační materiál		X	
9	Ventilační systém		X	
10	Venkovní přívodka (samec-kolíky) a propojovací kabelová trasa do P1.04 pro mobilní náhradní zdroj DA CETIN	X		
11	Vnitřní zakončení v P1.04 propojovací kabelové trasy pro mobilní náhradní zdroj DA CETIN		X	


Vytvoření nové místnosti P1.04 TR1 CETIN v místě stávající místnosti 019 (GP VUT)

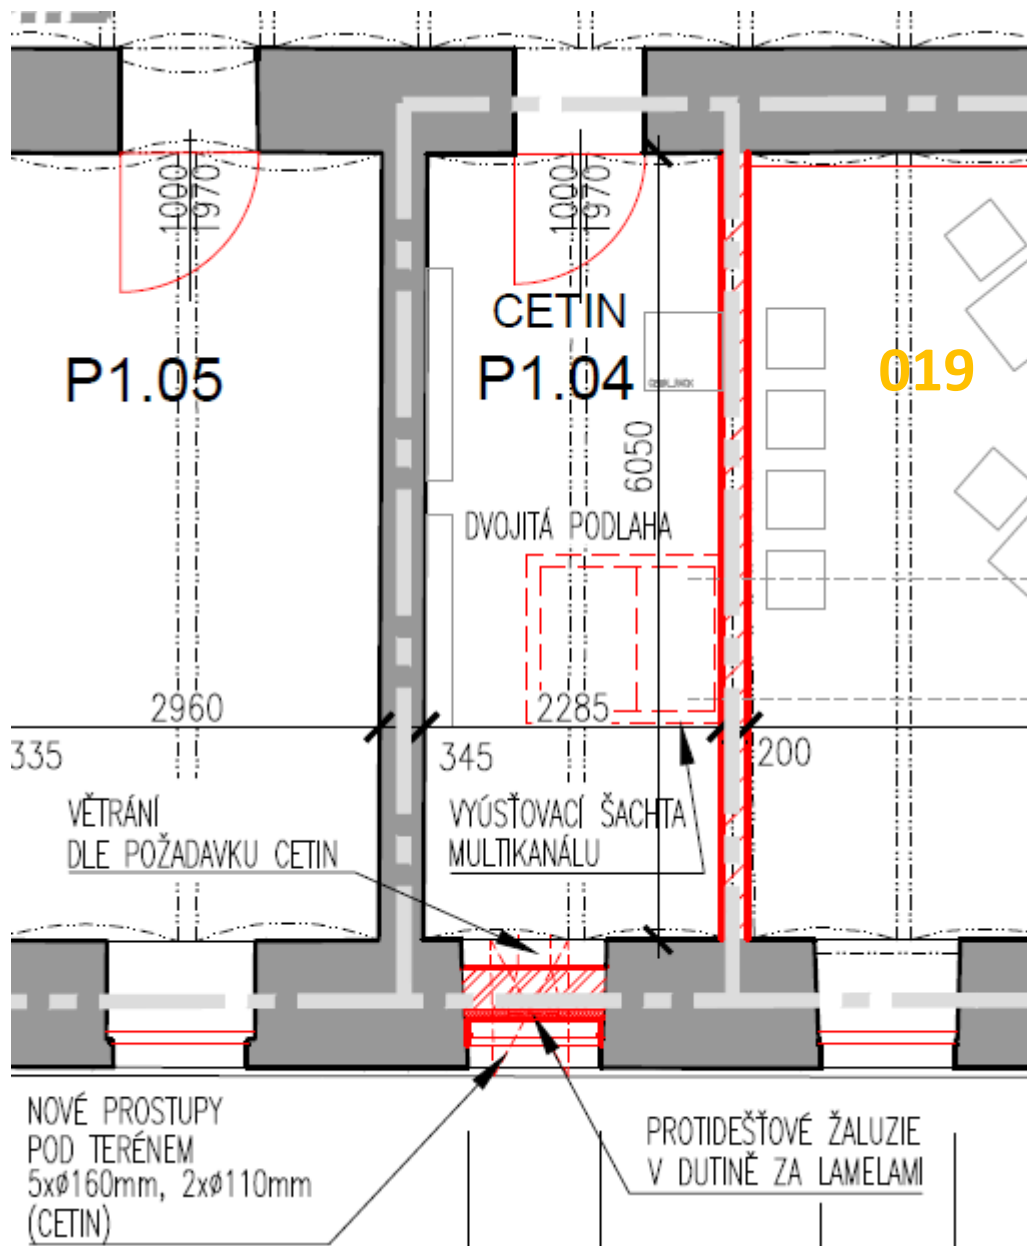

Šachta KK37 – severní konec trasy (GP CETIN)

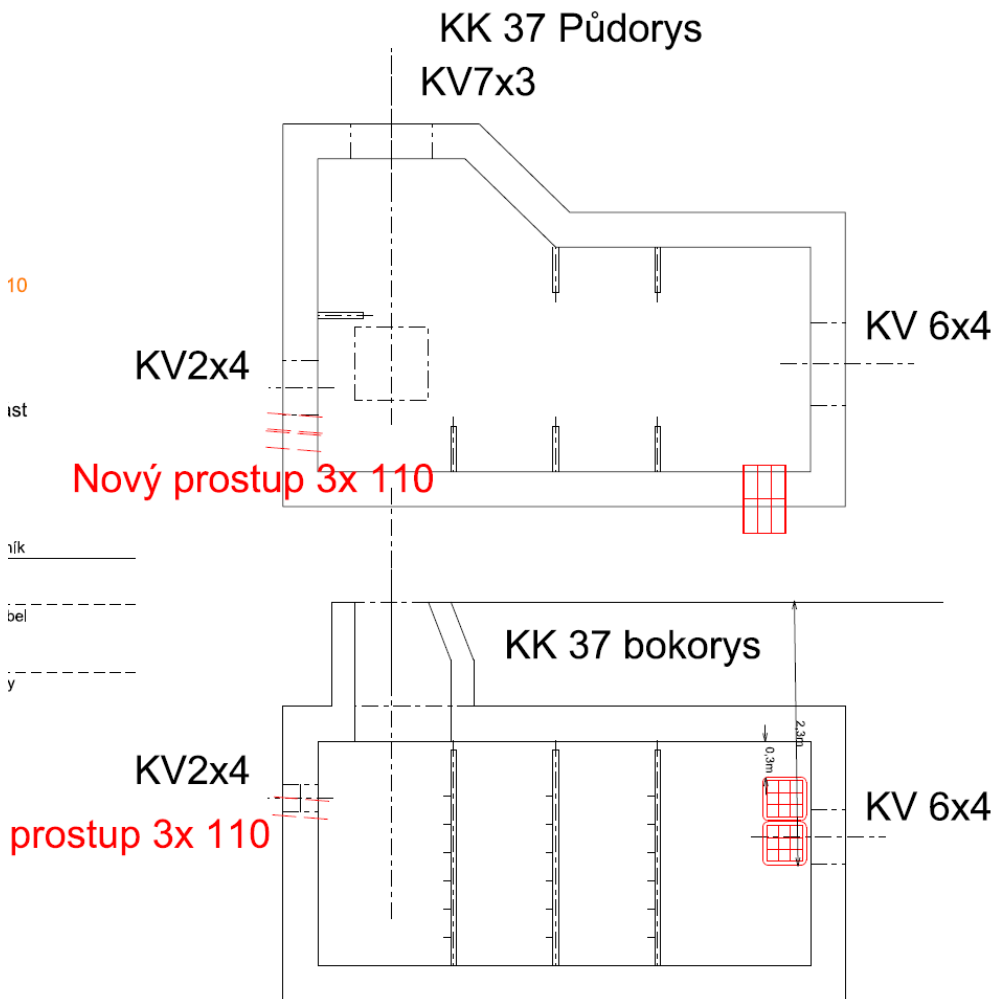


Řez trasy 2 multikanálů nad sebou z boční stěny šachty KK 37

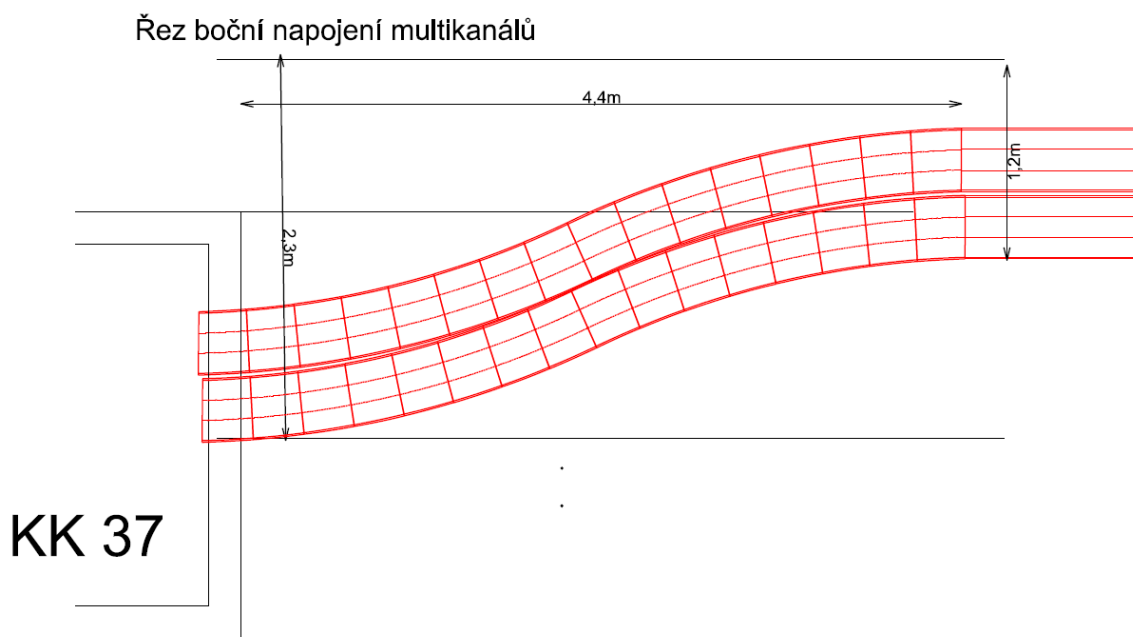


Řezy na SJ trase přeložky (GP CETIN)


Příčný a podélný řez chodníkem – přechod 2 multikanálů nad sebou do jedné výškové úrovně Komory 1 a Komory 2

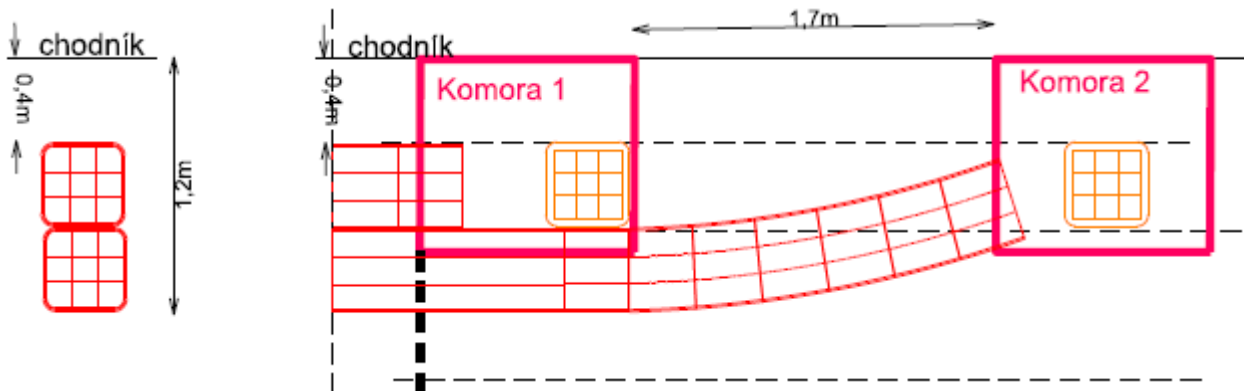

Boční řez prostupem obvodovou stěnou/základy U1 severní část trasy (ze směru KK37 do budovy U1)

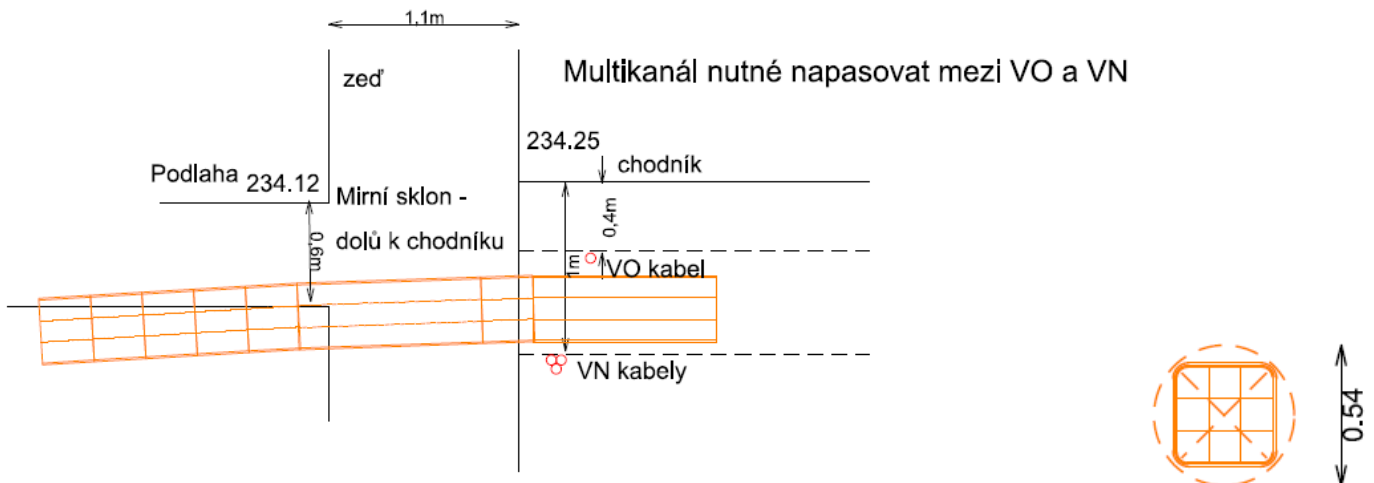


Vyústění trasy v nové místnosti P1.04 CETIN TR1

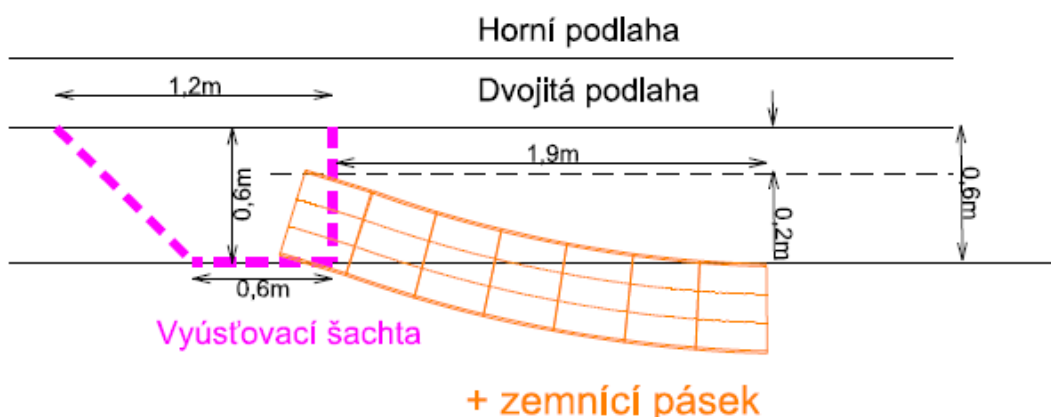

Prostup obvodovou stěnou/základy U1 jižní části trasy

(z nové místnosti P1.04 CETIN TR1 do chodníku Úvoz)

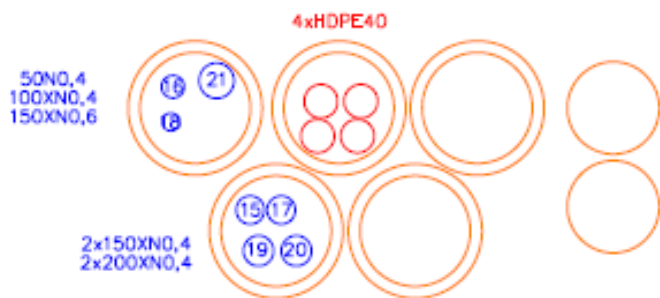

5x pr.160 2x pr. 110

Boční řez obvodovou stěnou/základy U1 s prostupem jižní část trasy

