



CENOVÁ NABÍDKA 7404_2

Projektová dokumentace „Optimalizace chladících zařízení gastro“

Doplnění 1 – přeložka stoupačky RTCH + doplnění vazby MAR

1. července 2024

IKA VIN 112, a.s.

Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3
T: +420 267 313 003 F: +420 267 332 585
www.ikavin112.cz, info@ikavin112.cz

1.1 Identifikace zadavatele

Letiště Praha, a.s., sídlem K Letišti 6/1019, Praha 6, PSČ 160 08, IČO: 282 44 532
zastoupený na základě plné moci ze dne 30.1.2015 společností

Český Aeroholding, a.s., Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, PSČ 160 08, IČO: 248 21 993


1.2 Identifikace dodavatele

Název firmy	IKA VIN 112, a. s.
Sídlo firmy	Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo (IČ)	28220498
Daňové identifikační číslo (DIČ)	CZ28220498
Zastoupená členy představenstva	████████████████████
Kontaktní osoba	████████████████████
Telefon	██████████████
Email	████████████████████████████

2 Předmět nabídky

Předmětem doplnění je rozšíření původní nabídky č. 7404 - stavební i technologická příprava prostoru na montáž typového výrobku chladicího boxu a dvou šokerů (zchladovačů pokrmů) pro potřeby gastroprovozu – o projekční práce související s vyžádanými úpravami:

1. přeložkou blízké stoupačky RTCH pro možnost umístění dveří boxu blíže středu (na schématu níže vyznačeny 2 potenciální možnosti přeložení potrubí – rozdělení / přeuspořádání – bude ještě upřesněno)

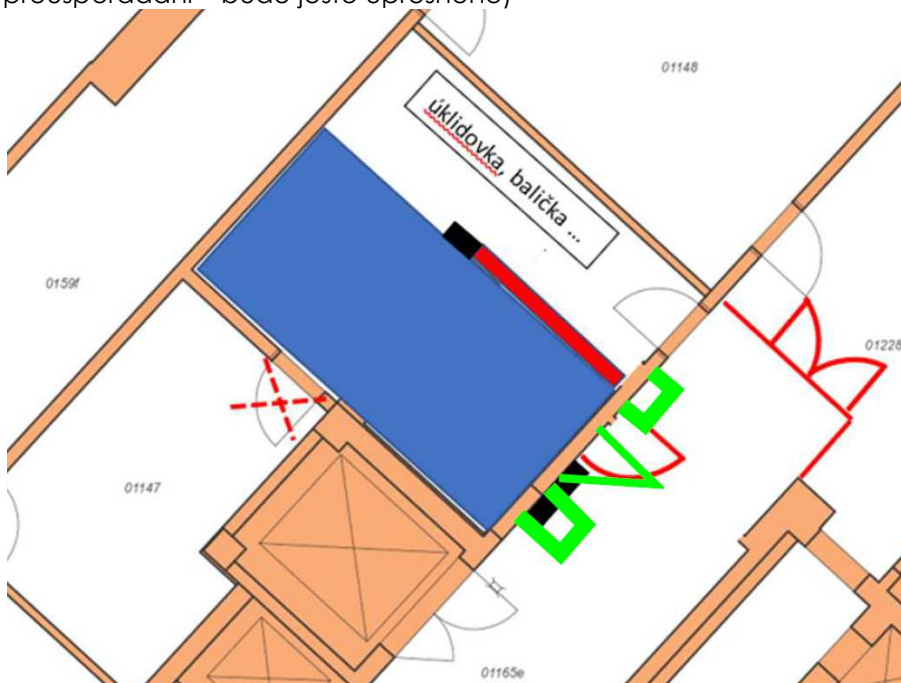

2. a doplnění chybějící vazby mezi VZT zařízeními obsluhujícími řešený prostor (VZT TSB15 a VZT 157)

Podkladem pro zpracování této nabídky jsou dodatečné informace a požadavky OJ ENG, místní prohlídky.

Konkrétně nabídka představuje doplnění o projekční práce související s:


add 1.:

- významným navýšením rozsahu samostatné složky PD (0400_RTCH) postihující vlastní přeložku potrubí
- doplněním vynucených zásahů do stavební a konstrukční části PD
- doplnění koordinací a rozpočtu

add 2.:

- významným navýšením rozsahu samostatné složky PD (0600_SŘTP - MAR) s návrhem vazby zařízení VZT 157 na stávající řídicí systém zařízení VZT TSB15 (rozvaděč MAR RS1.3) (POZN: zakresl nutných úprav stávajícího rozvaděče MAR se omezí pouze na vlastní doplňované/upravované komponenty, nebude zpracováno kompletní technologické schéma rozvaděče)
- doplněním případných vazeb do části 0700_ESIL
- doplněním vynucených zásahů do stavební části PD
- úprava VZT dle zjištěných skutečností
- doplnění koordinací a rozpočtu

3 Nabídková cena

Skladba nabídkové ceny dle předchozího dělení		Cena [Kč]
1. přeložka stoupačky RTCH		
2. doplnění vazby v MAR k VZT zařízením		
3. doplnění stavební prací a koordinací		
4. VZT doplnění		
5. Doplnění rozpočtu		
Celkem		82.000,-

Uvedené ceny jsou bez DPH

4 Termíny dodávky

Vzhledem k poměrně velkému rozšíření předpokládaného rozsahu PD dle původní objednávky je nutné upozornit, že toto doplnění rozsahu prací bude mít dopad do termínu odevzdání – prodloužení o: 4 týdny.

Zpracoval dne 1. července 2024

	IKA VIN 112, a. s.	
		
	E-mail: 	
	GSM: 	
		podpis

