

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: **SMLD-0716/00066001/2025**
dále také jako „**Objednatel 1**“

Obec Senohraby

Sídlo: Příčná 61, 251 66, Senohraby
IČO: 002 40 737
DIČ: CZ00240737
Zastoupené: Ing. Helenou Pechlátovou – starostkou obce
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce usnesením č. 42/2025 dne 15. 04. 2025.
dále také jako „**Objednatel č. 2**“

dále jen společně jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
zastoupená: Ing. Janem Freudlem, jednatelem, Petrem Váňou, jednatelem
bankovní spojení: KB, a.s. Benešov, č.ú.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
č. smlouvy: **S 115/2025**

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1. Předmět Díla

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**III/6031 Senohraby, průtah (etapa 1)**“, a to v následujícím rozsahu:
 - 1.1.1. Stavba se nachází v intravilánu obce Senohraby na silnici III/6031 mezi mostem ev. č. 6031-4 přes silnici I/3 (provozní staničení km 6,389) a provozním staničením km 7,693, s vynecháním úseku v km 0,449999 – km 0,521999, který již byl upraven. Předmětem stavby je rekonstrukce vozovky silnice III/6031 (SO 101), mostu ev. č. 6031-5 (SO 201), úprava přechodů pro chodce (SO 131), obnova dešťové kanalizace (SO 301) a veřejného osvětlení (SO 431). Na mostě bude provedena sanace říms a oprava záchytného systému. Součástí stavby jsou objekty trvalého a přechodného dopravního značení (SO 190 a SO 180). Stavba bude realizována společně s Obcí Senohraby, která se bude finančně podílet na SO 131, 301 a 431.
 - 1.1.2. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby.
Realizační dokumentace bude objednateli předána následovně:
koncept 2x kopie v tištěné podobě a 1x elektronický originál (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - 1.1.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz).
Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána následovně:
koncept 2x kopie v tištěné podobě a 2x elektronický originál (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
(dále společně jen „**Dílo**“)
- 1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závažné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „**Zakázka**“ a „**Závažná dokumentace**“). Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatелеm pouze k provedení Díla dle Smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu

provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel.

- 1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytyčení prostorové polohy stavby a vytyčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 1.6. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.
- 1.7. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 paré v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 4 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „**Staveniště**“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do **35 kalendářních dnů** od výzvy objednatel smlouvy. Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení.
- 3.2. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení
- 3.3. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odeprýt předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.10 Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 3.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.7. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce **do 8 měsíců.**
- 4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím Objednatele přerušit.
- 4.3. Objednatel zahazuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody rozhodnutí.
- 4.4. V případě vyhlášení technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu technologické přestávky možno dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu technologické přestávky je Zhotovitel oprávněn/povinen přerušit provádění Díla,

- 4.5. Zimní technologickou přestávku Objednatel vyhlašuje zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.
- 4.6. Před předáním staveniště zhotovitel předloží pracovní smlouvu (smlouvu/dohodu) s Osobou splňující požadavky odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací.
- 4.7. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovoznění části povolen oprávněnými orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele.
- 4.8. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 4.9. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s SD; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
 - d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
 - e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
- Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle 4.4. této Smlouvy jsou uvedeny v resortních normách dostupných na www.pjpk.cz.
- 4.10. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.11. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.12. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Odkup nadbytečného

materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02¹).

Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. přírodninu a demoliční a stavební materiál, recyklovat v souladu se Směrnicí R-Sm-42² a dále v souladu s rozpočtem (soupisem prací) Objednatele, a to na svou odpovědnost. Odpovědnost za nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem. Vlastnické právo k odpadu přechází na zhotovitele v okamžiku vytěžení/vybourání, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli doklad o uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42 pro potřeby Objednatele bez zbytečného odkladu. V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, nestanoví-li projektová dokumentace jinak; v takovém případě je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem.

- 5.3. Zhotovitel je povinen respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.DWG - AutoCAD 2004 a *.PDF, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od výzvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby.
- 5.5. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.6. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesl připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.7. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.8. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesl připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.9. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1 Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.

¹ Směrnice R-Sm-16 je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155981.html
včetně příloh:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155982.html

² Směrnice R-Sm-42 je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_163435.html
včetně příloh:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154250.html

- 5.11. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.12. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovému tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.14. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.15. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobcích, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.16. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.17. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.

- 5.18. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.19. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.20. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této Smlouvy.
- 5.21. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.22. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace).
- 5.23. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 5.24. Zhotovitel je povinen vyhotovit geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, a to v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, ve znění účinném k 01. 07. 2024, případně k pozdějšímu dni, bude-li účinnost předpisu odložena (dále jen „vyhláška DTM“), ve verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geometrický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní na základě aktuálních dat o ZPS, DI a TI ze systému IS DMVS nebo IS DTM Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být KSUS, SčK nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od KSUS, SčK nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.
- 6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle ZZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), která je dostupná jako veřejný dokument organizace na profilu zadavatele viz odkaz: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html s přílohami https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
 - a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,

- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ,
 - e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.
- 6.8. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ následující podmínky vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelům po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Položkami, které mohou být měřeny dle skutečně provedených prací, jsou všechny položky v soupisu prací, které nejsou označeny jako položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr. Cena za tyto položky, které budou měřeny, bude hrazena dle příslušných jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 Smlouvy a podle skutečně poskytnutého objemu konkrétní měřitelné položky.
 - b) Maximální vyhrazená změna nesmí překročit 10 % celkové ceny díla dle čl. 8.1 Smlouvy ke dni uzavření Smlouvy
 - c) Pro tyto změny se použije dokument Evidence změny dle Směrnice.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou.
- 7.2. Zhotovitel předává objednateli po dokončení stavebních prací dle čl. 4.1. Dílo je dokončeno je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby, který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelům odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatelům alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.4. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přijímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelům není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.5. O odstranění každé vady nebo nedodělky uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přijímacích zkoušek, budou-li Objednatelům nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělkami požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělky oběma smluvními stranami.
- 7.6. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoliv části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost,

zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatel provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

- 7.7. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.8. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 pracovních dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.9. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.10. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatel navrhout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.11. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.12. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy alespoň 7 pracovních dnů předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 5 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.13. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.
- 7.14. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zařazení nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:
celková cena díla:

Cena Díla bez DPH	49 959 633,24 Kč
Cena Díla včetně DPH	60 451 156,22 Kč

cena díla Objednatele 1:

Cena Díla bez DPH	40 009 796,71 Kč
Cena Díla včetně DPH	48 411 854,02 Kč

Cena díla Objednatele 2:

Cena Díla bez DPH	9 949 836,53 Kč
Cena Díla včetně DPH	12 039 302,20 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

- 8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 ZZVZ.
- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírůžek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.
- 8.5. Finanční rozdělení objektů Objednatelů:
Objednatel 1:
SO 001-A
SO 101
SO 180.1
SO 190.1
SO 201

SO 301-A

Objednatel 2:

SO 001-B

SO 131

SO 301-B

SO 431

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur jednotlivým Objednatelům, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.
- 9.2. Ustanovení se nepoužije.
- 9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.6. Faktury budou mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být jednotlivým Objednatelům dle finančního rozdělení čl. 8.5 Smlouvy doručeny alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a **označení „kapitola 12“**), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

- 9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy
- 9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.11. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele.
- 9.12. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následujícíce:

Objednatel č. 1:

adresa: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle.

Objednatel č. 2:

adresa: Příčná 61, 251 66, Senohraby

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: 967b6bm

nebo e-mailem na adresu: ucetni@senohraby.cz

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- **60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na část technologickou**
- Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednaní nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši **2 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele, prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.
- 11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;

- c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
 - d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.22 této Smlouvy, tj. povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,00 Kč za každé porušení této povinnosti;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 10.000,00 Kč za každé porušení takové povinnosti.
 - f) pokud Zhotovitel poruší povinnost nakládání s odpady v souladu se Směrnicí R-Sm-42 a požadavky dotačního orgánu pro poskytnutí dotace na realizaci Díla, a to v plné výši případného krácení dotace podle 17.1. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, verze 3³ ze strany dotačního orgánu. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
 - g) Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě dle čl. 3.1 a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště
- 12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve Směrnici. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy.

Článek 13.

Bankovní záruka za vady Díla

- 13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v minimální výši **3,5 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy platné ke dni protokolárního předání díla, za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelům vůči

³ <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>

- Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele.
- 13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatel do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a Objednatel.
- 13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatel vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že:
- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla.
 - výše bankovní záruky zůstane neměnná bez ohledu na případné změny ceny Díla provedené dodatkem ke smlouvě po datu podpisu Předávacího protokolu
- 13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

Článek 14.

Odstoupení od Smlouvy

- 14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatel, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbuje oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- 14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 15.

Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 ZZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je _____, za nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8 Smlouvy.
- 15.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou:

za Objednatele č. 1:

ve věcech smluvních:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

ve věcech technických:

jméno: Ing. Přemysl Vlček

email: _____

tel.:

jméno: Ing. Marek Hanuš, MPA
email: _____
tel.:

ve věcech ekonomických a finančních:
ekonomický náměstek
Ing. Jaroslava Jurková,

za Objednatele č. 2:

ve věcech smluvních:

jméno: Ing. Helena Pechlátová
email:
tel.:

ve věcech technických:

jméno: Ing. Helena Pechlátová
email:
tel.:

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno: Šárka Sovová
email:
tel.:

15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

15.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

jméno: Ing. Jan Freudl, jednatel
email: _____
tel.:

jméno: Petr Váňa, MSc., jednatel
email: _____
tel.:

ve věcech technických:

jméno: Ing. Zdeněk Račan
email: _____

tel.:

jméno: Radek Macháček

email: _____

tel.:

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno: Petr Váňa, MSc., jednatel

email: _____

tel.:

15.9. Realizační tým, jmenný seznam:

Stavbyvedoucí:

Ing. Roman Wilkonský

Zástupce stavbyvedoucího:

Ing. Aleš Pikora

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených v čl. 15.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do 5 pracovních dnů od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatel.

15.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatel, a/nebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

15.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

15.15. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupně číselné řadě.

15.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

- 15.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 15.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 15.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 15.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
 - Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram
 - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
 - Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

B E S s.r.o.

Obec Senohraby
Ing. Helena Pechlátová, starostka

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr




Firma:

Rekapitulace ceny**Stavba: 17 251 00 - III/6031 Senohraby, průtah**

Celková cena bez DPH: 49 959 633,24

Celková cena s DPH: 60 451 156,22

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 001-A	Všeobecné konstrukce a práce - investice KSÚS	2 469 763,40	518 650,31	2 988 413,71
SO 001-B	Všeobecné konstrukce a práce - investice obce Senohraby	861 755,70	180 968,70	1 042 724,40
SO 101	Silnice III/6031 úsek I/3 - most ev.č. 6031-5 - investice KSÚS	22 619 875,04	4 750 173,76	27 370 048,80
SO 131	Stavební úprava přechodů pro chodce - investice obce Senohraby	486 504,09	102 165,86	588 669,95
SO 180.1	Přechodné dopravní značení (SO 101) - investice KSÚS	3 270 484,80	686 801,81	3 957 286,61
SO 190.1	Trvalé dopravní značení (SO 101) - investice KSÚS	395 421,82	83 038,58	478 460,40
SO 201	Most ev.č. 6031-5 - investice KSÚS	5 513 089,58	1 157 748,81	6 670 838,39
SO 301-A	Obnovení dešťové kanalizace - investice KSÚS	5 741 162,07	1 205 644,03	6 946 806,10
SO 301-B	Obnovení dešťové kanalizace - investice obce Senohraby	7 499 661,06	1 574 928,82	9 074 589,88
SO 431	Veřejné osvětlení - investice obce Senohraby	1 101 915,68	231 402,29	1 333 317,97

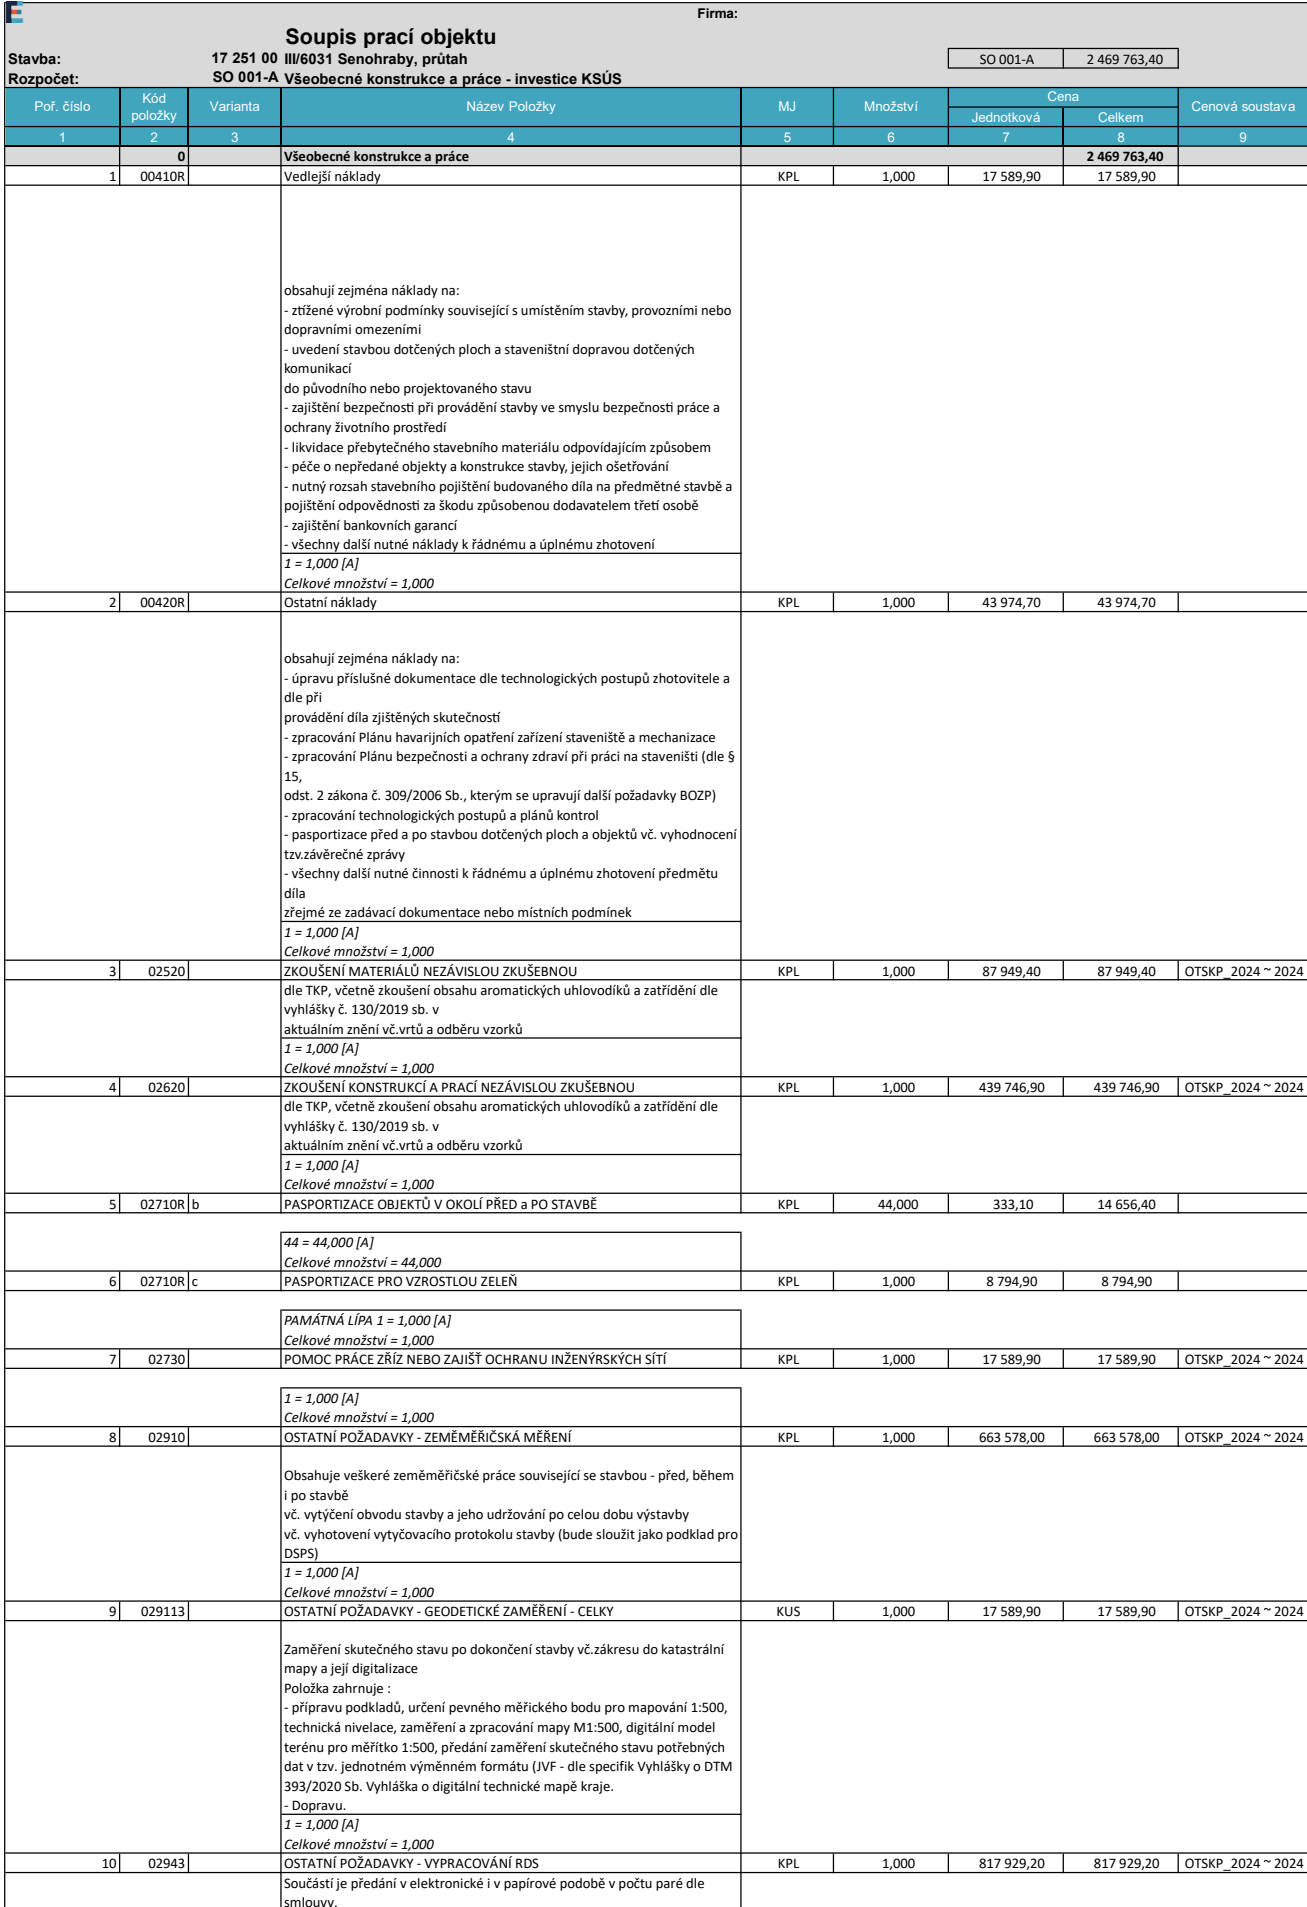

			1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000					
11	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	92 346,80	92 346,80	OTSKP_2024 ~ 2024
			Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona, dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (8/2017), v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (9/2006), kapitola 4. Součástí je předání v elektronické i v papírové podobě v počtu paré dle smlouvy. 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000					
12	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	1,000	17 589,90	17 589,90	OTSKP_2024 ~ 2024
			Vypracování geometrického plánu, vč. vytyčovací sítě v digitální podobě a včetně zavkládování ve formátu *jvf. s přehráním do *dmt. dle nového stav.zákona 1 = 1,000 [A]					
13	02960		Inženýrská činnost pro DIO	KPL	1,000	17 589,90	17 589,90	OTSKP_2024 ~ 2024
			1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000					
14	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	3,000	6 449,60	19 348,80	OTSKP_2024 ~ 2024
			1KS INFORMAČNÍ TABULE, 2 KS OMLUVNÁ TABULE 3 = 3,000 [A] Celkové množství = 3,000					
15	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	měsíc	8,000	24 186,10	193 488,80	OTSKP_2024 ~ 2024
			8 = 8,000 [A] Celkové množství = 8,000					

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

			Součástí je předání v elektronické i v papírové podobě v počtu paré dle smlouvy. 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000					
11	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	30 782,30	30 782,30	OTSKP_2024 ~ 2024
			Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona, dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (8/2017), v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (9/2006), kapitola 4. Součástí je předání v elektronické i v papírové podobě v počtu paré dle smlouvy. 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000					
12	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	1,000	17 589,90	17 589,90	OTSKP_2024 ~ 2024
			Vypracování geometrického plánu, vč. vytyčovací sítě v digitální podobě a včetně zavkládování ve formátu *jvf. s přehráním do *dmt. dle nového stav.zákona 1 = 1,000 [A]					
13	02960		Inženýrská činnost pro DIO	KPL	1,000	17 589,90	17 589,90	OTSKP_2024 ~ 2024
			1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000					
14	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	měsíc	8,000	5 863,30	46 906,40	OTSKP_2024 ~ 2024
			8 = 8,000 [A] Celkové množství = 8,000					

				Firma:					
Stavba:		17 251 00 III/6031 Senohraby, průtah				SO 101		22 619 875,04	
Rozpočet:		SO 101 Silnice III/6031 úsek I/3 - most ev.č. 6031-5 - investice KSÚS							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0	Všeobecné konstrukce a práce				2 035 937,54		
1	014102.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	t	2 100,530	187,60	394 059,43		
			17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Položka zahrnuje : Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. 11352: 791,17*0,25*0,15*2,3 = 68,238 [A] 96615: 62,29*0,3*2,3 = 42,980 [B] 11348: 855*0,06*2,3 = 117,990 [C] 11328 73,8*0,3*2,3 = 50,922 [D] 11333 758,50*2,40 = 1820,400 [E] Celkové množství = 2100,530						
2	014103.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	t	11 277,598	140,70	1 586 758,04		
			17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použi na této stavbě Položka zahrnuje : Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. 12373: 2815,6*2 = 5631,200 [A] 11130: 1327,20*0,2*2 = 530,880 [B] 11332 2487,178*1,9 = 4725,638 [D] 11348 855,0*0,24*1,9 = 389,880 [E] Celkové množství = 11277,598						
3	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	145,091	379,90	55 120,07	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Pořízení vhodné zeminy k rekultivaci Natěžení a dovoz na místo rozproštění v položce 12573 Rozproštění v položce 18222 967,27*0,15 = 145,091 [A] Celkové množství = 145,091						
	1		Zemní práce				5 485 326,16		
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	25,000	89,30	2 232,50	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Povinný odkup zhotovitelem Počet odečten digitálně ze situace 25 = 25,000 [A] Celkové množství = 25,000						
5	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1 327,200	27,90	37 028,88	OTSKP_2024 ~ 2024	
			vč. odvozu a uložení na skládku Plocha odečtena digitálně ze situace 1327,20 = 1327,200 [A] Celkové množství = 1327,200						
6	11203		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEŽŮ	KUS	6,000	13 762,00	82 572,00	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Postup s nakládáním s odpadem je uveden ve směrnici zadavatele R-SM-16 Počet odečten digitálně ze situace 6 = 6,000 [A] Celkové množství = 6,000						
7	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	73,800	126,10	9 306,18	OTSKP_2024 ~ 2024	
			vč. odvozu, uložení na skládku, poplatek za skládku sam.pol. 123,0*0,6 = 73,800 [A] Celkové množství = 73,800						
8	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	2 487,178	240,60	598 415,03	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Odstranění vozovkových vrstev z kameniva vč. odvozu a uložení na skládku Plocha odečtena digitálně ze situace 7585,0*0,3 = 2275,500 [A] 32,388*0,2 = 6,478 [B] 855,0*0,24 = 205,200 [C] Celkové množství = 2487,178						
9	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	758,500	555,20	421 119,20	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Odstranění vozovkových vrstev s asfaltovým pojivem vč. odvozu a uložení na skládku Plocha odečtena digitálně ze situace 7585*0,1 = 758,500 [A] Celkové množství = 758,500						
10	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	256,500	548,00	140 562,00	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Odstranění dlažby vč. podkladních vrstev, odvozu a uložení na skládku Plocha odečtena digitálně ze situace 855,0*0,3 = 256,500 [A] Celkové množství = 256,500						
11	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	791,170	90,70	71 759,12	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Odstranění betonové obruby vč. odvozu a uložení na skládku Délka odečtena digitálně ze situace						

			791,17 = 791,170 [A] Celkové množství = 791,170						
12	11372		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	890,004	873,90	777 774,50	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Povinný odkup zhotovitelem 7585*0,1+1315.04*0.1 = 890,004 [A] Celkové množství = 890,004						
13	113763		FŘEZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	2 485,010	64,50	160 283,15	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Prořiznutí spáry mezi asf. kryty š. 12 x 25 mm Žalívka v poloze 931323 Délka odečtena digitálně ze situace 2184,28+300.73 = 2485,010 [A] Celkové množství = 2485,010						
14	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	2 815,600	125,10	352 231,56	OTSKP_2024 ~ 2024	
			vč. odvozu na skládku Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů 2815,6 = 2815,600 [A] Celkové množství = 2815,600						
15	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	170,202	100,80	17 156,36	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Natěžení a dovoz zeminy vhodné k rekultivaci na místo rozprostření Rozprostření v poloze 18222 Poplatek za nákup zeminy v poloze 014211 Osetí travním semenem v poloze 18241 Plocha odečtena digitálně z charakteristických řezů 18220: 1134,68*0,15 = 170,202 [A] Celkové množství = 170,202						
16	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	25,000	866,90	21 672,50	OTSKP_2024 ~ 2024	
			čištění propustku z ulice Za Starou poštou vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného 25,0 = 25,000 [A] Celkové množství = 25,000						
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 815,600	24,80	69 826,88	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Uložení výkopku na skládku 12373: 2815,6 = 2815,600 [A] Celkové množství = 2815,600						
18	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	398,440	745,60	297 076,86	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Násp z vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů 398,44 = 398,440 [A] Celkové množství = 398,440						
19	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 477,790	745,60	1 847 440,22	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Sanace aktivní zóny z vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů 2477,79 = 2477,790 [A] Celkové množství = 2477,790						
20	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	278,940	1 341,80	374 281,69	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Dosyp z materiálu vhodného dle ČSN 73 6133 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů 278,94 = 278,940 [A] Celkové množství = 278,940						
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	8 348,310	15,40	128 563,97	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Úprava pláň Plocha odečtena digitálně ze situace 8348,31 = 8348,310 [A] Celkové množství = 8348,310						
22	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1 134,680	37,10	42 096,63	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Ohumsování vhodnou zeminou k rekultivaci tl. 150 mm Natěžení a dovoz zeminy v poloze 12573 Poplatek za nákup zeminy v poloze 014211 Osetí travním semenem v poloze 18241 Plocha odečtena digitálně ze situace 1134,68 = 1134,680 [A] Celkové množství = 1134,680						
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝŠEVEM	M2	1 134,680	23,40	26 551,51	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Odečteno digitálně ze situace 1134,68 = 1134,680 [A] Celkové množství = 1134,680						
24	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 134,680	6,50	7 375,42	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Plocha odečtena digitálně ze situace 1134,680 = 1134,680 [A] Celkové množství = 1134,680						
		2	Základy				1 458 345,17		
25	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM	M	1 106,710	839,30	928 861,70	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Délka odečtena digitálně ze situace 1106,71 = 1106,710 [A] Celkové množství = 1106,710						
26	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	10 028,096	52,80	529 483,47	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů Geotextilie aktivní zóny 7150,65 = 7150,650 [A] pro drenáž 1106,71*(0,4+0,5+0,5+0,6+0,6) = 2877,446 [B] Celkové množství = 10028,096						
		3	Svislé konstrukce				13 740,00		
27	33817C		SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	10,000	1 374,00	13 740,00	OTSKP_2024 ~ 2024	
			obnova oplocení v km 0.910 k poloze 767911 malé sloupky 10 = 10,000 [B] Celkové množství = 10,000						
		5	Komunikace				11 344 945,83		
28	56143G		SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM	M2	7 076,380	349,30	2 471 779,53	OTSKP_2024 ~ 2024	
			SC C8/10 tl. 120 mm Plocha odečtena digitálně ze situace Vozovka 1a: 7076,38 = 7076,380 [A] Celkové množství = 7076,380						
29	56144G		SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM	M2	58,200	494,80	28 797,36	OTSKP_2024 ~ 2024	
			SC C8/10 tl. 170 mm Plocha odečtena digitálně ze situace kce zvýš. ploch křižovatky: 58,2 = 58,200 [A] Celkové množství = 58,200						
30	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	207,280	311,20	64 505,54	OTSKP_2024 ~ 2024	

			ŠD 0/64 Plocha odečtena digitálně ze situace Sjezd 3b: 207,28 = 207,280 [A] Celkové množství = 207,280						
31	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	313,110	166,80	52 226,75	OTSKP_2024 ~ 2024	
			ŠDa 0/32 Plocha odečtena digitálně ze situace Sjezd 3b: 207,28 = 207,280 [A] Sjezdy 105,83 = 105,830 [B] Celkové množství = 313,110						
32	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	7 920,220	222,30	1 760 664,91	OTSKP_2024 ~ 2024	
			ŠDa 0/32 Plocha odečtena digitálně ze situace Vozovka 1a: 7092,45 = 7092,450 [A] Chodník 2: 769,57 = 769,570 [B] Kce zvýš. ploch křižovatky: 58,2 = 58,200 [C] Celkové množství = 7920,220						
33	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	220,890	277,90	61 385,33	OTSKP_2024 ~ 2024	
			ŠDa 0/32 Plocha odečtena digitálně ze situace Sjezd 3a: 220,89 = 220,890 [A] Celkové množství = 220,890						
34	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	111,440	252,00	28 082,88	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Krajnice z ŠDb Plocha odečtena digitálně ze situace 111,44 = 111,440 [A] Celkové množství = 111,440						
35	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	207,280	50,40	10 446,91	OTSKP_2024 ~ 2024	
			PI-C 0,6 kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace Sjezd 3b: 207,28 = 207,280 [A] Celkové množství = 207,280						
36	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15 789,920	11,60	183 163,07	OTSKP_2024 ~ 2024	
			PS-CP 0.35 kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace Vozovka 1a: 7054,07+7060,30 = 14114,370 [A] Vozovka 1b: 153,23 = 153,230 [B] Vozovka 5: 1315,04 = 1315,040 [D] Sjezd 3b: 207,28 = 207,280 [C] Celkové množství = 15789,920						
37	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 468,270	17,30	25 401,07	OTSKP_2024 ~ 2024	
			PS-CP 0.6 kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace Vozovka 1b: 153,23 = 153,230 [A] Vozovka 5: 1315,04 = 1315,040 [B] Celkové množství = 1468,270						
38	574834		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	8 729,720	253,70	2 214 729,96	OTSKP_2024 ~ 2024	
			ACO 11+ PmB 45/80-65 tl. 40mm Plocha odečtena digitálně ze situace Vozovka 1a: 7054,07 = 7054,070 [A] Vozovka 1b: 153,23 = 153,230 [B] Vozovka 5: 1315,04 = 1315,040 [D] Sjezd 3b: 207,38 = 207,380 [C] Celkové množství = 8729,720						
39	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	8 375,340	274,10	2 295 680,69	OTSKP_2024 ~ 2024	
			ACL 16+ PmB 25/55-60 tl. 50mm Plocha odečtena digitálně ze situace Vozovka 1a: 7060,3 = 7060,300 [A] Vozovka 5: 1315,04 = 1315,040 [B] Celkové množství = 8375,340						
40	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	7 427,370	258,50	1 919 975,15	OTSKP_2024 ~ 2024	
			ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm Plocha odečtena digitálně ze situace Vozovka 1a: 7066,86 = 7066,860 [A] Vozovka 1b: 153,23 = 153,230 [B] Sjezd 3b: 207,28 = 207,280 [C] Celkové množství = 7427,370						
41	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	58,200	727,00	42 311,40	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Kce zvýšených ploch křižovatek z kamenné dlažby tl. 100 mm do lože z M25- XF4 tl. 50 mm Plocha odečtena digitálně ze situace 58,2 = 58,200 [A] Celkové množství = 58,200						
42	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	749,690	187,60	140 641,84	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Betonová dlažba tl. 60 mm do lože z kameniva tl. 40 mm Plocha odečtena digitálně ze situace Chodník 2: 749,69 = 749,690 [A] Celkové množství = 749,690						
43	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	193,770	187,60	36 351,25	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Betonová dlažba tl. 80 mm do lože z kameniva tl. 40 mm Plocha odečtena digitálně ze situace Sjezd 3a: 193,77 = 193,770 [A] Celkové množství = 193,770						
44	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	20,200	187,60	3 789,52	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Betonová reliéfní dlažba tl. 60 mm do lože z kameniva tl. 40 mm Plocha odečtena digitálně ze situace Chodník 2: 20,20 = 20,200 [A] Celkové množství = 20,200						
45	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	26,720	187,60	5 012,67	OTSKP_2024 ~ 2024	
			Betonová reliéfní dlažba tl. 80 mm do lože z kameniva tl. 40 mm Plocha odečtena digitálně ze situace Sjezd 3a: 26,72 = 26,720 [A] Celkové množství = 26,720						

	8		Potrubí				512 539,90	
46	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	28,000	13 773,30	385 652,40	OTSKP_2024 ~ 2024
			Počet odečten digitálně ze situace					
			28 = 28,000 [A]					
			Celkové množství = 28,000					
47	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	33,000	2 848,20	93 990,60	OTSKP_2024 ~ 2024
			33 = 33,000 [A]					
			Celkové množství = 33,000					
48	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	23,000	1 430,30	32 896,90	OTSKP_2024 ~ 2024
			23 = 23,000 [A]					
			Celkové množství = 23,000					
	9		Ostatní konstrukce a práce				1 769 040,44	
49	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	6,000	445,60	2 673,60	OTSKP_2024 ~ 2024
			směrové sloupky plastové					
			6 = 6,000 [A]					
			Celkové množství = 6,000					
50	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	369,360	539,40	199 232,78	OTSKP_2024 ~ 2024
			Betonová obruba š. 80 mm do betonového lože C20/25nXF3					
			Délka odečtena digitálně ze situace					
			369,36 = 369,360 [A]					
			Celkové množství = 369,360					
51	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 826,950	645,00	1 178 382,75	OTSKP_2024 ~ 2024
			Betonová obruba š. 150 mm do betonového lože C20/25nXF3Délka					
			odečtena digitálně ze situace					
			1826,95 = 1826,950 [A]					
			Celkové množství = 1826,950					
52	9181150R		ČELA PROPUSTU Z BETONU - OPRAVA ČELA	KPL	1,000	31 409,00	31 409,00	
			oprava čela propustku - rozsah dle TZ (sanace, římsy, zábradlí)					
			1 = 1,000 [A]					
			Celkové množství = 1,000					
53	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	235,550	58,60	13 803,23	OTSKP_2024 ~ 2024
			Uvažováno na začátku a konci úpravy, v napojeních křižovatek a sjezdů.					
			Délka odečtena digitálně ze situace					
			167,9+67,65 = 235,550 [A]					
			Celkové množství = 235,550					
54	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	2 485,010	70,40	174 944,70	OTSKP_2024 ~ 2024
			Asfaltová zálivka modifikovaná za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-					
			1Frézování drážky v položce 113763Délka odečtena digitálně ze situace					
			zahrnuje podélné spáry kolem obrub, napojení na stávající vozovku apod.					
			2184,28+300.73 = 2485,010 [A]					
			Celkové množství = 2485,010					
55	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	18,687	5 387,00	100 666,87	OTSKP_2024 ~ 2024
			Bourání betonových základů tl. 300 mm vč. odvozu a uložení na skládku					
			Plocha odečtena digitálně ze situace					
			62,29*0,3 = 18,687 [A]					
			Celkové množství = 18,687					
56	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	19,740	1 853,80	36 594,01	OTSKP_2024 ~ 2024
			vč. odvozu a uložení a poplatku za skládku					
			19,74 = 19,740 [A]					
			Celkové množství = 19,740					
57	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	11,000	2 848,50	31 333,50	OTSKP_2024 ~ 2024
			vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku					
			11 = 11,000 [A]					
			Celkové množství = 11,000					


				Firma:					
Stavba:		17 251 00		III/6031 Senohraby, průtah		SO 131		486 504,09	
Rozpočet:		SO 131		Stavební úprava přechodů pro chodce - investice obce Senohraby					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0	Všeobecné konstrukce a práce				33 464,72		
1	014102.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Položka zahrnuje : Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. 11333 13,225*2,400 = 31,740 [E] Celkové množství = 31,740	t	31,740	187,60	5 954,42		
2	014103.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě Položka zahrnuje : Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. 11130: 144,930*0,2*2 = 57,972 [B] 17120: 5,08*2 = 10,160 [A] 11332 47,262*1,9 = 89,798 [C] Celkové množství = 157,930	t	157,930	140,70	22 220,75		
3	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Pořízení vhodné zeminy k rekultivaci Natěžení a dovoz na místo rozproštění v položce 12573 Rozproštění v položce 18222 0,15*126,890 = 19,034 [A] Celkové množství = 19,034	M3	19,034	277,90	5 289,55	OTSKP_2024 ~ 2024	
	1		Zemní práce				124 873,29		
4	11130		SEJMUTÍ DRNU vč. odvozu a uložení na skládku Plocha odečtena digitálně ze situace 144,930 = 144,930 [A] Celkové množství = 144,930	M2	144,930	27,90	4 043,55	OTSKP_2024 ~ 2024	
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění vozovkových vrstev z kameniva vč. odvozu a uložení na skládku Plocha odečtena digitálně ze situace 132,25*0,3 = 39,675 [A] 37,937*0,2 = 7,587 [B] Celkové množství = 47,262	M3	47,262	240,60	11 371,24	OTSKP_2024 ~ 2024	
6	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM Odstranění vozovkových vrstev s asfaltovým pojivem vč. odvozu a uložení na skládku Plocha odečtena digitálně ze situace 132,25*0,1 = 13,225 [A] Celkové množství = 13,225	M3	13,225	555,20	7 342,52	OTSKP_2024 ~ 2024	
7	11372		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Povinný odkup zhotovitelem 132,25*0,1 = 13,225 [A] Celkové množství = 13,225	M3	13,225	873,90	11 557,33	OTSKP_2024 ~ 2024	
8	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I vč. odvozu a uložení na skládku položka 17120 5,08 = 5,080 [A] Celkové množství = 5,080	M3	5,080	132,40	672,59	OTSKP_2024 ~ 2024	
9	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Natěžení a dovoz zeminy vhodné k rekultivaci na místo rozproštění Rozproštění v položce 18222 Poplatek za nákup zeminy v položce 014211 Osetí travním semenem v položce 18241 Plocha odečtena digitálně z charakteristických řezů 18220: 126,89*0,15 = 19,034 [A] Celkové množství = 19,034	M3	19,034	100,80	1 918,63	OTSKP_2024 ~ 2024	
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Poplatek za skládku viz sam. pol. 12273: 5,08 = 5,080 [A] Celkové množství = 5,080	M3	5,080	24,80	125,98	OTSKP_2024 ~ 2024	
11	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 102,4 = 102,400 [A] Celkové množství = 102,400	M3	102,400	745,60	76 349,44	OTSKP_2024 ~ 2024	
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 194,18 = 194,180 [A] Celkové množství = 194,180	M2	194,180	15,40	2 990,37	OTSKP_2024 ~ 2024	
13	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 126,890 = 126,890 [A] Celkové množství = 126,890	M2	126,890	37,10	4 707,62	OTSKP_2024 ~ 2024	

			Ohumusování vhodnou zeminou k rekultivaci tl. 150 mm Natěžení a dovoz zeminy v položce 12573 Poplatek za nákup zeminy v položce 014211 Osetí travním semenem v položce 18241 Plocha odečtena digitálně ze situace <i>126,890 = 126,890 [A]</i> <i>Celkové množství = 126,890</i>					
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝŠEVEM Odečteno digitálně ze situace <i>126,890 = 126,890 [A]</i> <i>Celkové množství = 126,890</i>	M2	126,890	23,40	2 969,23	OTSKP_2024 ~ 2024
15	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Plocha odečtena digitálně ze situace <i>126,890 = 126,890 [A]</i> <i>Celkové množství = 126,890</i>	M2	126,890	6,50	824,79	OTSKP_2024 ~ 2024
	3		Svislé konstrukce				8 797,80	
16	33817C		SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK obnova oplocení v km 0.910 k položce 767911 <i>3 = 3,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 3,000</i>	KS	3,000	1 373,20	4 119,60	OTSKP_2024 ~ 2024
17	33817D		VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK obnova oplocení v km 0.910 k položce 767911 <i>3 = 3,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 3,000</i>	KS	3,000	1 559,40	4 678,20	OTSKP_2024 ~ 2024
	5		Komunikace				106 682,71	
18	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	61,080	166,80	10 188,14	OTSKP_2024 ~ 2024
19	56334		Asf. sjezd 61,08 = 61,080 [A] <i>Celkové množství = 61,080</i> VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	61,080	166,80	10 188,14	OTSKP_2024 ~ 2024
20	56335		Asf. sjezd 61,08 = 61,080 [A] <i>Celkové množství = 61,080</i> VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	97,800	222,30	21 740,94	OTSKP_2024 ~ 2024
21	56336		chodník 37,43+46,05+14,32 = 97,800 [A] <i>Celkové množství = 97,800</i> VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	10,790	277,90	2 998,54	OTSKP_2024 ~ 2024
22	572123		Dl. sjezd 10,79 = 10,790 [A] <i>Celkové množství = 10,790</i> INFILTRAČNÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	61,080	50,40	3 078,43	OTSKP_2024 ~ 2024
23	572214		PI-C 0,6 kg/m2 Posyp kamenivem v položce 57621 Plocha odečtena digitálně ze situace Sjezd 2: 61,08 = 61,080 [A] <i>Celkové množství = 61,080</i> SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	61,080	11,60	708,53	OTSKP_2024 ~ 2024
24	574B34		PS-CP 0.35 kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace Sjezd 2: 61,08 = 61,080 [A] <i>Celkové množství = 61,080</i> ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	61,080	253,70	15 496,00	OTSKP_2024 ~ 2024
25	574E56		ACO 11+ PmB 45/80-65 tl. 40mm Plocha odečtena digitálně ze situace Sjezd 2: 61,08 = 61,080 [A] <i>Celkové množství = 61,080</i> ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	61,080	310,10	18 940,91	OTSKP_2024 ~ 2024
26	575B53		ACP 16+ PmB 50/70 tl. 60mm Plocha odečtena digitálně ze situace Sjezd 2: 61,08 = 61,080 [A] <i>Celkové množství = 61,080</i> LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM	M2	3,416	852,90	2 913,51	OTSKP_2024 ~ 2024
27	57622		4,42*0,5+4,02*0,3 = 3,416 [A] <i>Celkové množství = 3,416</i> POSPV KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	2,210	12,70	28,07	OTSKP_2024 ~ 2024
28	582611		na litý asf. MA 11 tl. 40 mm množství 6kg/m2 4,42*0,5 = 2,210 [A] <i>Celkové množství = 2,210</i> KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	85,380	187,60	16 017,29	OTSKP_2024 ~ 2024
29	582615		Betonová dlažba tl. 60 mm do lože z kameniva tl. 40 mm Plocha odečtena digitálně ze situace Chodník 1: 85,38 = 85,380 [A] <i>Celkové množství = 85,380</i> KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,430	187,60	1 581,47	OTSKP_2024 ~ 2024
30	58261A		Betonová dlažba tl. 80 mm do lože z kameniva tl. 40 mm Plocha odečtena digitálně ze situace Sjezd 3: 8,43 = 8,430 [A] <i>Celkové množství = 8,430</i> KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	12,090	187,60	2 268,08	OTSKP_2024 ~ 2024
31	58261B		Betonová reliéfní dlažba tl. 60 mm do lože z kameniva tl. 40 mm Plocha odečtena digitálně ze situace Chodník 1: 12,09 = 12,090 [A] <i>Celkové množství = 12,090</i> KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,850	187,60	534,66	OTSKP_2024 ~ 2024
	7		Přidružená stavební výroba				456,48	

32	767911		OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	M2	3,600	126,80	456,48	OTSKP_2024 ~ 2024
			obnova oplocení v km 0.910					
			Délka odečtena digitálně ze situace					
			2,0*1,8 = 3,600 [A] Celkové množství = 3,600					
	8		Potrubí				15 379,90	
33	89711		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	1,000	15 379,90	15 379,90	OTSKP_2024 ~ 2024
			1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000					
	9		Ostatní konstrukce a práce					
34	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16,000	11 140,30	178 244,80	OTSKP_2024 ~ 2024
			kompletní					
			16,0 = 16,000 [A] Celkové množství = 16,000					
35	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	63,340	164,20	10 400,43	OTSKP_2024 ~ 2024
			včetně lože					
			28,23+26,87+5,4+2,84 = 63,340 [A] Celkové množství = 63,340					
36	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	45,730	179,40	8 203,96	OTSKP_2024 ~ 2024
			včetně lože					
			40,56+5,17 = 45,730 [A] Celkové množství = 45,730					

<



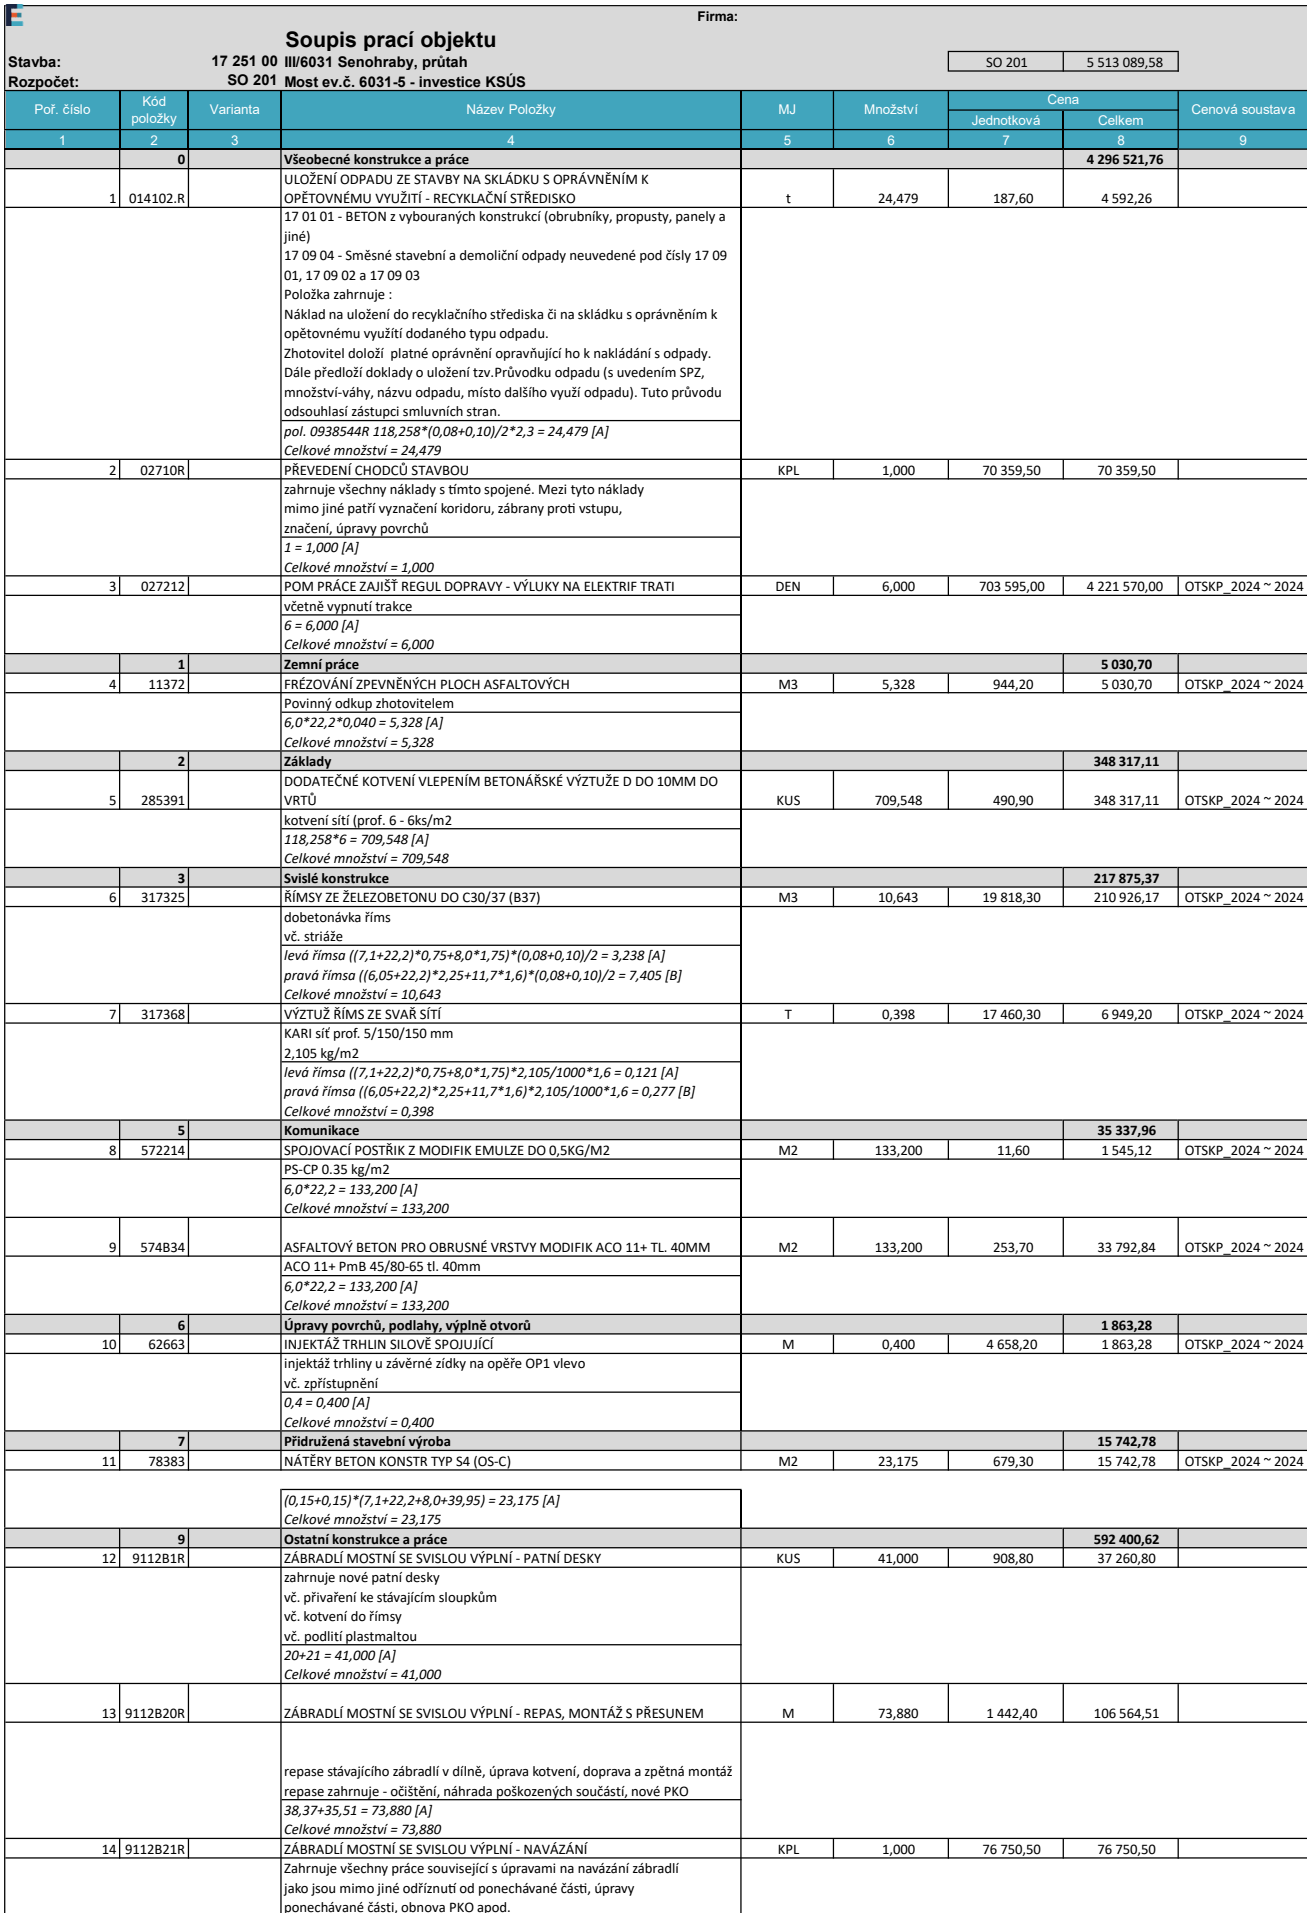

			1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000					
15	9112B3R		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	73,880	293,20	21 661,62	
			sejmutí stávajícího ocelového zábradlí a převoz k repasi do dílny 38,37+35,51 = 73,880 [A] Celkové množství = 73,880					
16	9112B3R1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - ŘEZ A OBNOVA SLOUPKŮ	KUS	41,000	1 119,90	45 915,90	
			odříznutí sloupků pod úroveň horního povrchu desky a obnovení PKO stávajících sloupků (20+21 ks) 20+21 = 41,000 [A] Celkové množství = 41,000					
17	9115C3		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	29,300	293,20	8 590,76	OTSKP_2024 ~ 2024
			odstranění stávajícího svodidla 7,10+22,20 = 29,300 [A] Celkové množství = 29,300					
18	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	6,000	1 177,20	7 063,20	OTSKP_2024 ~ 2024
			6 = 6,000 [A] Celkové množství = 6,000					
19	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	574,60	1 149,20	OTSKP_2024 ~ 2024
			komplet 2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000					
20	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000	410,40	1 231,20	OTSKP_2024 ~ 2024
			zpětné osazení P2 1 = 1,000 [A] IP6 2 = 2,000 [B] Celkové množství = 3,000					
21	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	117,30	351,90	OTSKP_2024 ~ 2024
			sejmutí značek vč. uložení ke zpětnému použití P2 1 = 1,000 [A] IP6 2 = 2,000 [B] Celkové množství = 3,000					
22	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	586,30	1 172,60	OTSKP_2024 ~ 2024
			sloupky k SDŽ - bez zabetonování, přikotveno k mostnímu zábradlí 2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000					
23	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	2,000	293,20	586,40	OTSKP_2024 ~ 2024
			2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000					
24	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	12,000	155,20	1 862,40	OTSKP_2024 ~ 2024
			v místě podpovrchových závěrů 6,0*2 = 12,000 [A] Celkové množství = 12,000					
25	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	89,250	119,60	10 674,30	OTSKP_2024 ~ 2024
			podél říms (7,1+22,2+8,0)+39,95 = 77,250 [A] v místě podpovrchových závěrů 6,0*2 = 12,000 [B] Celkové množství = 89,250					
26	932111R		PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	M2	78,000	587,90	45 856,20	
			20,0*2+19,0*2 = 78,000 [A]					
27	938544R		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	118,258	576,10	68 128,43	
			otryskání případně jiné odsranění horního betonu říms (otryskaná vrstva v tloušťce 8-10 cm) vč. odvozu na skládku levá římsa (7,1+22,2)*0,75+8,0*1,75 = 35,975 [A] pravá římsa (6,05+22,2)*2,25+11,7*1,6 = 82,283 [B] Celkové množství = 118,258					
28	94490R		OCHRANNÁ KONSTRUKCE	KPL	1,000	157 580,70	157 580,70	
			provizorní ochrana na obou okrajích NK (v celé délce NK) vč. ochrany proti dotyku v místě železniční trati komplet vč. kotvení vč. montáže, nájemného, demontáže a zpřístupnění 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000					

		Firma:						
Soupis prací objektu								
Stavba:		17 251 00 III/6031 Senohraby, průtah		SO 301-A				
Rozpočet:		SO 301-A Obnova dešťové kanalizace - investice KSÚS		SO 301-A		5 741 162,07		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce				250 312,95	
1	014102.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Položka zahrnuje : Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. <i>dle pol. 13188 (1,347*2,0)*0,4337 = 1,168 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,168</i>	t	1,168	187,60	219,12	
2	014103.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě Položka zahrnuje : Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. <i>dle pol. 17120 (2612,112*2,0)*0,4337 = 2265,746 [A]</i> <i>odpočet pol. 125838 (-589,302*2,0)*0,4337 = -511,161 [B]</i> <i>dle pol. 113328 (27,805*1,90)*0,4337 = 22,912 [C]</i> <i>Celkové množství = 1777,497</i>	t	1 777,497	140,70	250 093,83	
		1	Zemní práce				2 585 446,37	
3	11201		KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Kácení dřevin do průměru 20cm Postup s nakládáním s odpadem je uveden ve směrnici zadavatele R-SM-16 <i>Kácení dřevin do průměru 20cm 50*0,4337 = 21,685 [A]</i> <i>Celkové množství = 21,685</i>	KUS	21,685	1 863,10	40 401,32	OTSKP_2024 ~ 2024
4	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM Odstranění chodníku z betonové dlažby tl. 0,06 m vč. odvozu a uložení <i>Odstranění chodníku z betonové dlažby tl. 0,06 m (22,45*0,06)*0,4337 = 0,584 [A]</i> <i>Celkové množství = 0,584</i>	M3	0,584	1 106,90	646,43	OTSKP_2024 ~ 2024
5	113328		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM odstranění podkladních vozovkových a chodníkových vrstev vč. odvozu a uložení <i>Odstranění kce chodníku - lože z kamenné drti 0.04mm (22,45*0,04)*0,4337 = 0,389 [A]</i> <i>odstranění kce vozovky - tl. 0.3 m nestmel. Kam. (89,69*0,30)*0,4337 = 11,670 [B]</i> <i>Celkové množství = 12,059</i>	M3	12,059	539,40	6 504,62	OTSKP_2024 ~ 2024
6	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odstranění vozovky tl. 0,2 m s asf. pojivem předp. bez obsahu nebezpečných látek povinný odkup zhotovitele <i>odstranění vozovky tl. 0,2 m s asf. pojivem (101,28*0,20)*0,4337 = 8,785 [A]</i> <i>Celkové množství = 8,785</i>	M3	8,785	695,70	6 111,72	OTSKP_2024 ~ 2024
7	121104		SEJMUTÍ ŌRNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM Odhumusování tl. 0,2m vč. odvozu <i>Odhumusování tl. 0,2m (188,91*0,20)*0,4337 = 16,386 [B]</i> <i>Celkové množství = 16,386</i>	M3	16,386	117,00	1 917,16	OTSKP_2024 ~ 2024
8	125838		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II, ODVOZ DO 20KM vykopávka zeminuy z meziskládky <i>dle pol. 17411 551,520*0,4337 = 239,194 [A]</i> <i>dle pol. 18223 (188,91*0,20)*0,4337 = 16,386 [B]</i> <i>Celkové množství = 255,580</i>	M3	255,580	605,40	154 728,13	OTSKP_2024 ~ 2024
9	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM výkop šachet vč. odvozu a uložení vč. pažení <i>výkop 359,04*0,4337 = 155,716 [A]</i> <i>Celkové množství = 155,716</i>	M3	155,716	777,40	121 053,62	OTSKP_2024 ~ 2024
10	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM Výkop rýhy pro dešťovou kanalizaci vč. odvozu vč. pažení <i>Výkop rýhy pro dešťovou kanalizaci 2215,29*0,4337 = 960,771 [A]</i> <i>Celkové množství = 960,771</i>	M3	960,771	1 379,80	1 325 671,83	OTSKP_2024 ~ 2024
11	17120		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku a meziskládku (meziskládk bez poplatku) <i>dle pol. 132838 2215,290*0,4337 = 960,771 [A]</i> <i>dle pol. 121104 37,782*0,4337 = 16,386 [B]</i> <i>dle pol. 131838 359,04*0,4337 = 155,716 [C]</i> <i>Celkové množství = 1132,873</i>	M3	1 132,873	24,80	28 095,25	OTSKP_2024 ~ 2024


12	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	239,194	522,90	125 074,54	OTSKP_2024 ~ 2024
			zpětný zásep hutnění dle PD <i>Zásyp zeminou hutněnou 551,52*0,4337 = 239,194 [A]</i> <i>Celkové množství = 239,194</i>					
13	17561		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	592,586	1 004,30	595 134,12	OTSKP_2024 ~ 2024
			Obsyb nesoudržným materiálem <i>Obsyb nesoudržným materiálem 1366,35*0,4337 = 592,586 [A]</i> <i>Celkové množství = 592,586</i>					
14	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	58,836	2 953,40	173 766,24	OTSKP_2024 ~ 2024
			Zásyp šachty <i>Zásyp šachty 135,66*0,4337 = 58,836 [A]</i> <i>Celkové množství = 58,836</i>					
15	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	81,930	47,50	3 891,68	OTSKP_2024 ~ 2024
			Ohumusování tl. 0,2m <i>Ohumusování tl. 0,2m 188,91*0,4337 = 81,930 [A]</i> <i>Celkové množství = 81,930</i>					
16	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	81,930	23,40	1 917,16	OTSKP_2024 ~ 2024
			Odečteno digitálně ze situace <i>188,910*0,4337 = 81,930 [A]</i> <i>Celkové množství = 81,930</i>					
17	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	81,930	6,50	532,55	OTSKP_2024 ~ 2024
			Plocha odečtena digitálně ze situace <i>188,910*0,4337 = 81,930 [A]</i> <i>Celkové množství = 81,930</i>					
	4		Vodorovné konstrukce				142 029,21	
18	451112		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15	M3	5,027	6 066,90	30 498,31	OTSKP_2024 ~ 2024
			podkladní beton <i>podkladní beton 11,59*0,4337 = 5,027 [A]</i> <i>Celkové množství = 5,027</i>					
19	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,947	1 400,10	2 725,99	OTSKP_2024 ~ 2024
			Obnova chodníku <i>Obnova chodníku (22,45*(0,30-0,10))*0,4337 = 1,947 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,947</i>					
20	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	91,073	1 194,70	108 804,91	OTSKP_2024 ~ 2024
			Štěrkopískové lože <i>Štěrkopískové lože 209,99*0,4337 = 91,073 [A]</i> <i>Celkové množství = 91,073</i>					
	5		Komunikace				66 555,41	
21	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+	M3	6,150	10 525,00	64 728,75	OTSKP_2024 ~ 2024
			obnova vozovky <i>obnova vozovky (101,28*0,14)*0,4337 = 6,150 [A]</i> <i>Celkové množství = 6,150</i>					
22	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,737	187,60	1 826,66	OTSKP_2024 ~ 2024
			Obnova chodníku vč. lože 40mm <i>Obnova chodníku 22,45*0,4337 = 9,737 [A]</i> <i>Celkové množství = 9,737</i>					
	8		Potrubi				2 696 818,13	
23	87400R		Křížení IS	kus	79,367	2 345,30	186 139,43	
			Křížení IS <i>Křížení IS 183*0,4337 = 79,367 [A]</i> <i>Celkové množství = 79,367</i>					
24	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	163,032	684,50	111 595,40	OTSKP_2024 ~ 2024
			plastové potrubí DN200 SN16 <i>Připojka DN 200 375,91*0,4337 = 163,032 [A]</i> <i>Celkové množství = 163,032</i>					
25	87444		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	55,492	1 087,30	60 336,45	OTSKP_2024 ~ 2024
			plastové potrubí DN250 SN16 <i>Připojka DN 250 127,95*0,4337 = 55,492 [A]</i> <i>Celkové množství = 55,492</i>					
26	87457		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	305,329	4 254,40	1 298 991,70	OTSKP_2024 ~ 2024
			plastové potrubí DN500 SN16 <i>Stoka DN 500 704,01*0,4337 = 305,329 [A]</i> <i>Celkové množství = 305,329</i>					
27	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	52,385	379,00	19 853,92	OTSKP_2024 ~ 2024
			<i>(0,10*(375,910+127,95+704,01))*0,4337 = 52,385 [A]</i> <i>Celkové množství = 52,385</i>					
28	894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	17,348	35 941,30	623 509,67	OTSKP_2024 ~ 2024
			Šachty jsou tvořeny prefabrikovanými betonovými skružemi o vnitřním průměru 1000 mm a prefabrikovanými betonovými dny. <i>Kontrolní šachta 40*0,4337 = 17,348 [A]</i> <i>Celkové množství = 17,348</i>					
29	89722		VPUŠT KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	0,434	18 644,80	8 091,84	OTSKP_2024 ~ 2024
			Horská vpušť je navržena z prefabrikovaných dílců s odtokem přípojkou ze stěny <i>Horská vpušť 1*0,4337 = 0,434 [A]</i> <i>Celkové množství = 0,434</i>					
30	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	20,119	4 483,10	90 195,49	OTSKP_2024 ~ 2024
			<i>pro potrubí DN200 (0,10*375,910*(2/3*3,14*0,40^2-3,14*0,10^2))*0,4337 = 4,949 [A]</i> <i>pro potrubí DN250 (0,10*127,950*(2/3*3,14*0,425^2-3,14*0,125^2))*0,4337 = 1,826 [B]</i> <i>pro potrubí DN500 (0,10*704,100*(2/3*3,14*0,55^2-3,14*0,25^2))*0,4337 = 13,344 [C]</i> <i>Celkové množství = 20,119</i>					
31	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	218,524	240,30	52 511,32	OTSKP_2024 ~ 2024
			vč. vyhodnocení a protokolu <i>(375,910+127,95)*0,4337 = 218,524 [A]</i> <i>Celkové množství = 218,524</i>					
32	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	305,329	547,00	167 014,96	OTSKP_2024 ~ 2024
			vč. vyhodnocení a protokolu <i>704,01*0,4337 = 305,329 [A]</i> <i>Celkové množství = 305,329</i>					
33	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	523,853	150,00	78 577,95	OTSKP_2024 ~ 2024

vč. vyhodnocení a protokolu
$(375,910+127,95+704,01)*0,4337 = 523,853 \text{ [A]}$
Celkové množství = 523,853

				Firma:			

12	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	312,326	522,90	163 315,27	OTSKP_2024 ~ 2024
			zpětný zásep hutnění dle PD Zásyp zeminou hutněnou 551,52*0,5663 = 312,326 [A] Celkové množství = 312,326					
13	17561		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	773,764	1 004,30	777 091,19	OTSKP_2024 ~ 2024
			Obsyb nesoudržným materiálem Obsyb nesoudržným materiálem 1366,35*0,5663 = 773,764 [A] Celkové množství = 773,764					
14	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	76,824	2 953,40	226 892,00	OTSKP_2024 ~ 2024
			Zásyp šachty Zásyp šachty 135,66*0,5663 = 76,824 [A] Celkové množství = 76,824					
15	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	106,980	47,50	5 081,55	OTSKP_2024 ~ 2024
			Ohumusování tl. 0,2m Ohumusování tl. 0,2m 188,91*0,5663 = 106,980 [A] Celkové množství = 106,980					
16	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	106,980	23,40	2 503,33	OTSKP_2024 ~ 2024
			Odečteno digitálně ze situace 188,910*0,5663 = 106,980 [A] Celkové množství = 106,980					
17	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	106,980	6,50	695,37	OTSKP_2024 ~ 2024
			Plocha odečtena digitálně ze situace 188,910*0,5663 = 106,980 [A] Celkové množství = 106,980					
	4		Vodorovné konstrukce				185 447,65	
18	451112		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15	M3	6,563	6 066,90	39 817,06	OTSKP_2024 ~ 2024
			podkladní beton podkladní beton 11,59*0,5663 = 6,563 [A] Celkové množství = 6,563					
19	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,543	1 400,10	3 560,45	OTSKP_2024 ~ 2024
			Obnova chodníku Obnova chodníku (22,45*(0,30-0,10))*0,5663 = 2,543 [A] Celkové množství = 2,543					
20	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	118,917	1 194,70	142 070,14	OTSKP_2024 ~ 2024
			Štěrkopískové lože Štěrkopískové lože 209,99*0,5663 = 118,917 [A] Celkové množství = 118,917					
	5		Komunikace				86 900,71	
21	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+	M3	8,030	10 525,00	84 515,75	OTSKP_2024 ~ 2024
			obnova vozovky obnova vozovky (101,28*0,14)*0,5663 = 8,030 [A] Celkové množství = 8,030					
22	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	12,713	187,60	2 384,96	OTSKP_2024 ~ 2024
			Obnova chodníku vč. lože 40mm Obnova chodníku 22,45*0,5663 = 12,713 [A] Celkové množství = 12,713					
	8		Potrubí				3 524 545,15	
23	87400R		Křížení IS	kus	103,633	2 345,30	243 050,47	
			Křížení IS Křížení IS 183*0,5663 = 103,633 [A] Celkové množství = 103,633					
24	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	212,878	684,50	145 714,99	OTSKP_2024 ~ 2024
			plastové potrubí DN200 SN16 Připojka DN 200 375,91*0,5663 = 212,878 [A] Celkové množství = 212,878					
25	87444		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	72,458	1 087,30	78 783,58	OTSKP_2024 ~ 2024
			plastové potrubí DN250 SN16 Připojka DN 250 127,95*0,5663 = 72,458 [A] Celkové množství = 72,458					
26	87457		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	398,681	4 254,40	1 696 148,45	OTSKP_2024 ~ 2024
			plastové potrubí DN500 SN16 Stoka DN 500 704,01*0,5663 = 398,681 [A] Celkové množství = 398,681					
27	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	68,402	379,00	25 924,36	OTSKP_2024 ~ 2024
			(0,10*(375,910+127,95+704,01))*0,5663 = 68,402 [A] Celkové množství = 68,402					
28	894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	22,652	35 941,30	814 142,33	OTSKP_2024 ~ 2024
			Šachty jsou tvořeny prefabrikovanými betonovými skružemi o vnitřním průměru 1000 mm a prefabrikovanými betonovými dny. Kontrolní šachta 40*0,5663 = 22,652 [A] Celkové množství = 22,652					
29	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	0,566	24 315,60	13 762,63	OTSKP_2024 ~ 2024
			Horská vpust je navržena z prefabrikovaných dílců s odtokem připojkou ze stěny Horská vpust 1*0,5663 = 0,566 [A] Celkové množství = 0,566					
30	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	26,270	4 483,10	117 771,04	OTSKP_2024 ~ 2024
			pro potrubí DN200 (0,10*375,910*(2/3*3,14*0,40^2-3,14*0,10^2))*0,5663 = 6,462 [A] pro potrubí DN250 (0,10*127,950*(2/3*3,14*0,425^2-3,14*0,125^2))*0,5663 = 2,384 [B] pro potrubí DN500 (0,10*704,100*(2/3*3,14*0,55^2-3,14*0,25^2))*0,5663 = 17,424 [C] Celkové množství = 26,270					
31	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	285,336	240,30	68 566,24	OTSKP_2024 ~ 2024
			vč. vyhodnocení a protokolu (375,910+127,95)*0,5663 = 285,336 [A] Celkové množství = 285,336					
32	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	398,681	547,00	218 078,51	OTSKP_2024 ~ 2024
			vč. vyhodnocení a protokolu 704,01*0,5663 = 398,681 [A] Celkové množství = 398,681					
33	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	684,017	150,00	102 602,55	OTSKP_2024 ~ 2024

vč. vyhodnocení a protokolu
$(375,910+127,95+704,01)*0,5663 = 684,017 [A]$
Celkové množství = 684,017

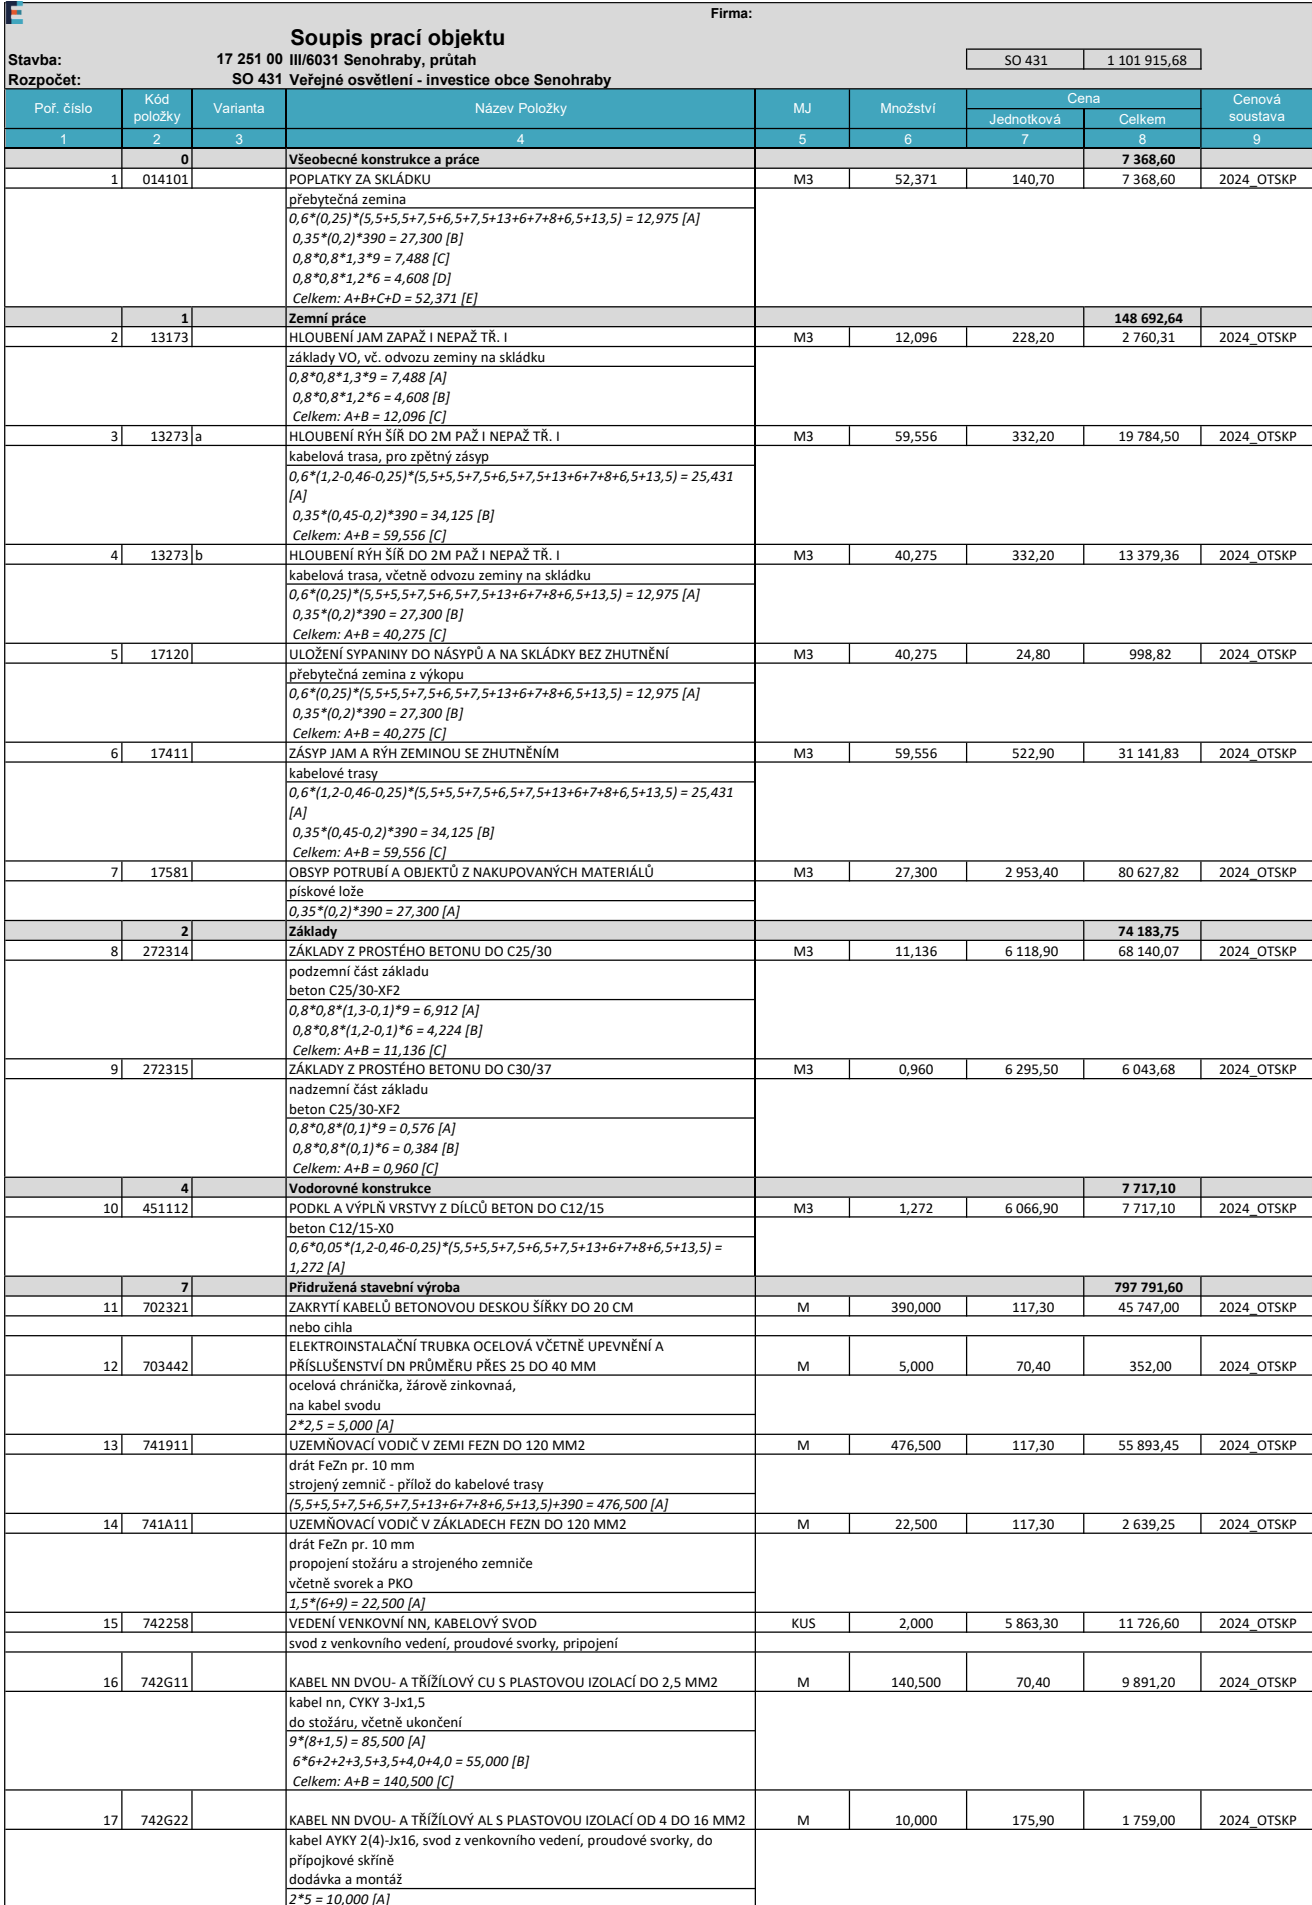

18	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	531,000	293,20	155 689,20	2024_OTSKP
			kabel CYKY 4-Jx16					
			dodávka a montáž					
			$440+5*(6+9)+8+8 = 531,000 [A]$					
19	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	32,000	175,90	5 628,80	2024_OTSKP
			včetně označení štítkem					
			$2*(6+9)+2 = 32,000 [A]$					
20	742L22		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	1,000	117,30	117,30	2024_OTSKP
21	743122		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	9,000	16 417,20	147 754,80	2024_OTSKP
			stožár jm. výšky 8,0 m. 159/133/114 mm					
22	743141	a	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M	KUS	4,000	11 726,60	46 906,40	2024_OTSKP
			zesílený typ pro dlouhý výložník, výška 6 m, PC6-159/133/114 mm					
			dodávka a montáž					
23	743141	b	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M	KUS	2,000	16 417,20	32 834,40	2024_OTSKP
			typ pro střední výložník, výška 6 m, PB6-133/108/89 mm					
			dodávka a montáž					
24	743142		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M	KUS	2,000	3 518,00	7 036,00	2024_OTSKP
			výložník 2,0 m					
			dodávka a montáž					
25	743143	a	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ PŘES 3 M	KUS	2,000	6 449,60	12 899,20	2024_OTSKP
			výložník 3,5 m					
			dodávka a montáž					
26	743143	b	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ PŘES 3 M	KUS	2,000	5 863,30	11 726,60	2024_OTSKP
			výložník 4,0 m					
			dodávka a montáž					
27	743151		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY	KUS	15,000	1 172,70	17 590,50	2024_OTSKP
			s řadovými svorkami a pojistkovým spodkem					
			$6+9 = 15,000 [A]$					
28	743312		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTLIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	KUS	9,000	1 759,00	15 831,00	2024_OTSKP
			vyložení 1,5 m					
			dodávka a montáž					
29	743531		SVÍTLIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE DO 150 W	KUS	6,000	16 417,20	98 503,20	2024_OTSKP
			LED zdroj světla.					
			dodávka a montáž					
30	743554		SVÍTLIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	9,000	10 553,90	94 985,10	2024_OTSKP
			osvětlení ulice					
			dodávka a montáž					
31	743C11		SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ	KUS	2,000	9 381,30	18 762,60	2024_OTSKP
			na sloup, typ SP100					
			dodávka a montáž					
32	747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000	3 518,00	3 518,00	2024_OTSKP
			kompletní revize objektu, beu ohledu na IN a MTŽ práce					
	8		Potrubí					66 161,99
33	87614		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	67,500	82,10	5 541,75	2024_OTSKP
			chráničky 40/33 do základu stožáru, 3 ks na jeden základ					
			$3*(6+9)*1,5 = 67,500 [A]$					
34	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	173,000	117,30	20 292,90	2024_OTSKP
			chráničky 110/94, korugované, do prostupu					
			$(5,5+5,5+7,5+6,5+7,5+13+6+7+8+6,5+13,5)*2 = 173,000 [A]$					
35	87645		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	15,000	952,40	14 286,00	2024_OTSKP
			trubkové pouzdro do základu stožáru, včetně otvorů pro chráničky a pro zemnič					
			$1,0*(6+9) = 15,000 [A]$					
36	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	5,086	5 120,20	26 041,34	2024_OTSKP
			obetonování chrániček					
			beton C25/30-XA1					
			$0,6*0,2*(1,2-0,46-0,25)*(5,5+5,5+7,5+6,5+7,5+13+6+7+8+6,5+13,5) = 5,086 [A]$					

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5 Obec Senohraby Příčná 61, 251 66, Senohraby	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní přejímka dokladů bude dokončena do</i>	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha	
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD Kč Celková cena s DPH	

Záruční doba (konečné datum):		
<i>Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu</i> Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
Zástupci zhotovitele	Jméno a příjmení	podpisy
<i>Zástupci přejímací</i> organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

HARMONOGRAM ČASOVÝ								
III/6031 Senohraby, průtah (etapa 1)								
provádění / čas (měsíce)	1	2	3	4	5	6	7	8
Převzetí staveniště/DIO								
Frézování								
Zemní práce								
Pokládka AC vrstev								
Dokončovací práce/vyklizení stanoviště								

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

	Identifikační údaje poddodavatele <i>(název/obchodní firma, sídlo, IČO)</i>	Identifikace části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit¹ <i>(popis části veřejné zakázky/prací realizovaných poddodavatelem)</i>	Podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky vyjádření v %, příp. finanční hodnotou v Kč bez DPH
1.	-----	-----	-----

V této fázi zadávacího řízení nemá zhotovitel zcela upřesněn poddodavatelský systém. Máme v úmyslu zadat tyto práce:

- DIO

¹ Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění veřejné zakázky.

Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001 Obec Senohraby Sídlo: Příčná 61, 251 66, Senohraby IČO: 002 40 737	Razítko, datum, podpis:
--------------------	---	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém:
Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			
