

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 80SD001317

Číslo smlouvy konzultanta: 250183

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: **PD D35 Oprava AB vozovky v km 270,3-276,0 L+P, vč. MÚK Slavonín, Nemilany, Holice**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2024

s vedoucím společníkem společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 427 67 377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

se společníkem společnosti **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem: Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 469 95 447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
bankovní spojení:
zastoupen: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2024**“

a

se společníkem společnosti **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem: Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 188 27 527
DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
bankovní spojení:
zastoupen: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2024**“

a

se společníkem společnosti **SHB, akciová společnost**

se sídlem: Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 253 24 365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
bankovní spojení:
zastoupen: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2024**“

a

se společníkem společnosti **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem: Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 255 64 901
DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954
bankovní spojení:
zastoupen: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2024**“

a

se společníkem společnosti **G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem: Výstavní 367/109, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 646 16 886
DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
bankovní spojení:
zastoupen: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2024**“

a

se společníkem společnosti **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 452 71 895

DIČ: CZ45271895

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

bankovní spojení:

zastoupen: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2024**“

a

se společníkem společnosti **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 485 88 733

DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

bankovní spojení:

zastoupen: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2024**“

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování projektových dokumentací (DSP, VD-ZDS)
- zajištění výkonu inženýrské činnosti (IČ, SP)
- výkonu autorského dozoru (AD)

Podrobná specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2024“, číslo 01PU-005959, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-063272 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

- 1) Tato Smlouva

- 2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
- 3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
- 4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
- 5) Rámcová dohoda
- 6) Technické podmínky, mj. Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
11 870 342,-	2 492 771,82	14 363 113,82

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této Smlouvy.
3. Cena plnění byla Konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Konzultantu hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je Pavla Polláková.

Článek III.

Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění je součástí Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Úsek dálnice D35 v km 268,8 – 276,9; MÚK Slavonín, EXIT 267; MÚK Nemilany, EXIT 272; MÚK Holice, EXIT 276

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Doplnkový diagnostický průzkum, který bude dodán nejpozději 12 týdnů od zahájení prací.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.
5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa dálnic, Oddělení oprav dálnic Morava, Šumavská 524/31, 602 00 Brno.
7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za konzultanta
8. Součástí plnění budou výstupy z činnosti Konzultanta v rozsahu dle Přílohy č. 1 Smlouvy včetně Soupisu služeb, které Konzultant Objednateli předá v termínech dle Přílohy č. 4 Smlouvy.
9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy u něj ani u jeho poddodavatelů neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl. 3.11.1 Smluvních podmínek. Dozví-li se Konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat a postupovat podle čl. 3.1.3 Smluvních podmínek.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
11. Faktury vystavené Konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 - Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací
 - Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem
 - Příloha č. 3 Odměna a platba
 - Příloha č. 4 Harmonogram
 - Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 - Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu
 - Příloha č. 7 Předávací protokol ke Smlouvě
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.23
13:03:38 +02'00'

PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2024

ROZSAH SLUŽEB

Čl. 1

Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 **PD D35 Oprava AB vozovky v km 270,3-276,0 L+P, vč. MÚK Slavonín, Nemilany, Holice**

Specifikace projektu:

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro opravu AB vozovky na dálnici D35 úsek km 270,32 – 276,90 a na MÚK EXIT 267 (Slavonín), EXIT 272 (Nemilany) a EXIT 276 (Holic). Součástí díla je i projektová dokumentace nezbytných oprav mostních objektů pro zajištění funkčnosti a odstranění provozních závad.

Oprava vozovky bude provedena v souladu s diagnostikou vozovky, která předpokládá v daném rozsahu provedení opravy krytu, částečné nebo úplné opravy vozovky. Diagnostika je součástí zadávací dokumentace, příloha č.8.

MÚK Slavonín, EXIT 267 na křížení dálnic D46 a D35

- oprava semidirektní a vratné rampy. U větvi A+B navržení kompletní opravy vozovky a u větve C opravu asfaltového krytu (dle aktuálního stavu i další větve).

Úsek dálnice D35 v km 270,32 – 276,90

- D35 PJP - 272,85 – 274,875 + 275,925 – 276,9 - navržení opravy vozovky dle DGN,
- D35 PJP - 270,330 – 270,400 + 270,850 – 272,850 – navržení opravy vozovky dle doplňkového diagnostického průzkumu, který bude Objednatelem dodán nejpozději 12 týdnů od zahájení prací,
- D35 LJP –273,97 – 274,875 + 275,925 – 276,9, - navržení opravy vozovky dle DGN,
- D35 LJP –270,320 – 270,400 + 271,100 – 273, – navržení opravy vozovky dle doplňkového diagnostického průzkumu, který bude Objednatelem dodán nejpozději 12 týdnů od zahájení prací,

MÚK Nemilany, EXIT 272

- Navržení opravy asfaltového krytu.

MÚK Holice, EXIT 276

- Navržení opravy asfaltového krytu.

V rámci řešeného rozsahu opravy bude také navrženo a řešeno:

V celém opravovaném úseku bude proveden bezúdržbový střední dělicí pás s obnovou telematiky. Celkový úsek opravy SDP bude v km cca 268,8 – 276,9. Upřesněno vše na VV za účasti SSÚD a Úseku telematiky.

- Kompletní výměna kabelové trasy v SDP dle platných PPK-KAB, tzn. silový napájecí kabel NN, 5x optotrubky HDPE (3x 40/33 červená, žlutá, modrá, 2x 32/27 červená, žlutá) včetně optického kabelu DIS. Stávající kabelová trasa je v havarijním stavu, skladba a není již v souladu s předpisy PPK, např. jsou pouze 4x optotrubky HDPE, atd.
- Kabelovou trasu neobsazovat zásuvkovými skříněmi – ZS, všechny RO vymisťovat do krajnice komunikace, opravy rozvaděčů RM3 dle předpisu PPK-KAB.
- Obnova a doplnění telematických zařízení (hlásky, meteo, ASD, kamery, atd.) dle dnešních platných předpisů ŘSD PPK-ITS, PPK-KAB (zde upozorňuji toto je v gesci oddělení telematiky, nutné s nimi projednat, navrhnout, doplnit).
- U středových šachet v SDP nutno dodržet výškovou úroveň těchto šachet (nemohou usazeny být osazeny níže).
- Nutné do PD zahrnout práce na případné vyčištění chrániček na mostech při průchodu kabelové trasy, či zajistit přechody mostů kabelové trasy dle PPK-KAB.
- Stavebně musí být upraveny plochy u hlásek SOS dle PPK a příslušných R plánů.
- Vše uvedené výše musí být u SO ř. 400 dle předpisů ŘSD PPK-CIS, PPK-KAB, PPK-ITS a vypracováno projektantem elektro.

Vozovky

- Odvodnění vozovky – oprava vpustí a betonových žlabů
- Čištění a opravy žlabů příkopů zemních těles na základě prohlídky provedené projektantem a SSÚD po zahájení prací
- Svodidla a bezpečnostní zařízení – řešení v souladu s TP114 a R-plány – zvýšení úrovně zadržení
- Svislé dopravní značení včetně portálů DZ – výměna a revize dle plánů TP, R-plánů a PPK
- DIS-SOS – kompletní oprava dle platných R-plánů a PPK
- Sjezdy v MÚK – oprava propustků pod služebními sjezdy na propustky s šikmými čely
- Zrušení nepoužívané mýtné brány na D35 v km 274,677

Mostní objekty


D35	rozsah opravy
D35-147A.1	Obnova těsnění kolem MZ a těsnění mezi lícním prefabrikátem a monolitickou částí římsy v SDP u MZ, provedení hydrofobního nátěru říms, zakrytí SDP nad oběma opěrami s přesahem 1,0m přes úložné prahy, vyčistit odvodňovací žlaby a opravit spárování, Rozpadlá přídlažba a vyvrácený obrubník nad OP3
D35-147A.2	Obnova těsnícího tmelu v místě spár říms a spár na kontaktu římsa/mostní závěr, obnova izolačního nátěru v prostoru podélného žlabu, obnova PKO patních desek a kotevních šroubů svodidel , opravit nebo vyměnit poškozenou trubku odvodnění opěry 1, odstranit vegetaci a opravit spárování na dlažbách a schodištích, obnova PKO patních desek a kotevních šroubů svodidel v SDP, kotevní šrouby opatřit plastovými krytkami vyplněnými vazelinou, opravit těsnící profily PHS, oprava spárování dlažby skluzů, Obnova PKO uchycení svislých svodů odvodnění, vyčistit zanesený příkop u O3 pro zajištění volného průtoku vody
D35-147B.3	Přetěsnění spáry mezi dilatačními celky říms a mezi římsami a žlaby za římsou, oprava lokálně poškozené PKO na zábradlí a oplocení, odstranit vegetaci z dlažby pod mostem a provést přespárování dlažby, nově předláždít všechna dopadiště pod odvodněním, případně zvážít jiná provedení dopadišť provedení zábradlí na křídlech
D35-148..1	Obnova PKO zábradlí a kotevních šroubů zábradlí, kotevní šrouby opatřit plastovými krytkami vyplněnými vazelinou, obnova izolace odvodňovacího žlabu, prodloužit trubky odvodnění u obou opěr, odstranit vegetaci z dlažby a opravit spárování, obnovit zálivky podél MDZ, obnovit tmel dilatační spáry mezi mosty
D35-148..2	Obnova PKO zábradlí a kotevních šroubů zábradlí, obnova izolace a PKO odvodňovacího žlabu, obnova lokálně poškozené PKO plechu ukončujícího vozovkové vrstvy u odvodňovacího žlabu, prodloužit trubku odvodnění úložného prahu opěry 4, odstranit vegetaci z odláždění a opravit odláždění, opravit spárování, obnova porušené izolace odvodňovacího žlabu, obnovit tmel dilatační spáry mezi mosty
D35-148B.1	Očištění a provedení lokální sanace říms, oprava prosedlých podpovrchových dilatačních závěrů, nebo provést nový povrchový MDZ, na mostě doplnit modré sloupky
D35-148B.2	Odstranění odlupující se vrstvy nátěrů a provedení nové PKO kotevních šroubů zábradelních svodidel, vymleté spárování odláždění, vegetace v dlažbách a schodištích – odstranit vegetaci, opravit dláždění (prosedlé za římsami), schodiště, přetěsnění spár okolo MDZ, na mostě doplnit modré směrové sloupky
D35-148C.3	Odstranit vegetaci v dlažbách a na schodišti, doplnit zábradlí na křídlech
D35-149..1	Provedení sanace betonu nášlapu středové římsy, širší trhliny v opěrách, závěrných zídkách a pilířích zainjektovat, vyčistit odvodňovače, na mostě doplnit modré sloupky na svodidla
D35-149..2	Vyčištění a oprava odvodňovacího proužku a zanesených košů odvodňovačů, sanace rozpadlého betonu odvodňovacího proužku, provést opravu dláždění (prosedlé za římsami), opravit schodiště, přetěsnění spar okolo MDZ, opravit PKO zábradelního svodidla
D35-149A.3	Sanace betonu říms, popraskaného spárování, a lokálně rozpadlého betonu v místě zabetonování patky zábradlí na křidelních římsách, opravit žlaby a spárování

MUK 276	rozsah opravy
D35-150.1	Obnova PKO ukotvovacího materiálu, obnova zakrytí spojů betonového svodidla, opravit spárování dlažeb,
D35-150A.1	Provést přetmelení spár, provést obnovu PKO korozi dotčených částí zábradelního svodidla, oprava spárování dlažby, provést přetmelení všech spár na římsách, prodloužit trubičky odvodnění, opravit rozpojené části zábradelního svodidla
D35-150B.1	Obnova ochranných nátěrů říms, provést nové zatmelení spár, u MDZ provést zatmelení spár, prodloužit odvodňovací trubičku u O5
D35-150C.1	Obnova PKO zábradelního svodidla, opravit spárování dlažby, stopy po zatékání – prodloužit odvodňovací trubičky
D35-150C.2	Oprava PKO na zábradelním svodidle, opravit dláždění a doplnit spárování, prodloužit odvodňovací trubičky


Vyjma výše uvedených, správcem evidovaných závad je v rámci všech mostních objektů také uvažováno:

- kompletní oprava/obnova protikoroziční ochrany příslušenství
- výměna krytu vozovky
- výměna svodidel a vyšší UZ (pokud bude možné z hlediska kotvení římsy)
- plošné a lokální sanace drobných poruch říms, spodní stavby, NK a úprav pod mostem vyplývající z mostních prohlídek


Přehledný rozsah řešených úseků:

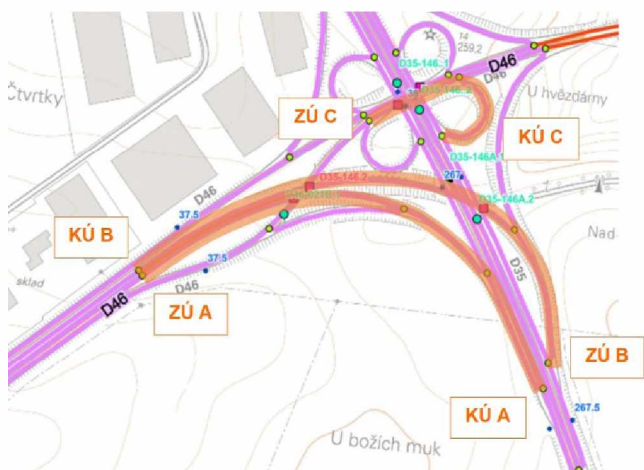


MUK 267

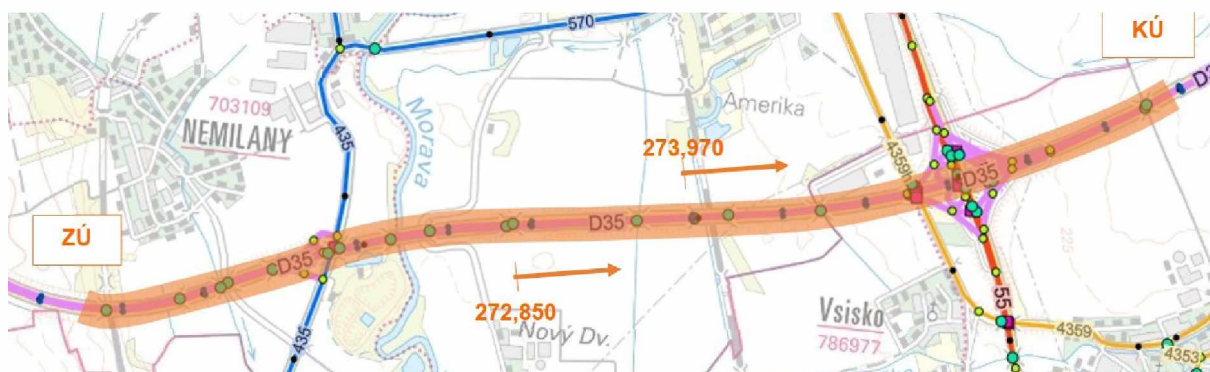

D35 KM 270.32 – 276.90

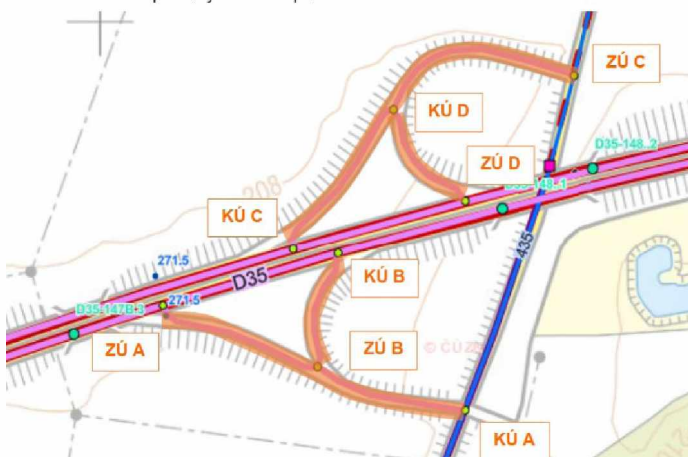

MUK 272

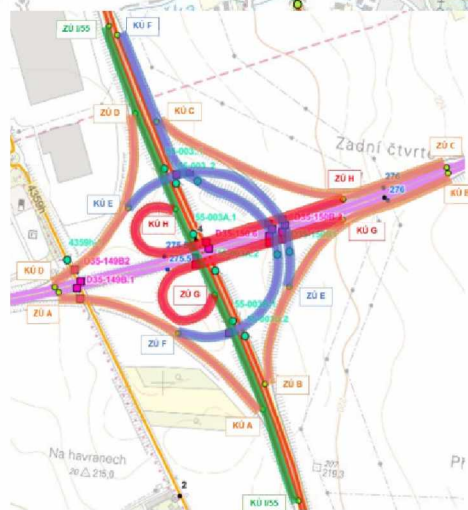

MUK 276

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci a podklady:

- Diagnostický průzkum
- Doplnkový diagnostický průzkum, který bude dodán nejpozději 12 týdnů od zahájení prací,

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

Čl. 2

Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, telematika apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat především:

- a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP-DI (dokumentace pro vydání společného povolení);
- b) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS (vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby;
- c) výkon inženýrské činnosti pro získání správního rozhodnutí;
- d) výkon dozoru projektanta;
- e) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;
- f) zajištění výkonu dozoru projektanta na stavbě.

Zhotovitel před vypracováním konceptu projektové dokumentace provede vizuální prohlídku stávajícího stavu za účasti SSÚD a majetkového správce, a vypracuje zprávu pro Objednatele s návrhem varianty opravy, kterou předloží na výrobním výboru.

Na základě koncepce schválené na výrobním výboru bude vypracován koncept PD v souladu se zadávacími podmínkami zakázky.

Dále jsou součástí díla nezbytné průzkumy a Souvisící dokumentace, přiměřeně k rozsahu zadání. Jedná zejména o:

- Geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro zpracování PDPS opravy vozovky (nelze použít mobilní mapovacího systému MMS) a zjištění údajů z KN a od správců a vlastníků IS
- Průzkum inženýrských sítí
- Plán BOZP vypracovaný subdodavatelem Konzultanta
- Zpracování projektu DIO v souladu a v podrobnostech vyžadovaných interními předpisy ŘSD s.p.
- Doplnkový diagnostický průzkum levého pruhu: - D35 PJP 270,330 – 270,400 + 270,850 – 272,850 a D35 LJP 270,320 – 270,400 + 271,100 – 273,970.

V projektové dokumentaci budou zapracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající z povolení, rozhodnutí, vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí a dalších dotčených subjektů.

DIO (stínění) v průběhu přípravných prací projektové dokumentace (zaměření, doplnkové diagnostické práce) zajistí dodavateli příslušné SSÚD (5 Kocourovce) bez úplaty.

Datum zahájení plnění služeb je stanoveno od data účinnosti smlouvy.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků Objednatel, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- Metodika_M4_Zásady 05_2023_fin
- R 139 _Stavební úpravy _Obecné požadavky na projekty oprav
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD, v platném znění
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD v platném znění
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění;
- Interní předpisy ŘSD (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné na stránkách ŘSD (www.rsd.cz);

Pakliže jsou Konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba Objednatel ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti Konzultanta dle Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektovat stav i sestavení katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatel a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li Objednatel stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Čl. 3

Předmět plnění

DOKUMENTACE PRO ÚČELY VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU

Dokumentace bude zpracována ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice“) a dle podmínek a požadavků Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec jsou uvedeny ve Smlouvě.

Součástí prací je zajištění níže uvedených průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DUSP-DI. Náklady na zajištění níže uvedených podkladů/průzkumů jsou součástí příslušné položky Soupisu prací (rozpisu služeb) – část Technická pomoc.

Průzkumy a podklady zajišťované Konzultantem:

- Geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro zpracování PDPS opravy vozovky (nelze použít mobilní mapovacího systému MMS) a zjištění údajů z KN a od správců a vlastníků IS
- Průzkum inženýrských sítí
- Plán BOZP vypracovaný subdodavatelem Konzultanta
- Zpracování projektu DIO v souladu a v podrobnostech vyžadovaných interními předpisy ŘSD s.p.
- Doplnkový diagnostický průzkum levého pruhu: - D35 PJP 270,330 – 270,400 + 270,850 – 272,850 a D35 LJP 270,320 – 270,400 + 271,100 – 273,970.

Tyto průzkumy a podklady jsou součástí související dokumentace.

Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení předávaných podkladů dle Čl. 1 této Přílohy.

Konzultant, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace sloužící pro účely podání žádosti o povolení záměru je v souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj, konzultant prověří, zda při zpracování čistopisu projektové dokumentace nedošlo ke změnám technického řešení stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

Součástí plnění je mimo jiné i záborový elaborát (ZE) a geometrické plány, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Konzultant je povinen zpracovat návrh konceptu ZE (zpracován dle datového předpisu pro úroveň DSP), projednat návrh hranic trvalých záborů, dopad dočasných záborů včetně věcných břemen s jednoznačným řešením rizik dopadající do majetkoprávního vypořádání a zbytkových parcel.

Konzultant zpracuje a předá čistopis ZE-DSP s odsouhlasenými hranicemi trvalých a dočasných záborů i věcných břemen, který je vstupním podkladem pro tvorbu geometrických plánů (GP).

Konzultant zpracuje a vyznačí v souladu s legislativou oddělovací GP na základě Objednatelem odsouhlaseného ZE-DSP, zajistí ověření GP ÚOZI a katastrem nemovitostí a zpracuje čistopis ZE-DSP-SP dle ověřených GP a stavu katastrálního operátu dle datového předpisu C3. Nedílnou součástí dokumentace je vždy výměnný formát záborového elaborátu VFZE pro automatické zadání stavby do systému majetkoprávního vypořádání MPV.

Konzultant zpracuje Harmonogram postupu výstavby s využitím technického předpisu ŘSD M1 – Metodika pro tvorbu harmonogramu (Katalog prací)“.

Objednatel si vyhrazuje právo žádat odevzdání dokumentace stavebních objektů cizích správců v samostatné dokumentaci (dokumentacích). Za takovéto případné rozdělení dokumentace nenáleží Konzultantovi nárok na dodatečnou platbu.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE

Projednání s Objednatelem

Konzultant je povinen před odevzdáním konceptu projednat rozpracovanou projektovou dokumentaci s Objednatelem. Výrobní výbory budou svolány pro každou řadu objektů SO a to min. 2x během zpracování konceptu, pokud Objednatel nerozhodne jinak. U technicko-ekonomické studie budou výrobní výbory svolány 1x měsíčně, pokud Objednatel nerozhodne jinak.

Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena Objednateli k posouzení. Požaduje se předložení úplného konceptu, tj. všech příloh dle příslušných Vyhlášek stanovujících rozsah těchto dokumentací a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (vyjma příloh, které z podstaty jejich náplně nelze v konceptu předložit).

Po obdržení vyjádření Objednatele ke konceptu zajistí Konzultant zpravidla ve lhůtě do 28 dnů projednání uplatněných připomínek Objednatele za účasti příslušných specialistů Objednatele. Konzultant je povinen postupovat tak, aby byly všechny připomínky včas a řádně vypořádány a v daném rozsahu zapracovány.

Protokol s vypořádáními připomínkami Objednatele je součástí neveřejné části projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn provést kontrolu způsobu zapracování připomínek.

Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Konzultant je povinen výrobní výbor svolat nejpozději v termínu odevzdání konceptu projektové dokumentace.

Projednání s externími subjekty

V průběhu zpracování projektové dokumentace je Konzultant povinný podle potřeby daného projektu a po dohodě s Objednatelem projednávat dokumentaci s dotčenými organizacemi, dotčenými orgány a dalšími subjekty, vč. zástupců Objednatele a jim stanovených externích subjektů. Ze všech projednání je Konzultant povinný zpracovat odsouhlasený záznam/zápis, anebo doložit písemné vyjádření z projednání. Konzultant je povinen projektovou dokumentaci dle požadavků vzešlých z projednání, v rozsahu odsouhlaseném ze strany Objednatele, doplnit.

Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla), je-li Objednatelem stanoven, musí být pozván na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.

Konzultant je povinen zpracovat ucelený přehled připomínek externích subjektů vč. uvedení způsobu vypořádání dohodnutého s Objednatelem, tento přehled bude doložen v rámci neveřejné části projektové dokumentace.

Konzultant se po odsouhlasení Objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a doplňuje projektovou dokumentaci zejména aktualizacemi ZE a podkladů pro sestavení smluvních dokumentů.

Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, dokumentaci pro odnětí ZPF a PUPFL atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskládněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu.

Projednání a koordinace stavby s ČEZ Distribuce, a. s.

Spolupráce s ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen ČEZd) se řídí uzavřenou smlouvou mezi ŘSD a ČEZd v posledním platném znění. Projektové práce na stavebních objektech Přeložek ČEZd vyvolaných stavbou ŘSD zajišťuje ČEZd,

Konzultant je povinen bez zbytečného odkladu zpracovat řešení stavby ŘSD v rozsahu nezbytném pro zaslání výzvy na ČEZd k řešení Přeložek dotčených vedení ČEZd, na základě které ČEZd zpracuje návrh rozsahu Přeložky a následně zahájí zpracování projektové dokumentace Přeložky. Konzultant postupuje tak, aby technické řešení stavby ŘSD a Přeložky bylo vzájemně koordinované, navržené v souladu s požadavky dotčených subjektů, a bude činit tak, aby v maximální možné míře předešel vícepracím spojených s následnou úpravou technického řešení.

Konzultant je povinen průběžně koordinovat svou činnost s projektantem určeným ze strany ČEZd, poskytovat mu všechny dostupné a potřebné informace pro bezproblémový návrh technického řešení Přeložky ČEZd a následného zajištění pravomocného správního rozhodnutí. Konzultant se na výzvu Objednatel podílí na projednání projektové dokumentace Přeložky ČEZd s dotčenými subjekty v průběhu zpracování projektové dokumentace.

Konzultant je povinen Objednateli potvrdit, že rozsah a podoba předané projektové dokumentace od ČEZd, je zpracována v rozsahu dle uzavřené smlouvy mezi ŘSD a ČEZd, a je dostačující pro účely provedení inženýrské činnosti pro zajištění správního rozhodnutí.

Konzultant bez zbytečné odkladu informuje Objednatel o nečinnosti projektanta ČEZd, a o všech vyskytnuvší se skutečnostech majících dopad na projektovou dokumentaci zpracovávanou pro ŘSD.

Další ustanovení

Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci. To neplatí, jestliže dokumentace byla příslušnému orgánu Konzultantem prokazatelně předložena a projednána, dotčený orgán však následně změnil svůj názor nebo požadavky s tím, že tyto požadavky vyvolávají podstatné přepracování projektové dokumentace.

Koncepční změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu, pokud je požaduje Objednatel nebo jakákoliv třetí strana po vypořádání připomínek Objednatel ke konceptu dokumentace se považují za práce nad rámec uzavřené smlouvy za předpokladu, že tyto změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování nejsou důsledkem porušení povinností Konzultanta dle této smlouvy. Při takovýchto změnách projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování má Konzultant právo postupovat podle čl. 5 Smluvních podmínek (Variace služeb).

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného povolení záměru, či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Součástí inženýrské činnosti je zajištění správního rozhodnutí pro vyvolané přeložky ČEZ Distribuce dle PD zpracované ČEZ Distribuce.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního či stavebního nebo společného řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.

Pro výkon inženýrské činnosti obdrží Konzultant plnou moc Objednatele.

Konzultant je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb, a to v rozsahu evidence a průběžné aktualizace údajů o postupu inženýrské činnosti. Přístup do systému PPS Objednatel poskytne Konzultantovi, a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Konzultant má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky v rozsahu dle dohody s Objednatelem dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Veškeré náklady spojené s vedením PPS zahrnul konzultant do nabídkové ceny služeb jako celku. Náklady na pořízení a správu aplikace PPS nese Objednatel, přístup do on-line aplikací poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Konzultant musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posouzení (supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení projektové dokumentace je Konzultant povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení, odsouhlasenými Objednatelem. Pokud bude Objednatelem stanoven koordinátor projektových prací, je Konzultant povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených Objednatelem.

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím najatého konzultanta) je součástí plnění a související náklady zahrne Konzultant do nabídkové ceny.

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (DÁLE JEN „VD-ZDS“)

Konzultant je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu s platnou přílohou k vyhlášce č. 131/2024 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích vyhlášek, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny ve Smlouvě.

V rámci zpracování VD-ZDS je Konzultant povinen dbát pokynů Objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi Konzultantem a Objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací. Objednatel je oprávněn požádat zpracovatele o předání projektu Základní vytyčovací sítě v předstihu samostatně, a to bez nároku na platbu za samostatné předání výše uvedeného projektu. Součástí plnění je i projekt skryvek pro ZAV, pokud je uveden v soupisu prací.

Součástí VD-ZDS je i technická podpora Objednateli při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu prací a ZTKP. Náklady za tuto činnost zahrne Konzultant do nabídkové ceny za zpracování VD-ZDS.

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

- a) Doplnující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
- b) Doplnující odborné, popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů;
- c) Doplnující odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
- d) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a Objednatelem požadovaného technického řešení;
- e) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
- f) Technické rozpracování zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu Objednatele;
- g) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele;
- h) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na zhotovitele stavby;
- i) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při oponentuře výstupů Objednatele a jeho externích poradců;
- j) Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
- k) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při řešení sporných otázek mezi Objednatelem a Konzultantem, při předcházení sporů, při smírném řešení sporů i v rámci případných soudních či rozhodčích řízeních;
- l) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc v rámci případných správních řízeních a navazujících soudních řízeních správních;
- m) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech projektových stupňů z pohledu norem, předpisů, zákonů;
- n) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
- o) Součinnost při provádění geotechnického průzkumu;
- p) Na základě pokynu Objednatel zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace stavby
- q) Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, přípravě a realizaci ZBV:

i. Přípravná fáze zahrnující provedení:

- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;
- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikaci dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností spojených se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti Objednatele.

ii. Analytická fáze zahrnující provedení:

- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změny během výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn;
- oponentura tvrzení a nároků uplatňovaných Konzultantem;
- vyhodnocení možností postupu podle smluvní dokumentace, výkladových pravidel FIDIC a ZZVZ, včetně související rozhodovací a výkladové praxe k ZZVZ;
- úvodní kontrolu rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle ZZVZ a dle výkladové praxe MMR, ÚOHS a SFDI, včetně související analýzy splnění podmínek pro realizaci ZBV.

iii. Finální fáze zahrnující provedení:

- přípravu technických a ostatních částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků základních smluvních dokumentů mezi Objednatelem a jednotlivými konzultanti.
- činnost bude soustředěna zejména na přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV a začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících podkladů a informací za použití výkladové praxe dle ZZVZ.

Výsledným výstupem finální fáze bude

- finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh;
- závěrečné posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se ZZVZ;
- cenové posouzení.

r) Technická pomoc Objednateli při zpracování odborných analýz a posudků:

- i. Analýza zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce, včetně doporučení na úpravu zadávacích podmínek;
- ii. Analýza žádostí konzultantů o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce, včetně přípravy návrhu vypořádání žádostí;
- iii. Analýza námitek konzultantů proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky na stavební práce, posouzení důvodnosti námitek a zákonnosti a věcné správnosti postupu Objednatele, včetně přípravy návrhu na vypořádání námitek;
- iv. Analýza podnětů a návrhů k ÚOHS na přezkum úkonů Objednatele v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, včetně přípravy návrhu jednotlivých vyjádření Objednatele a případného rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS;
- v. Analýza podaných správních žalob event. analýza možností podání správních žalob, navazujících na správní řízení před ÚOHS, včetně přípravy návrhu procesních úkonů Objednatele;
- vi. Oponentura k znaleckým posudkům a odborným vyjádřením a stanoviskům, zpracovaným pro Objednatele třetími osobami;
- vii. Analýza problematických aspektů nabídek účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce;
- viii. Příprava doporučení Objednateli a jím jmenovaným komisím k postupu při posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na stavební práce;
- ix. Analýza možností zaslání výzev účastníkům zadávacího řízení k vysvětlení nabídek, včetně přípravy návrhu souvisejících výzev;
- x. Posouzení možností Objednatele ve vztahu k prošetření mimořádně nízké nabídkové ceny;
- xi. Analýza dodatečných sdělení účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce;
- xii. Analýza jednotlivých úkonů Objednatele v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce;
- xiii. Analýza nároků zhotovitele v rámci plnění smlouvy o dílo, včetně přípravy návrhu řešení;
- xiv. Analýza vadného plnění zhotovitele a jeho důsledků z hlediska uzavřené smlouvy o dílo, včetně přípravy souvisejících dokumentů pro Objednatele;
- xv. Analýza postupu správce stavby, resp. technického dozoru stavby z hlediska uzavřených smluv a příprava návrhu souvisejících dokumentů pro Objednatele.

DOZOR PROJEKTANTA (AD)

Výkon dozoru projektanta bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon dozoru projektanta bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy Objednatele. Výzva musí být Konzultantu oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu dozoru projektanta.

Osoba pověřená výkonem dozoru projektanta provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření

a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce Objednatel.

Zjistí-li Konzultant při výkonu dozoru projektanta nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, Objednatel. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro Konzultanta nezbytné podmínky pro výkon sjednaného dozoru projektanta, v tomto smyslu zejména oznámí Konzultanta jako osobu vykonávající dozor projektanta stavby a zajistí, aby Konzultant dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

V rámci AD zpracovává poskytovatel na základě vyžádání Objednatel odborná vyjádření, posouzení změn díla a další činnosti přímo vyplývající ze Směrnice státního podniku 10-S-11.6 Změny závazků v platném znění.

AD, na základě pokynu Objednatel, ve vzájemně dohodnutém termínu a rozsahu, zapracovává projektovou dokumentaci (výkresová část + soupis prací s výkazem výměr) změny vzniklé v průběhu realizace stavby (skutečně zastižené podmínky na staveništi).

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Čl. 4

Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu C3).

Dokončené dílo v tištěné (analogové) podobě s USB diskem, pokud je požadováno, bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Dálnic, Oddělení oprav dálnic Morava, Šumavská 524/31, 602 00 Brno.

Elektronická verze díla (vč. průběžných výstupů dle rozpisu v následující tabulce) bude Objednateli vždy odevzdávána taky prostřednictvím společného datového uložště Objednatel (CDE nebo jiný SW nástroj/slужba definovaná Objednatel) během plnění díla. Přístup je poskytnut bezplatně.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

DUSP-DI	<u>Koncept</u>	2x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
	<u>Čistopis</u>	1x autorizovaná PD 2x elektronicky na datovém nosiči 1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti
	Pravomocná správní rozhodnutí	1x originál s doložkou o nabytí právní moci 1x úředně ověřená kopie 1x elektronicky na datovém nosiči
	Vyjádření, rozhodnutí	1x originál 1x kopie 1x na datovém nosiči
	Výpisy z LV	1x originál 1x na datovém nosiči
	Smlouvy (kupní, věcná břemena, a další)	2x originál 1x kopie 1x na datovém nosiči

VD-ZDS	(část PDPS, ZTKP, soupis prací) koncept	1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
	(část PDPS, ZTKP, soupis prací) čistopis	1x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči
	Datový nosič se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. ASPE, atd.)	2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)
	VD-ZDS čistopis po zadávacím řízení	2x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči, 4x autorizovaná PD v tištěné podobě

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive hlavním inženýrem projektu. Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Elektronickou verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý rozsah plnění vždy odevzdat ve formátu *.pdf, a dále minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Čl. 5

Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-konzultantů, minimálně následující části projektové dokumentace:

- (i) objekty řady 100 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného souhlasu Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného v pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle pod-čl. 3.5.1

Čl. 6

Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy doklad:

- a) o zavedeném systému managementu kvality v souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat kvalitativní požadavky Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.
- b) o zavedeném systému environmentálního managementu v souladu s ČSN ISO 14001
- c) o zavedeném systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ČSN ISO 45001

Konzultant před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy Objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah	Činnost
-------------------	---------

Doklad o zavedení systému managementu kvality – certifikát dle ČSN EN ISO 9001, v platném znění a splňující požadavky MP SJ-PK nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu MP SJ-PK	- projektová činnost ve výstavbě, - výkon zeměměřických činností, - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - geologické práce.
Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu – certifikát dle ČSN EN ISO 14001 v platném znění	- projektová činnost ve výstavbě, - výkon zeměměřických činností, - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - geologické práce.
Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – certifikát dle ČSN ISO 45001 v platném znění	- projektová činnost ve výstavbě, - výkon zeměměřických činností, - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - geologické práce.

Soupis prací je přiložen samostatně.

**PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB POSKYTOVANÉ
OBJEDNATELEM**

1.1 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem

Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

1.3 Personál konzultanta

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-konzultantů, minimálně výkon těchto pozic:

- (i) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby

Konzultant je povinen všechny své pod-konzultanty zavázat ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným pro danou stavbu.

1.4 Služby od třetích stran

Nejsou uvažovány.

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy

a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.

b) Zástupce Konzultanta

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za Konzultanta. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)

Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.

e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:

Druh pojištění	Minimální hranice pojistného plnění
pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této Rámcové dohody,	pro každou jednu škodní událost minimálně Kč

PŘÍLOHA 3 - ODMĚNA A PLATBA

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

1) Cena a sazby

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ a „dozor projektanta“ bude cena určena jako násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, související výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod., pakliže není v Rámcové dohodě stanoveno jinak. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně, to je zpravidla do 14 kalendářních dnů, schválí nebo vznesl své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany Objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury – daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvních stran je možné vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

b. Dozor projektanta

Odměna za dozor projektanta dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se k doзору projektanta. Evidenci odpracované doby předá Konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byl „dozor projektanta“ realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba Objednatele, kterou

je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznesne své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany Objednatele. Objednatel schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury – daňového dokladu (Předávacího protokolu). Na základě dohody smluvních stran je možné vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

c. Inženýrská činnost

Odměna za výkon inženýrské činnosti bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 20 % na základě doložení dokladu o tom, že byly osloveny všechny DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, které jsou předmětem plnění;
- 60 % na základě podání všech žádostí o vydání povolení záměru (tzn. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na stavbu;
- 20 % na základě získání všech stavebních povolení/společných povolení/povolení záměru v právní moci, které jsou předmětem plnění (splátka bude uhrazena po získání posledního).

Součástí faktury bude, osobami k tomu oprávněnými ve Smlouvě, potvrzený Předávací protokol, potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedeně ve Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré Objednatel předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, aj.) budou Konzultantu proplaceny dle Konzultantem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Pro zamezení dvojímu výkladu uvádíme, že pokud jsou v soupisu prací uvedeny položky sloužící k nacenění a oceněné „zajištěním znaleckého posudku“ zahrnují tyto položky nejen spolupráci Konzultanta se znalci, ale i cenu samotných znaleckých posudků (znalečné).

Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy DUSP-DI a VD-ZDS bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 75 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné DUSP-DI;
- 25 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné DUSP-DI;
-
- 75 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné VD-ZDS;
- 20 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu VD-ZDS;
- 5 % z této ceny po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS po výběrovém řízení

Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků zástupcem Objednatele ve věcech technických. Přílohou potvrzení je soupis Konzultantem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu.

3) Společné ustanovení k fakturám

Faktura – daňový doklad – vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND).

Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Konzultanta.

4) Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti Konzultantu vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její úhradou, jestliže:

- a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího protokolu (je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objednateli zpochybněna);
- b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo Rámcovou dohodou;
- c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den její splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:

- a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně dozoru projektanta: vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
- b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je ze strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo dokladů, v souladu s kap. 2.3
- c) ve vztahu k cenové úpravě položkových cen v důsledku inflace podle Článku 6: okamžik doručení Konzultantovi oznámení Objednatele o schválení vyúčtování předloženého Konzultantem, toto oznámení je pro účely fakturace považováno za předávací protokol.

6) Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, že v případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitě částky je Objednatel povinen uhradit Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na náhradu škody.

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen případný nárok na náhradu škody.

7) Smluvní pokuty

Popis části díla (služeb)	Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení Služeb nebo jejich částí
koncept DUSP-DI	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
čistopis DUSP-DI	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Výkon inženýrské činnosti ke správnému rozhodnutí	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Koncept VD-ZDS	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Čistopis VD-ZDS	[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Výkon technické pomoci/výkon dozoru projektanta	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však Kč bez DPH za každý započatý den prodlení

HARMONOGRAM

Datum zahájení: ode dne účinnosti smlouvy

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DUSP-DI	Nejpozději do 24 týdnů od zahájení plnění. Doplňková diagnostika bude Objednatelem dodána nejpozději 12 týdnů od zahájení plnění.
Čistopis DUSP-DI	Nejpozději do 4 týdnů od doručení souhrnných přípomínek Objednatele ke konceptu
Výkon inženýrské činnosti k Povolení záměru)	Podání úplné žádosti o povolení záměru (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) nejpozději do 16 týdnů od předání čistopisu DSP.
Koncept VD-ZDS	nejpozději do 10 týdnů od předání čistopisu DSP
Čistopis VD-ZDS	Nejpozději do 3 týdnů od doručení souhrnných přípomínek Objednatele ke konceptu
Výkon technické pomoci	Na výzvu objednatele, v průběhu realizace stavby
Výkon dozoru projektanta (AD)	Na výzvu objednatele, v průběhu realizace stavby

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2024**

vedoucí společník společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 427 67 377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727, jakožto konzultant služby „**PD D35 Oprava AB vozovky v km 270,3-276,0 L+P, vč. MÚK Slavonín, Nemilany, Holice**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	Identifikace poddodavatele: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo poddodavatele, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) poddodavatel je / není malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit: a) popis dle soupisu prací, b) % z celkové ceny Smlouvy	Obchodní název konzultanta (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění poddodavatele, tj. smluvní strana konzultanta v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s poddodavatelem bude uzavírat.
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.	IČO: 496 06 123 Janáčkova 1020/7 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava poddodavatel je malým nebo středním podnikem poddodavatel není akciová společnost	Zajištění projekčních prací a činností v oboru Ochrana ovzduší – rozptylové studie a posudky, činnost osoby zajišťující odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií a odborných posudků. Zpracovávání rozptylové (exhalační) studie, technicko-konzultační součinnost.	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

PUTTNER, s r.o.	IČO: 255 52 953 Šumavská 416/15 602 00 Brno poddodavatel je malým nebo středním podnikem poddodavatel není akciová společnost	Zajištění komplexních projekčních prací v oboru technologická zařízení staveb, především vypracování dílčích částí projektové dokumentace řady 400 a technicko-konzultační součinnost.	PK OSSENDORF s.r.o.
GB-geodezie, spol. s r.o.	IČO: 262 71 044 Tuřanka 1521/92b 627 00 Brno poddodavatel je malým nebo středním podnikem poddodavatel není akciová společnost	Zajištění komplexních zeměměřičských činností v rozsahu geodetického polohopisného a výškopisného zaměření, ověřování výsledků, součinnost při ověření záborového elaborátu, vypracování geodetického koordinačního výkresu, technicko – konzultační součinnost.	PK OSSENDORF s.r.o.
DD plus – geodetická kancelář s.r.o.	IČO: 469 62 808 Pekárenská 330/12 602 00 Brno poddodavatel je malým nebo středním podnikem poddodavatel není akciová společnost	Zajištění komplexních zeměměřičských činností v rozsahu geodetického polohopisného a výškopisného zaměření, ověřování výsledků, součinnost při ověření záborového elaborátu, vypracování geodetického koordinačního výkresu, technicko – konzultační součinnost.	PK OSSENDORF s.r.o.
AQUATIS a.s.	IČO: 463 47 526 Botanická 834/56 602 00 Brno poddodavatel není malým nebo středním podnikem poddodavatel není akciová společnost	Zajištění komplexních činností v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.	PK OSSENDORF s.r.o.
AQUA PROCON s.r.o.	IČO: 469 64 371 Palackého třída 768/12 612 00 Brno poddodavatel je malým nebo středním podnikem poddodavatel není akciová společnost	Činnosti v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství	VIAPONT, s.r.o.

Poznámka: Pokud poddodavatel nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídky, v bodu 1 (zadavatel je oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2024**

vedoucí společník společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 427 67 377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727,

jakožto konzultant služby „**PD D35 Oprava AB vozovky v km 270,3-276,0 L+P, vč. MÚK**

Slavonín, Nemilany, Holice, 80SD001317“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby Rámcová dohoda na projektové práce pro údržbu a provoz pozemních komunikací 2024, 01PU-005959.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce (hodnocená osoba)		
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce (hodnocená osoba)		
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce (hodnocená osoba)		
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby (hodnocená osoba)		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby (hodnocená osoba)		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby (hodnocená osoba)		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce (hodnocená osoba)		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce (hodnocená osoba)		

Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce (hodnocená osoba)	
Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
Osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	
Osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	
Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika (hodnocená osoba)	
Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika (hodnocená osoba)	
Osoba provádějící zeměměřické činnosti	
Osoba provádějící zeměměřické činnosti	
Osoba provádějící zeměměřické činnosti	
Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	
Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	
Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	
Osoba zajišťující inženýrskou činnost (hodnocená osoba)	
Osoba zajišťující inženýrskou činnost (hodnocená osoba)	
Osoba zajišťující inženýrskou činnost	
Osoba zajišťující inženýrskou činnost	
Osoba zodpovědného projektanta v oboru inženýrská geologie	

- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2024: 01PU-005959

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 80SD001317
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: PD D35 Oprava AB vozovky v km 270,3-276,0 L+P, vč. MÚK
Slavonín, Nemilany, Holice

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby

(dále jen „**Objednatel**“),

a

jméno/název: [doplň konzultant]

se sídlem: [doplň konzultant]

IČO: [doplň konzultant]

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplň konzultant]

(dále jen „**Konzultant**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V [Praxe] dne _____

V [Praxe] dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

PD D35 Oprava AB vozovky v km 270,3-276,0 L+P, vč. MÚK Slavonín, Nemilany, Holice - BEZ BIM

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP-DI*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k povolení záměru bez majetkopr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli + autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
	1,190%	0,105%	0,930%		
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					11 870 342
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	86,23%	95,11%	91,97%	88,28%	88,90%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplň do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 8

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP/DUSP/DUSP-DI/DPS Rozdíl:	Chyba	Pozn. pro zpracovatele: Jedná se o kontrolní tabulku provedení výpočtu. Celková hodnota ocenění v jednotlivých listech a v této souhrnné tabulce se zaokrouhluje na tři desetinná místa. Upozorňujeme, že hodnoty v jednotlivých listech slouží pouze ke kontrole správnosti ocenění a současně slouží ke kontrole v
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP/povolení záměru Rozdíl:	Ok	
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok	

V Ostravě dne viz eletronický podpis

Tabulka č. 4

Dokumentace DUSP-DI

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD D35 Oprava AB vozovky v km 270,3-276,0 L+P, vč. MÚK Slavonín, Nemilany, Holice - BEZ BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje	8	8		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	64	64		
3. Seznam vstupních podkladů	64	64		
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby	20	20		
2. Celkový popis stavby	20	20		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	20	20		
4. Dopravní řešení	20	20		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	20	20		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	20	20		
7. Ochrana obyvatelstva	10	10		
8. Zásady organizace výstavby	100	100		
9. Celkové vodohospodářské řešení		neoceňuje se		
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů	80	80		
2. Katastrální situační výkres	160	160		
3. Koordinační situační výkres	320	320		
		neoceňuje se		
4. Speciální situační výkres				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva	350	350		
1.2 Výkresy	1900	1800		
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva	250	250		
2.2 Výkresy	850	850		
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				0
3.1 Technická zpráva		neoceňuje se		0
3.2 Hydrotechnické výpočty		neoceňuje se		0
3.3 Statické výpočty		neoceňuje se		0
3.4 Výkresy		neoceňuje se		0
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				0
4.1 Technická zpráva		neoceňuje se		0
4.2 Výkresy		neoceňuje se		0
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva		neoceňuje se		0
5.2 Výkresy		neoceňuje se		0
5.3 Statická část		neoceňuje se		0
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní				0
6.1 Technická zpráva		neoceňuje se		0
6.2 Výkresy		neoceňuje se		0
7. Objekty drah		neoceňuje se		
8. Objekty pozemních staveb		neoceňuje se		0
9. Ostatní stavební objekty	500	500		
10. Požárně bezpečnostní řešení		neoceňuje se		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická				
2.1 Technická zpráva		neoceňuje se		
2.2 Výkresy		neoceňuje se		
Dokladová část				
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	200	200		
2. Doklad podle jiného právního předpisu		neoceňuje se		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury		neoceňuje se		
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	80	80		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neoceňuje se		
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy		neoceňuje se		
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených		neoceňuje se		
Související dokumentace, podklady a průzkumy				
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		neoceňuje se		
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		neoceňuje se		
3. Projekt odpadového hospodářství	80	80		
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se		
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace		neoceňuje se		
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	40	40		
7. Podrobný pedologický průzkum		neoceňuje se		0
8. Hluková studie nebo její aktualizace		neoceňuje se		0
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neoceňuje se		0
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		neoceňuje se		0
11. Rešerše geotechnického průzkumu		neoceňuje se		
12. Hydrogeologický posudek		neoceňuje se		0
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		neoceňuje se		0
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		neoceňuje se		
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neoceňuje se		0
16. Geodetické zaměření	200	200		
Odhad stavebních nákladů	160	160		
Plán BOZP	48	48		
Reprografie	45 000			
SOUČET celkem za DSP bez přírážky na BIM v Kč bez DPH				

Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k povolení záměru

PD D35 Oprava AB vozovky v km 270,3-276,0 L+P, vč. MÚK Slavonín, Nemilany, Holice - BEZ BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, EIA,...)	16	16		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>zejména</u>	350	350		
ČÁST A – CELKEM				

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	neoceňuje se			0
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	neoceňuje se			0
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	neoceňuje se			0
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	neoceňuje se			0
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	neoceňuje se			0
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	neoceňuje se			0
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:	neoceňuje se			0
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	neoceňuje se			0
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.	neoceňuje se			0
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	neoceňuje se			0
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	neoceňuje se			0
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	neoceňuje se			0
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	neoceňuje se			0
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	neoceňuje se			0
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	neoceňuje se			0
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	neoceňuje se			0
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	neoceňuje se			0
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	neoceňuje se			0
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	neoceňuje se			0
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	neoceňuje se			0
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytké omice	neoceňuje se			0
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	neoceňuje se			0
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	neoceňuje se			0
ČÁST B CELKEM				0

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	50	50		
ČÁST C CELKEM				

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	40	40		
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	30	30		
ČÁST D CELKEM				
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP				

Pozn.: Znalecké posudky jsou zajišťovány objednatelem

VD-ZDS	
--------	--

PD D35 Oprava AB vozovky v km 270,3-276,0 L+P, vč. MÚK Slavonín, Nemilany, Holice - BEZ BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")						
Pozn. Pro zpracovatele: Je-li k dispozici skutečný seznam SO z předchozího projektového stupně, bude tento doplněn níže a to včetně SN bez DPH		A. Souhrnné řešení stavby				
		0. Průvodní zpráva	60	60		
		1. Přehledná situace	40	40		
		2. Koordinační situace	450	450		
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	120	120		
		4. Bilance zemních prací	120	120		
		5. Zásady organizace výstavby	200	200		
		6. Celkové vodohospodářské řešení	neoceňuje se			0
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část				
SO řady 0xx	65 000 000	Příprava staveniště	neoceňuje se			
SO řady 1xx	1 200 000 000	Pozemní komunikace	1150	1300		
SO řady 2xx	980 000 000	Mostní objekty, zdi	750	750		
SO řady 3xx	450 000 000	Vodohospodářské objekty	neoceňuje se			
SO řady 4xx	325 000 000	Elektro a sdělovací objekty	340	340		
SO řady 5xx	285 000 000	Objekty trubních vedení	neoceňuje se			
SO řady 6xx	900 000 000	Pozemní objekty (vč. PHS) a tunleové objekty	neoceňuje se			
SO řady 7xx	250 000 000	Objekty úpravy území	neoceňuje se			
SO řady 8xx	45 000 000	Objekty zařízení staveniště	neoceňuje se			
4 500 000 000		D. Doklady	160	160		
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	240	240		
		F. Kontrolní rozpočet	150	150		
		G. Souvisící dokumentace	200	200		
		H. ZTKP	100	100		
		Rešerše geotechnického průzkumu	neoceňuje se			
		Reprografie v počtu dle VOP				
Celkem VD-ZDS bez přírážky na BIM v Kč bez DPH						

* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc

PD D35 Oprava AB vozovky v km 270,3-276,0 L+P, vč. MÚK Slavonín, Nemilany, Holice - BEZ BIM

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli v rozsahu výkonu AD	600		
Cena AD celkem bez DPH	600		

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
	80
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	120
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	80
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	110
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenímu množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	90
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	120
celkem hodin	600
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
