

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2016/00204

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená Ing. Stanislavem Nevrtalem, supervizorem pro výstavbu sítě Morava dle pověření

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu:

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Město Náměšť nad Oslavou

se sídlem Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

zastoupené: Vladimírem Měrkou - starostou

IČ: 00289965

DIČ :CZ00289965

bankovní spojení: KB Třebíč, a.s., Třebíč

Číslo účtu:

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 2.9.2015 pod č. 679952/15 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č.127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením
„VPIC Náměšť n.Osl. TR překl. UR NANO415“.

Čl. 2 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3 Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK VPIC Náměšť n.Osl. TR překl. UR NANO415, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládka),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4 Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:

- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

- po realizaci Překládky:
- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
- zajistit zemní práce související s Překládkou včetně zřízení kabelového lože
- k převzetí výkopu a předání staveniště vyzvat zástupce společnosti CETIN viz kontakt Čl.8 věci technické této smlouvy.
- nejpozději 2.týdny před zahájením realizace Překládky písemně vyzvat společnost CETIN k realizaci Překládky.

Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního souhlasu se stavbou „Přeložení sloupového rozvaděče na křižovatce ulic Krátká a Husova, VPIC Náměšť n.Osl. TR překl. UR NANO415 na pozemku parc. č. 675/1 v k.ú. Náměšť nad Oslavou“, č.j. 5638/16/Výst/Če ze dne 14.11.2016, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínek v tomto územním souhlasu stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním souhlasu stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této smlouvy předal společnosti CETIN tento územní souhlas.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 1 měsíce od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 1 měsíce od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **59.193,-Kč**. Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne jejího vystavení.

6.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé jednotlivé faktury

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: tel.
ve věcech technických: , specialista pro výstavbu sítě – přístupová síť
e-mail: , tel.:

b) Za stavebníka :Město Náměšť nad Oslavou

ve věcech smluvních: Vladimír Měrka, starosta
e-mail: , tel.:) fax:

ve věcech technických: vedoucí odboru SMM
e-mail: tel.: fax.: !

Čl. 9 Rozvazovací podmínka

9.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

9.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

10.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

10.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

10.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

10.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

10.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu,

10.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

10.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Náměště nad Oslavou na schůzi č. 23 dne 14.11.2016.

Přílohy :

1. Cenový a technický návrh Překládky
2. Specifikace nákladů
3. ÚS Č.j.:5638/16/Výst/Če

V Brně dne

V Náměšti nad Oslavou dne

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
Ing. Stanislav Nevrtal
supervizor pro výstavbu sítě Morava

Město Náměšť nad Oslavou
Vladimír Měrka
starosta

TECHNICKÁ ZPRÁVA CaTN

VPIC Náměšť n.Osl. TR překl. UR NANO415

CaTN řeší požadavek stavebníka – Města Náměšť nad Oslavou na přemístění stávajícího sloupového rozvaděče CETIN UR NANO415 mimo křižovatku ulic Krátká a Husova.

Stávající sloupový rozvaděč UR NANO415 bude demontován a nový rozvaděč MRS20 s novým patkovaným sloupem bude postaven o 2m výše ve směru ulice Husova. Stávající nadzemní přípojka pro č.p. 125 bude přepojena (případně nastavena) do přemístěného rozvaděče.

Přívodní samonosný kabel 3XN pro UR NANO415 bude zrušen. UR NANO415 bude napájen novým zemním kabelem 3XN0,6 FLE, který bude napojen přes dělicí spojku ze stávajícího přívodu pro UR NANO377. Pro přívodní kabel 3XN bude stavebníkem připravena chránička AROT v rámci rekonstrukce chodníku. Stávající nefunkční nadzemní přípojky budou zrušeny na základě TKH na náklady CETIN.

Na akci nebude zpracován realizační stupeň PD

ÚS – zajistí stavebník

GEO – ano

GP – ano

VBŘ – ano

Stavebník: Město Náměšť nad Oslavou

Kontakt: , Město Náměšť nad Oslavou, SMM

Masarykovo nám.104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

tel. , mob. , e-mail.

! , Město Náměšť nad Oslavou

odbor správy majetku města

tel.: , e.mail:

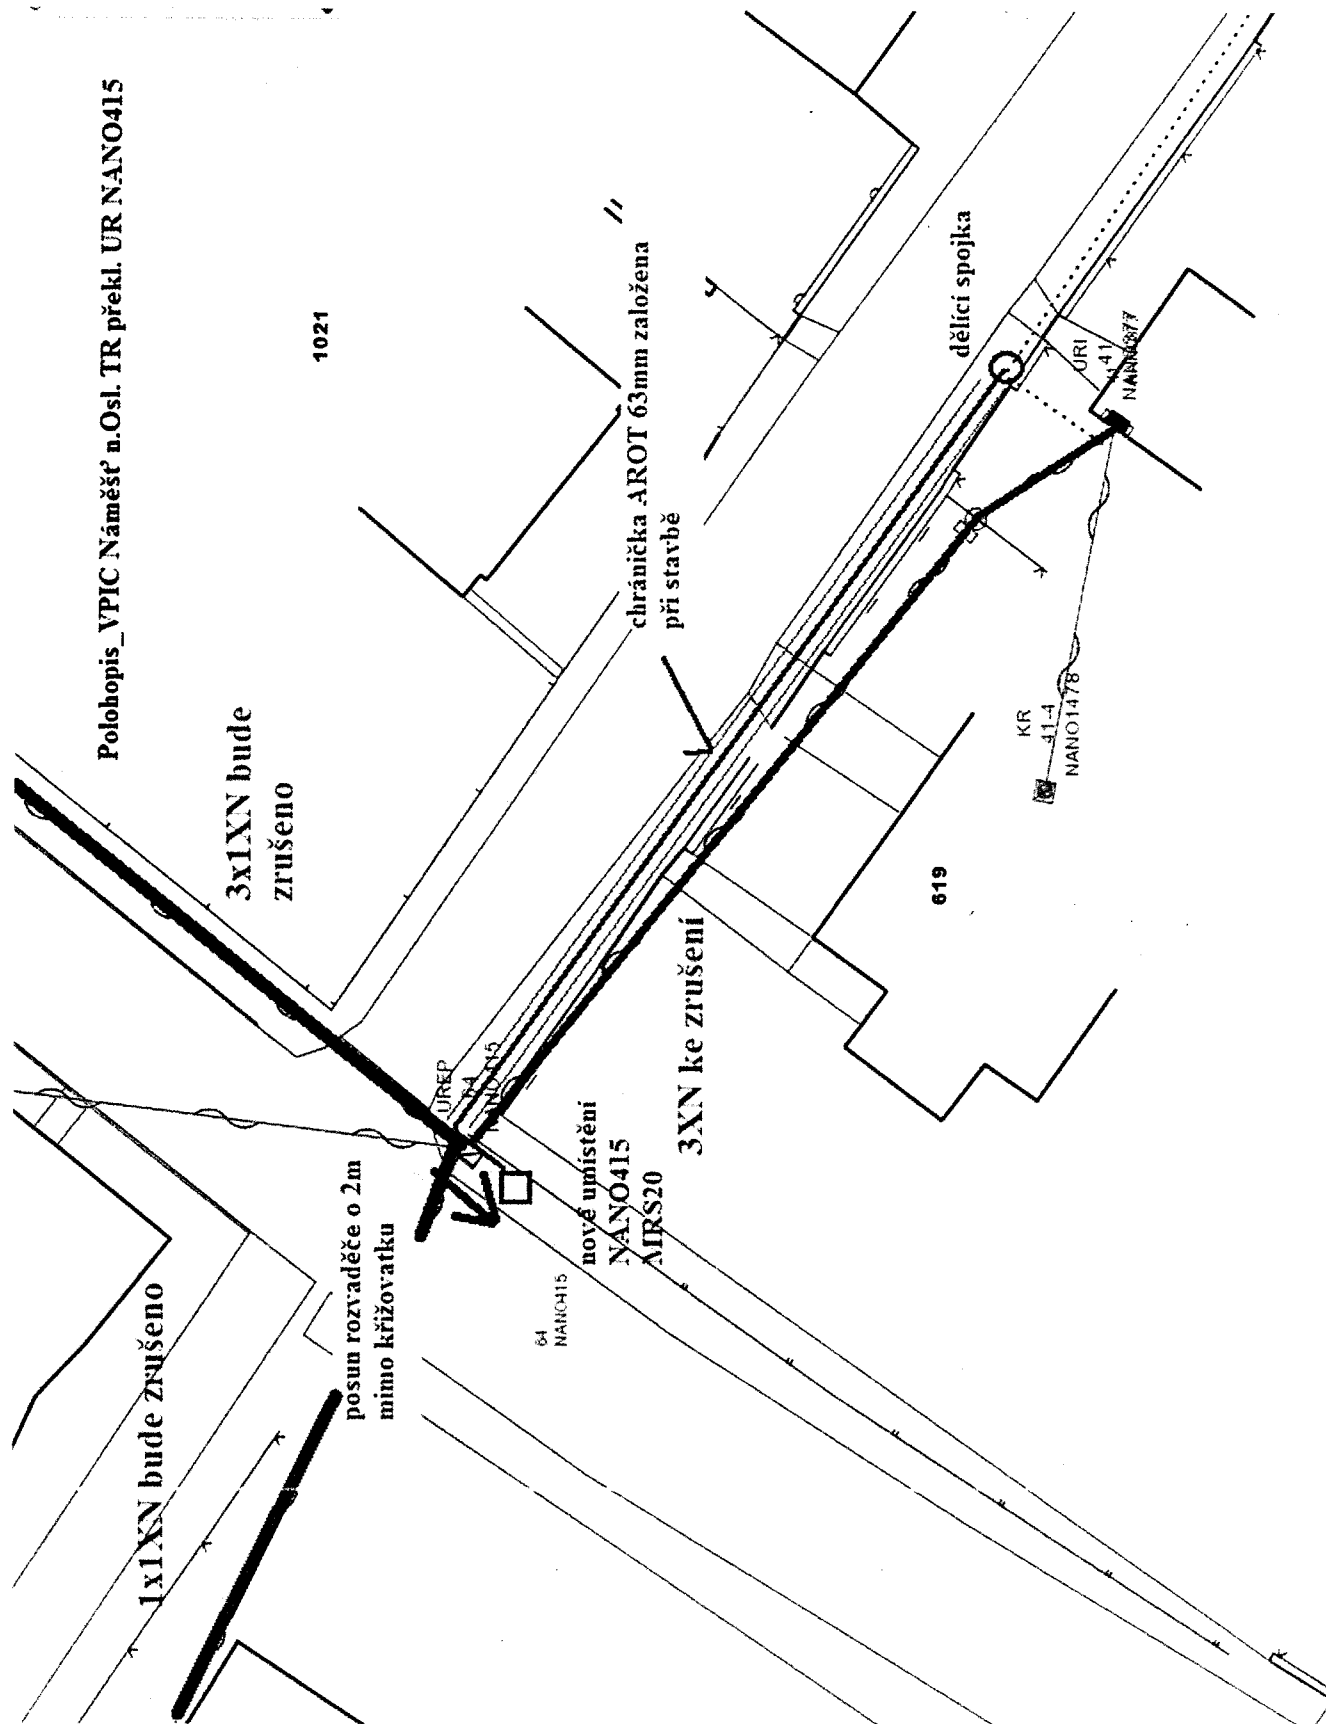


Schéma - VPIC Náměstí n.Osl. TR překl. UR NANO0415

4x1XN - zrušit
1x3XN - zrušit

přesunutý
NANO0415
MRS20

64
NANO0415
xNANC077/2 5/1-6
1xMRK 10
1xvod t LSA 10x18 kab forma 1p
Kabla . . . u čp 019
Náměstí nad Oslavicí
Náměstí nad Oslavicí

50m 3XN0,6FLE

SCVD

p. 1-5

p. 6-10

41
NANC077
xNANO1HR(Naměstí 14 & 1-10)

41-4
NANO1478
xNANC077/2 4/1-2
1xBOX - A2
1xžal sv žp
Kraha .019 .
Náměstí nad Oslavicí
Náměstí nad Oslavicí

41
NANC077
xNANO1HR(Naměstí 14 & 1-10)

**přesunutý
NANO415
MRS20**

64
NAN0415
xNANC077:2 5:1-6
1xMRK 10
1xvod ř LSA 10x1,8:kab forma 1p
Křáká . . . u č p 619
Náměstí nad Oslavou
Náměstí nad Oslavou

50m 3XN0,6FLE

41-4
NANO1478
xNANO3772.41-2
1xBOX - A2
1xžat. sv.žp
Křakla.019
Náměstí nad Oslavou
Náměstí nad Oslavou

41-4
NANO1478
xNANO377-2549

SCX/D

p. 1-5

0.6-10

41
NANCY77
XNANOIHRINAPESIV178410

41
NANC077
xNANOHR(Naměstí) 14 6 1-10
1xKab skřín V a
1xZAU-20-14kab forma 1p
Křeslo 284
Naměst nad Oslavou
Naměst nad Oslavou

VPIC Náměšť n.Osl. TR překl. UR NANO415 - specifikace nákladů _31_10_2016

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2016.10

Název stavby: **VPIC Náměšť n.Osl. TR překl. UR NANO415**

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	9 442,40 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	7 361,43 Kč
MONTÁŽ	20 705,67 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 504,77 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 983,15 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	158,49 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	9 185,64 Kč

Celkové náklady: 59 193,00 Kč

Seznam položek		Množství	Celková cena
Číslo SAP	Název položky		
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	9 442,40 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
958554	Paušál na zemní práce do 50 m	1.00 ks	5 184,06 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	3.00 m	1 294,56 Kč
952345	Rýha v trávě 35/70-100	3.00 m	829,47 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	6.00 m	53,34 Kč
MONTÁŽ			
955015	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	40.00 m	869,20 Kč
955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	50.00 m	1 975,00 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	128,37 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	2.00 ks	59,26 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	3.00 ks	59,25 Kč
954984	Montáž kotvy na stávající stožár	1.00 ks	735,52 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	3 719,92 Kč
955296	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	851,18 Kč
954981	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	40.00 m	1 066,80 Kč
955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	1.00 ks	938,07 Kč
955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	900,55 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	8.00 ks	158,00 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	572,72 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
954985	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	1.00 ks	1 819,61 Kč
958555	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	925,73 Kč
955024	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	1.00 ks	1 213,08 Kč
955107	Zrušení rozvaděče sloupového	1.00 ks	582,59 Kč
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	4.00 ks	55,32 Kč
955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	355,50 Kč

GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE

956281	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 196,62 Kč
955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 308,15 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBŘ odhadovaná	1.00 ks	200,00 Kč
--------	---	---------	-----------

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	1 999,57 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 616,94 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	166,64 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE

955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	158,49 Kč
--------	--	---------	-----------

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE			
305463	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem	1.00 ks	253,73 Kč
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	6.00 ks	219,84 Kč
305745	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm	1.00 kg	58,23 Kč
305789	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.30 kg	17,47 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	6.00 m	25,56 Kč
300116	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	50.00 m	974,50 Kč
300174	Kabel samonosný TCEKFLES 1x4x0,6	5.00 m	90,75 Kč
306358	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m	2.30 kg	365,31 Kč
306610	Matice napínače M 16 ČSN 021682	1.00 ks	50,38 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	1.00 ks	236,82 Kč
306701	Napínač šroubový oko-hák M 16	1.00 ks	90,28 Kč
303174	Objímka stožár. D 140 mm rozvodná	1.00 ks	126,52 Kč
309698	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	2.00 ks	185,80 Kč
305506	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	1.00 ks	1 554,33 Kč
306382	Skříň rozváděče MRS 20-QT 20p-na sloup	1.00 ks	1 707,41 Kč
301331	Sloup dřevěný 6,5m-impregnace Korasit CK	1.00 ks	1 482,37 Kč
320312	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	149,29 Kč
312845	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	1.00 ks	418,87 Kč
307033	Svorka lanová D 9-12 mm	6.00 ks	93,84 Kč
309974	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks	43,83 Kč
309380	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	2.00 ks	244,10 Kč
306789	Svorník M 16x1520x85x85 FeZn	1.00 ks	146,41 Kč
306843	Svorník M 20x410x90x25	2.00 ks	91,32 Kč
306457	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371	1.00 ks	41,87 Kč
309814	Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn	1.00 ks	516,81 Kč



Městský úřad Náměšť nad Oslavou

Odbor výstavby a územního rozvoje

Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Číslo jednací: 5638/16/Výst/Če

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

V Náměšti nad Oslavou dne 14. listopadu 2016



S008P005P2F4

SDĚLENÍ

Stavebník Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ 00289965, (dále jen žadatel), doručil dne 10. 11. 2016 odboru výstavby a územního rozvoje Městského úřadu Náměšť nad Oslavou žádost o územní souhlas pro stavbu PŘELOŽENÍ SLOUPOVÉHO ROZVADĚČE NA KŘÍŽOVATCE ULIC KRÁTKÁ A HUSOVA, VPIC NÁMĚŠŤ N. OSL. TR PŘEKL. UR NANO415 na pozemku p.č. 675/1 v kat. území Náměšť nad Oslavou.

Popis záměru

Z důvodu zřízení místa pro přecházení na křižovatce ulic Krátká a Husova dojde k přeložce sloupového rozvaděče.

Umístění a rozsah stavby je patrný z výkresu situace stavby, který tvoří přílohu oznámení o záměru k vydání územního souhlasu a tvoří i nedílnou součást tohoto sdělení (poslední strana).

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, posoudil předložené oznámení a vzhledem k tomu, že je záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydává podle § 96 odst. 4 stavebního zákona

územní souhlas

se stavbou

PŘELOŽENÍ SLOUPOVÉHO ROZVADĚČE NA KŘÍŽOVATCE ULIC KRÁTKÁ A HUSOVA, VPIC NÁMĚŠŤ N. OSL. TR PŘEKL. UR NANO415

na pozemku p.č. 675/1 v kat. území Náměšť nad Oslavou

Žadatel k oznámení o záměru doložil

- jednoduchý technický popis záměru
- souhlasy osob, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn, souhlas je vyznačen na situačním výkresu

Stavební úřad posoudil oznámení o záměru v území a dospěl k závěru, že stavba splňuje podmínky dle § 96 odst. 1 stavebního zákona. Jedná se o stavbu uvedenou v § 96 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.

Upozornění

- územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli;
- územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání (dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit);


- územní souhlas nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
- územní souhlas lze změnit na žádost oprávněného územním souhlasem nebo územním rozhodnutím za podmínek §94 odst. 1
- před zahájením zemních prací nutno vytýčit vedení podzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Rovněž tak vzdušná vedení nesmí být během stavby poškozena.

otisk úředního razítka

Rozdělovník:

Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Po nabytí účinnosti:

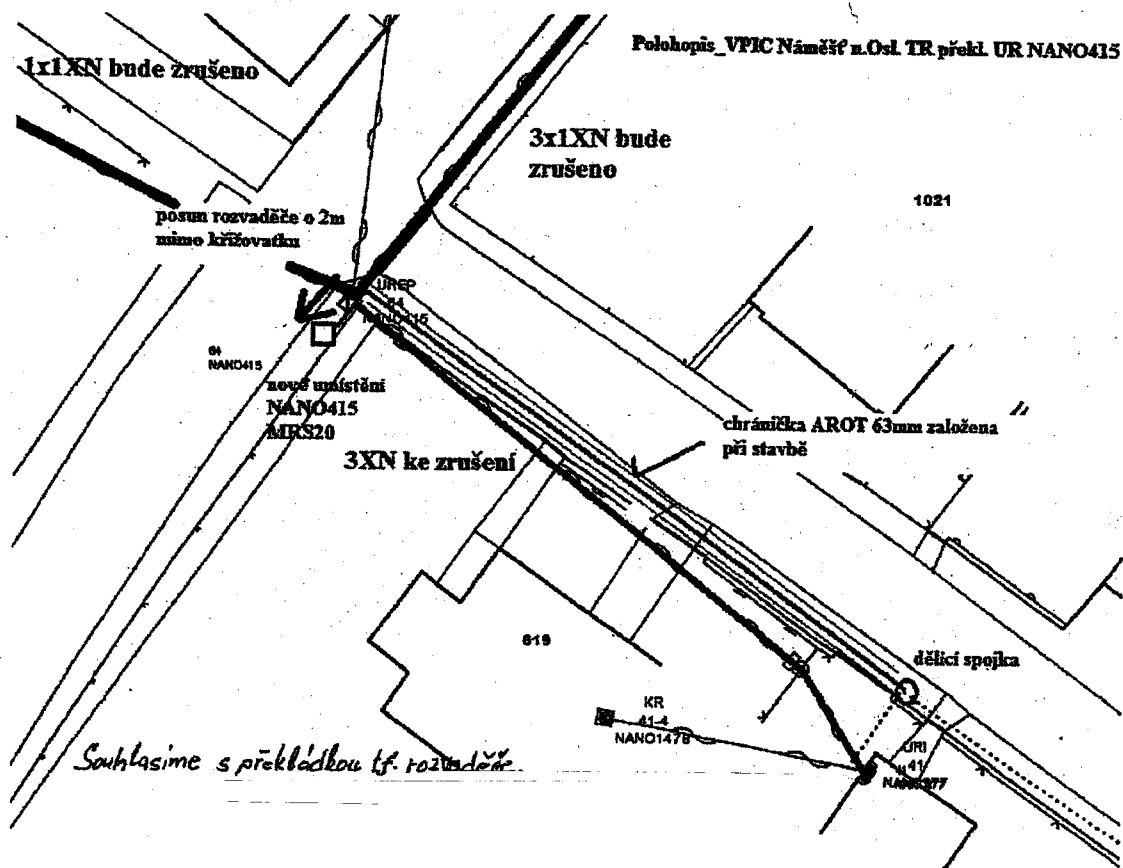

Účinnost od: 14. 11. 2016

2/2

Polohopis VPIC Náměstí n.Osl. TR přehl. UR NANO415

3x1XN bude
zrušeno

1024

chránička AROT 63mm založena
při stavbě

dělicí spojka

KR
41.4
NANO1478

NANO377

619

3XN ke zrušení

posun rozvaděče o 2m
mimo křižovatku

64
NANO415

nové umístění
NANO415
MPS20

1x1XN bude zrušeno

Souhlasíme s překladkou t.j. rozvaděče.

Projektová dokumentace byla ověřena
a je podkladem pro provedení stavby
podle územního souhlasu - rozhodnutí

č.j. 1628/16

ze dne 14.11.2016
