
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ č. VPI/MS/2018/00117
(17-1-951/18/Ost)**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená dle pověření Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále „**CETIN**“)

a

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ : CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

bankovní spojení: [REDAKCE]

Korespondenční adresa: LČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01

Frýdek-Místek

(dále „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti související s Překládkou a nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, jedná se o zpracování CTN a činnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.1 písmeno a) této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 8.3.2017 vydané společností CETIN pod čj. 555081/17, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Fryčovice, levý přítok Ondřejnice“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady za podmínek stanovených touto Smlouvou spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení Projektu,
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006), předat stavebníkovi geodetickou část zaměření skutečného provedení stavby v elektronické podobě ve formátu pdf a ve formátu dwg (dgn) Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

- 4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

před realizací Překládky:

- i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- ii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka“) s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve 4 měsíce po uzavření této smlouvy,

Stavebník se zavazuje po nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky, převést na CETIN práva a povinnosti z tohoto územního rozhodnutí týkající se Překládky (uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy a předat toto územní rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 4 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 4 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízení.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy **121.323,-Kč**. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do 3 měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, budou tyto náklady mezi smluvními stranami projednány. Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN na základě dodatku k této smlouvě uhradit, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít před provedením prací nebo vznikem nákladů souvisejících s překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění.

Mezi další náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

a) Fakturu č. 1 za Přípravu Překládky ve výši **21.353,-Kč** do 30 dnů ode dne jejího doručení,

b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů souvisejících s Překládkou do 30 dnů od jejího doručení stavebníkovi, k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně vynaložených nákladů, za něž je účtováno.

6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány ve **třech vyhotoveních** na adresu Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 281, 738 01 Frýdek-Místek .

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 CETIN je povinen v případě nesplnění závazku dle čl. 4 odst. 4.1 uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnutých nákladů dle článku 5. odstavce 5.2. za každý den prodlení.

7.3 CETIN je povinen v případě nesplnění závazku dle čl. 4 odst. 4.3) uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnutých nákladů dle článku 5. odstavce 5.3. za každý den prodlení.

7.4 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.5 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

7.6 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN

[REDACTED]

[REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

[REDACTED]

[REDACTED]

8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.

9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 nebo 9.2. tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k

[REDACTED]

zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení

lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
 - c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).
- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Tato Smlouva může být měněna pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Stavebník obdrží dvě (2) vyhotovení a CETIN jedno (1) vyhotovení.

12.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.12 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.13 CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smluvní strany se níže svým podpisem zavazují, že při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících budou postupovat čestně a transparentně.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Stavebník za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

12.15 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;


Příloha č. 3 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby
– vzor

CETIN:


Stavebník:

V Brně dne 29 - 11 - 2018


V Fryčově - Místky dne 2. 1. 2019



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Miroslav Kot
supervizor pro výstavbu sítě



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí správy toků-oblast povodí Odry



Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Technické řešení I.

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie AN – Přístupová síť
Podkategorie VPI - metalické kabelové přístupové sítě
Číslo SAP
Číslo interní 23443/17/0030
Schvalování akce 2 - kolové schvalování
Název

VPIC Fryčovice, levý přítok Ondřejnice

Budoucí uživatel NO-OS Ostrava

Zpracovatel Hudziec Rostislav

Předkladatel Vedoucí: Pavel Sedlář
Manažer: Pavel Sedlář

Schvaluje

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

- 1.1 Základní údaje
- 1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

- 2.1 Vstupní podklady
- 2.2 Navrhované řešení
- 2.3 Popis tras
- 2.4 Použitá technologie
- 2.5 Použité předpisy
- 2.6 Koordinace
- 2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

| | |
|----------------|--|
| Název: | VPIC Fryčovice, levý přítok Ondřejnice |
| Kategorie: | AN - Přístupová síť |
| Podkategorie: | VPI - Metal. kab přístupová síť |
| Typ investice: | |
| Důvod 1: | |
| Číslo interní: | |
| Prvek SPP: | |
| ABC: | |
| HOST: | |
| ATÚ: | |

Kapacitní údaje

| | | Průměrný náklad na: |
|---|----------|---------------------|
| 100800_Délka HDPE trubek pro OK | 0.000 km | kmp mk |
| 100200_Délka metalických kabelů | 0.000 km | kmk mk |
| 100700_Délka nadzemní tratě | 0,000 km | km vyk |
| 100100_Délka párů v metalických kabelech | 0,000 km | km kv |
| 100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů | 0.000 km | kmo kv |
| Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústí. | 0 pár | b.j. |
| 100400_Páry zakončené v účast. Rozvaděčích | 0 pár | |
| 100900_Počet bytových domů | 0 BD | |
| 101100_Počet bytových jednotek v bytových domech | 0 bj | |
| 100500_Počet rodinných domů | 0 RD | |
| 100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech | 0 bj | |

Požadavky:

Název polygonu:

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Rekapitulace nákladů:

| | |
|--|-----------------|
| Příprava: | 0 tis. Kč |
| Materiál - přímá dodávka Cetin: | 0 tis. Kč |
| Materiál zhotovitele-vykazovaný: | 0tis. Kč |
| Materiál zhotovitele-nevykazovaný: | 0 tis. Kč |
| Montáž: | 0 tis. Kč |
| Zemní práce: | 0tis. Kč |
| GOZ: | 0 tis. Kč |
| Poplatky: | 0 tis. Kč |
| Ostatní: | 0 tis. Kč |
| Provozní práce: | 0 tis. Kč |
| VBŘ příprava + realizace: | 0 tis. Kč |
| NPV: | |
| OPEX: | 0 tis. Kč |
| Celkové investiční náklady včetně přípravy: | 0 tis.Kč |
| Celkové realizační náklady: | 0 tis.Kč |

Územního rozhodnutí zajistí investor.

Termíny:

| | |
|-------------------------------|--|
| Platnost ÚR od: | VPIC Fryčovice, levý přítok Ondřejnice |
| Platnost ÚR do: | |
| Plánované zahájení přípravy: | |
| Plánované ukončení přípravy: | |
| Plánované zahájení realizace: | 08/ 2019 |
| Plánované ukončení realizace: | 1/ 2020 |
| Nabídka k přejímce (Plán): | |

0

1.2 Účel stavby:**SD stavby " VPIC Fryčovice, levý přítok Ondřejnice".**

Akce řeší přeložení telefonního rozvaděče FRYC54, zrušení sloupu a přeložení nadzemních telefonních kabelů, ochranu zemních kabelu pod opěrnou zdi ve Fryčovicích z důvodů úpravy levého toku Ondřejnice.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka Cetin, a.s., podklady TEDO a situace projektu poskytnutá investorem.

2.2 Navrhované řešení:

Rozvaděč UR – FRYC54 demontovat spolu se sloupem Jp 6,5 a uzemněním a také nadzemní kabely FLES 3XN 0,6 a 5XN 0,6 v délce 8+12, které vedou na ČEZ sloup za potokem. Montáž nové SIS v místě bývalého sloupového rozvaděče a přívodní kabel PPFLE 15XN 0,4 a také odcházející kabely zapojit do SIS, kterou uzemnit. Ze SIS provést výkop v délce 10m ke stávajícímu sloupu obce Fryčovice, uložit HGR 110mm v délce 5m a PE 110mm v délce 5m a protáhnout PPFLE 10XN 0,6 který na sloupu vtáhnout do PVC trubky, kterou připevnit Bandimex páskou na sloup a ukončit v novém HSU a provést montáž objímky. Z HSU natáhnout FLES 10XN 0,6 v délce 2+18m do HSU na ČEZ sloupu za potokem. Trasu kabelu PPFLE 25XN 0,4 v délce 35m odkopat v souběhu s potokem a provést zajištění kabelu proti sesunutí do koryta a provedení výkopu pro definitivní uložení kabelu po realizaci opěrné zdi. V místě kolize s novou betonovou zdí kabely vložit do SYSPRO 160/110mm v délce 2m. Kabely proměřit, trasu geodetický zaměřit a zhotovit geometrický plán a zhotovit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž. Sítě na parc.č. 2200, 2203 a 2240/1. Územní rozhodnutí – zajistí investor.

ČEZ

2.3 Popis tras

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Rozvaděče: Budou postaveny

Dále bude provedeno závěrečné měření dle předpisu TPP2001- 4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi a kontinuity stínění proti provoznímu páru.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III

TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely

TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření K1).

Dokumentace skutečného provedení bude zpracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

2.7 Ostatní:

Kontakty:

Projektový koordinátor Cetin: Ing. Tomáš Marek – 602 696 938, ochrana sítě – p. K. Dombrovský 602786457,

Investor stavby: Investor: Lesy České republiky, s. p., IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451, sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540, statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel, zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisového řádu: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků –

oblast povodí Odry, ve věcech technických jedná: [REDACTED]

Údaje o žadateli: Regioprojekt Brno, s.r.o., Adresa: Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno
IČ: 00220078, DIČ: CZ00220078, [REDACTED]

– Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce – vloženy: nejsou

| Interní číslo | SAP | Název projektu: | Stav: |
|---------------|-----|-----------------|-------|
|---------------|-----|-----------------|-------|

Navazující akce - vložené:

| Interní číslo | SAP | Název projektu: | Stav: |
|---------------|-----|-----------------|-------|
|---------------|-----|-----------------|-------|

4. Vyjádření a záznamy – viz příloha

5. Přílohy

| Název přílohy | Stupeň |
|----------------------------------|--------|
| K1 – Katastrální mapa.pdf | SD |
| P1 – Polohopisný plán.dgn | SD |
| S1,S2 – Kabelové schema.dgn | SD |
| Informace o parcele.pdf | SD |
| Kalkulace nákladů - PPD | SD |
| Situace stavby | SD |
| Podklady dokumentace Cetin, a.s. | SD |

Informace o pozemku



| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Parcelní číslo: | <u>2200</u> |
| Obec: | <u>Fryčovice [598135]</u> |
| Katastrální území: | <u>Fryčovice [634808]</u> |
| Číslo LV: | <u>1</u> |
| Výměra [m²]: | 1123 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Způsob využití: | ostatní komunikace |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Obec Fryčovice, č. p. 83, 73945 Fryčovice

Informace o pozemku



| | |
|--------------------|---|
| Parcelní číslo: | <u>2203</u> |
| Obec: | <u>Fryčovice [598135]</u> |
| Katastrální území: | <u>Fryčovice [634808]</u> |
| Číslo LV: | <u>1</u> |
| Výměra [m²]: | 796 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Způsob využití: | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |
| Druh pozemku: | vodní plocha |

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Obec Fryčovice, č. p. 83, 73945 Fryčovice

Informace o pozemku



| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Parcelní číslo: | <u>2240/1</u> |
| Obec: | <u>Fryčovice [598135]</u> |
| Katastrální území: | <u>Fryčovice [634808]</u> |
| Číslo LV: | <u>1</u> |
| Výměra [m²]: | 818 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Způsob využití: | ostatní komunikace |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

Sousední parcely


Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Obec Fryčovice, č. p. 83, 73945 Fryčovice




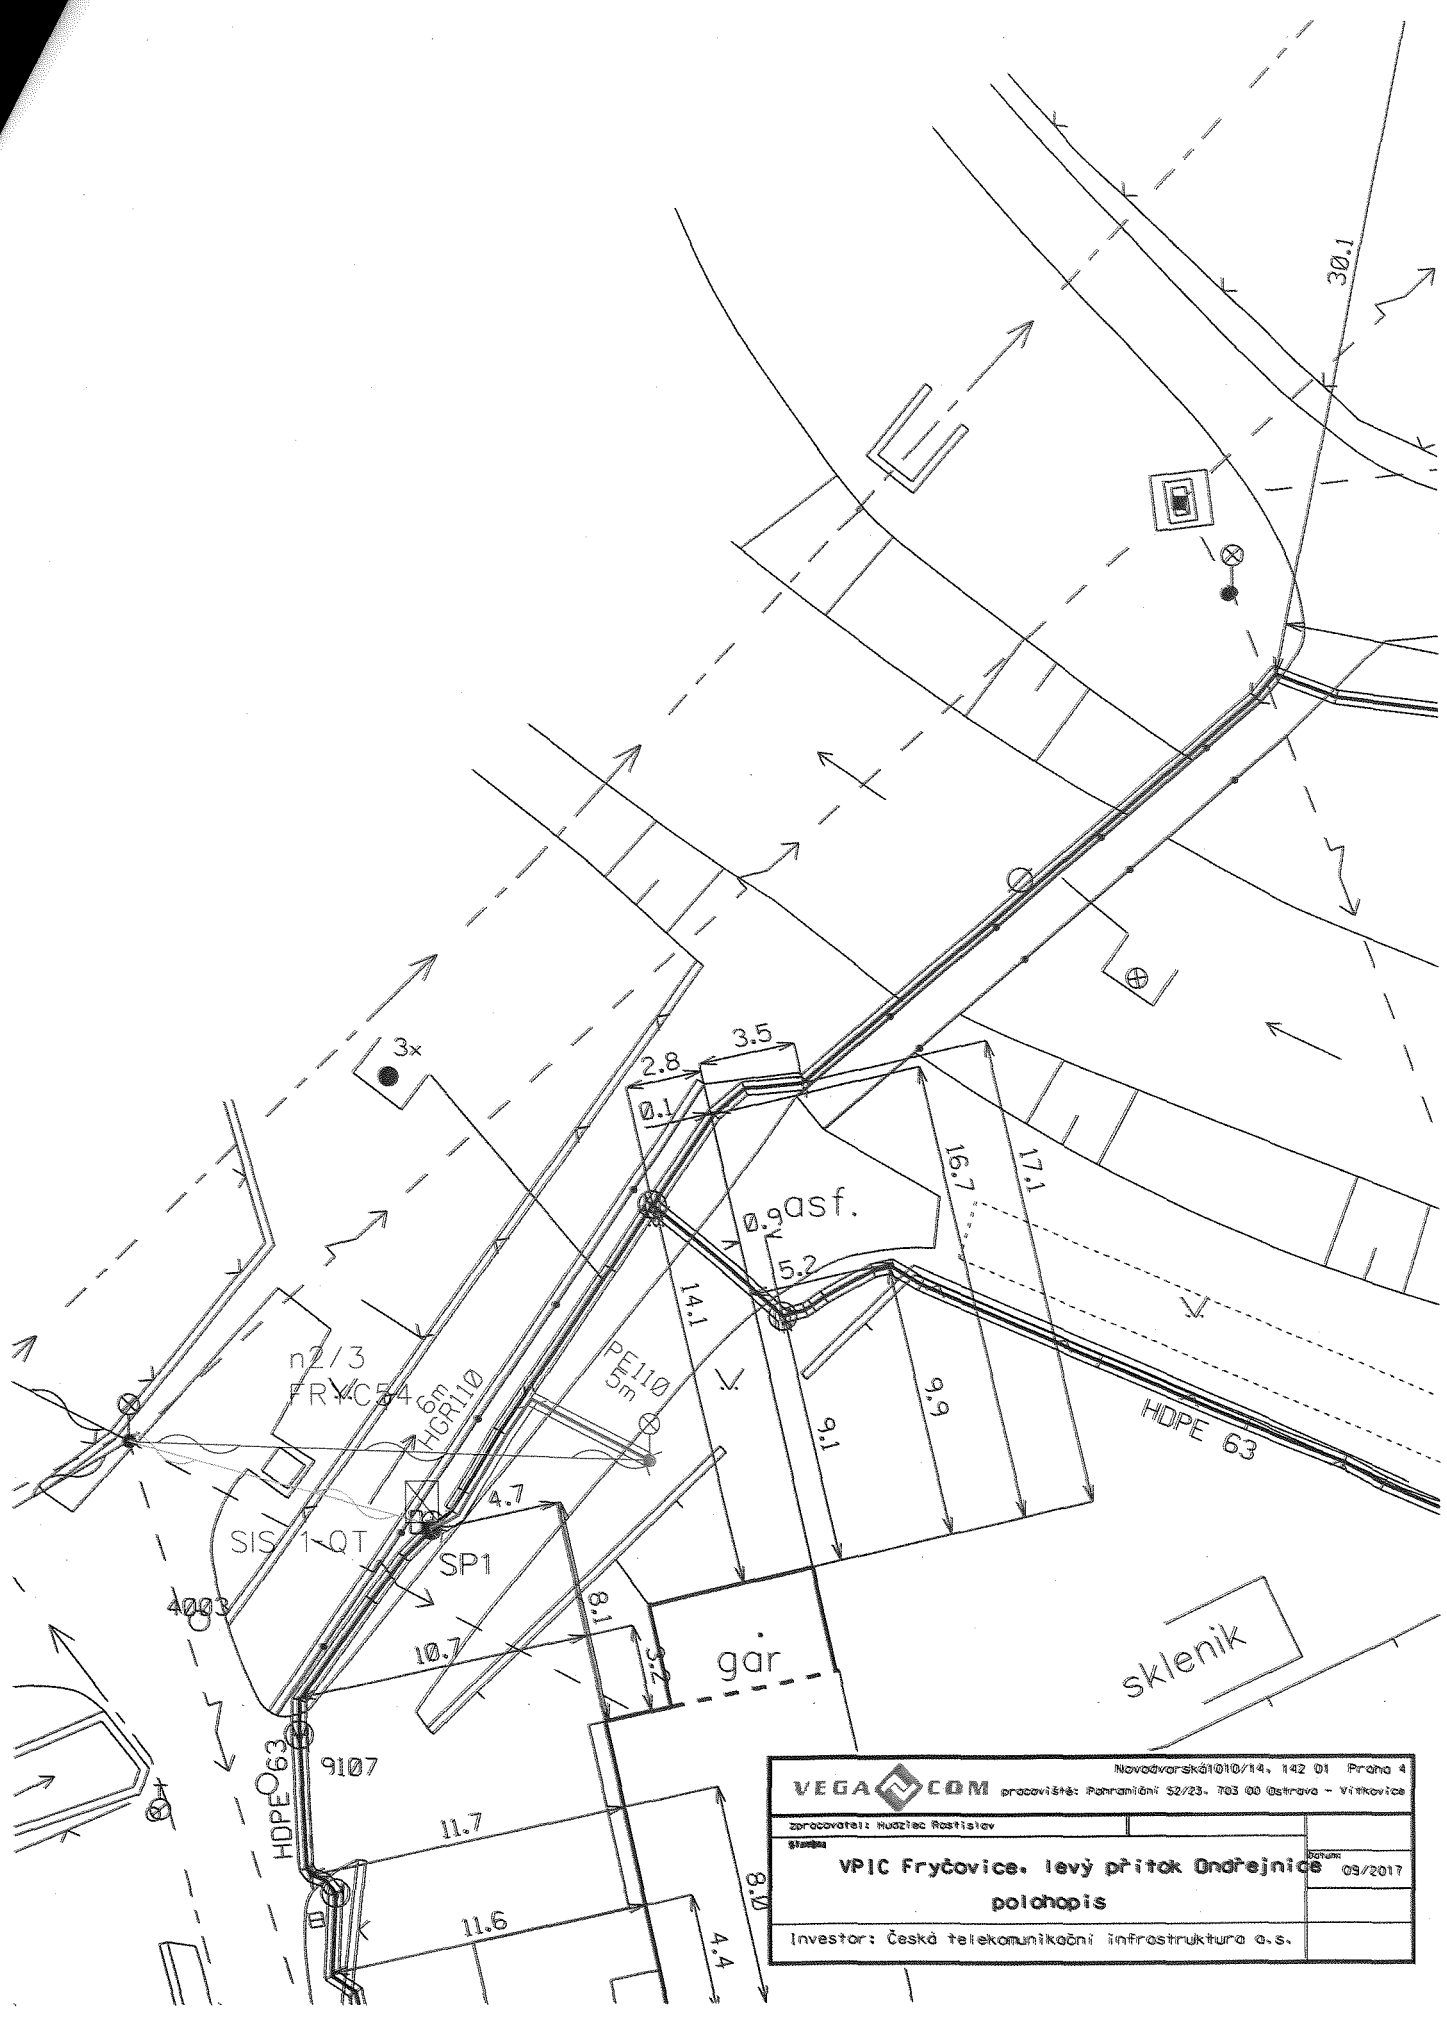


| | | | |
|---|---|--|----------------|
| VEGA COM | | Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 | |
| | | pracoviště: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava - Vítkovice | |
| zpracovatel: Hudzlec Rostislav | | | |
| stavba | VPIC Fryčovice, levý přítok Ondřejnice | | datum: 09/2017 |
| polohopis | | | |
| investor: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. | | | |

evid.č.:


zpracoval:

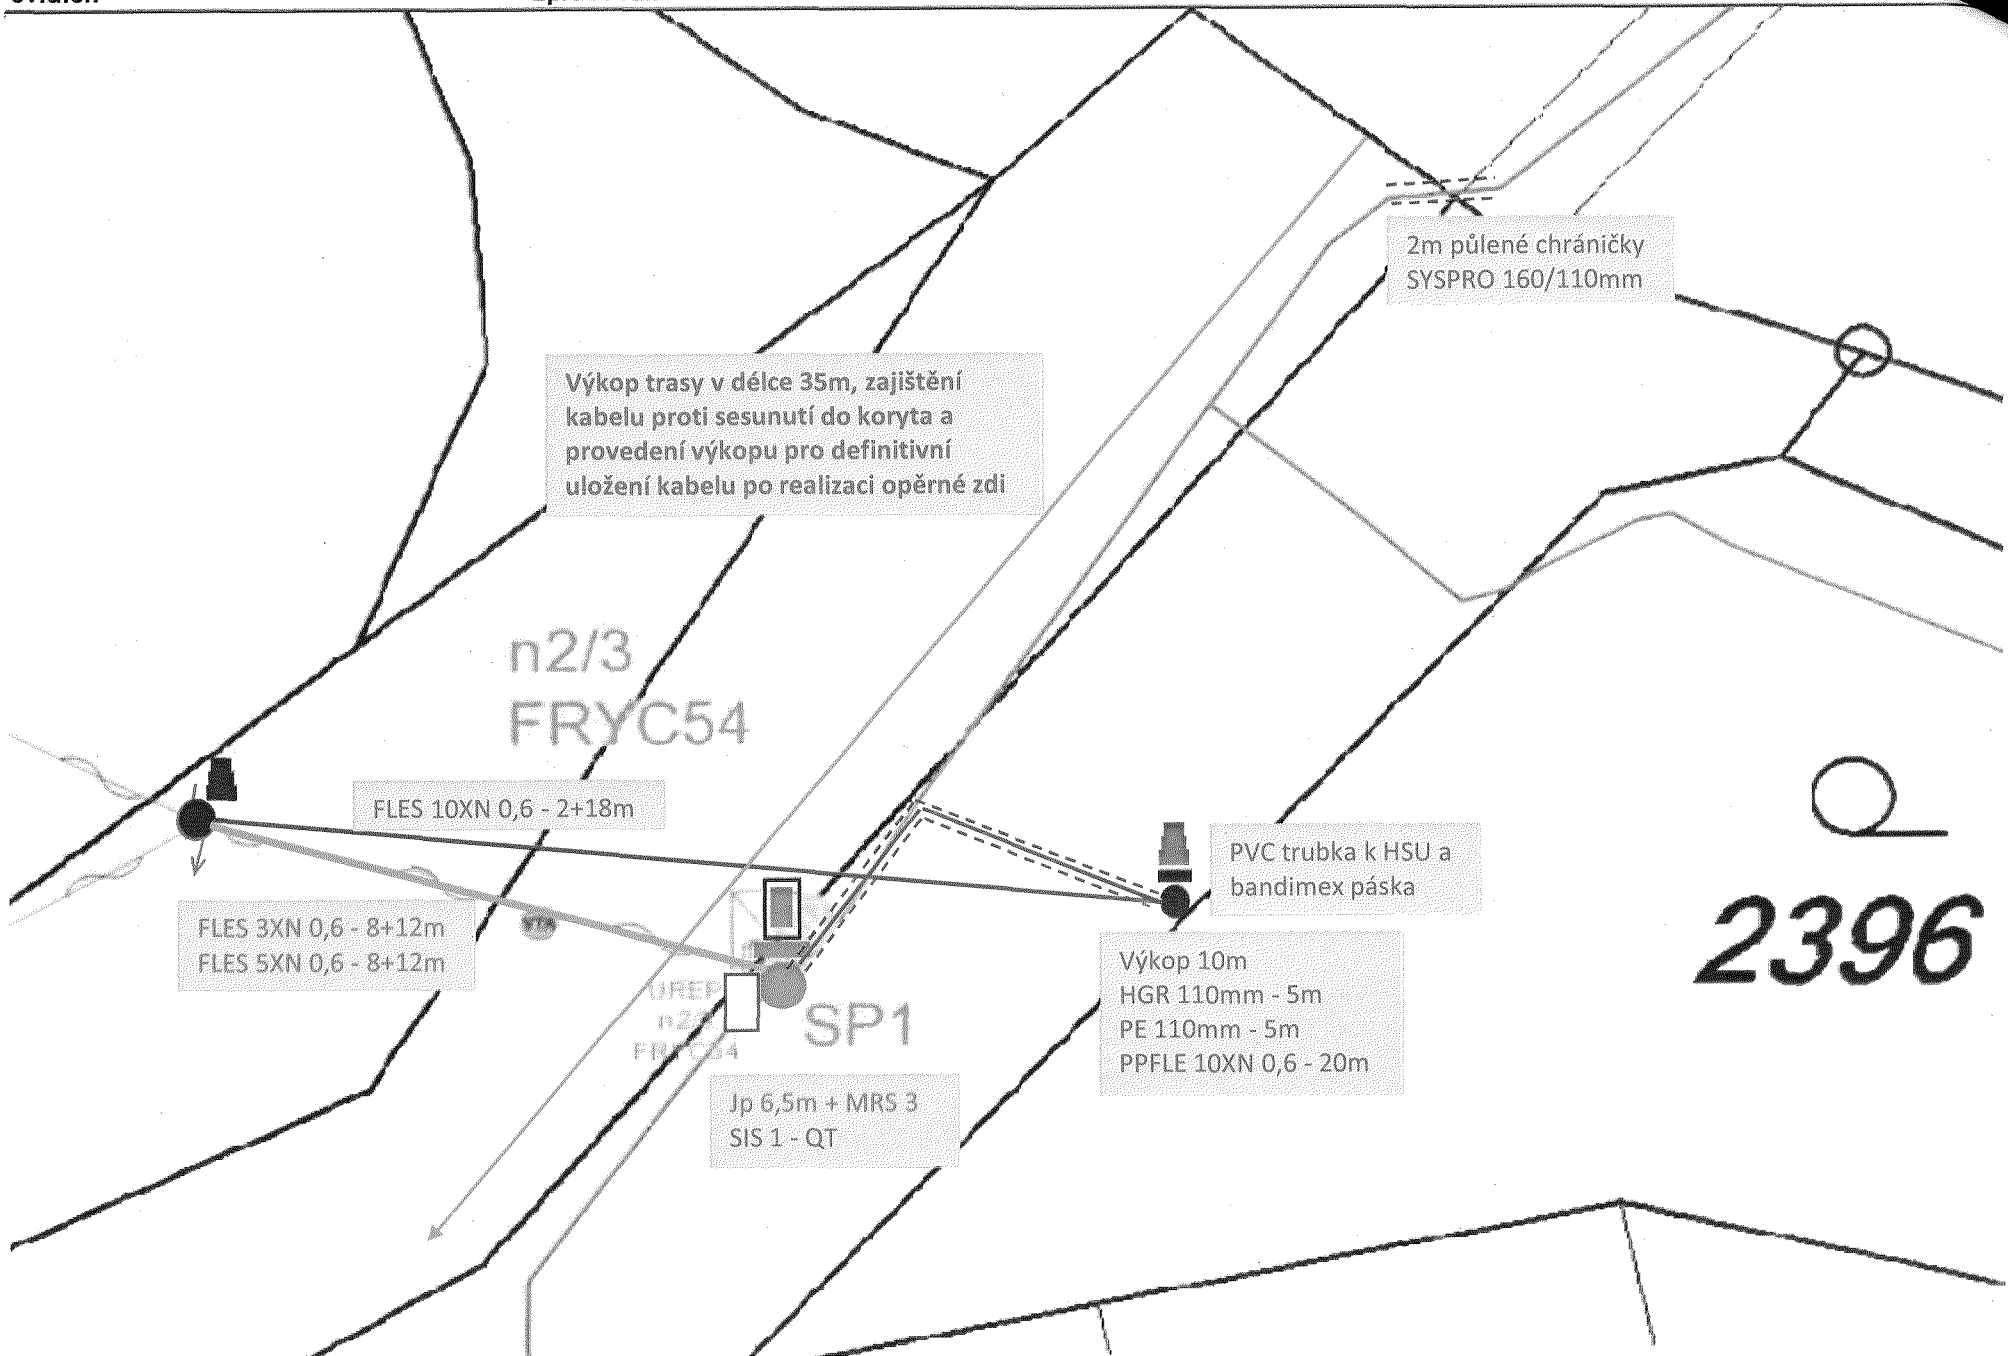

2396

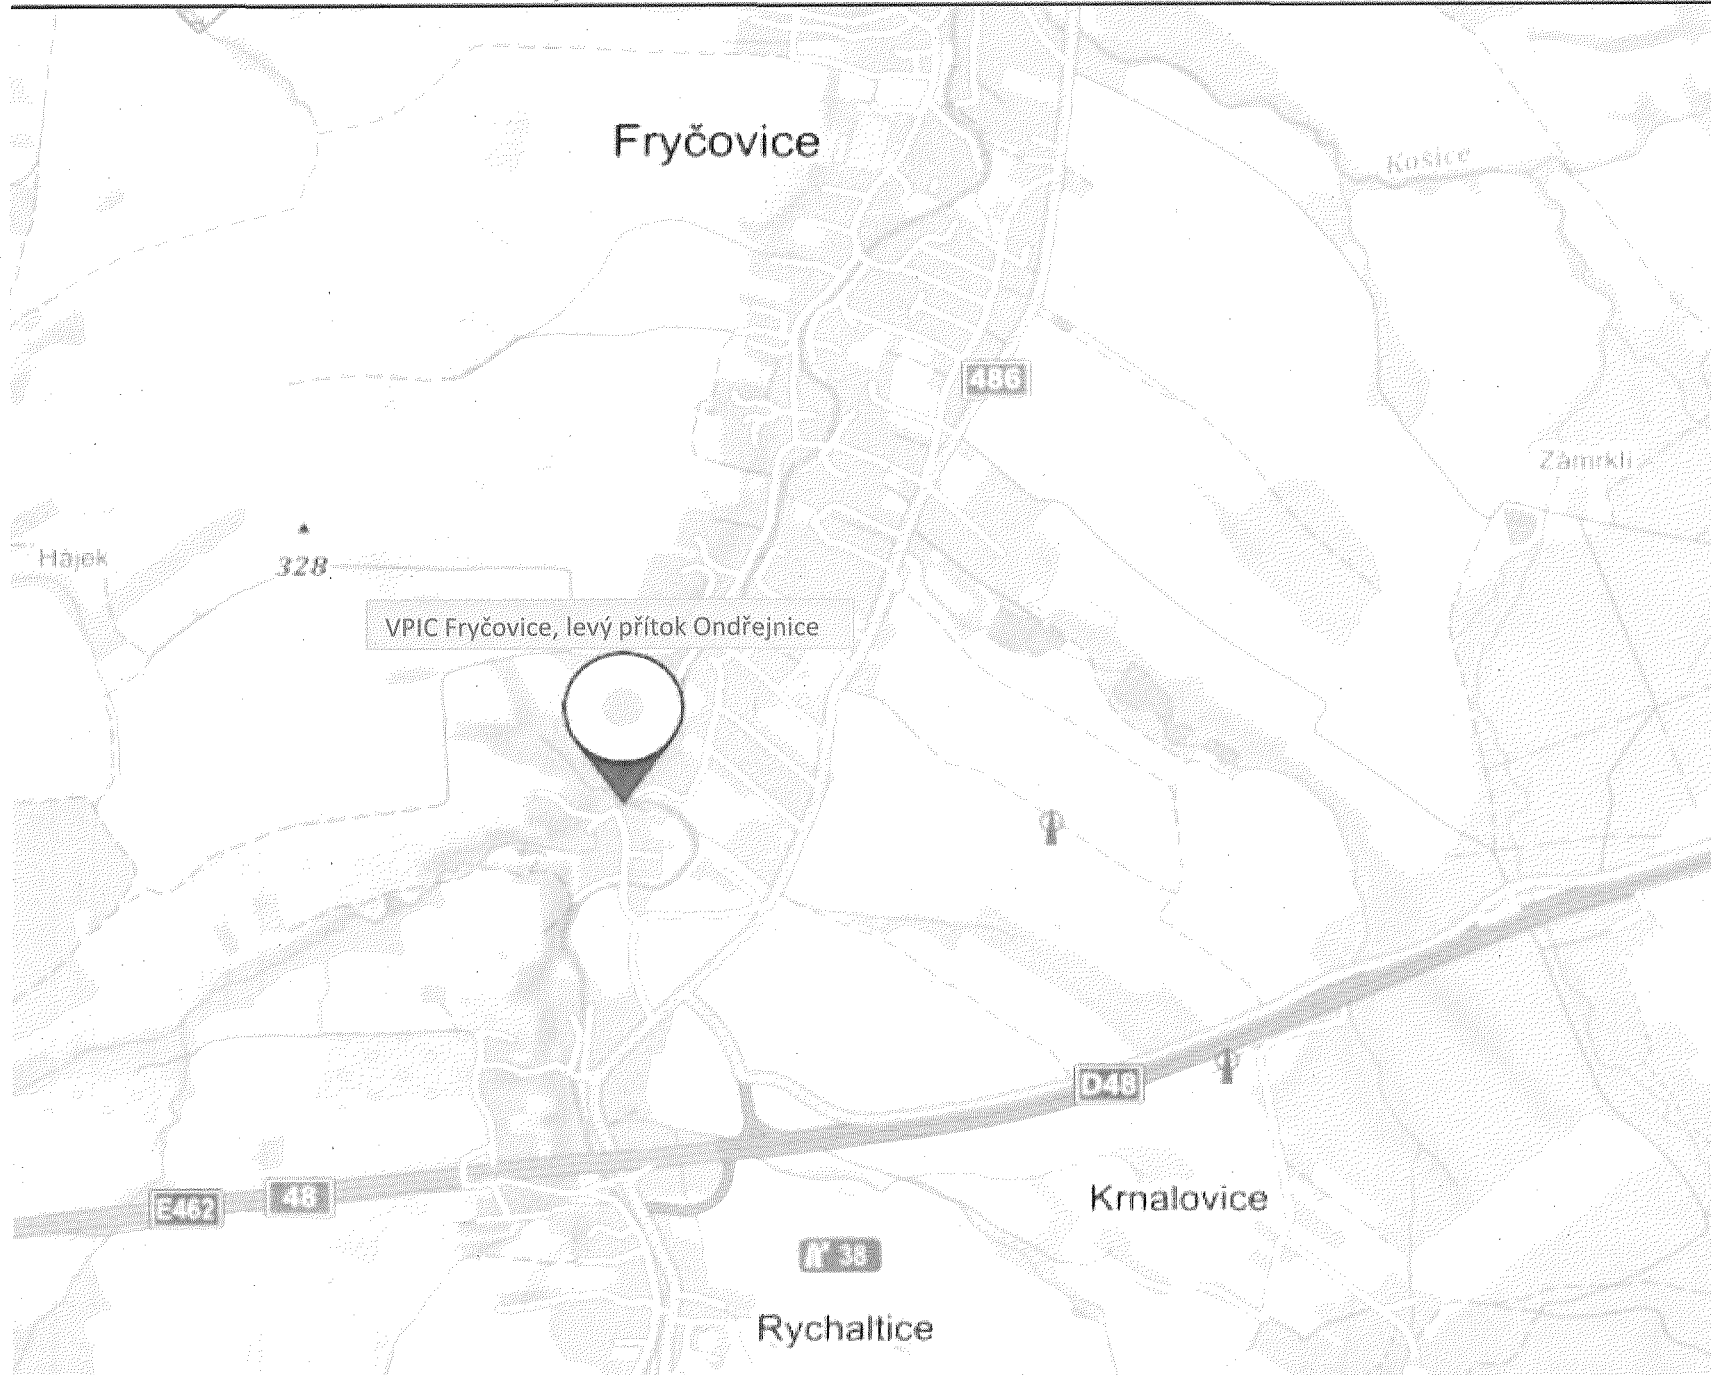

n2/3
 FRYC54
 xFRYC13/1.3.1/41-70
 1xMRS 3;
 1xsvork.20p.;7xsv.r.LSA 10x1;
 ; ; ; ;UR 02/3 u č.p.153
 Fryčovice
 Fryčovice

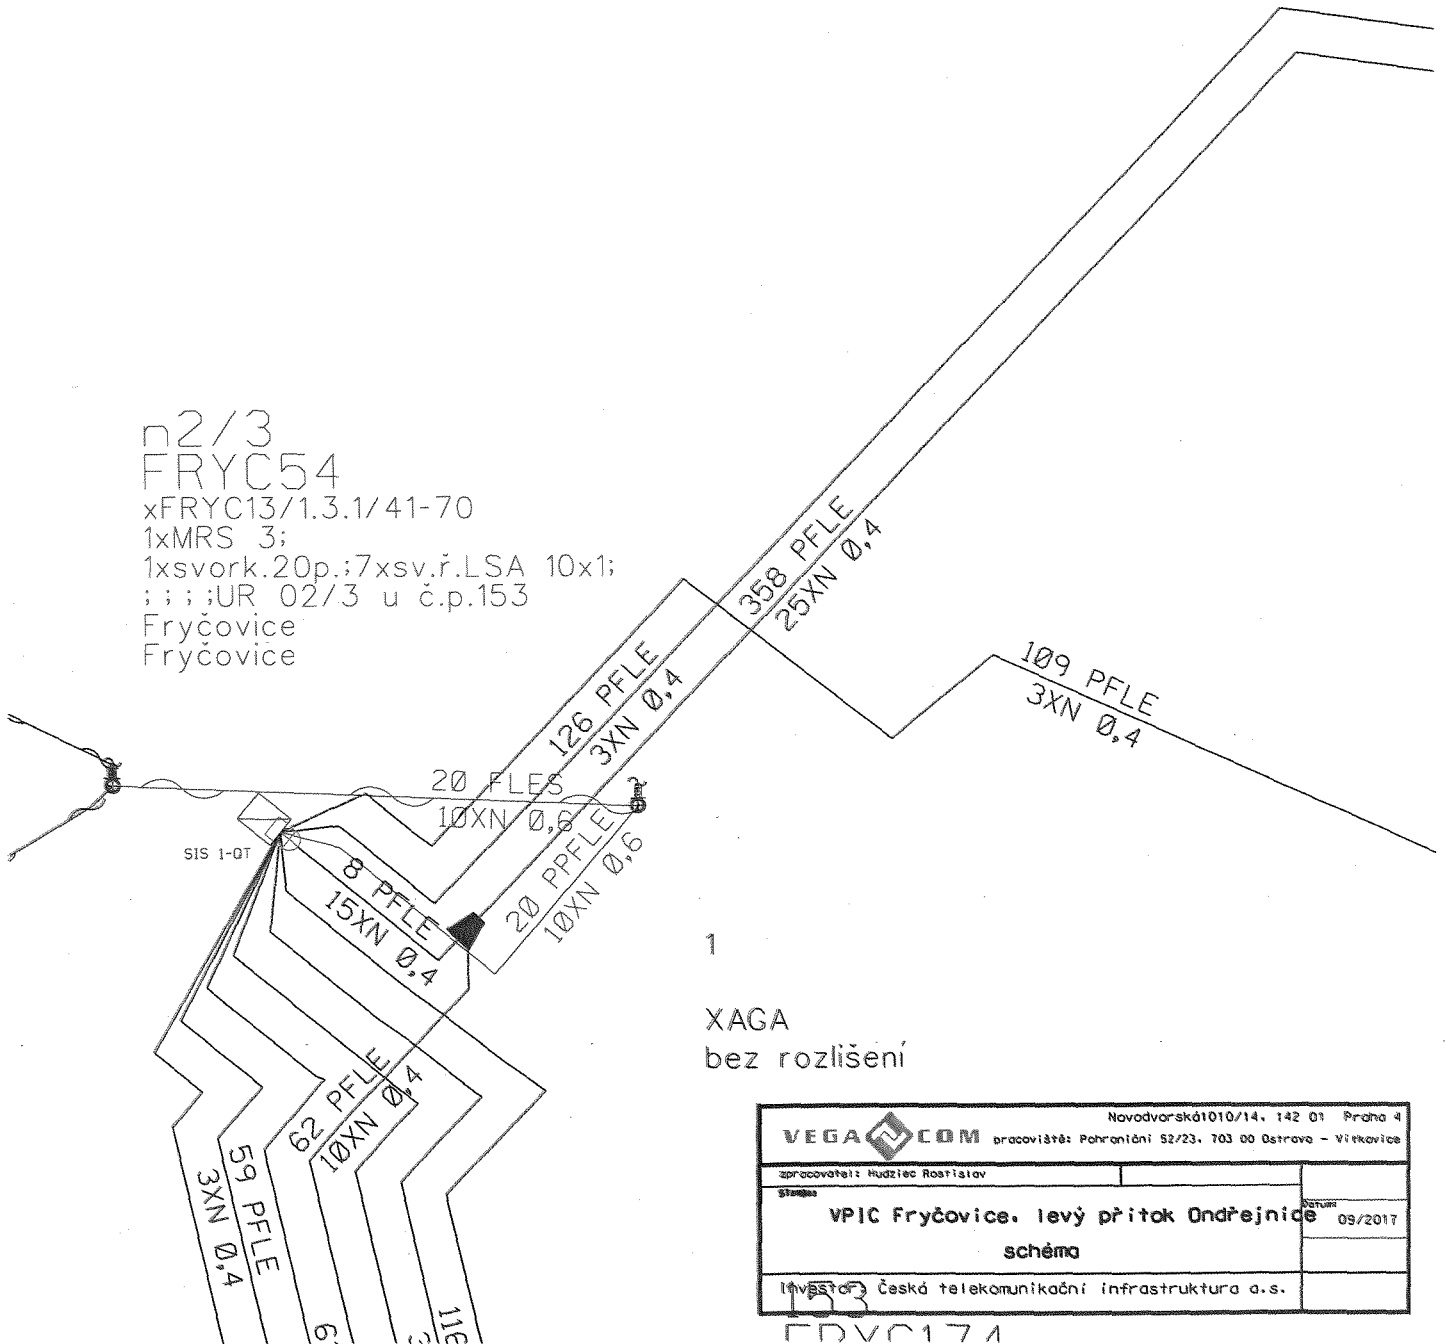


1
 XAGA
 bez rozlišení

| | |
|--|----------------|
| VEGA COM Novodvorská1010/14, 142 01 Praha 4 pracoviště: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava - Vítkovice | |
| zpracovatel: Hudzic Rostislav Stupeň: | Datum: 09/2017 |
| VPIC Fryčovice. levý přítok Ondřejnice schéma | |
| Investor: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. | |

FRYC171

VPIC Fryčovice, levý přítok Ondřejnice

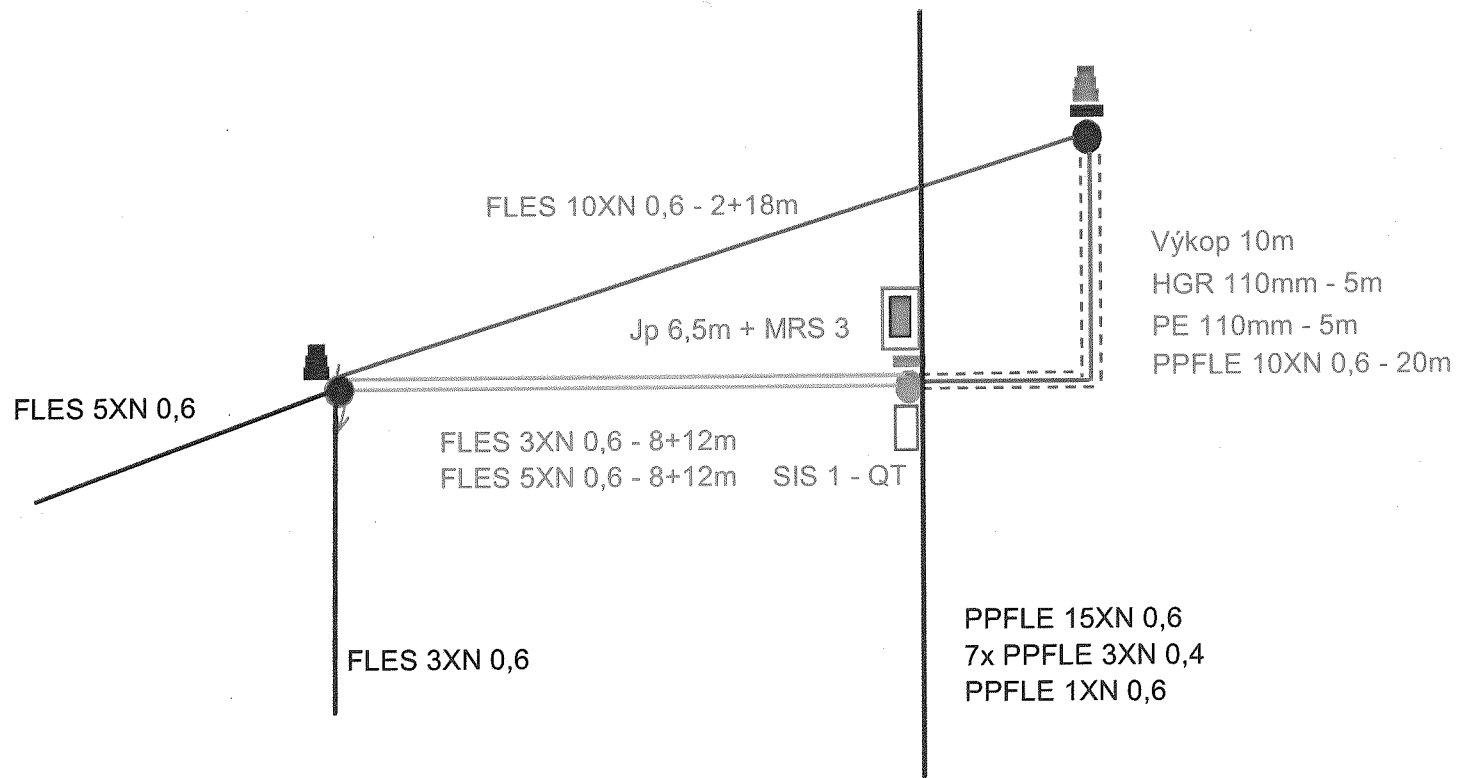

Příloha č. 2_Specifikace nákladů_VPIC Fryčovice, levý přítok Ondřejnice

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2018.06

Položková 2018.06

Název stavby: **VPIC Fryčovice, levý přítok Ondřejnice**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: p. Hudziec

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| PŘÍPRAVA | 19 317,78 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | 34 644,84 Kč |
| MONTÁŽ | 36 859,31 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA | 0,00 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | 8 417,93 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | 2 036,60 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | 4 165,88 Kč |
| PROVOZNÍ PRÁCE | 1 426,77 Kč |
| MATERIÁL DOD. CETIN | 0,00 Kč |
| MATERIÁL VYŘAZENÝ | 0,00 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | 14 453,92 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | 0,00 Kč |
| POPLATKY | 0,00 Kč |

Celkové náklady: 121 323,03 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 95 802,77 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 25 520,26 Kč

Seznam položek

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|-------------------|------------------|--|----------|--------------|
| PŘÍPRAVA | | | | |
| 958210 | | Návrh cenový a technický bez projednání | 1.00 ks | 5 677,78 Kč |
| 953634 | | Projekt tlkm liniové metalické sítě | 1.00 ks | 13 640,00 Kč |
| Projekt v zóně II | | | | |
| ZEMNÍ PRÁCE | | | | |
| 954970 S | | Pokládka PE nebo vrapované chráničky | 10.00 m | 181,50 Kč |
| 955577 S | | Rýha v chodníku 35/50-70 | 10.00 m | 5 286,60 Kč |
| 952345 S | | Rýha v trávě 35/70-100 | 67.00 m | 22 692,90 Kč |
| 955570 S | | Rýha ve vozovce lity asfalt 50/100 | 4.00 m | 5 515,84 Kč |
| 955054 S | | Vytyčení trasy podél silnice,železnice | 80.00 m | 968,00 Kč |
| MONTÁŽ | | | | |
| 955091 S | | Demontáž rozvaděče sloupového | 1.00 ks | 907,22 Kč |
| 955015 S | | Demontáž samonos. kabelů do 5 XN | 40.00 m | 1 066,80 Kč |
| 955029 S | | Demontáž úložných kabelů do15 XN | 27.00 m | 490,05 Kč |
| 955824 S | | Instal.metal. kab. do stávajících trubek | 10.00 m | 483,90 Kč |
| 952649 S | | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka | 11.00 ks | 1 729,75 Kč |

| | | | |
|---|---|------------|-------------|
| 952650 S | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka | 88.00 ks | 3 193,52 Kč |
| 954999 S | Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování | 20.00 ks | 484,00 Kč |
| 955299 S | Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek | 1.00 ks | 1 042,74 Kč |
| 955268 S | Montáž podzemní tratě síťové metalické | 7802.08 JV | 7 802,08 Kč |
| Zajištění kabelu proti sesunutí do koryta | | | |
| Rozpočtová rez. 3% z nákladů stavby | | | |
| 954982 S | Montáž samonosných kabelů nad 5 XN | 25.00 m | 1 058,50 Kč |
| 955285 S | Montáž spojky hrncové | 1.00 ks | 477,80 Kč |
| 954990 S | Montáž úložných kabelů do 15 XN | 10.00 m | 206,20 Kč |
| 955303 S | Montáž uzemnění venkovního rozvaděče | 1.00 ks | 1 103,22 Kč |
| 955298 S | Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči | 75.00 ks | 1 815,00 Kč |
| 955259 S | Ukončení kabelu v rozvaděči | 13.00 ks | 4 560,27 Kč |
| 958469 S | Uvedení stavby do provozu | 3720.00 JV | 3 720,00 Kč |
| Kolaudační rozhodnutí | | | |
| 954989 S | Vystrojení na stávajících podpěrách | 1.00 ks | 471,75 Kč |
| 958555 S | Zpracování dok. skut. provedení do 50 m | 1.00 ks | 1 110,87 Kč |
| 955024 S | Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru | 1.00 ks | 1 508,57 Kč |
| 955081 S | Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. | 75.00 ks | 1 268,25 Kč |
| 955083 S | Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči | 11.00 ks | 1 596,76 Kč |
| 955097 S | Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče | 1.00 ks | 762,06 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | | | |
| 955198 S | Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) | 1.00 ks | 2 987,01 Kč |
| 956284 S | Zaměření trasy pro stavbu do 100m | 1.00 ks | 5 430,92 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | | | |
| 955313 | Uzavření sml. o SB o VBŘ | 1.00 ks | 2 036,60 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | | | |
| 954830 | Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene | 1.00 ks | 500,00 Kč |
| náhrada za VBŘ - odhadovaná | | | |
| Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí. | | | |
| 955315 | Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ | 1.00 ks | 2 443,92 Kč |
| 958085 | Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z K | 1.00 ks | 1 221,96 Kč |
| PROVOZNÍ PRÁCE | | | |
| 955204 S | Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár | 1.00 ks | 166,39 Kč |
| 955205 S | Zrušení převodu v rozvaděči - další pár | 15.00 ks | 450,00 Kč |
| 955208 S | Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár | 1.00 ks | 180,83 Kč |
| 955209 S | Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár | 15.00 ks | 629,55 Kč |

Limitka materiálu

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|-----------------------------------|------------------|--|-----------|--------------|
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | | | | |
| 305833 S | | Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m | 2.00 kg | 95,52 Kč |
| 303813 S | | Fólie výstražná 330mm PE oranžová | 46.00 m | 195,96 Kč |
| 303777 S | | Fólie výstražná 80mm PE červenobílá | 95.00 m | 209,00 Kč |
| 300118 S | | Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6 | 20.00 m | 900,60 Kč |
| 300177 S | | Kabel samonosný TCEKFLES 10x4x0,6 | 25.00 m | 1 660,00 Kč |
| 312240 S | | Konektor UY2 přímý - plněný | 100.00 ks | 139,00 Kč |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------|-------------|
| 306701 S | Napínač šroubový oko-hák M 16 | 1.00 ks | 90,28 Kč |
| 311310 S | Objímka kotevní D140 mm FeZn s hákem | 1.00 ks | 117,62 Kč |
| 318799 S | Páska ner.Bandimex B806/50-19x0,75mm | 5.00 m | 227,90 Kč |
| 306419 S | Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek | 1.00 ks | 6 617,68 Kč |
| 314750 S | Spojka kabelová HSU univerzální hrncová | 1.00 ks | 927,63 Kč |
| 318800 S | Spona Bandimex S256-19,0mm | 4.00 ks | 37,56 Kč |
| 319184 S | Spona trubkySYSPRO | 12.00 ks | 235,56 Kč |
| 307033 S | Svorka lanová D 9-12 mm | 6.00 ks | 93,84 Kč |
| 309992 S | Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm | 1.00 ks | 47,24 Kč |
| 319209 S | Trubka dělená SYSPRO 160/110 | 2.00 m | 889,70 Kč |
| 302655 S | Trubka PE 110/3,5/6000mm | 1.00 ks | 494,56 Kč |
| 302619 S | Trubka PVC 32/1,8/4000mm hladká | 2.00 ks | 314,02 Kč |
| 302423 S | Trubka vrapovaná 110/94 s lankem | 5.00 m | 196,95 Kč |
| 302885 S | Vodič propoj.autokonektor C4 10114-C4L50 | 10.00 ks | 963,30 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | | | |
| 401646 S | Matice šestihřanná M 16,0 ČSN 021601 | 2.00 ks | 0,00 Kč |
| 304267 S | Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá | 5.00 ks | 0,00 Kč |
| 404063 S | Podložka D 17 mm ČSN 021702 | 2.00 ks | 0,00 Kč |
| 408348 S | Šroub s šestihř.hl. M16x45 ČSN021301 | 2.00 ks | 0,00 Kč |
| 314473 S | Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY) | 3.00 m | 0,00 Kč |
| 402871 S | Vrut s šestihř.hl. 10x80 mm ČSN021810 | 2.00 ks | 0,00 Kč |

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Z ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená Ludmilou Uhrovou, specialistou pro výstavbu sítě dle pověření

na straně jedné

(dále jen „Nabyvatel“)

a

IČ: DIČ:

se sídlem:

zastoupena

na straně druhé

(dále jen „Převodce“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby („dále jen „tato dohoda“).

čl. I.

Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „.....“, kteréžto bylo vydáno dne, (kým) pod čj. a nabylo právní moci dne (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění (dále jen „Stavba“/ event. „Stavební objekt“).

Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby a to právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“), tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

čl. II.

Převodce ke dni podpisu této dohody převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v Rozhodnutí

o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.

čl. III.

Převodce a Nabyvatel prohlašují, že si celý text této dohody pozorně přečetli, plně mu rozumějí a bezvýhradně s ním souhlasí. Připojením svých vlastnoručních podpisů stvrzují, že text této dohody věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli a že tato dohoda není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek pro kteréhokoliv z nich.

čl. IV.

- (1) Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Převodce a po jednom Nabyvatel.
- (2) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Převodcem a Nabyvatelem.

V Brně dne

V dne

za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ludmila Uhrová
Specialista pro výstavbu sítě
