

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2018/00122
Číslo smlouvy stavebníka:

SRM: 8020011441
Registr smluv: ANO



S009P00TW9SA

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ**
č. VPI/MJ/2018/00122

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

město Blansko

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623
zastoupená na základě pověření Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě
bankovní spojení: PPF banka, číslo účtu: [REDACTED]

(dále „**CETIN**“)

a

město Blansko

se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

IČO : 002 79 943

DIČ : CZ00279943

zastoupené: Ing. Bc. Jiřím Crhou, starostou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace a specifikace nákladů Překládky, jež je Přílohou číslo 1 této Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne [15.10.2017] vydané společností

CETIN pod čj. [741998/17-POS], jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst.17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením **VPIC Blansko komunikace u Salmova mlýna**.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN - a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.
(vše dále „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi
 - a) před realizací Překládky:
 - i) zajistit vyhotovení CTN

- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,
- b) po realizaci Překládky:
 - i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006),
 - ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit geodetické vytýčení hranic pozemků související s Překládkou,
- ii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka“).

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN následující práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby „**rozšíření komunikací, most, parkoviště, manipulační plocha, zpevněná plocha sjezdu, veřejné osvětlení a přeložka sdělovacího vedení** v Blansku v lokalitě u Salmova mlýna“, č.j. SÚ ÚR 161/2018-34520/2018/SI ze dne 24.09.2018: (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a (ii) dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 3 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebnosti do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této Smlouvy činí **114.552,- Kč**. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (bližší specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,

- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:
 - a) Fakturu č. 1 za CTN ve výši **5.678,- Kč** do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
 - b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.
- 6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode dne ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail: [redacted], tel.: [redacted]

ve věcech technických: Petr Bílek
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [redacted] tel.: [redacted]

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: : Ing. Bc. Jiří Crha
funkce: starosta
tel.: [redacted]

ve věcech technických: Ing. Eva Laštůvková
e-mail: [redacted]
Ing. Marek Štefan
e-mail: [redacted]

8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

9.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

9.2 S ohledem na ustanovení odst. 9.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.

- 10.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 10.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 10.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.
- 10.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/ nebo
 - c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).

11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

11.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

11.12 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

11.13 CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a

mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikttní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

11.14 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 – Specifikace nákladů Překládky

Příloha č. 3 Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: SÚ ÚR 161/2018-34520/2018/SI

Doložka

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 109 ze 14. schůze Rady města Blansko konané dne 28.06.2011.

CETIN:

Stavebník:

29 -11- 2018

V Brně dne _____

V BLANSKU dne 24.01.2019

Česká telekomunikace a.s.
Ing. Miroslav Kotlík
supervizor pro výstavbu sítě

město Blansko
Ing. Bc. Jiří Crha
starosta

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Startovací dokumentace

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie

Podkategorie

Číslo SAP

Číslo interní 20725/18/0047

Název

VPIC Blansko komunikace u Salmova mlýna

Budoucí uživatel

GMO-BOJI Bílek Petr
Manažer/KPO

Zpracoval

Vedoucí
Manažer

Michal Novotný
Petr Švestka
Petr Švestka

Schváleno

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

- 1.1 Základní údaje
- 1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

- 2.1 Vstupní podklady
- 2.2 Navrhované řešení
- 2.3 Popis tras
- 2.4 Použitá technologie
- 2.5 Použité předpisy
- 2.6 Koordinace
- 2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC Blansko komunikace u Salmova mlýna
Kategorie:	
Podkategorie:	
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem CAPEX
Důvod 1:	Bez určení
Číslo interní:	20725/18/0047
Prvek SPP:	
ABC:	B
HOST:	
ATÚ:	BLAN:RE:1 - Blansko(Svitavská)-RSU

Kapacitní údaje

100800_Délka HDPE trubek pro OK	0 km	Průměrný náklad na:	
100200_Délka metalických kabelů	0.088 km	kmp mk	36.364 tis. Kč
100700_Délka nadzemní tratě	0 km	kmk mk	1090.909 tis. Kč
100100_Délka párů v metalických kabelech	2.64 km	km vyk	2400 tis. Kč
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0.040 km	km kv	0 tis. Kč
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár	kmo kv	0 tis. Kč
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.	0 tis. Kč
100900_Počet bytových domů	0 BD		
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj		
100500_Počet rodinných domů	0 RD		
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj		
nástavba skříně SIS 2, 3 pro rDSLAM Micos	0 ks		
Skřín SIS 900-A s nást. rDSLAM HD 180	0 ks		
Skřín SIS 900 B HD180	0 ks		
Skřín SIS 900 C HD180	0 ks		
Skřín SIS 900 D HD180	0 ks		
Sloupek nn měření pro DSLAM 350 vč. zákl.	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM pod omítku	0 ks		
Skřín mDSLAM 450 HD180 s ventilátorem	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM	0 ks		
Skřín SIS 1350 D HD 180	0 ks		
Délka HDPE trubek pro OK	0 km		

Termíny:

Platnost ÚR od:	
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	24.08.2018
Plánované ukončení přípravy:	15.10.2018
Plánované zahájení realizace:	15.04.2019
Plánované ukončení realizace:	15.07.2019
Nabídka k přejímce (Plán):	15.06.2019

1.2 Účel stavby:

Navržené technické řešení je v souladu s TM000072.
--

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 20725/18/0047 na zpracování CTN: VPIC Blansko komunikace u Salmova mlýna

2.2 Navrhované řešení:

Z důvodu výstavby komunikace a chodníku u Salmova mlýna v Blansku, dojde k přeložení stávající SEK spol. CETIN. Jedná se o zemní kabely typu PFLEZE 25XN0,4 a PFLEZE 5XN0,4.

Na začátku překládky budou oba kabely přerušeny. Pomocí dvouplášťových spojek XAGA se naspojkují na nové kabely stejných typů i kapacit. Novou trasou budou kabely SEK přivedeny do stávajícího sloupového rozvaděče BLAN169, kde budou ukončeny na původních pozicích.

Pod pojízdnými plochami budou prvky SEK uloženy do chráničky PE 110mm. Vedle bude založena rezervní chránička stejného typu.

Kabelové spojky budou umístěny v nepojízdných plochách a budou, společně s konci kabelových chrániček, opatřeny detekčními markery miniBall.

Měření:

Před provedením překládky bude na metalických kabelech provedeno kontrolní stejnosměrné měření vybraných párů (cca 10%). Po provedení překládky bude provedeno standardní měření na celém profilu kabelů.

2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Kabel typu PFLEZE 0,4

Kabelová dvouplášťová spojka XAGA/EZE

Minimarker Ball

PE 110mm

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část III.)

TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

Josef Novák, MT: [redacted] projektant, zástupce stavebníka

Michal Novotný, MT: [redacted], zpracovatel CTN

2.7 Ostatní:

PD: NE

ÚR: Stavební titul zajistí stavebník

VBŘ: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GP: ANO (zakresleno v KM)

GEO zaměření: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GEO vytyčení hranic pozemků, vč. nové trasy SEK: zajistí investor (bude zapsáno so smlouvou)

SoUZ: NE

PEW: _ ANO

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení metalických kabelů) - min. 40 dnů předem

RZ je povinný oznámit PC a pracovníkovi provozní složky spol. CETIN časové období realizace stavby, termíny provedení záhozů a termín závěrečných měření.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

Navazující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

4. Vyjádření a záznamy

5. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
DUR.zip	SD
A_Průvodní zpráva.docx	SD
B_Souhrnné řešení stavby .doc	SD
741998_17_Podmínky ochrany SEK CETIN.pdf	SD
Situační výkres (741998-17).pdf	SD
Vyjádření o existenci SEK (741998-17).pdf	SD
zahájení územního řízení.pdf	SD

Informace o pozemku

Parcels číslo:	10021
Oheč:	10021
Katastrální území:	10021
Číslo 12:	10021
Výměra (m ²):	5528
Typ parcely:	Parcela katastru mimo-hostí
Kapový list:	D004
Území výměry:	Grady nbo v d. platné nbo nbo
Druh pozemku:	trasy travní parcel

Source: *parceby*

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnická práva

Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko



Podium

Informace o pozemku


Parceni d'Ar:	115314	Parceni karstno samonizirani	379
Obraz:		DAM	
Karstni širi Lavreni:	115315	Za socradice = 5,175K	
	115316	ostati koprivnice	
	115317	ostati plima	
	115318		
	115319		
	115320		
	115321		
	115322		
	115323		
	115324		
	115325		
	115326		
	115327		
	115328		
	115329		
	115330		
	115331		
	115332		
	115333		
	115334		
	115335		
	115336		
	115337		
	115338		
	115339		
	115340		
	115341		
	115342		
	115343		
	115344		
	115345		
	115346		
	115347		
	115348		
	115349		
	115350		
	115351		
	115352		
	115353		
	115354		
	115355		
	115356		
	115357		
	115358		
	115359		
	115360		
	115361		
	115362		
	115363		
	115364		
	115365		
	115366		
	115367		
	115368		
	115369		
	115370		
	115371		
	115372		
	115373		
	115374		
	115375		
	115376		
	115377		
	115378		
	115379		
	115380		
	115381		
	115382		
	115383		
	115384		
	115385		
	115386		
	115387		
	115388		
	115389		
	115390		
	115391		
	115392		
	115393		
	115394		
	115395		
	115396		
	115397		
	115398		
	115399		
	115400		
	115401		
	115402		
	115403		
	115404		
	115405		
	115406		
	115407		
	115408		
	115409		
	115410		
	115411		
	115412		
	115413		
	115414		
	115415		
	115416		
	115417		
	115418		
	115419		
	115420		
	115421		
	115422		
	115423		
	115424		
	115425		
	115426		
	115427		
	115428		
	115429		
	115430		
	115431		
	115432		
	115433		
	115434		
	115435		
	115436		
	115437		
	115438		
	115439		
	115440		
	115441		
	115442		
	115443		
	115444		
	115445		
	115446		
	115447		
	115448		
	115449		
	115450		
	115451		
	115452		
	115453		
	115454		
	115455		
	115456		
	115457		
	115458		
	115459		
	115460		

Source: parcels

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko

**Flowchart**

Informace o pozemku


Parcelní číslo:	135/172
Oblast:	Buřanská 15314312
Katastrální území:	Čáslav 165218
Číslo LV:	10041
Výměra (m ²):	194
Typ parcely:	Parcela kástru nemovitostí
Mapový list:	D04
Učelí symbol:	Za součástí v 5/TSK
Zásob využití:	ostání komunikace
Druh pozemku:	části plocha

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Mesto Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko



tippecanoe

Informace o pozemku

Farárin číslo:	12541-2
Oblasť:	Bratislava II
Katolíckej územnej:	Bratislava
Číslo LV:	10001
Výmera (m ²):	3675
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapsový list:	D14
Učelový výnaly:	Grafický nábo v digitalizovanej mape
Znárodný výzby:	ostien komunikácie
Druh pozemku:	ostien pozadia


Szwedzi parady

Vlastníci, jiní oprávnění


Vlastnické právo

Mesto Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko

**Abstract**

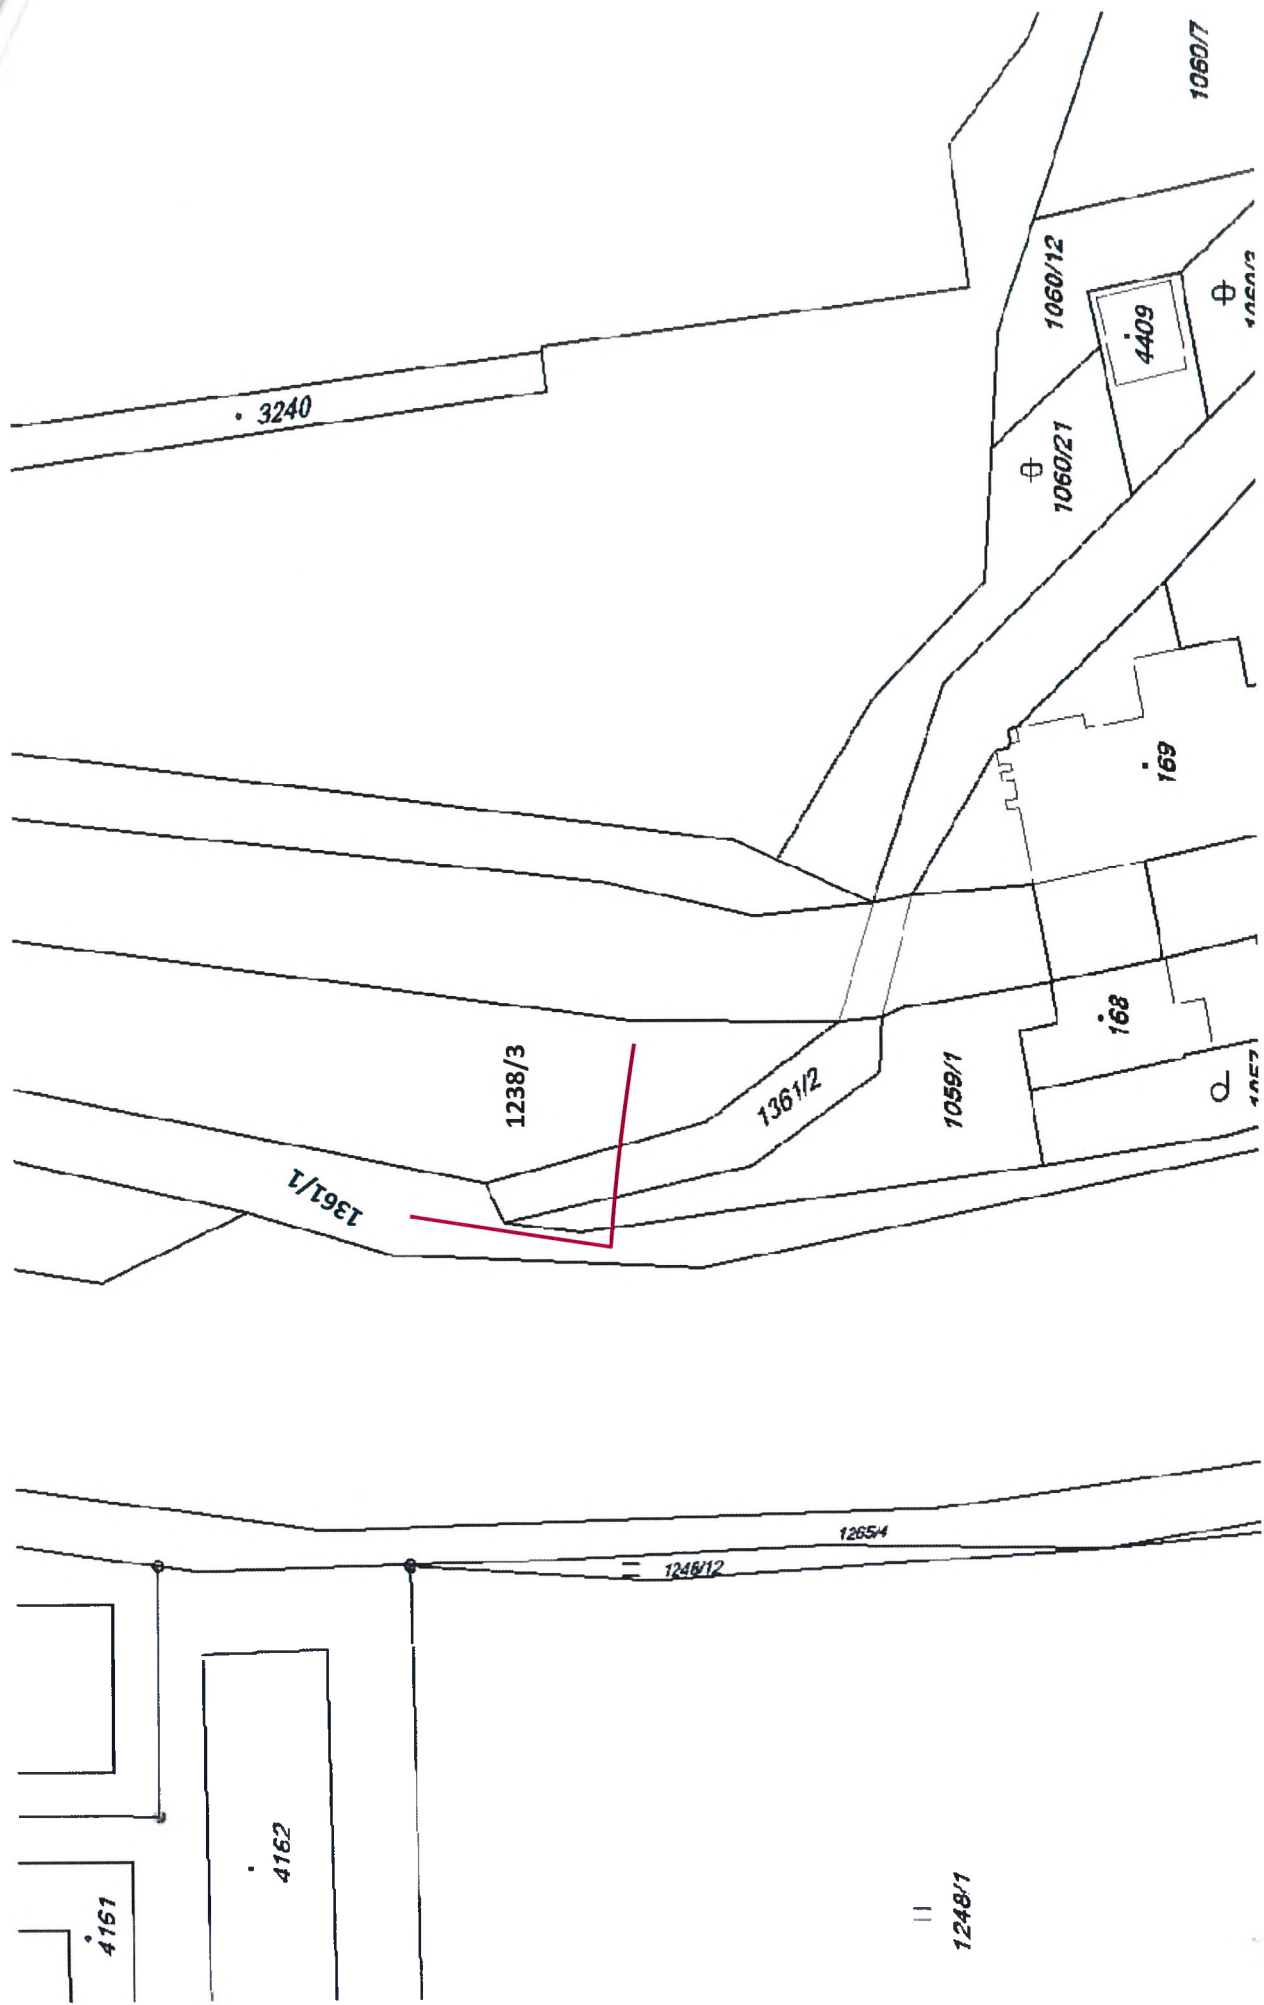

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

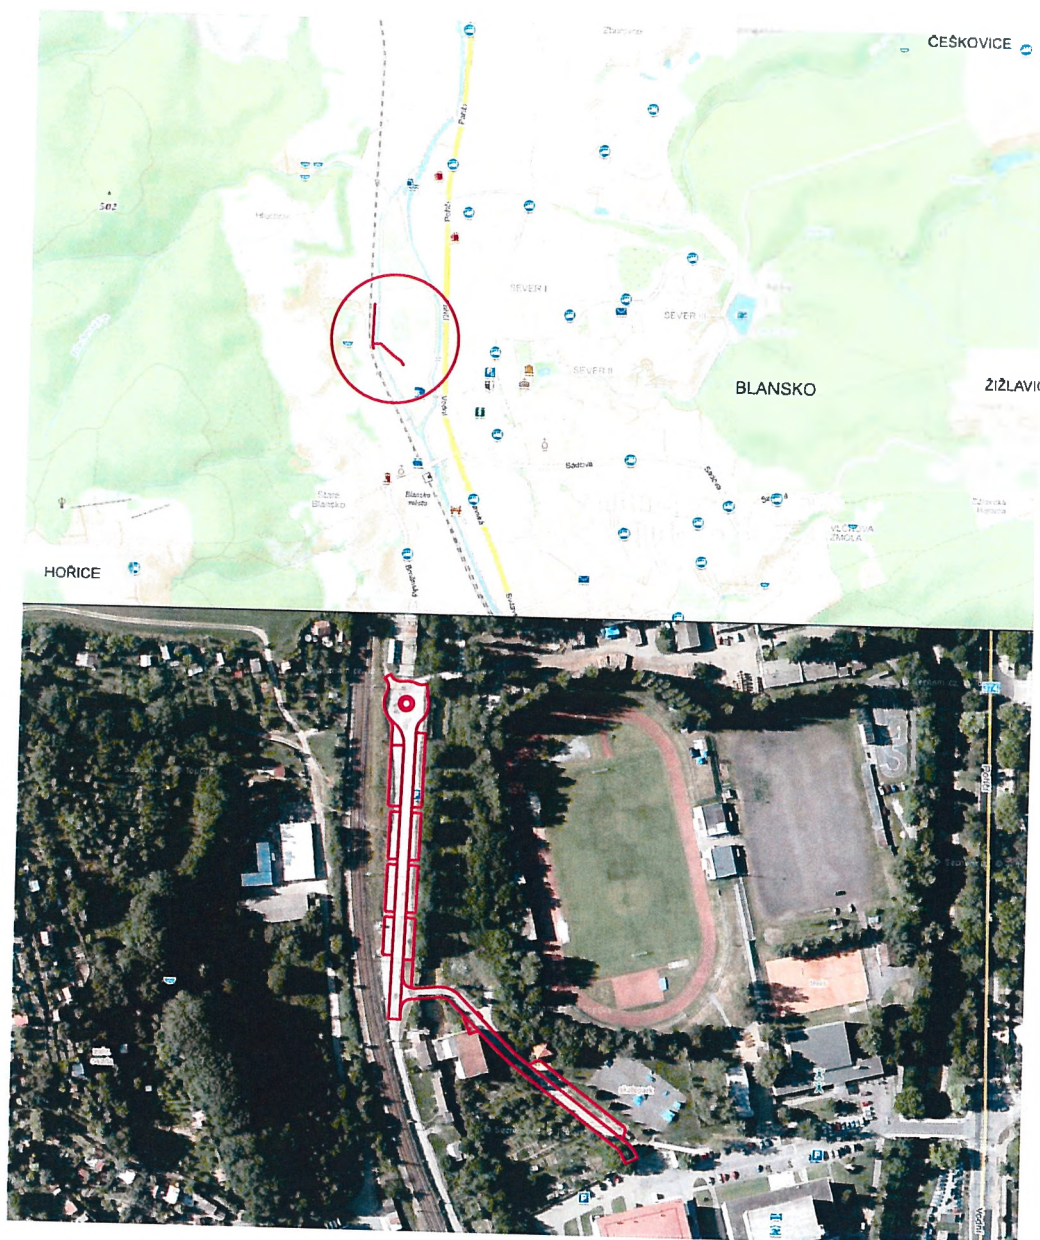

JNDS
projekt s.r.o.

Josef Novák
projekce dopravních staveb
Jiráskova 871/28, Letovice 679 61, tel.: 776 754 849
email : novkjosef30@gmail.com

IČO:05734894

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL
JOSEF NOVÁK JOSEF NOVÁK

INVESTOR: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

"Blansko - most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna"

p.č. 1361/3, 1060/22, 1060/3, 1060/7, 1060/21, 169, 1060/2, 1393/1, 1238/3, 1361/2,
1059/1, 1361/1, 1242, 1245/1, k.ú. Blansko

NÁZEV VÝKRESU

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

AUTORIZOVÁNO

ČÍSLO PARÉ

STUPEŇ PD

DUR

ZAKÁZKA

24JNDS/17

FORMÁT

A4

DATUM


12/2017

MĚŘÍTKO

ČÍSLO PŘÍLOHY

-

C.1.

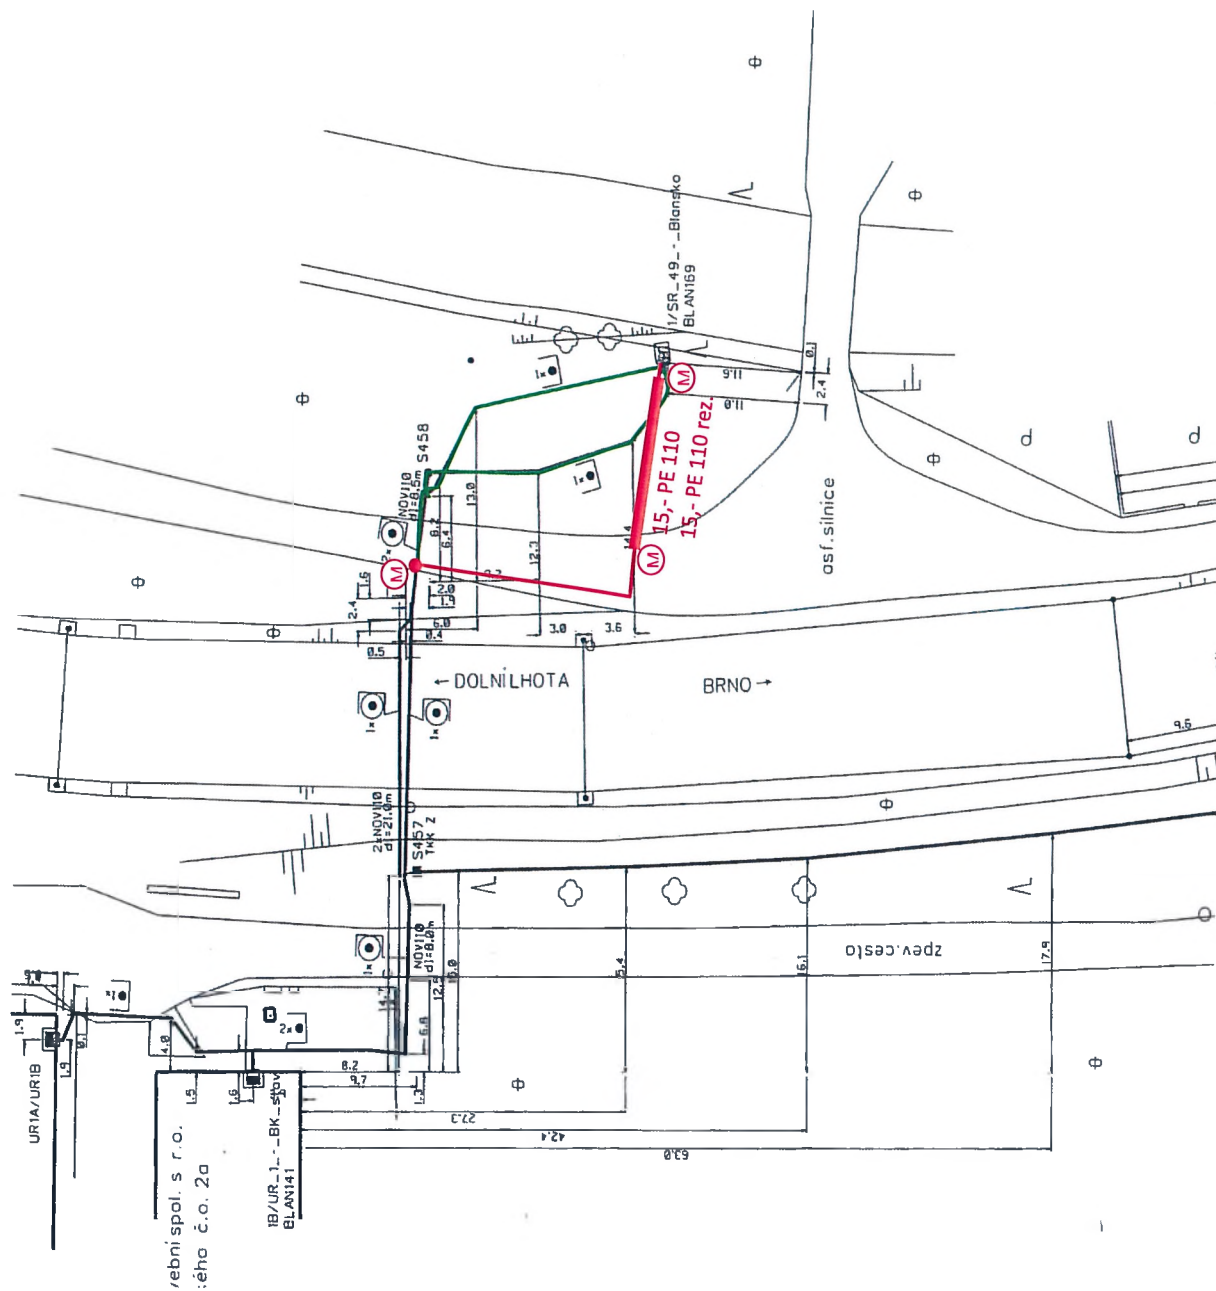



POZNÁMKA:

[illegible]

VPIC Blansko komunikace u Salmova mlýna - specifikace nákladů_příloha č. 2

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2018.10

Název stavby: **VPIC Blansko komunikace u Salmova mlýna**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., Michal Novotný

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	5 677,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	51 120,64 Kč
MONTÁŽ	23 421,10 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 417,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 783,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	377,22 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	18 717,70 Kč

Celkové náklady: 114 552,00 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	30.00 m	544,50 Kč
958554	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 080,38 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	13.00 m	6 872,58 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	6.00 m	907,26 Kč
955570	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	27.00 m	37 231,92 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	40.00 m	484,00 Kč
MONTÁŽ			
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	629,00 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	30.00 ks	1 088,70 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	28.00 ks	677,60 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	169,36 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	314,50 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	30.00 ks	726,00 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	6 200,72 Kč
955279	Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř.	2.00 ks	3 145,00 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	44.00 m	907,28 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	44.00 m	1 118,92 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	30.00 ks	726,00 Kč
955258	Ukončení kabelu armovaného v rozvaděči	2.00 ks	870,94 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 738,60 Kč
955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 079,03 Kč
958555	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 110,87 Kč
955082	Zrušení ukončení armov. kab. v rozvaděči	2.00 ks	411,28 Kč
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	30.00 ks	507,30 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 987,01 Kč
956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 036,60 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBŘ odhadovaná	1.00 ks	500,00 Kč
--------	---	---------	-----------

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 443,92 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 839,11 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE

955204	Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár	1.00 ks	166,39 Kč
955205	Zrušení převodu v rozvaděci - další pár	1.00 ks	30,00 Kč
955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	180,83 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	15.00 ks	570,30 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	54.00 m	207,36 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	15.00 m	66,30 Kč
300137	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 25x4x0,4	44.00 m	4 424,20 Kč
300134	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 5x4x0,4	44.00 m	2 710,40 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	3.00 ks	610,98 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	6.00 ks	138,36 Kč
303501	Spojka plastová 110/94 mm	4.00 ks	139,04 Kč
322269	Spojka XAGA 500-43/8-150/EZE	1.00 ks	3 114,88 Kč
322268	Spojka XAGA 500-43/8-300/EZE	1.00 ks	3 948,35 Kč
302655	Trubka PE 110/3,5/6000mm	5.00 ks	2 566,15 Kč
303465	Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	42,38 Kč
303222	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	2.00 ks	176,56 Kč
315502	Vodič sděl. nf U 2x0,5	1.00 m	2,44 Kč
