



S009P00TZX7G

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2019/00022**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

město Blansko

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. [REDAKCE]
zastoupená na základě pověření Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále „**CETIN**“)

a

město Blansko

se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

IČO : 00279943

DIČ : CZ00279943

Zastoupené Ing. Jiřím Crhou, starostou města Blansko

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace a specifikace nákladů Překládky, jež je Přílohou číslo 1 této Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 02.01.2019 vydané společností

CETIN pod čj. 810076/18, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst.17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením **VPIC Blansko ul. Kamnářská-rekonstrukce**.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN - a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného společného povolení, případně též územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.
(vše dále „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi
 - a) před realizací Překládky:
 - i) zajistit vyhotovení CTN

- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006),
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit společné povolení, případně též územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- ii) zajistit geodetické vytýčení hranic pozemků související s Překládkou, včetně nové trasy SEK
- iii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka“).

Stavebník se zavazuje po nabytí právní moci společného povolení, případně též územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky, převést na CETIN práva a povinnosti z tohoto společného povolení, případně též územního rozhodnutí týkající se Překládky (uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy a předat toto společné povolení, případně též územní rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci společného povolení, případně též územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 4 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 4 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebnosti

do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této Smlouvy činí **173.790,- Kč**. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnouch na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,

- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:
- a) Fakturu č. 1 za CTN ve výši **5.678,- Kč** do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
 - b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.
- 6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode dne ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
[redacted]

ve věcech technických: Petr Bílek
funkce: Senior specialista pro výstavbu sítě
[redacted]

- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Svoboda funkce: investiční referent
e-mail: [redacted] [redacted]

Ing. Jiří Crha funkce: starosta města Blansko
e-mail: [redacted] [redacted]

ve věcech technických: Ing. Jiří Svoboda funkce: investiční referent
e-mail: [redacted] [redacted]

- 8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 9.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 9.2 S ohledem na ustanovení odst. 9.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 10.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména

zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Strany či jiné osoby pověřené druhou Stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.

- 10.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 10.3 Strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 10.4 Strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přejímající Strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména zajištění poskytování služeb dle Smlouvy, zřízení části nebo koncového bodu veřejné komunikační sítě CETINu, odstraňování poruch, opravy, revize či jiné úkony týkající se předmětu nájmu dle Smlouvy nebo jeho vybavení.
- 10.5 Předávající Strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Stranou je CETIN, předávající Strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Strana povinna přejímající Straně na výzvu písemně doložit.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;

- b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/ nebo
- c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).

- 11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 11.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 11.12 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

11.13 CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

11.14 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky

Příloha č. 3 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o společném povolení, případně z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Doložka

Tato Smlouva se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko na její 14. schůzi dne 28. 06. 2011 usnesením č. 109.

CETIN:

14-02-2019


V Brně dne _____




Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Miroslav Kot
supervizor pro výstavbu sítě

Stavebník:

V Blansku dne 22.2.2019



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města Blansko



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Startovací dokumentace

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie

Podkategorie

Číslo SAP

Číslo interní 20725/18/0069

Název

VPIC Blansko ul. Kamnářská-rekonstrukce

Budoucí uživatel

GMO-BOJI Bílek Petr
Manažer/KPO

Zpracoval

Vedoucí
Manažer

Michal Novotný
Petr Švestka
Petr Švestka

Schváleno

Obsah:**1 Souhrnná zpráva**

- 1.1 Základní údaje
- 1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

- 2.1 Vstupní podklady
- 2.2 Navrhované řešení
- 2.3 Popis tras
- 2.4 Použitá technologie
- 2.5 Použité předpisy
- 2.6 Koordinace
- 2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby**4 Vyjádření a záznamy****5 Přílohy**

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC Blansko ul. Kamnářská-rekonstrukce
Kategorie:	
Podkategorie:	
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem CAPEX
Důvod 1:	Bez určení
Číslo interní:	20725/18/0069
Prvek SPP:	
ABC:	B
HOST:	
ATÚ:	BLAN:RE:1 - Blansko(Svitavská)-RSU

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:	
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0 km	kmp mk	130 tis. Kč
100200_Délka metalických kabelů	0.055 km	kmk mk	2600 tis. Kč
100700_Délka nadzemní tratě	0 km	km vyk	1324.074 tis. Kč
100100_Délka párů v metalických kabelech	1.1 km	km kv	0 tis. Kč
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0.108 km	kmo kv	0 tis. Kč
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár	b.j.	0 tis. Kč
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár		
100900_Počet bytových domů	0 BD		
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj		
100500_Počet rodinných domů	0 RD		
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj		
nástavba skříně SIS 2, 3 pro rDSLAM Micos	0 ks		
Skříň SIS 900-A s nást. rDSLAM HD 180	0 ks		
Skříň SIS 900 B HD180	0 ks		
Skříň SIS 900 C HD180	0 ks		
Skříň SIS 900 D HD180	0 ks		
Sloupek nn měření pro DSLAM 350 vč. zákl.	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM pod omítku	0 ks		
Skříň mDSLAM 450 HD180 s ventilátorem	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM	0 ks		
Skříň SIS 1350 D HD 180	0 ks		
Délka HDPE trubek pro OK	0 km		

Termíny:

Platnost ÚR od:	
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	17.12.2018
Plánované ukončení přípravy:	15.03.2019
Plánované zahájení realizace:	15.08.2019
Plánované ukončení realizace:	30.12.2019
Nabídka k přejímce (Plán):	15.11.2019

1.2 Účel stavby:

Navržené technické řešení je v souladu s TM000072.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 20725/18/0069 na zpracování CTN: VPIC Blansko ul. Kamnářská-rekonstrukce

2.2 Navrhované řešení:

Z důvodu rekonstrukce ulice Kamnářská v Blansku, dojde k přeložení prvků SEK spol. CETIN. Přeložení SEK se děje na více místech.

1) Před BD č.o. 7 _ v místech výstavby nových parkovacích stání. Zde dojde k přeložení stávajícího metalického kabelu TCEKE 10XN0,4. Začátek překládky je stanoven před BD č.o. 7 ve stávající dělicí spojce neznámého typu. Konec překládky je na druhé straně rekonstruované asfaltové komunikace. Stávající kabel bude v překládaném úseku nahrazen tendrovaným prvkem typu PFLE.

Pod komunikací bude SEK uložena do chráničky PE110. Vedle bude připoložena rezervní chránička stejného typu.

2) Vedle BD č.o. 17 _ v místech výstavby nových parkovacích stání. Zde dojde k úpravě stávající trasy SEK takovým způsobem, aby pod zpevněnými pojízdnými plochami nebyly žádné „ostré“ ohyby.

Stávající SEK bude pod parkovacím stáním i rekonstruovanou komunikací uložena do dělených chrániček SYSPRO. Vedle bude připoložena rezervní chránička typu PE 110.

Úprava trasy SEK je navržena bez přerušení provozu.

3) Před BD č.o. 11 a č.o. 13 _ v místech úprav chodníků a schodiště. Zde dojde k výškové překládce stávající průběžné trasy SEK (z důvodu úpravy nivelety povrchů). Kabelové „odbočky“ typu TCEKE 15P 0,4 a TCEKE 10P 0,4 do zmíněných BD zůstanou i nadále pod plánovaným schodištěm. Uloženy budou do dělených chrániček SYSPRO.

V případě potřeby budou stávající dělicí spojky přepřeláštěny.

Kabelové spojky budou umístěny mimo pojízdné plochy a budou, spolu s konci chrániček, opatřeny detekčními markery miniBall.

2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Kabel typu TCEPKPFLE 0,4

Kabelová spojka (dělička) XAGA

Mini Markér Ball

Dělená trubka SYSPRO

PE110

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část III.)

TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

Ing. Jiří Svoboda, [redacted] investiční referent, zástupce stavebníka
Michal Novotný, [redacted] zpracovatel CTN

2.7 Ostatní:

PD: NE

ÚR: Stavební titul zajistí stavebník

VBŘ: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GP: ANO (zakresleno v KM)

GEO zaměření: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GEO vytyčení hranic pozemků, vč. nové trasy SEK: zajistí investor (bude zapracováno do smlouvy)

SoUZ: NE

PEW: _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušeni metalických kabelů) min. 40 dnů předem.

RZ je povinný oznámit PC a pracovníkovi provozní složky spol. CETIN časové období realizace stavby, termíny provedení záhozů a termín závěrečných měření.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

Navazující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

4. Vyjádření a záznamy

5. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
Vyjádření o existenci SEK (810076-18).pdf	SD
C 3 Blansko, Kamnářská ulice - koordinační situace.pdf	SD
Vyjádření o existenci SEK (801899-18).pdf	SD
Situace výkres (801899-18).pdf	SD

Informace o pozemku

Parcelní číslo:
Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m²]:
Typ parcely:
Mapový list:
Účelové vymezení:
Způsob využití:
Druh pozemku:
Součástí parcely:

833042#
Blatná (531133)#
Blatná (531133)
10001
1973
Parcelní katastr nemovitostí
DMA
Ze součástí v S-JTSK
ostatní komunikace
ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnická práva

Město Blatná, nám. Svobody 32/3, 67801 Blatná

Podíl

Informace o pozemku

Parcelní číslo:
Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m²]:
Typ parcely:
Mapový list:
Účelové vymezení:
Způsob využití:
Druh pozemku:
Součástí parcely:

833042#
Blatná (531133)#
Blatná (531133)
10001
1028
Parcelní katastr nemovitostí
DMA
Ze součástí v S-JTSK
ostatní komunikace
ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnická práva

Město Blatná, nám. Svobody 32/3, 67801 Blatná

Podíl

Informace o pozemku

Parcelní číslo:
Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m²]:
Typ parcely:
Mapový list:
Účelové vymezení:
Způsob využití:
Druh pozemku:
Součástí parcely:

833042#
Blatná (531133)#
Blatná (531133)
10001
238
Parcelní katastr nemovitostí
DMA
Ze součástí v S-JTSK
zeleň
ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnická práva

Město Blatná, nám. Svobody 32/3, 67801 Blatná

Podíl

Informace o pozemku

Parcelní číslo:
Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m²]:
Typ parcely:
Mapový list:
Účelové vymezení:
Způsob využití:
Druh pozemku:
Součástí parcely:

833042#
Blatná (531133)#
Blatná (531133)
10001
450
Parcelní katastr nemovitostí
DMA
Ze součástí v S-JTSK
ostatní komunikace
ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnická práva

Město Blatná, nám. Svobody 32/3, 67801 Blatná

Podíl

Informace o pozemku

Parcelní číslo:
Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m²]:
Typ parcely:
Mapový list:
Účelové vymezení:
Způsob využití:
Druh pozemku:
Součástí parcely:

833042#
Blatná (531133)#
Blatná (531133)
10001
536
Parcelní katastr nemovitostí
DMA
Geotický náhon v dřevěném náhoně
ostatní komunikace
ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnická práva

Město Blatná, nám. Svobody 32/3, 67801 Blatná

Podíl

Informace o pozemku

Parcelní číslo:
Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m²]:
Typ parcely:
Mapový list:
Účelové vymezení:
Způsob využití:
Druh pozemku:
Součástí parcely:

833042#
Blatná (531133)#
Blatná (531133)
10001
1204
Parcelní katastr nemovitostí
DMA
Ze součástí v S-JTSK
zeleň
ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnická práva

Město Blatná, nám. Svobody 32/3, 67801 Blatná

Podíl

Informace o pozemku

Parcelní číslo:
Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m²]:
Typ parcely:
Mapový list:
Účelové vymezení:
Způsob využití:
Druh pozemku:
Součástí parcely:

833042#
Blatná (531133)#
Blatná (531133)
10001
1204
Parcelní katastr nemovitostí
DMA
Ze součástí v S-JTSK
zeleň
ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění


Vlastnická práva


Město Blatná, nám. Svobody 32/3, 67801 Blatná

Podíl

20725/18/0069 VPIC Blatná ul. Kamnářská-rekonstrukce



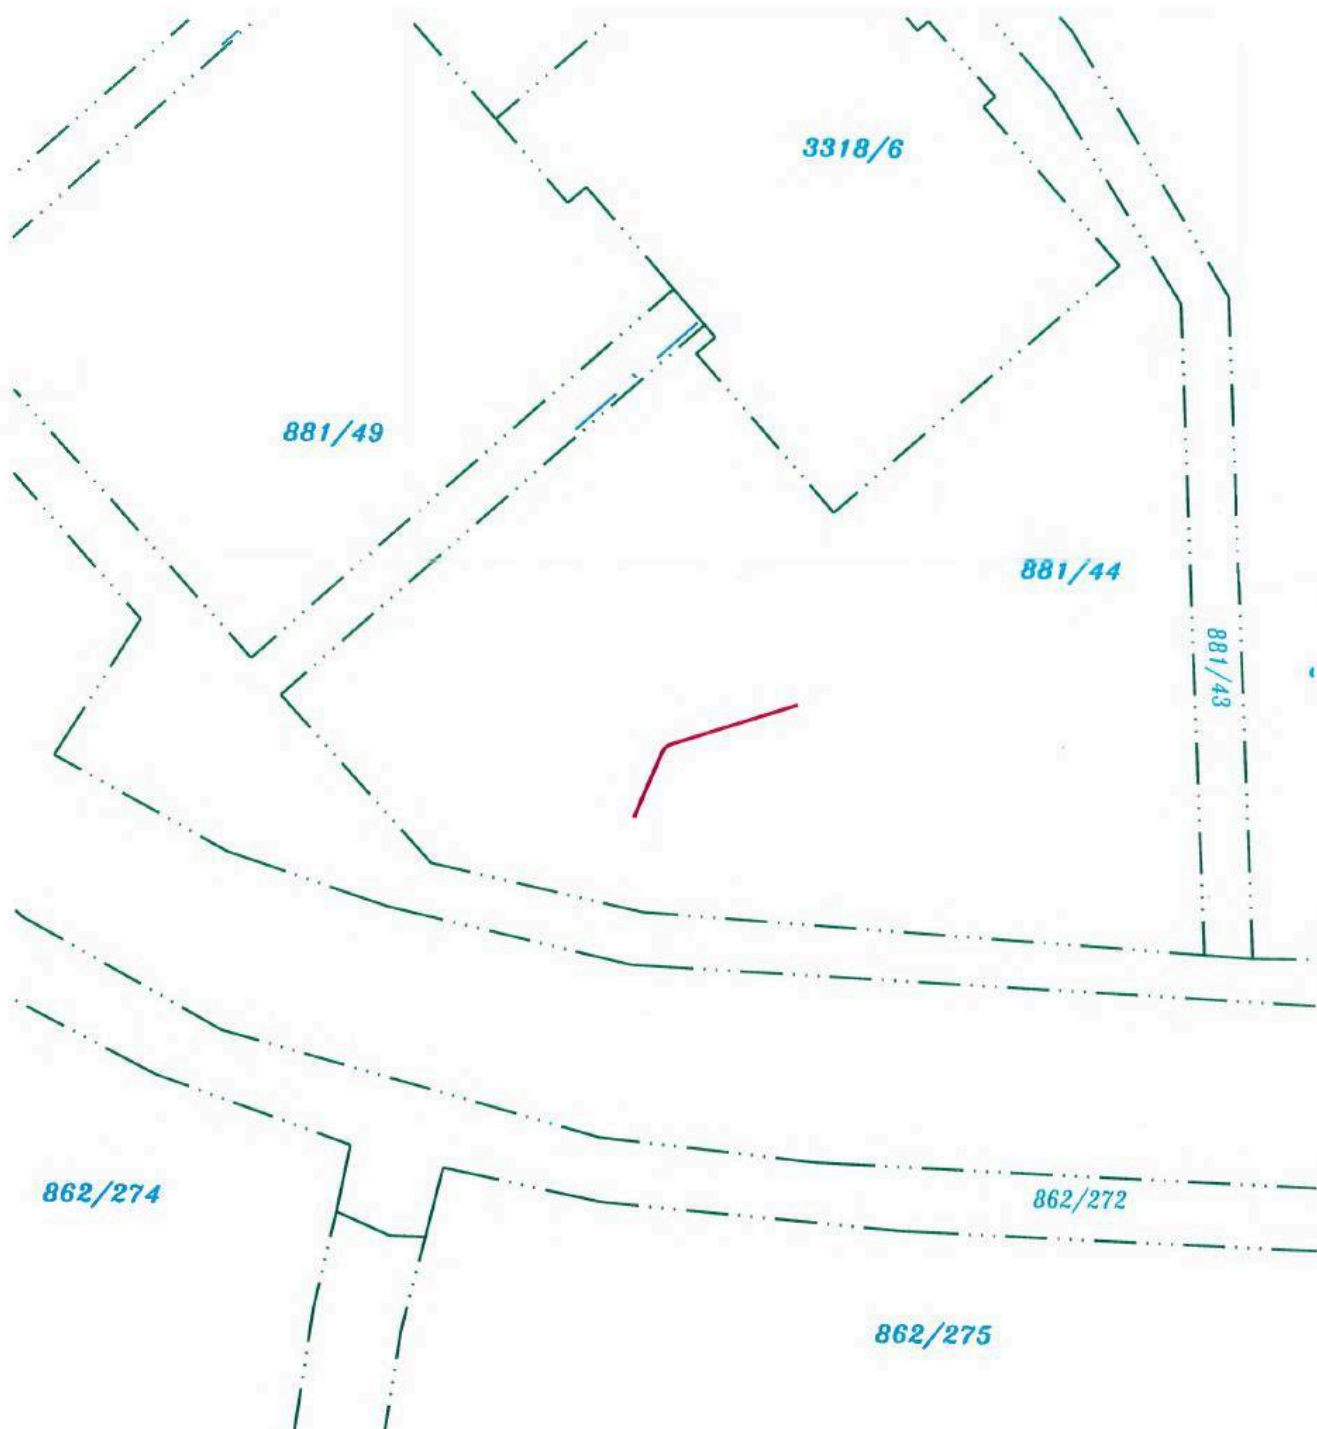

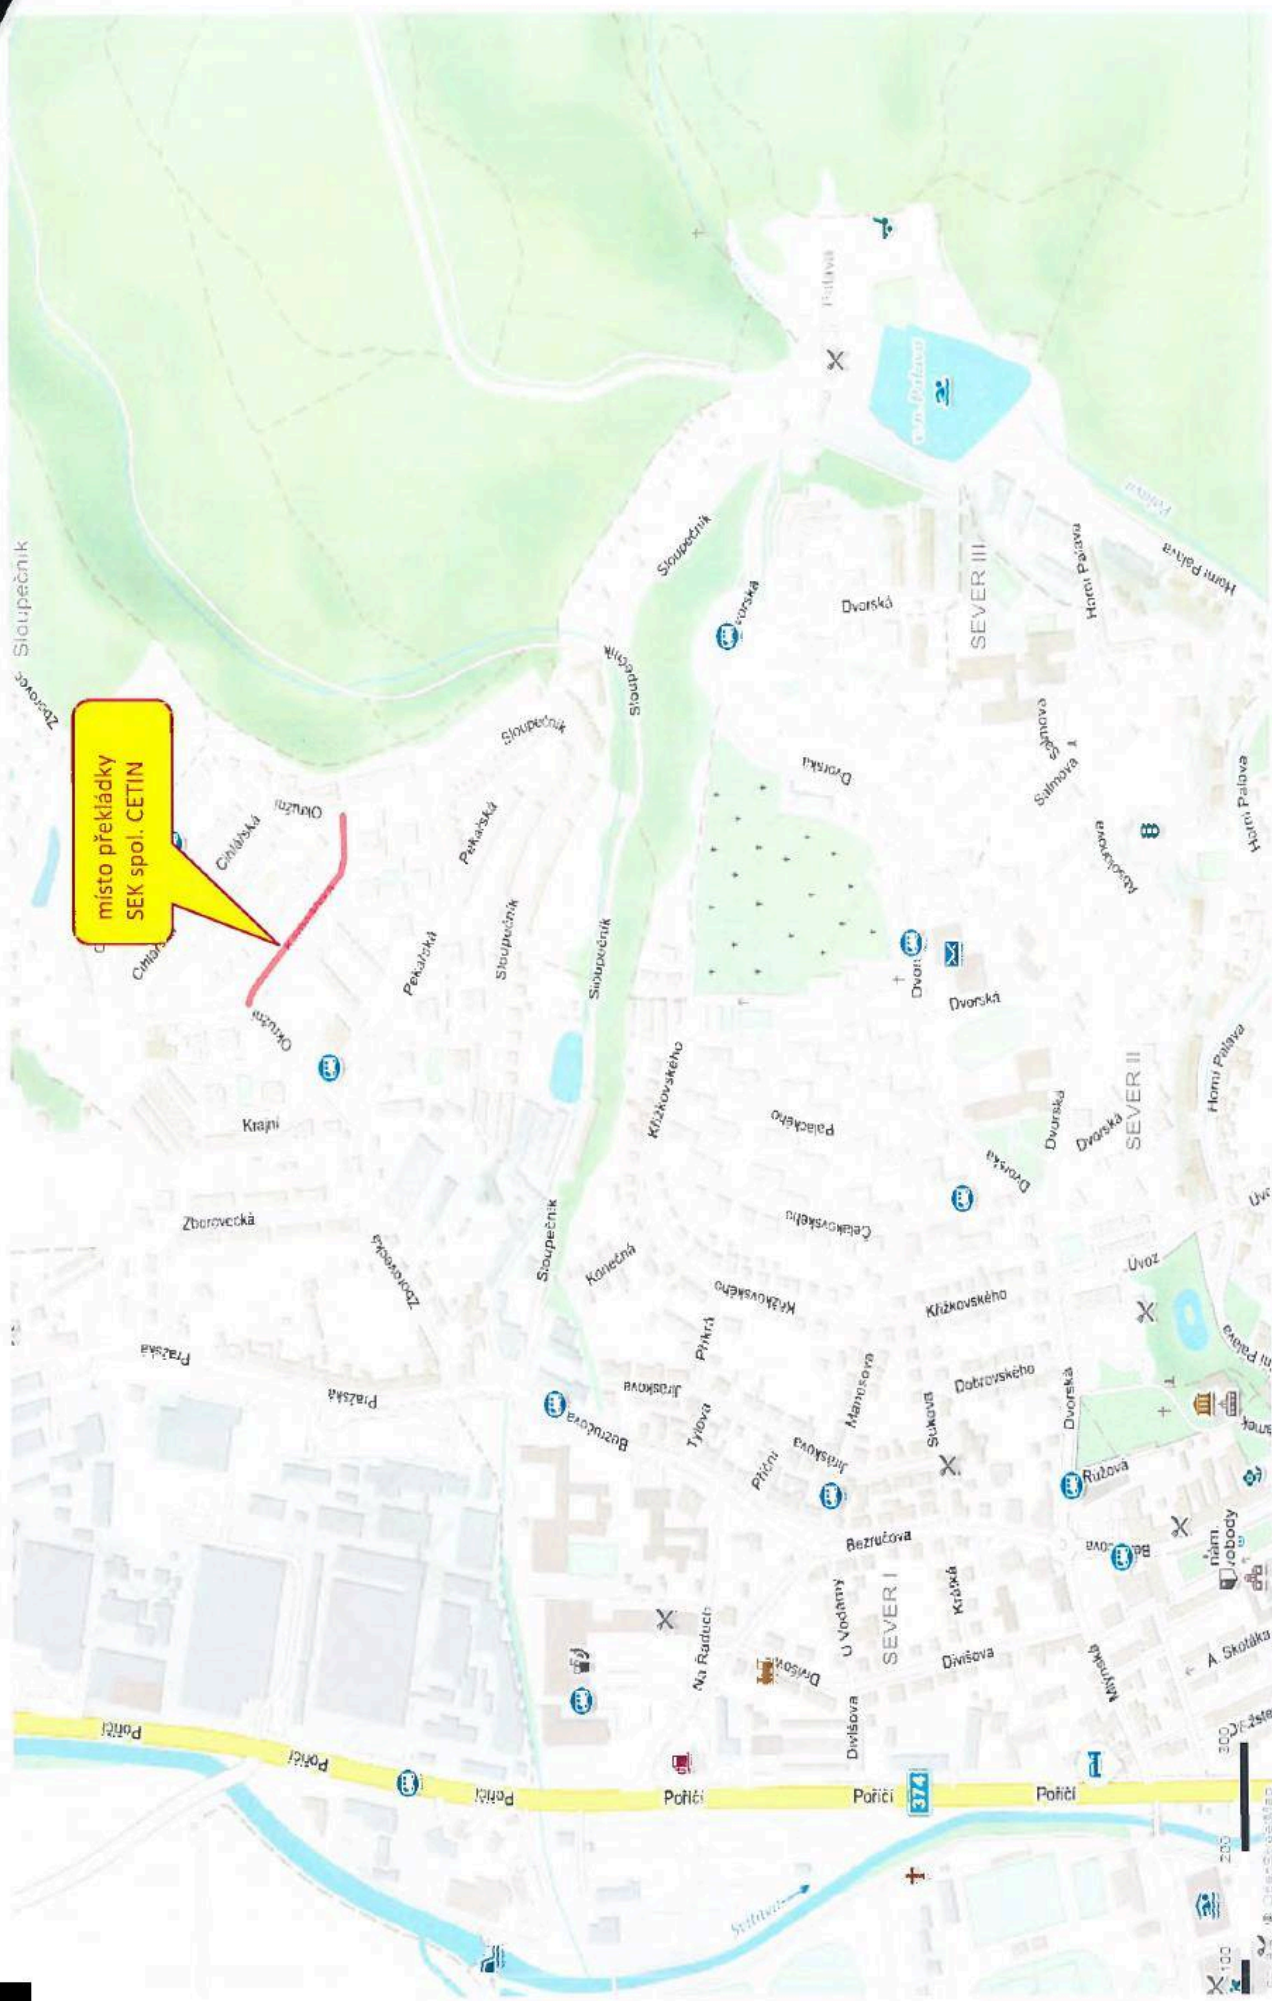



VPIC Blansko ul. Kamnářská-rekonstrukce - specifikace nákladů_příloha č.2

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.01

Název stavby: **VPIC Blansko ul. Kamnářská-rekonstrukce**

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	5 677,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	82 653,45 Kč
MONTÁŽ	42 821,49 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 417,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 783,03 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	27 399,72 Kč

Celkové náklady: 173 790,00 Kč

Číslo SAP	Seznam položek	Množství	Celková cena
	Název položky		
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	31.00 m	562,65 Kč
951549	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	2.00 ks	72,58 Kč
954960	Rýha v chodn.bet.desky35/50-70rozš.o10cm	18.00 m	3 266,10 Kč
954959	Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm	12.00 m	2 177,40 Kč
952359	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	16.00 m	10 368,16 Kč
952362	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	21.00 m	13 608,21 Kč
952345	Rýha v trávě 35/70-100	27.00 m	9 144,90 Kč
952355	Rýha v trávě 50/110	31.00 m	13 874,36 Kč
954962	Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm	13.00 m	4 212,13 Kč
954952	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	13.00 m	21 060,26 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	108.00 m	1 306,80 Kč
954972	Znovuosazení obrubníků chodníkových	12.00 m	2 757,96 Kč
951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	241,94 Kč
MONTÁŽ			
955031	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	60.00 m	1 888,80 Kč
955030	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	40.00 m	869,20 Kč
955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	20.00 m	363,00 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	5.00 ks	786,25 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	85.00 ks	3 084,65 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	49.00 ks	1 185,80 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	84,68 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	157,25 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	160.00 ks	3 872,00 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	10.00 ks	302,50 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	6 200,69 Kč
955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	3.00 ks	5 080,38 Kč

955281	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	1.00 ks	1 149,14 Kč
955266	Montáž trubky ochranné montáž dělených trubek SYSPRO	21.00 ks	2 403,12 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	75.00 m	1 546,50 Kč
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	60.00 m	2 177,40 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	40.00 m	1 017,20 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 738,60 Kč
955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 079,03 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
955066	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	1.00 ks	798,35 Kč
955067	Zrušení spojky smrštiteľné nad 50 čtyř	2.00 ks	2 370,86 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 987,01 Kč
956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 036,60 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBŘ odhadovaná	1.00 ks	500,00 Kč
--------	---	---------	-----------

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 443,92 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 839,11 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	101.00 ks	3 840,02 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	50.00 m	192,00 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	114.00 m	503,88 Kč
300106	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	55.00 m	1 368,40 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	10.00 ks	2 036,60 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	34.00 ks	784,04 Kč
320312	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	3.00 ks	440,04 Kč
312863	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1.00 ks	515,45 Kč
312889	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	3.00 ks	2 155,26 Kč
303501	Spojka plastová 110/94 mm	4.00 ks	139,04 Kč
319184	Spona trubkySYSPRO	126.00 ks	2 566,62 Kč
319209	Trubka dělená SYSPRO 160/110	21.00 m	9 694,23 Kč
302655	Trubka PE 110/3,5/6000mm	6.00 ks	3 079,38 Kč
303465	Víčko plastové trubky 110/100 mm	4.00 ks	84,76 Kč

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Z ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka [REDACTED]

Zastoupená Ludmilou Uhrovou, specialistou pro výstavbu sítě dle pověření

na straně jedné

(dále jen „Nabyvatel“)

a

IČ: DIČ:

se sídlem:

zastoupena

na straně druhé

(dále jen „Převodce“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby („dále jen „tato dohoda““).

čl. I.

Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „.....“, kteréžto bylo vydáno dne, (kým) pod čj. a nabylo právní moci dne (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění (dále jen „Stavba“/ event. „Stavební objekt“).

Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby a to právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“), tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

čl. II.

Převodce ke dni podpisu této dohody převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v Rozhodnutí



o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.

čl. III.

Převodce a Nabyvatel prohlašují, že si celý text této dohody pozorně přečetli, plně mu rozumějí a bezvýhradně s ním souhlasí. Připojením svých vlastnoručních podpisů stvrzují, že text této dohody věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli a že tato dohoda není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek pro kteréhokoliv z nich.

čl. IV.

- (1) Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Převodce a po jednom Nabyvatel.
- (2) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Převodcem a Nabyvatelem.

V Brně dne

V dne

za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ludmila Uhrová
Specialista pro výstavbu sítě
