

SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupeným

číslo smlouvy: 02PU-001537

(dále jen "obídnatelem") na jedné straně

a

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00, Praha 8

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 IČ:

00014915 DIČ: CZ00014915 zastoupeným

číslo smlouvy: 1)4/88/2016

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/18 Příbram ulice Evropská, ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 13 430 209,30 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	<u>Nabídková cena stavby v Kč bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	a		(c) = (a) + (b)
I/18 Příbram ulice Evro ská	13 430 209,30	2 820 343,95	16 250 553,25

kteřáto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměř)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/18 Příbram ulice Evropská, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 636614 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel ve znění Zvláštních podmínek“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací — výkaz výměř
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem — Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)

- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
Související dokumenty, které zahrnují:
- Oceněný soupis prací -- výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) — netýká se
 - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 9.8.2016.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum:

Metrostav a.s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Praze dne **13 -10- 2016**.....


číslo zakázky: 02PU-001537

Dle rozdělovníku

č.j.: 18772/21/16-21300-Rock

Vyřizuje:

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky



Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, I zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„I/18 Příbram ulice Evropská“

zadávací řízení zahájeno dne 21. 07. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 636614 / výzva o zahájení zadávacího řízení č.j. 13013/21/16-21300-Rock / ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném I znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 6 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako neivhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem

která podle výsledků hodnocení nabídek^k podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

Metrostav a.s.

IČ: 00014915 se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 OO
Praha 8 -- Libeň

Celková nabídková cena uchazeče: 13 430 209,30,- Kč (bez DPH)

Čerčanská 12
140 00 Praha 4

tel.: 241 084 111
fax: 241 084 575

IČO 65993390
DIČ CZ65993390

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ: 45357269 se sídlem: Klatovská
410/167, 321 00 Plzeň

Celková nabídková cena uchazeče: 13 750 587,64,- Kč (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

ROBSTAV STAVBY k.s.

IČ: 27430774 se sídlem: Pražská 483,
397 01 Písek

Celková nabídková cena uchazeče: 14 497 940,97,- Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6, podaná uchazečem

M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868 se sídlem: Husova 1697, 530
03 Pardubice

Celková nabídková cena uchazeče: 14 584 867,07,- Kč (bez DPH)

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná uchazečem

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČ: 47781734 se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
Kročehlavy

Celková nabídková cena uchazeče: 14 893 279,49,- Kč (bez DPH)

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem

Porr a.s.

IČ: 43005560 se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha
IO Strašnice

Celková nabídková cena uchazeče: 14 977⁰⁹⁵,⁵⁴,- Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem číslo 2 jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle 81 zákona.

11 -10- 2016

V Praze dne

.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: 1/18 Příbram ulice Evropská

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla	Nabídková cena bez DPH*	DPH v Kč	Celková nabídková \$ cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) DPH z cen a	(c) = (a) + (b)
I/18 Příbram ulice Evropská	13 430 209,30	2820 343,95	16 250 553,25

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnoticího kritéria nejnižší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)

- (c) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a (h) Ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami) - Netýká se.
 - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno:

Metrostav a.s.

Adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 2.9.2016

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/18 Příbram ulice Evropská

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

Název Pod-článku	Číslo Podčlánku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1 1 22, . . . 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 OO Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1 1 23, . . . 1.3	Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 OO Praha 8
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4 , 1.3	ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 OO, Praha 4;
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	2 měsíce bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci

Název Pod-článku	číslo Podčlánku	Údaje
------------------	-----------------	-------

Záruční doba		60 měsíců na stavební práce 36 měsíců na vodorovné dopravní značení plastem
Dílo		1/18 Příbram ulice Evropská
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk		Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3% Přijaté smluvní částky

Název Pod-článku	číslo Podčlánku	Údaje
------------------	-----------------	-------

Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 44 35.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Podčlánku 4.29 7.500,- Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 c)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Podčlánku 4.31 30.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec 7.0000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 7.500,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 g)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se Pod-článek 13.8.1.
	14.6. c)	Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 10 % průběžné platby
	14.6 e)	Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3 10 % průběžné platby

Název Pod-článku	Číslo Podčlánku	Údaje
------------------	-----------------	-------

	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

Datum: 30.8.2016

Metrostav a.s.

DÍL 1, ČÁST 4

FORMULÁŘ 4.4.2

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

V souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/18 Příbram ulice Evropská“, ev. č. dle Věsmíku veřejných zakázek 636614 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme

k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo

s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 11.8.2016

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: I/18 Příbram ulice Evropská

Společnost Metrostav a.s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 OO Praha 8, IČ: 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/18 Příbram ulice Evropská, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 636614 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Vytěžený asfaltový recyklát		
Vytěžený železný odpad		

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vyděženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Praze dne 30.8.2016

Metrostav a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6
HARMONOGRAM, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ
PRACÍ

Společnost Metrostav a.s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/18 Příbram ulice
Evropská, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 636614 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živíc), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu,
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích: viz příloha,
3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.
4. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky: - pokládka asfaltových vrstev

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavatelí	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z řfáté cen díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
frézování	FREKO a.s. Teplárenská 602/9 108 OO Praha 10 - Malešice	7,6	
CELKEM ⁰ /0		7,6	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 2.9.2016

Metrostav a.s.

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

Příloha:
Program prací
I/18 Příbram, ulice Evropská


V rámci SO 101 jsou navrženy tyto stavební práce:

- Obnova dělícího dopravního ostrůvku na kruhovém objezdu u začátku staničení
- Demontáž výškových náběhů svodidel ve staničeních km 0,307 47 a km 0,435 03
- Odstranění stávajících uličních vpustí
- Osazení nových uličních vpustí a jejich napojení na stávající přípojky
- Výšková úprava znaků inženýrských sítí
- Frézování asfaltových vrstev
- Odstranění stávajících nezpevněných krajnic
- Pokládka nových asfaltových vrstev
- Vytvoření nových nezpevněných krajnic z recyklované asfaltové drtě z frézování
- Osazení nových ocelových svodidel
- Výměna svislého dopravního značení
- Obnova vodorovného dopravního značení

Příloha:

Str. 1

Schéma zařízení staveniště I/18 Příbram, ulice Evropská

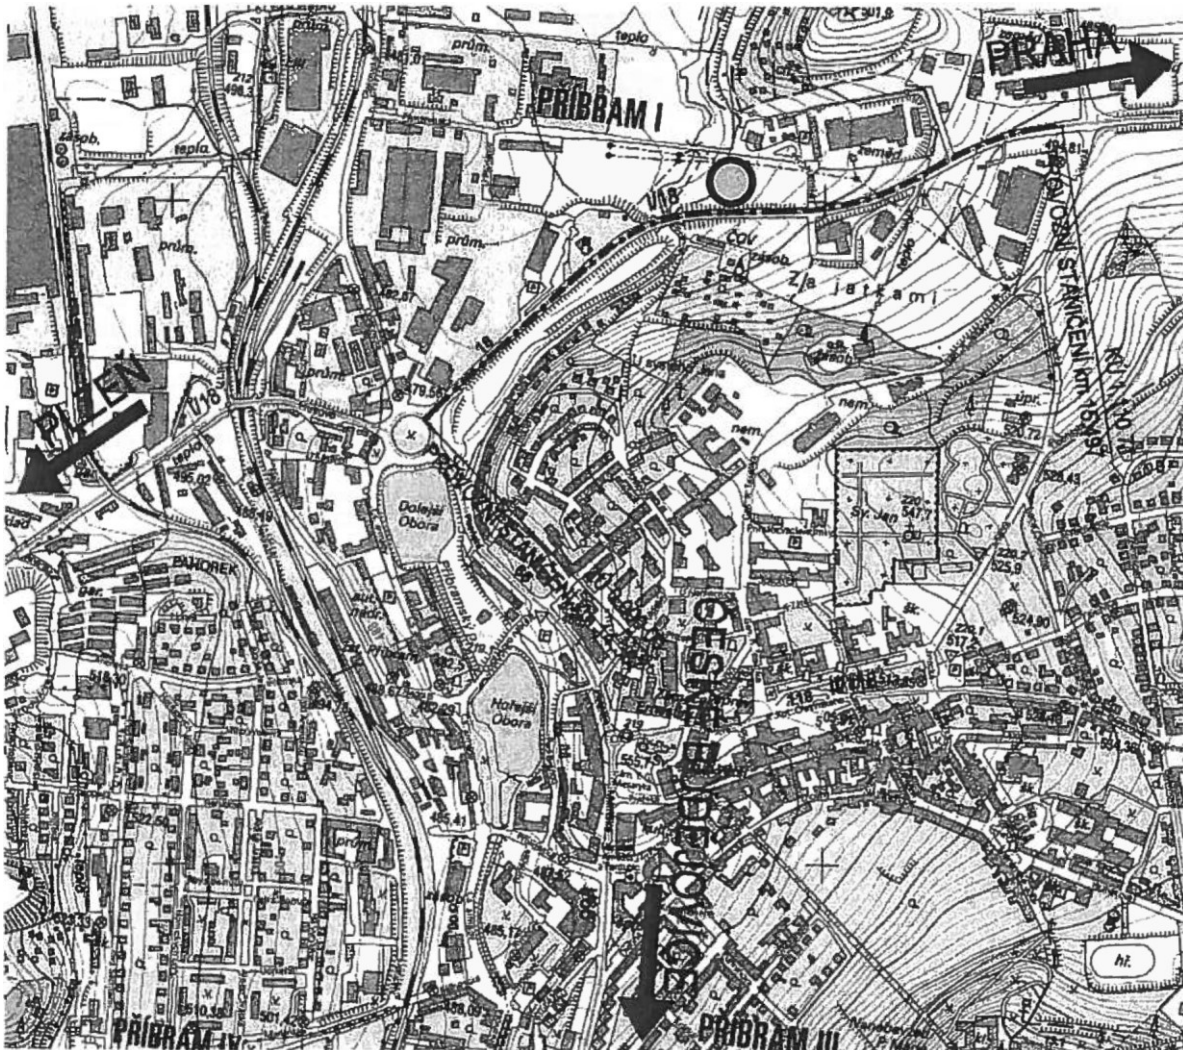

Legenda:

Zařízení staveniště — uvažováno v polovině úseku výstavby

Orientační časový plán stavby I/18 Příbram, ulice Evropská

Příloha:

OBJ.	Označení práce	Rok	2016		
		Měsíc	10 říjen	11 listopad	12 prosinec
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	Zahájení 2016			
SO 101	Komunikace				
	Příprava území, demolice				
	Zemní práce, odstranění kanalizace				
	Osazení nové kanalizace				
	Frézování				
	Vozovkové souvrství, krajnice				
	Trvalé DZ, silniční svodidla				
	Úprava území a dokončovací práce				
SO 120	DIO				

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7
SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost Metrostav a.s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 OO Praha 8, IČ: 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/18 Příbram ulice Evropská, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 636614 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a Smlouvou (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:

Název / jméno	IC / datum narození	Sídlo / bydliště
Metrostav a.s.	00014915	Koželužská 2450/4 180 OO Praha 8

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Praze dne 30.8.2016

Metrostav a.s.

System výstupní kontroly realizační dokumentace stavby

Realizační dokumentace stavby (RDS) je z pozice zhotovitele kontrolována ještě před odevzdáním konceptu RDS. Projektant realizační dokumentace stavby předá pro tyto účely zhotoviteli paré dokumentace, do které jsou případné nedostatky vyznačeny, -případně popsány. Paré dokumentace pro kontrolu zhotovitelem, předá projektant RDS odpovědné osobě zhotovitele (která má patřičnou odbornou způsobilost ke kontrole RDS) pět pracovních dní před termínem vydání čistopisu, z toho tři dny je na provedení kontroly zhotovitelem a dva dny na zapracování připomínek projektantem RDS. Dokumentace je následně předána zpět projektantovi s průvodním dopisem. Projektant následně nedostatky upraví a vydá koncept RDS, který je již připomínkován pouze objednatelem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Zhotovitel kontroluje zda-li je dokumentace v souladu se smluvními podmínkami (ČSN,

TKP, ZTKP, a další smluvní dokumenty), zda-li je technické řešení technologicky proveditelné a jestli obsahuje veškeré formální náležitosti dle souhrnu smluvních dohod.

Kontrolu RDS provádí technické oddělení zhotovitele osobami s požadovanými autorizacemi. Nezávislou kontrolu RDS budou provádět tyto osoby v zaměstnaneckém poměru zhotovitele:

V Praze dne 30.8.2016

Metrostav a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.12
SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost Metrostav a.s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %/0, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakáz řesahuje 1 rok
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]		
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
		[bude doplněno]

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/18 Příbram ulice Evropská, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 636614 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % (z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok).

alternativa A

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníkům akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	
[bude doplněno]	[bude doplněno]

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění Smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníkům akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.

V Praze dne 30.8.2016

Mefrostav a.s.

CD-R

compact disc
digital audio
recording

80 min

„I/18 Příbram ulice Evropské“
- smlouva podmínky - obecní,
zvláštní, technické spec.,
výkresy
