

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MS/2018/00267
Číslo smlouvy stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8020000034
Registr smluv: ANO



S00AP00WMRS6

PVMU 22962/2019 60
SPOF 56.f S 10
LISTU⁰ 19 STRAN 32

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍŤE ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ**
č. VPI/MS/2018/00267

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Statutární město Prostějov

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“), v platném znění mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená na základě pověření Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě

[REDAKCE]

(dále „**CETIN**“)

a

Statutární město Prostějov

se sídlem náměstí T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

IČO : 002 88 659

DIČ : CZ 002 88 659

zastoupené Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města

[REDAKCE]

(dále „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace a specifikace nákladů Překládky;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 20.7.2018 vydané pod čj. 672724/18 včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst.17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.

1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIK_Žešov_rekonstrukce komunikace“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Cenovém a technickém návrhu Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „CTN“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
- ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.
(vše dále „Předpoklady pro realizaci Překládky“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení CTN
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky,
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),

- ii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka“),

Stavebník se zavazuje po nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky, převést na CETIN práva a povinnosti z tohoto územního rozhodnutí týkající se Překládky (uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy a předat toto územní rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 4 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízení.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této Smlouvy činí **185.155,-Kč**. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně :

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY


- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:
 - a) Fakturu č. 1 za CTN ve výši **12.065,- Kč** do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
 - b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.
- 6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode dne ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE


- 7.1 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Sankce je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.3 Povinností zaplatit sankci, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit sankci může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.4 Povinnost zaplatit sankci, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.
- 7.5 Pro případ, že realizace překládky nebude dokončena ve smluvené lhůtě nebo v jiné lhůtě dohodnuté se Stavebníkem a dojde tak k prodlení s navazujícími stavebními pracemi pro akci uvedenou v článku 1, zaplatí CETIN stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky uvedené v článku 5 odst. 5.2. za každý den prodlení s dokončením Překládky dle této smlouvy. Povinnost nahradit škodu Stavebníkovi tímto ustanovením není dotčena.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1



8.2



9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 9.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 9.2 S ohledem na ustanovení odst. 9.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 10.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména Zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.
- 10.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 10.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 10.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.
- 10.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

- 11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 11.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 11.12 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 11.13 CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně

mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

11.14 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN


Příloha č. 2 – Specifikace nákladů Překládky

Příloha č. 3 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor


Doložka

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Prostějova na schůzi č. 7, usnesením č. 9064 dne 22.1.2019.

CETIN:



Stavebník:



VPIC_Žešov_rekonstrukce komunikace

1 Technická zpráva

1.1 Vstupní podklady:

Poptávka stavebníka, projekt generálního projektanta stavby, podklady GWS.

1.2 Navrhované řešení:

Rekonstrukce komunikace v Prostějově, místní části Žešov vyvolá nutnost ve 2 dotčených místech stranovou překládku a v dalších 4 dotčených místech kontrolu popř. doplnění či prodloužení mechanické ochrany v křížení komunikací na stávajících trasách SEK CETIN. Dotčena bude pouze metalická síť, úložné kabely:

- Místo č.1_doplnění mechanické ochrany v křížení silnice mezi č.p.38/č.p.11_kabely TCEKE 35XN0,4 a TCEKE 5p 0,5
- Místo č.2_doplnění mechanické ochrany v křížení silnice mezi č.p.34/č.p.17_kabel TCEKE 2,5XN0,4 a stranová překládka v dl. cca 26m mimo novou obrubu nového park.stání_kabely TCEKE 35XN0,4 a TCEKE 2,5XN0,4
- Místo č.3_doplnění mechanické ochrany v křížení silnice naproti č.p.31_kabel TCEKE 20XN0,4
- Místo č.4_doplnění mechanické ochrany v křížení silnice naproti č.p.42_kabel TCEKE 10XN0,4
- Místo č.5_překládka trasy v křížení křižovatky mezi č.p.87/č.p.84 v dl.cca 27m_kabely TCEKE 10XN0,4

Rekonstrukce komunikace je rozdělena do dvou etap.

V první etapě viz místo č.4 a č.5 již rekonstrukce komunikace probíhá. Stavební firma STRABAG realizující komunikaci provedla pod dohledem POS CETIN (Bohumil Gartner) výkop po stávající trase SEK v místech č.4 a č.5 dle PD stavebníka. Byly doplněny uvedené mechanické ochrany a doplněny prázdné rezervní chráničky HGR110 ze stávající trasy SEK CETIN na druhou stranu komunikace. Před záhozem byl v době realizace přizván správce sítě CETIN ke kontrole.

V druhé etapě budou realizovány zbývající místa č. 1, 2, 3.

V rámci této akce dojde ke kompletnímu GEO zaměření včetně REZ chrániček položených přes komunikace, doplnění markerů uzavření VBŘ, zapracování do systémů CETIN.

Trasa kabelu je v kat. území Žešov.

Stavební titul : bude zajišťovat stavebník, Magistrát Prostějov na všechna dotčená místa

Bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VBŘ s vlastníkem dotčených parcel.

Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, bude vyhotoven geometrický plán, uzavřena konečná smlouva o VBŘ a zavkládáno VBŘ do KN.

1.3 Popis tras

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

1.4 Použitá technologie:

Kabely: TCEPKPFLE

Kabelové soubory a přechody přes komunikace budou označeny Minimarkery 3M , typ 1255.

1.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle předpisu TPP2001- 4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi a kontinuity stínění proti provoznímu páru.

Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

1.6 Koordinace:

Navrhovaná trasa bude koordinována s generálním dodavatelem stavby, STRABAG, hl.stavbyvedoucí [REDACTED]

1.7 Ostatní:

Kontakty

Stavebník a žadatel :


Statutární město Prostějov, Nám.T.G.Masaryka 130/14, 79601 Prostějov, IČO 00288659, DIČ CZ00288659,
[REDACTED]

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.


2. Podmiňující, související a navazující stavby nejsou


3. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
Přehledová situace	CTN
Polohopis	CTN
Schéma	CTN
Situace stavebníka	CTN
Vyjádření o existenci SEK (672724-18)	CTN
Kalkulace nákladů, rámcový zhotovitel	CTN
Výpisy KN	CTN
Poznámky k PPD	CTN

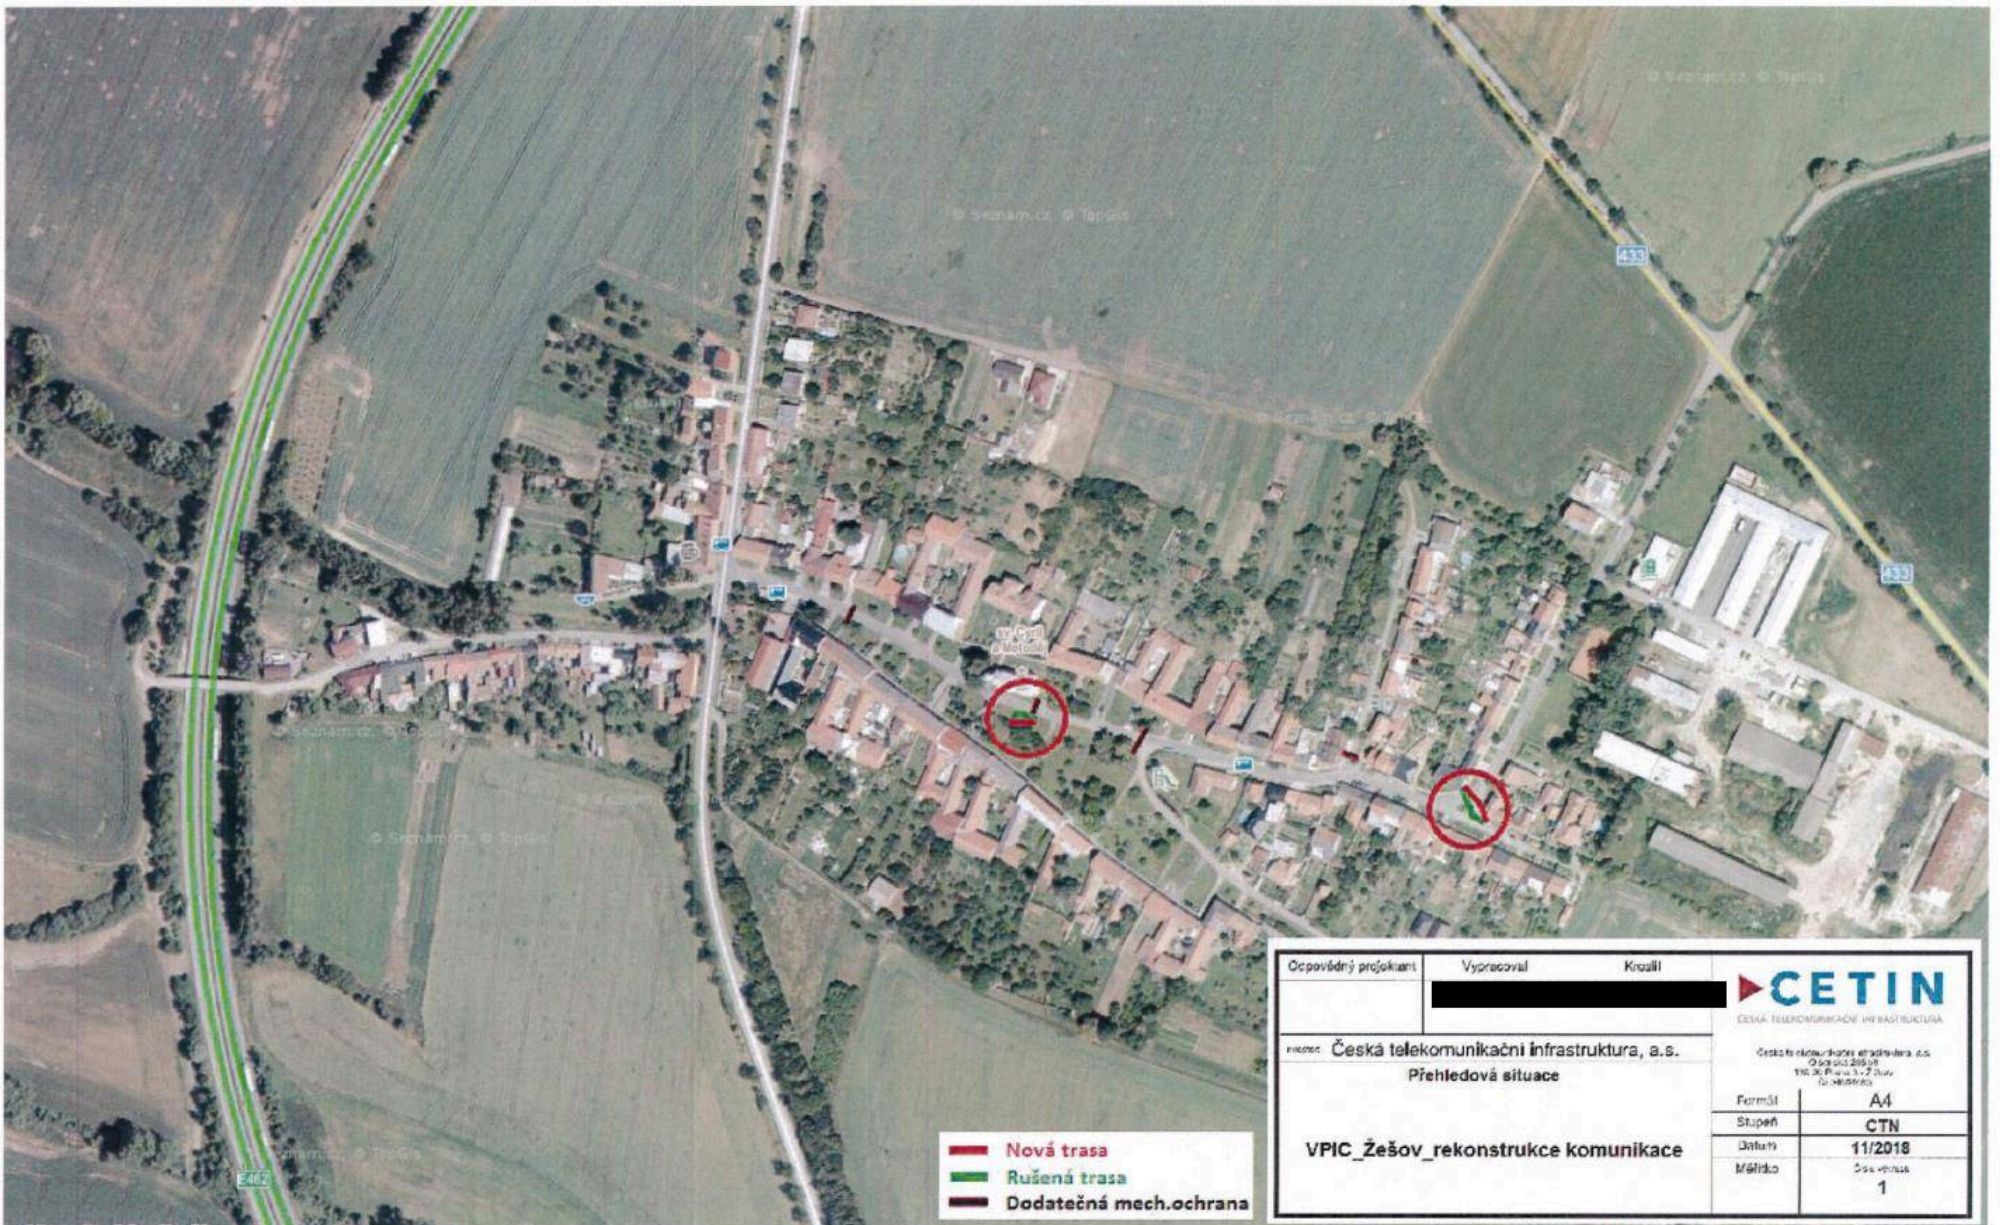

- Nová trasa
- Rušená trasa
- Dodatečná mech.ochrana

Odpovědný projektant Vypracoval Kreslil	[Redacted] [Redacted]	 ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA
investor: Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Přehledová situace		
VPIC_Žešov_rekonstrukce komunikace		Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Opatřovací úsek 110 20, Píseňská 3-7, Žešov 250 01 Žešov
		Formát: A4
		Stupeň: CTN
		Datum: 11/2018
		Měřítko: Stav. výkres 1

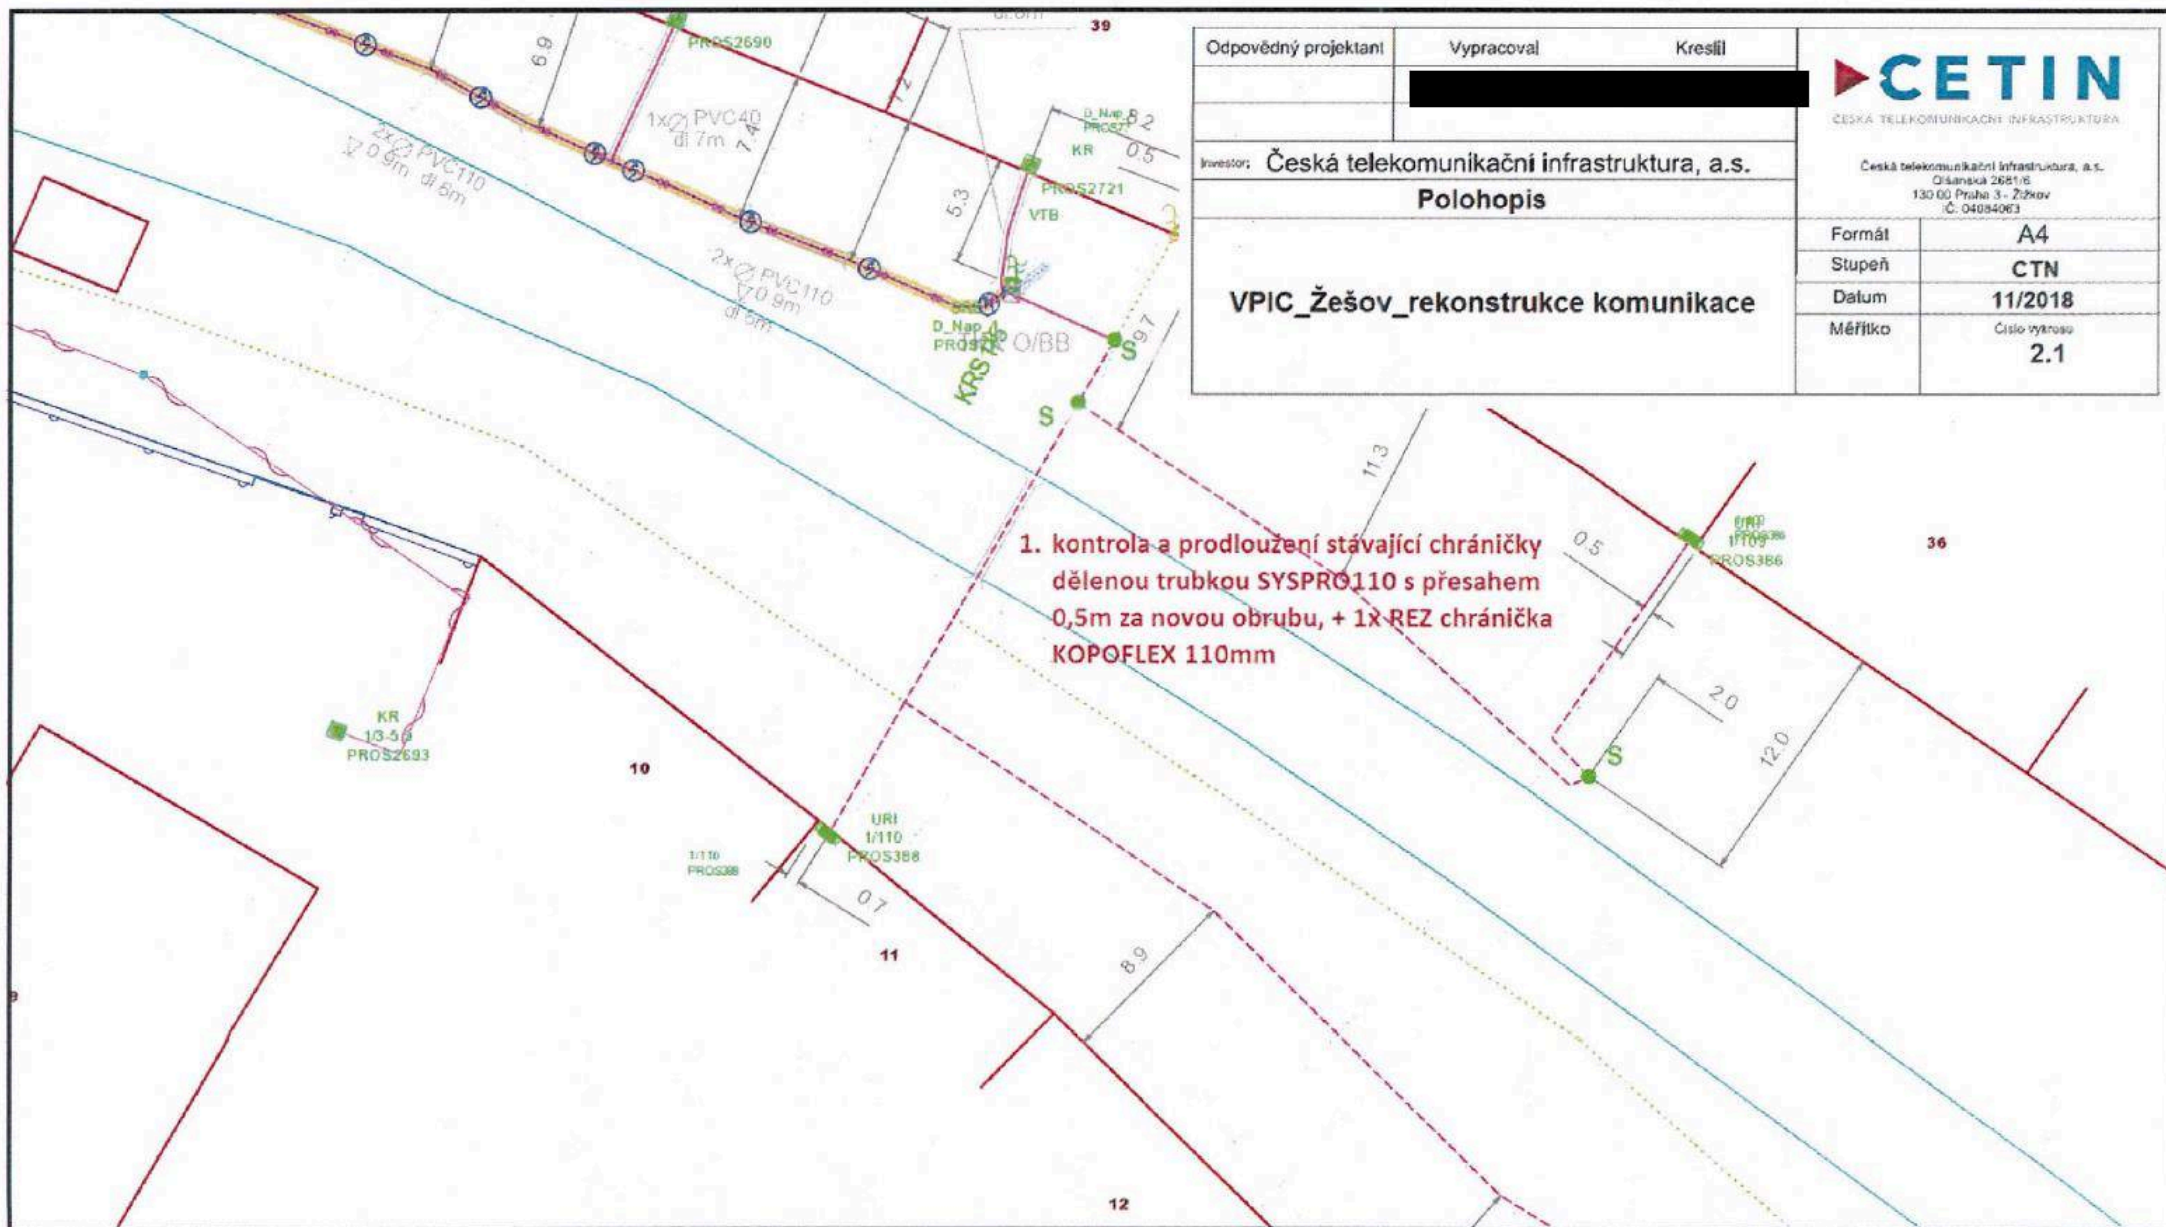

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil




Investor: Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
Polohopis

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
 Ošánská 2681/8
 130 00 Praha 3 - Žižkov
 IČ: 04084063


VPIC_Žešov_rekonstrukce komunikace

Formát	A4
Stupeň	CTN
Datum	11/2018
Měřítko	Číslo výkresu 2.1


1. kontrola a prodloužení stávající chráničky dělenou trubkou SYSPRO110 s přesahem 0,5m za novou obrubu, + 1x REZ chránička KOPOFLEX 110mm

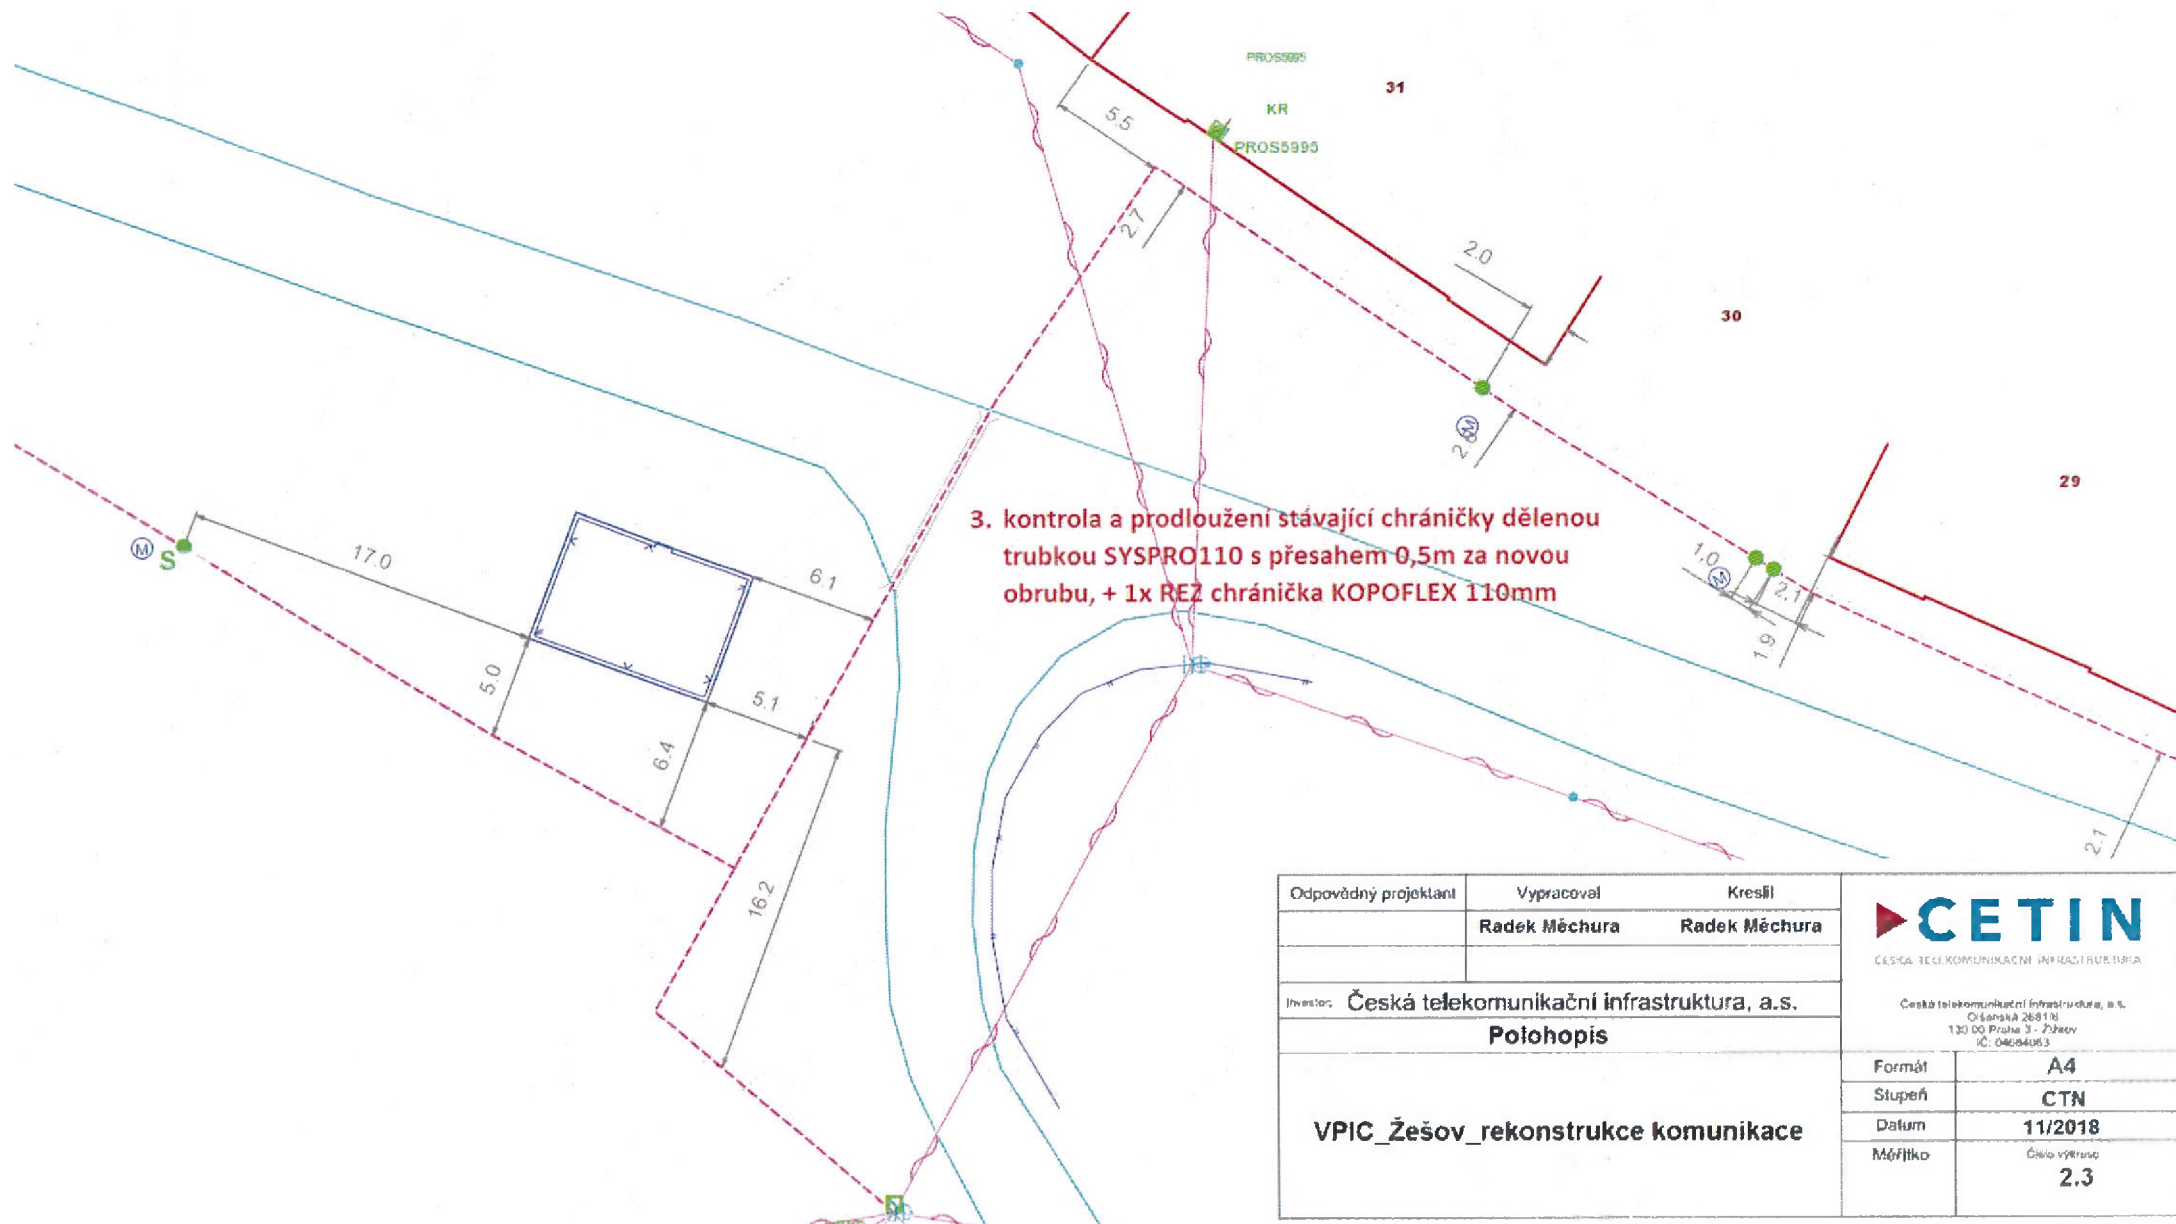

3. kontrola a prodloužení stávající chráničky dělenou trubicou SYSPRO110 s přesahem 0,5m za novou obrubu, + 1x REZ chránička KOPOFLEX 110mm

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	 <small>ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA, a.s.</small>	
	Radek Měchura	Radek Měchura		
Investor:	Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.		<small>Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Ošanská 2681/8 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 04604953</small>	
Polohopis			Formát	A4
VPIC_Žešov_rekonstrukce komunikace			Stupeň	CTN
			Datum	11/2018
			Měřítko	Cíle výkresu 2.3

Číslo stránky: 1

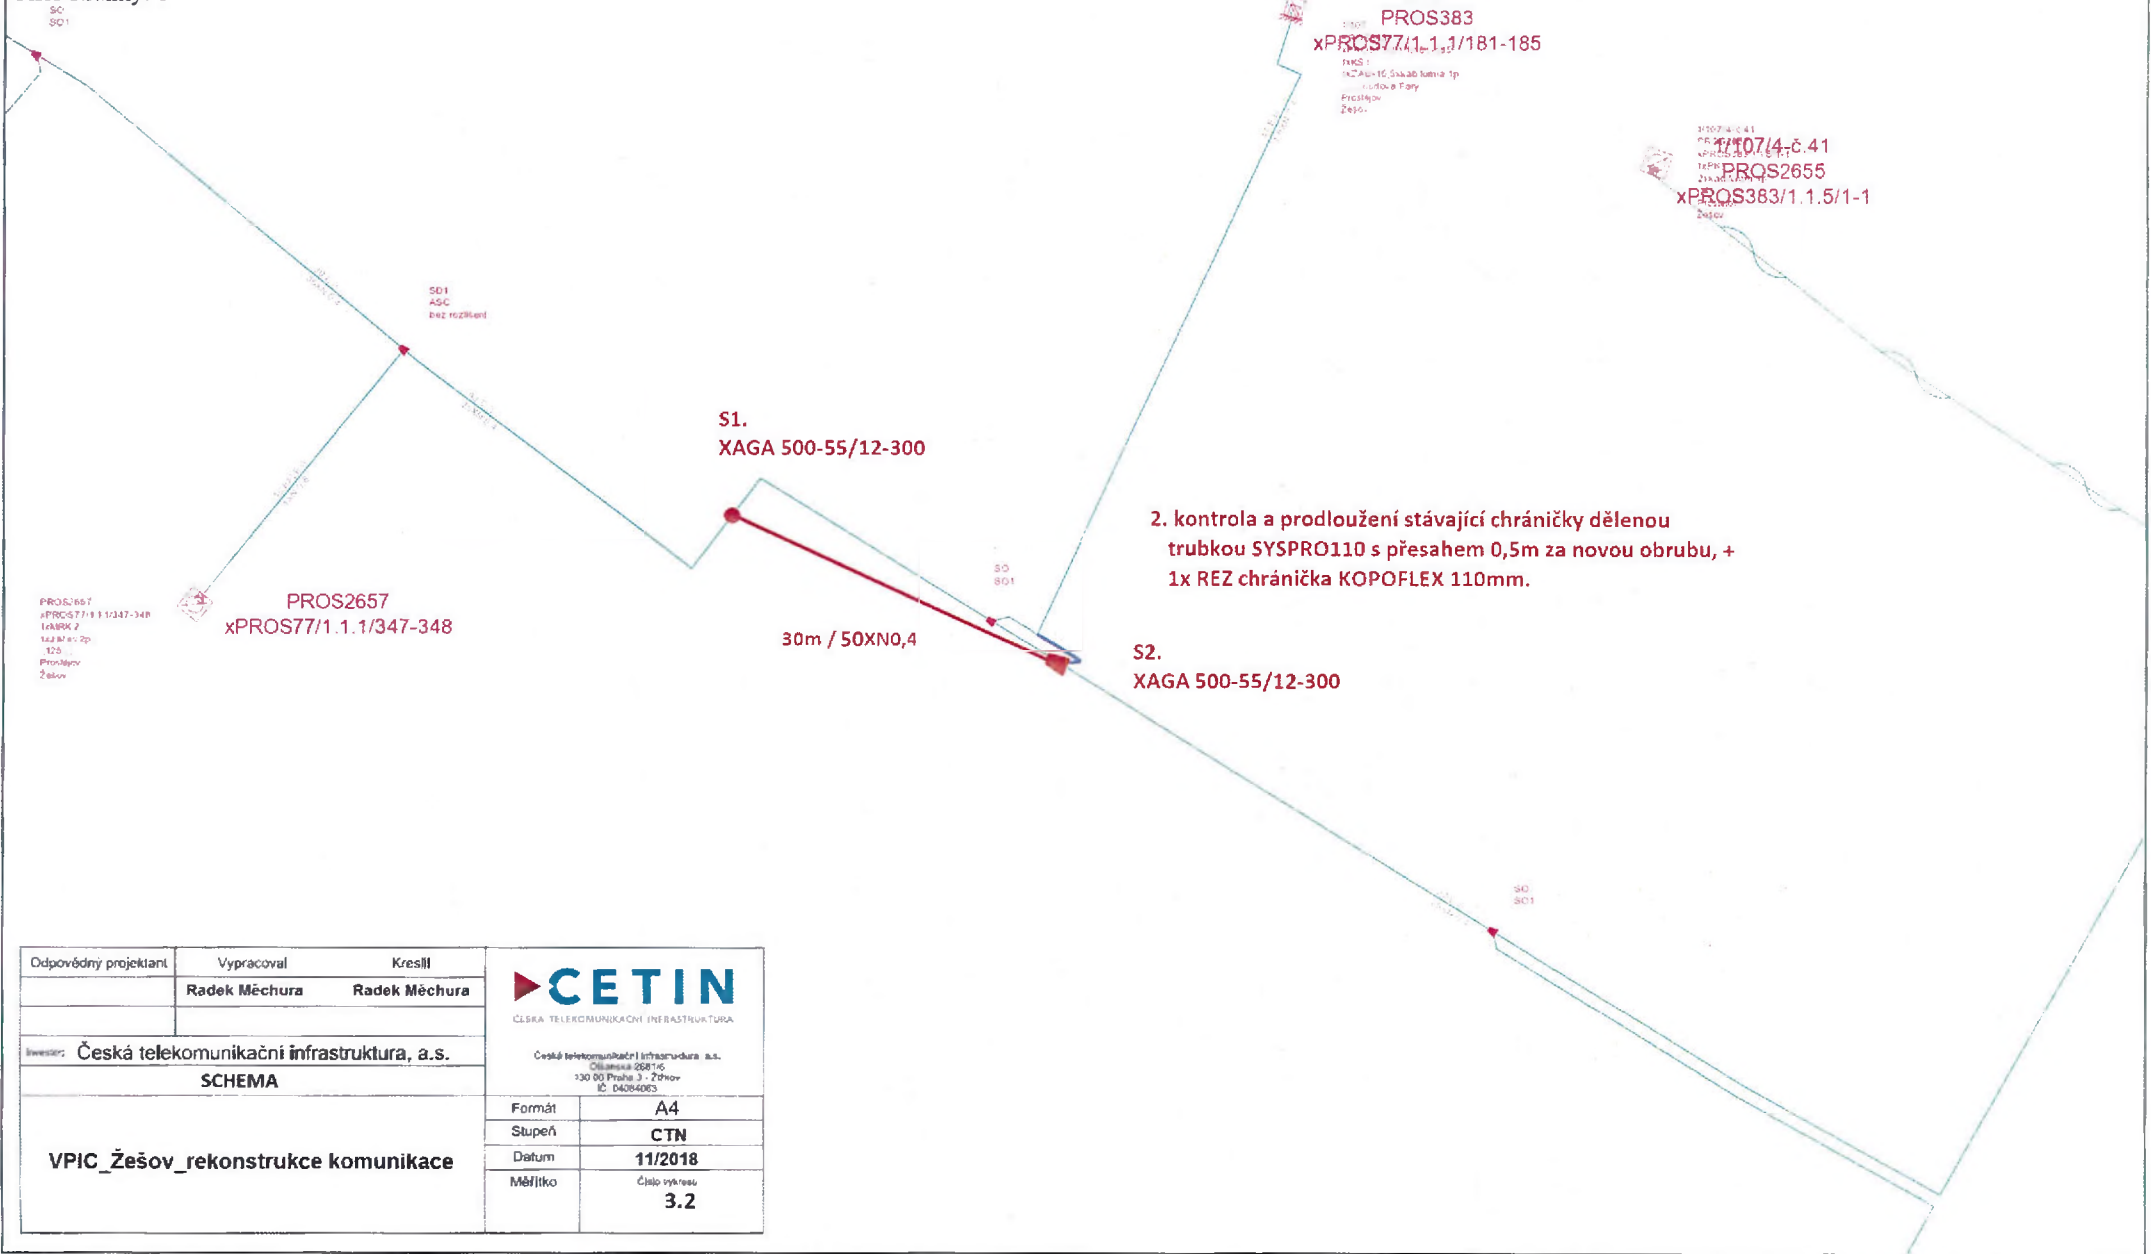

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil
	Radek Měchura	Radek Měchura
CETIN ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA		
Investor: Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.		
SCHEMA		
Formát		
Stupeň		
Datum		
Měřítko		
VPIC_Žešov_rekonstrukce komunikace		
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Obláskova 2681/6 130 00 Praha 3 - Žitov IČ: 04084083		
A4		
CTN		
11/2018		
Číslo výkresu 3.2		

1/102
 PROS375
 xPROS77/1.1.1/146-150
 1xMSD 3 - QT
 2xMSD - C přímová
 skup. vlnový rozvaděč
 Přodávav
 Žešov

S3.
 XAGA 500-43/8-150

REZ

4 78,97
 2 2500
 2 2500

31m / 10XN0,4

10XN0,4

KR 85

KR 85

SC1
 XAGA500
 43/8-150

PROS6023
 xPROS375/1.1.1/15-16
 1xMSD 2
 1xZDF 1xZP
 57
 Přodávav
 Žešov

PROS6023
 xPROS375/1.1.1/15-16


S5.
 XAGA 500-43/8-150

15m / 10XN0,4

S4.
 XAGA 500-43/8-150

1/102
 PROS373
 xPROS77/1.1.1/141-145


1/102
 PROS373
 xPROS77/1.1.1/141-145
 1xMSD 3 - QT
 2xMSD - C přímová
 skup. vlnový rozvaděč
 Přodávav
 Žešov

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	 ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA
Investor: Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.			Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Opatovská 2681/6 130 03 Praha 3 - Žitněv IČ: 04084063
SCHEMA			
VPIC_Žešov_rekonstrukce komunikace		Formát	A4
		Stupeň	CTN
		Datum	11/2018
		Měřítko	Číslo výkresu 3.5

Parcela	Stavba	Jednotka	Právo stavby	Řízení	Mapa	Kat. území
---------	--------	----------	--------------	--------	------	------------

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	422
Obec:	Prostějov [5892301]
Katastrální území:	Žešov [796671]
Číslo LV:	I
Výměra (m ²):	8679
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha

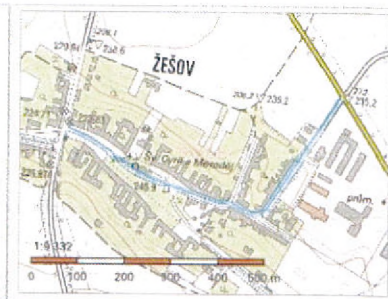

Sousední parcely

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno vedení

Věcné břemeno zřízení a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2018 22:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	410/1
Obec:	Prostějov (589250)
Katastrální území:	Želčiv (796671)
Číslo LV:	1
Výměra (m ²):	2134
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno vedení

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2018 22:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	411
Obec:	Prostějov [589250]
Katastrální území:	Žešov [796671]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	12187
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [katastrální úřad s.p. Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2018 22:00:00.

Parcela	Stavba	Jednotka	Právo stavby	Řízení	Mapa	Kat. území
---------	--------	----------	--------------	--------	------	------------

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	412/1
Obec:	Prostějov [589250]
Katastrální území:	Žešovy [796671]
Číslo LV:	1
Výměra (m ²):	4065
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitosti
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
------------------	-------

Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2018 22:00:00.

Příloha č. 2 Specifikace nákladů_VPIC_Žešov_rekonstrukce komunikace

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2018.12

Položková 2018.12

Název stavby: VPIC_Žešov_rekonstrukce komunikace

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	12 065,29 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	93 090,77 Kč
MONTÁŽ	38 047,35 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	11 795,98 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 783,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	22 335,54 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	1 000,00 Kč

Celkové náklady: 185 154,56 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 165 269,64 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 19 884,92 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 065,29 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	35.00 m	635,25 Kč
952367 S		Pokládka žlabů TK1	12.00 m	870,96 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	30.00 m	15 859,80 Kč
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	54.00 m	74 463,84 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	116.00 m	1 260,92 Kč
MONTÁŽ				
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	46.00 m	2 225,94 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	471,75 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	46.00 ks	1 669,34 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	46.00 ks	1 113,20 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	254,04 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	3.00 ks	471,75 Kč
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	103.00 ks	2 492,60 Kč

955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické koordinace se stavbou	6200.00 JV	6 200,00 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	5.00 ks	5 745,70 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	30.00 m	762,90 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	6200.00 JV	6 200,00 Kč
	Rozpočtová rezerva		
958469 S	Uvedení stavby do provozu kolaudace	1.00 ks	3 738,60 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	3.00 ks	3 237,09 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	1.00 ks	798,35 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 974,02 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	16.00 m	391,04 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevn	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady za SoSB - odhadovaná	1.00 ks	500,00 Kč
	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 443,92 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 839,11 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. zábory	1000.00 JV	1 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	30.00 ks	1 140,60 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	108.00 m	414,72 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	30.00 m	132,60 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	200.00 m	458,00 Kč
300106 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	46.00 m	1 166,10 Kč
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	30.00 m	2 709,30 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	15.00 ks	3 054,90 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	21.00 ks	484,26 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	2.00 ks	1 277,36 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	2.00 ks	293,36 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks	823,04 Kč
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1.00 ks	515,45 Kč
312881 S		Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	2.00 ks	1 429,20 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	72.00 ks	1 466,64 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	12.00 m	5 539,56 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	35.00 m	1 430,45 Kč

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Z ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

(dále jen „Nabyvatel“)

a

IČ: DIČ:

se sídlem:

zastoupena

na straně druhé

(dále jen „Převodce“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby („dále jen „tato dohoda“).


čl. I.

Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „.....“, kteréžto bylo vydáno dne, (kým) pod čj. a nabylo právní moci dne (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění (dále jen „Stavba“/ event. „Stavební objekt“).

Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby a to právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“), tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

čl. II.

Převodce ke dni podpisu této dohody převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v Rozhodnutí



o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.

čl. III.

Převodce a Nabyvatel prohlašují, že si celý text této dohody pozorně přečetli, plně mu rozumějí a bezvýhradně s ním souhlasí. Připojením svých vlastnoručních podpisů stvrzují, že text této dohody věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli a že tato dohoda není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek pro kteréhokoliv z nich.

čl. IV.

- (1) Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Převodce a po jednom Nabyvatel.
- (2) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Převodcem a Nabyvatelem.

V Brně dne

V

dne
