



**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ č. VPI/MJ/2019/516**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Město Havlíčkův Brod

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“)

mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623
zastoupená Ing. Miroslavem Kotem, Supervizorem, Výstavby PPS Čechy/Morava jih dle pověření

bankovní spojení: PPF banka, Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Město Havlíčkův Brod

se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

IČO: 00267449

DIČ:00267449

zastoupená Mgr. Jan Tecl MBA starosta města

bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod Číslo účtu 0000327521/0100

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, která je přílohou č.1 této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne **16. 5. 2016** vydané společností CETIN pod čj. **611800/16**, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC H.Brod st.úpravy MK Strážná**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se společností CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) podat návrh o vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) a učinit nezbytné kroky směřující k vydání rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.),
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) písemně vyzvat společnosti CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „**Písemná výzva Stavebníka**“) s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve 4 měsíce po uzavření této Smlouvy.

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Stavební úpravy MK ul. Stážná, Waldhauserova, Sekaninova Havlíčkův Brod, Strážná, Sekaninova, č.j. MHB ST/965/2017/Ha ze dne 11.5.2018, které nabylo právní moci dne 13.6.2018, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. Společnost CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

- 4.3 Společnost CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 2 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch společnosti CETIN.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o

elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této Smlouvy činí **81.493,- Kč**. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně :

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,

- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury vystavené společností CETIN po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.2 Faktura dle čl. 6 odst. 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Ludmila Pažoutová
funkce: Specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Milan Baránek
funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť
e-mail: [REDACTED]

- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Josef Beneš
funkce: vedoucí odboru rozvoje města
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Pavel Sláma
funkce: technický dozor objednatele
e-mail: [REDACTED]

- 8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

- 9.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 9.2 S ohledem na ustanovení odst. 9.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná Písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 10.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat

osobní údaje (dále jen „**osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.

- 10.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 10.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 10.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.
- 10.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

- 11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
 - c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).
- 11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 11.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu

s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

11.12 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

11.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

11.14 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky

Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j. MHB ST/965/2017/Ha ze dne 11.5.2018

Doložka


Tato Smlouva byla schválena Radou města [] na schůzi č. [] dne [].


CETIN:


Stavebník:

V Praze dne 20.3.2019

V Havl. Brodě dne 26.3.2019


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Miroslav Kot
Supervizor Výstavba PPS Čechy/Morava jih


Stavebník: Město Havlíčkův Brod
Mgr. Jan Tecl MBA
starosta města



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
219

Obsazení logické vazby pro přepojení

Výtisk: x0535571

Datum: 05.02.2018

Vazba: (IO) : (SR)(HVB-H-HAVLIČKŮV_BROD)HVB67 [D_Nap_102]-(UR)(HVB-H-HAVLIČKŮV_BROD)HAVB312 [102/1] COP50XN_0,4_TCEPKPFLE(1):1

Pár:	Zakončení od - do:	St:	Typ služby:	Tel.číslo:	CASE ID:	Jméno zákazníka:	Adresa zákazníka:
4	1/1/1/104 - 1/1/1/4	IO	DSL (K)		HAVB/CTN/CETIN/CZE-HAVE 7154155		Havličkův Brod, 3328, Strážná

Rozpárovací tabulka																															
Název rozváděče - nový				Název rozváděče-původní				Poznámka 1 - rozváděče																							
HAVB312				102/1				tiskárna																							
Adresa umístění rozváděče dle ROP								Typ rozv.				Výstroj rozváděče 1x SID-CD 10p. rozp.; 1x SID-CD 40x1 uzem.; 12x kab.forma 1p.																			
Havlíčkův Brod, 3328, Strážná								UR																							
Typ skříňné rozváděče				Umístění skříňné rozváděče				EPJ																							
MIS 1b - QT				SKŘÍŇ NA ZDI				OBJ																							
Název /číslo - skříňné				Poznámka - skříňné																											
1				S1																											
Rozváděč												Měděná vazba / kabel										Propojovaný směr									
skříň	svislice	řada	východní pozice	počet párů ve vazbě	Pozice od - do	typ zakončení	název vazby	typ kabelu	označení kabelu, číslo kabelu	páry kabelu	směr z / do	typ rozváděče	název rozv. nový	název rozv. původní	typ skříňné	typ zakončení	skříň	svislice	řada	východní pozice	Pozice od - do										
1	1	1	1	10	1-10	SID-CD rozp.10p	50XN_0,4_TCEP KPFILE(1):1				z	SR	HAVB67	D_Nap_102	mDSLAM 450 HD	HD180 10x1 sv.blok	1	1	1	101	101-110										
1	1	1	3	1	3-3	SID-CD rozp.10p	334429856:				do	BUD EMPTY01633 OVA 220																			
1	1	1	4	1	4-4	SID-CD rozp.10p	334431432:				do	BUD EMPTY01633 OVA 220																			
1	UK	1	1	6	1-6	kab.forma 1p.	3XN_0,4_TCEPK PFLE(1):1	3XN 0,4TCEP KPFILE		1-6	do	VTA	HAVB4716 d	130Havl.Bro d	MRK 2	kab.forma 1p.	1	1	1	1	1-6										
1	UK	2	1	6	1-6	kab.forma 1p.	3XN_0,4_TCEPK PFLE(2):1	3XN 0,4TCEP KPFILE		1-6	do	KR	HAVB1907	1432Havl.Br od	KO 68 el.krab.ku latá	kab.forma 1p.	1	1	1	1	1-6										

Obsazení logické vazby pro přepojení

Vytiskl: x0535571

Datum: 05.02.2018

Vazba: (IO) : (SR)(HVB-H-HAVLIČKŮV_BROD)HAVB67 [D_Nap_102]{(UR)}(HVB-H-HAVLIČKŮV_BROD)HAVB317 [102/2] COP50XN_0,4_TCEPKPFLE(1):11

Pár:	Zakončení od - do:	St:	Typ služby:	Tel.číslo:	CASE ID:	Jméno zákazníka:	Adresa zákazníka:
3	1/1/1/113 - 1/1/1/3	IO	DSL (K)	HAVB/CTN/CETIN/CZE-HAVE	8323711	Havličkův Brod, 357, Strážná	

Rozpárovací tabulka

Název rozváděče - nový		Název rozváděče-původní		Poznámka 1 - rozváděče																	
HAVB317		102/2																			
Adresa umístění rozváděče dle ROP																					
Havlíčkův Brod, 357, Strážná		UR		Typ rozv.																	
Typ skříňové rozváděče		EPJ		Výstroj rozváděče																	
MIS 1b - QT		OBJ		1x SID-CD 10p. rozp.; 1x SID-CD 40x1 uzem.																	
Název / číslo - skříňové		Umístění skříňové rozváděče																			
1		SKŘÍŇ NA ZDI																			
		Poznámka - skříňové																			
		S1																			
Rozváděč				Měděná vazba / kabel				Propojovaný směr													
skříň	svíslíce	řada	východní pozice	počet pářů ve vazbě	Pozice od - do	typ zakončení	název vazby	typ kabelu	označení kabelu, číslo kabelu	páry kabelu	směr z / do	typ rozváděče	název rozv. nový	- název rozv. původní	typ skříňové	typ zakončení	skříň	svíslíce	řada	východní pozice	Pozice od - do
1	1	1	1	10	1-10	SID-CD rozp. 10p	50XN_0.4_TCEP KPFL(1):11				z	SR	HAYB67	D_Nap_102	mDSLAM 450 HD	HD180 10x1 sv.blok	1	1	1	111	111-120
1	1	1	1	1	1-1	SID-CD rozp. 10p	97720755				do	BUD OVA 237	EMPTY01635								
1	1	1	2	1	2-2	SID-CD rozp. 10p	334429544:				do	BUD OVA 218	EMPTY01633								
1	1	1	3	1	3-3	SID-CD rozp. 10p	58144874				do	BUD OVA 218	EMPTY01633								

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2397/2
Obec:	Havlíčkův Brod [568414]
Katastrální území:	Havlíčkův Brod [637823]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	6262
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno zřízení a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 29.01.2018 10:00:00.

© 2004 - 2018 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.1 build 0

Název stavby:

VPIC H. Brod st. úpravy MK Strážná

SAP: 16010-045268

Stupeň dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

Investor akce:

Město Havlíčkův Brod

Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2

Dodavatel stavby:

Dle výběrového řízení

Zpracovatel dokumentace:

ZLINPROJEKT a.s.

Pod Šternberkem 306

763 02 Zlín – Louky, www.zlinprojekt.cz

Zakázka č.: ZP-6732/18

Autorizovaná osoba:

Ing. Přemysl Zlobický

Datum:

02/2018

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ PRŮMYŠLOVÁ


zlinprojekt.

Titulní list

Obsah dokumentace pro provádění stavby

	Název	Počet listů	List číslo
1	Titulní list	1	1
2	Obsah dokumentace pro provádění stavby	1	2
3	A. Průvodní zpráva	2	3-4
4	B. Souhrnná technická zpráva	7	5-11
5	E. Rozpočtová (dokladová) část		
	E.1 Rozpočtová část	3	12-14
	E.2 Informace o parcelách	1	
6	C. Situační výkresy	-	-
	Katastrální mapa (M 1:1000)	1	C1
	Polohopisná situace (M 1:500)	1	C2
7	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
	Schéma metalického kabelu	1	D1
	Vzorové řezy výkopů	1	D2
	Tabulky rozpárování a obsazenosti	4	
	Celkem listů	23	

A. Průvodní zpráva

A. 1 Identifikační údaje

A. 1. 1. Název stavby

VPIC H. Brod st. úpravy MK Strážná
- montáž metalického kabelu

A. 1. 2. Investor stavby

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkově náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2

A. 1. 3. Číslo stavby objednatele

16010-045268

A. 1. 4. Uživatel stavby

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

A. 1. 5. Místo stavby

k. ú. Havlíčkův Brod

A. 1. 6. Obec

Havlíčkův Brod

A. 1. 7. Odvětví

Telekomunikace

A. 1. 8. Charakter stavby

Novostavba

A. 2 Účel stavby

Stavba řeší přemístění trasy telekomunikačního vedení z důvodu stavební úpravy místní komunikace v ul. Strážná v Havlíčkově Brodě.

A. 3 Výchozí podklady

- Zadávací dokumentace zpracovaná investorem akce.
- Podklady technické dokumentace spol. CETIN.
- Místní šetření projektanta.

A. 4 Charakteristika stavby

Projektová dokumentace předmětné akce řeší:

- Překládku metalického kabelu.

A. 5 Členění stavby

Tato stavba není členěna.

A. 6 Související investice, podmiňující investice

Tato akce je prováděna z důvodu stavební úpravy místní komunikace v ul. Strážná v Havlíčkově Brodě.

Vypracoval:

Ing. Smýkal

Kontroloval:

Ing. Mršina

Zakázka č.:

ZP-6732/18

Strana č.: 3

A. 7 Předpokládaný termín zahájení a ukončení stavby

2018

A. 8 Celkové náklady stavby

Celkové náklady budou vyčísleny investorem akce dle výkazu výměr, který je součástí této projektové dokumentace.

A. 9 Kontaktní údaje

A. 9. 1. Investor akce

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2

Kontakt na projektanta: Ing. J. Marek, DMC H. Brod, s.r.o., tel.
569 400 525, 602 234 377, e-mail: marek@dmchb.cz

A. 9. 2. Dodavatel stavby

Dle výběrového řízení

A. 9. 3. Zpracovatel dokumentace pro provádění stavby

ZLINPROJEKT a.s.

Zodpovědný projektant Ing. Přemysl Zlobický,
577 607 240, 602 787 202
premysl.zlobicky@zlinprojekt.cz

Projektant: Ing. Jiří Smýkal
577 607 254, 773 838 722
jiri.smykal@zlinprojekt.cz

Vypracoval:

Ing. Smýkal

Kontroloval:

Ing. Mrlina

Zakázka č.:

ZP-6732/18

Strana č.: 4

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY

Stavba řeší přemístění trasy telekomunikačního vedení z důvodu stavební úpravy místní komunikace v ul. Strážná v Havlíčkově Brodě.

Stavba nebude vyžadovat trvalý zábor zemědělského ani lesního půdního fondu.

Výstavbou a provozem nedojde k trvalému negativnímu ovlivnění životního prostředí. Při realizaci stavby bude dbáno, aby nedošlo k trvalému poškození porostů a veřejné zeleně.

Z hlediska PO je stavba bez požárního rizika.

Z hlediska CO nedojde ke zhoršení systému CO, ale naopak dojde k jeho zlepšení.

Ochranná pásma souběžných a křížených inženýrských sítí dle ČSN budou dodržena.

B.2. PROVEDENÉ PRŮZKUMY

Tato akce je prováděna z důvodu stavební úpravy místní komunikace v ul. Strážná v Havlíčkově Brodě.

Akce řeší stranovou přeložku SEK.

B.3. POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY, ZAMĚŘENÍ A OVĚŘENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ

Veškeré zakreslené inženýrské sítě jsou pouze orientační, jelikož převzaté podklady jsou pouze informativní a často nepřesné.

B.4. PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU

Zařízení staveniště bude umístěno po dohodě s Městským úřadem Havlíčkův Brod. Přebytková zemina a jiný odpad bude odvezen na skládku.

B.5. TLAKOVÁ OCHRANA

Celistvý polyetylenový plášť použitého kabelu a plnění mezižilních prostor vazelínou zajišťuje ochranu proti zatečení, zvlhnutí, vztlínání vody a korozi.

Vypracoval:

Ing. Smýkal

B.6. VLIVY VN, VVN A STŘÍDAVÉ TRAKCE

V oblasti se nenachází vedení, které by způsobilo výrazné rušivé vlivy.

Kontroloval:

Ing. Mrlna

B.7. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ CELKOVÉ KONCEPCE ŘEŠENÍ

Zemní kabel TCEPKPFLE 10XN0,4 bude stranově přeložen v délce cca 24. Bude na něm zrušena stávající dělicí spojka před č.p.1432, která bude nahrazena novou spojkou XAGA. Z této nové spojky bude vycházet stávající kabel TCEPKPFLE

Zakázka č.:

ZP-6732/18

Strana č.: 5

5XN0,4 směřující do ÚR HAVB317 a stranově přeložený kabel TCEPKPFLE 5XN0,4, směřující do ÚR HAVB312.

Pod vjezdy do domů bude přeložený kabel uložen do chráničky PE 110mm. Vše bude osazeno markery.

B.8. POPIS KABELOVÝCH ROZVODŮ

Zemní kabel TCEPKPFLE 10XN0,4 bude stranově přeložen v délce cca 24. Bude na něm zrušena stávající dělicí spojka před č.p.1432, která bude nahrazena novou spojkou XAGA. Z této nové spojky bude vycházet stávající kabel TCEPKPFLE 5XN0,4 směřující do ÚR HAVB317 a stranově přeložený kabel TCEPKPFLE 5XN0,4, směřující do ÚR HAVB312..

Pod vjezdy do domů bude přeložený kabel uložen do chráničky PE 110mm. Vše bude osazeno markery.

Spojky a chráničky budou osazeny Markery. Trasy jsou zakresleny v polohopisu v měř. 1:500.

B.9. POPIS ZEMNÍCH PRACÍ

B.9.1. Výkopy

Trasa kabelů bude vedena v chodníku.

Kabely budou ve výkopu uloženy do pískového lože, nad kterým bude uložena krycí deska a min 20 cm pod povrchem bude ve výkopu uložena výstražná folie oranžové barvy.

B.9.2. Hloubka uložení kabelu

Kabely budou ve výkopu pro místní síť uloženy v hloubce:

- chodník 50 cm s krytím kabelu min. 40 cm
- vjezd 70 cm s krytím kabelu min. 60 cm

B.9.3. Prostorové uspořádání sdělovacího kabelu

Při prostorovém umístění sdělovacího kabelu vůči ostatním podzemním sítím je nutno dodržet minimálně (pokud správci sítí ve vyjádřeních neuvádí jinak) vzdálenosti dané ČSN 736005, kde jsou určeny nejmenší vodorovné vzdálenosti při souběhu a svislé vzdálenosti při křížení s podzemními sítěmi.

B.9.4. Přechody

a) Přechod přes komunikace a vjezdy

V rámci projektu dojde k přechodu vjezdů do domů. Kabel bude uložen do chráničky PE 110mm.

b) Přechod přes toky

V rámci projektu nedochází k přechodu vodního toku.

Vypracoval:

Ing. Smýkal

Kontroloval:

Ing. Mršina

Zakázka č.:

ZP-6732/18

Strana č.: 6

c) Přechod přes železnici

V rámci projektu nedochází k přechodu železnice.

B.9.5. Inženýrské sítě

V situačních výkresech jsou zakresleny všechny zjištěné inženýrské sítě získané od správců inženýrských sítí a plánované inženýrské sítě zjištěné od investora výstavby nových objektů obchodního centra.

Veškeré zakreslené sítě jsou pouze orientační, jelikož přebírané podklady od správců sítí jsou pouze informativní a často i nepřesné. Veškeré sítě je nutno před započítáním realizace akce vytyčit, provést sondy a vyznačit v terénu kolíky nebo barvou. Odchyly trasy od projektu budou konzultovány na kontrolních dnech.

K ochraně podzemních sítí před mechanickým poškozením a ke snížení jiných nežádoucích ovlivnění jednotlivých sítí navzájem, musí být při křížení mezi potrubím, stokami, kabely a ochrannými konstrukcemi dodrženy nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti, dále musí být dodrženy příslušné zákony, vyhlášky, normy a vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.

Mechanická ochrana sdělovacích kabelů při křížení a souběhu s jinými sítěmi je řešena uložením sdělovacích kabelů do kabelových žlabů (viz. propočet PPD).

Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi podzemními vedeními

Druh vedení :	kabely		MTS	
	křížení (m)		souběh (m)	
	chráněné	nechráněné	chráněné	nechráněné
- silové vedení do 1 kV	0,10	0,30	0,10	0,30
do 35 kV	0,10	0,80	0,30	0,80
- plynovody do 0,005 MPa	--	0,10	--	0,40
do 0,3 Mpa	--	0,50	--	0,40
- vodovodní potrubí	--	0,20	--	0,40

B.9.6. Definitivní úpravy povrchů

Projekt obsahuje definitivní úpravy povrchů. Po skončení prací bude proveden zához kabelové rýhy s hutněním po vrstvách. Při provádění def. povrchů budou dodrženy technologické podmínky pro jejich provádění a podmínky stanovené jejich majiteli resp. správci.

B.10. POUŽITÝ MATERIÁL A MONTÁŽ KABELŮ

B.10.1. Kabely

Pro místní síť je použit stávající tendrovaný kabel s měděnými jádry průměru 0,4mm typu TCEPKPFLE.

Pokládku a montáž kabelů nutno provést dle výkresu situace, schéma zapojení, předpisů pro podzemní sdělovací vedení a technických podmínek výrobce kabelů. Po montáži kabelových souborů nutno provést předepsaná měření elektrických parametrů.

Vypracoval:

Ing. Smýkal

Kontroloval:

Ing. Mršina

Zakázka č.:

ZP-6732/18

Strana č.: 7

B.10.2. Spojky

Bude použita nová spojka typu XAGA.

B.10.3. Hlavní rozvod

Projektová dokumentace neřeší ukončení kabelu na hlavním rozvodu.

B.10 4. Traťový rozvaděč

Projektová dokumentace neřeší ukončení kabelů v traťovém rozvaděči.

B.10.5. Síťové rozvaděče

Projektová dokumentace neřeší ukončení kabelů v síťovém rozvaděči.

B.10.6. Účastnické rozvaděče

Projektová dokumentace neřeší ukončení kabelů v účastnickém rozvaděči.

B.10.7. Domovní přípojky

Nové domovní přípojky nejsou řešeny.

B.10.8. Uzemnění rozvaděčů

Projektová dokumentace neřeší uzemnění rozvaděčů.

B.10.9. Markery

Markery budou umístěny na spojkách a na obou koncích chrániček.

B.10.10. Nadzemní vedení

Projektová dokumentace neřeší nadzemní vedení.

B. 11. VYROVNÁNÍ KABELŮ

K zajištění potřebné jakosti přenášených signálů je třeba kabely přístupové sítě v důležitých úsecích kapacitně vyrovnávat. Vyrovnávají se kabely delší než 2,0 km a to výhradně metodou křížování žil dle TPP 2001-3; TPP 2001 A.

V rámci této stavby nebude nutno kabely kapacitně vyrovnávat.

B.12. HODNOTA ÚTLUMU A ODPORU

Míra hlasitosti přípojných vedení mezi ISDN ústřednou a koncovým bodem nesmí být větší než 7 dB, smyčkový odpor samotného kabelového vedení napojeného na analogový modul ISDN ústředny je limitován hodnotou $R = 1200 \Omega$ a celková provozní kapacita kabelového přípojného vedení nesmí překročit $0,5 \mu F$.

Vypracoval:

Ing. Smýkal

Kontroloval:

Ing. Mrlina

Zakázka č.:

ZP-6732/18

Strana č.: 8

Pro výpočet útlumových plánů byly použity tyto hodnoty :

Ø mm Cu	odpor Ω/km	útlum dB/km	kapacita nF/km
0,4	300	1,8	49
0,6	130	1,2	49
0,8	74	0,84	49

B.13. ZÁVĚREČNÁ MĚŘENÍ

Účelem závěrečných měření metalických kabelů přístupové sítě je zjištění elektrických parametrů smontované kabel.sítě. Měření se provádějí po ukončení stavebně montážních prací.

U kabelů (včetně kabelů ukončených v koncovce) se měří :

- kontinuita žil
- smyčkové rezistance
- izolační rezistance žil
- kapacitní nerovnováha k1, k2, k3
- provozní útlum
- rezistance stínící fólie
- izolační rezistance stínící fólie
- u kabelů opatřených pancířem a ochranným obalem izolační rezistance pancíře
- rezistance uzemnění u kabelových rozváděčů a dalších objektů, u nichž je uzemnění zřízeno

Měření při zásahu do stávajícího kabelu:

- a) před zásahem – kompletní SS a STŘ měření
- b) po montáži – kompletní SS a STŘ měření + měření útlumu na první čtyřce

Měření kontinuity stínění bude respektovat opatření č.12, které zajišťuje dohled kabelů měřením stínění kabelu proti zemi. Při montáži je nutno dodržet zásady popsané v opatření č.12. Měřicí protokol bude obsahovat údaje, proti kterému provoznímu páru bylo měření kontinuity stínění provedeno. Výsledky se zapisují do protokolů A, B, B1, C, C1, D.

Všechna závěrečná měření provádět dle předpisu TPP 2001-4; TPP 2001 A.

B.14. OCHRANA KABELU

a) Požární bezpečnost

Pro provoz místní telefonní sítě není nutné PO řešit, jelikož ukončení kabelů se nachází v objektech, ve kterých je požární bezpečnost zajištěna provozními řády.

b) Protikorozní ochrana

Celistvý polyetylenový plášť použitého kabelu a plnění mezižilních prostor vazelínou zajišťuje ochranu proti zatečení, zvlhnutí, vztlínání vody a korozi.

c) Ochrana před elektrickými vlivy

Stavba kabelu zajišťuje ochranu před el. vlivy. Rozvaděče budou uzemněny. Ve spojkách musí být stínění propojeno, ale nikdy uzemněno. Při souběhu a křížení s kabely nn, vn je nutno dodržovat ČSN.

Vypracoval:

Ing. Smýkal

Kontroloval:

Ing. Mršina

Zakázka č.:

ZP-6732/18

Strana č.: 9

B.15. HDPE TRUBKY

PD neřeší překládku HDPE trubek.

B.16. VLIV MTS NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Provoz místní telefonní sítě je bez jakéhokoliv negativního vlivu na životní prostředí.

Při realizaci stavby je nutno dodržet vyjádření týkající se životního prostředí. V případech, kdy jde trasa kabelů kolem vzrostlých stromů je nutné dodržet min. vzdálenost výkopu od kmene stromu 6 m. V případě výkopu v menší vzdálenosti od kmene, než je 6 m, je nutno veškeré práce provádět ručně. Při případném přeseknutí kořene musí být tento kolmo odříznut nebo vyčistěny rány a zatřeny luxolovou barvou s fungicidy. Dle situace nutno stromy obednit, případně fixovat. Keře budou ve většině případů obcházeny a pouze, kde nebude jiná schůdná možnost budou přesazeny.

Výkop kabelových rýh bude proveden tak, aby vykopaný materiál zabíral co nejméně prostoru. Přebytkový materiál bude odvezen. Nejdříve to bude stavební suť a kameny, aby výkopy byly zasypány převážně zeminou a v takovém vrstvení, aby ornice a travní drn byly opět nahoře. V místech, kde bude dotčen zemědělský půdní fond, je nutné provést skrývku ornice do hloubky min. 20 cm s tím, že po ukončení prací bude provedeno její opětovné rozprostření po dotčené ploše.

B.17. BEZPEČNOST PRÁCE

V průběhu realizace stavby bude třeba v kabelizované části obce zajistit a dodržet taková opatření, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků provádějících stavbu, ani chodců a obyvatelů obce. Osoby, které budou realizovat stavbu a následně pracovníci provádějící údržbu zařízení, musí být vyškoleni ve smyslu platných norem, směrnic a předpisů. Výkopy podél chodníků nebo v chodnicích budou zajištěny ochranným zábradlím, přechody přes výkopy a přístup do domů a ostatních budov bude zajištěn provizorními lávkami. V místech vjezdů a slepých ulic musí být zajištěn průjezd vozidel do míst za překopem a zejména nesmí být omezen průjezd vozidel rychlé zdravotní služby, požárníků, policie a pohotovostních vozidel správců inženýrských sítí. Výkopy musí být co nejdříve zahrnuty a povrchy uvedeny do původního stavu. Na nedostatečně osvětlených místech bude zřízeno osvětlení výkopů. Budou rozmístěny dopravní značky, informující o prováděných pracích a o omezeních nebo úpravě provozu vozidel. Budou respektována všechna vyjádření v PD a podmínky v nich uvedené, v souvislosti s bezpečností práce, především plnit požadavky energetiky, plynárenství a dopravy.

B.18. ODPADY

Při realizaci akce vzniknou odpady :

<i>Číslo odpadu</i>	<i>Název odpadu</i>	<i>Původ</i>	<i>Kateg. odpadu</i>
31409	Stavební suť	Bourání zdiva	0
31410	Materiál z demolic vozovky	Překopy komunikací a chodníků	0
31411	Výkopová zemina	Kabelová rýha	0

Vypracoval:

Ing. Smýkal

Kontroloval:

Ing. Mrlina

Zakázka č.:

ZP-6732/18

Strana č.: 10

Z hlediska nakládání s odpady dává vyjádření v územním řízení příslušný městský úřad.

Dodržet vyjádření orgánu odpadového hospodářství odboru ŽP.

B.19. UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Přesné umístění, termín a poplatky je nutno dohodnout se zástupci Města Havlíčkův Brod před realizací stavby. Poplatník je povinen ohlásit písemně správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započítáním.

B.20. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Dodavatel provede geodetické zaměření skutečného průběhu trasy včetně hloubek uložení, řezů, detailů.

Dodavatel stavebně montážních prací předá investoru akce odpočtovou dokumentaci. Digitální souřadnice budou zpracovány programem MICRO STATION V 5.0.

B.21. STANOVISKO PROJEKTANTA

Projektant zapracoval do DPS veškeré připomínky dotčených vlastníků nemovitostí.

Projektová dokumentace je zpracována podle právních předpisů a technických norem platných v době zpracování projektu.

B.22. Související legislativní a normalizační dokumenty

Dokumentace je zpracována v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době zpracování této dokumentace.

C. Situační výkresy

Seznam výkresů je uveden v obsahu DPS, viz. strana č. 02.

Situační výkresy jsou přiloženy na konci této DPS.

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Seznam výkresů je uveden v obsahu DPS, viz. strana č. 02.

Výkresová část je přiložena na konci této DPS.

Vypracoval:

Ing. Smýkal


Kontroloval:

Ing. Mrlina

Zakázka č.:

ZP-6732/18


Strana č.: 11

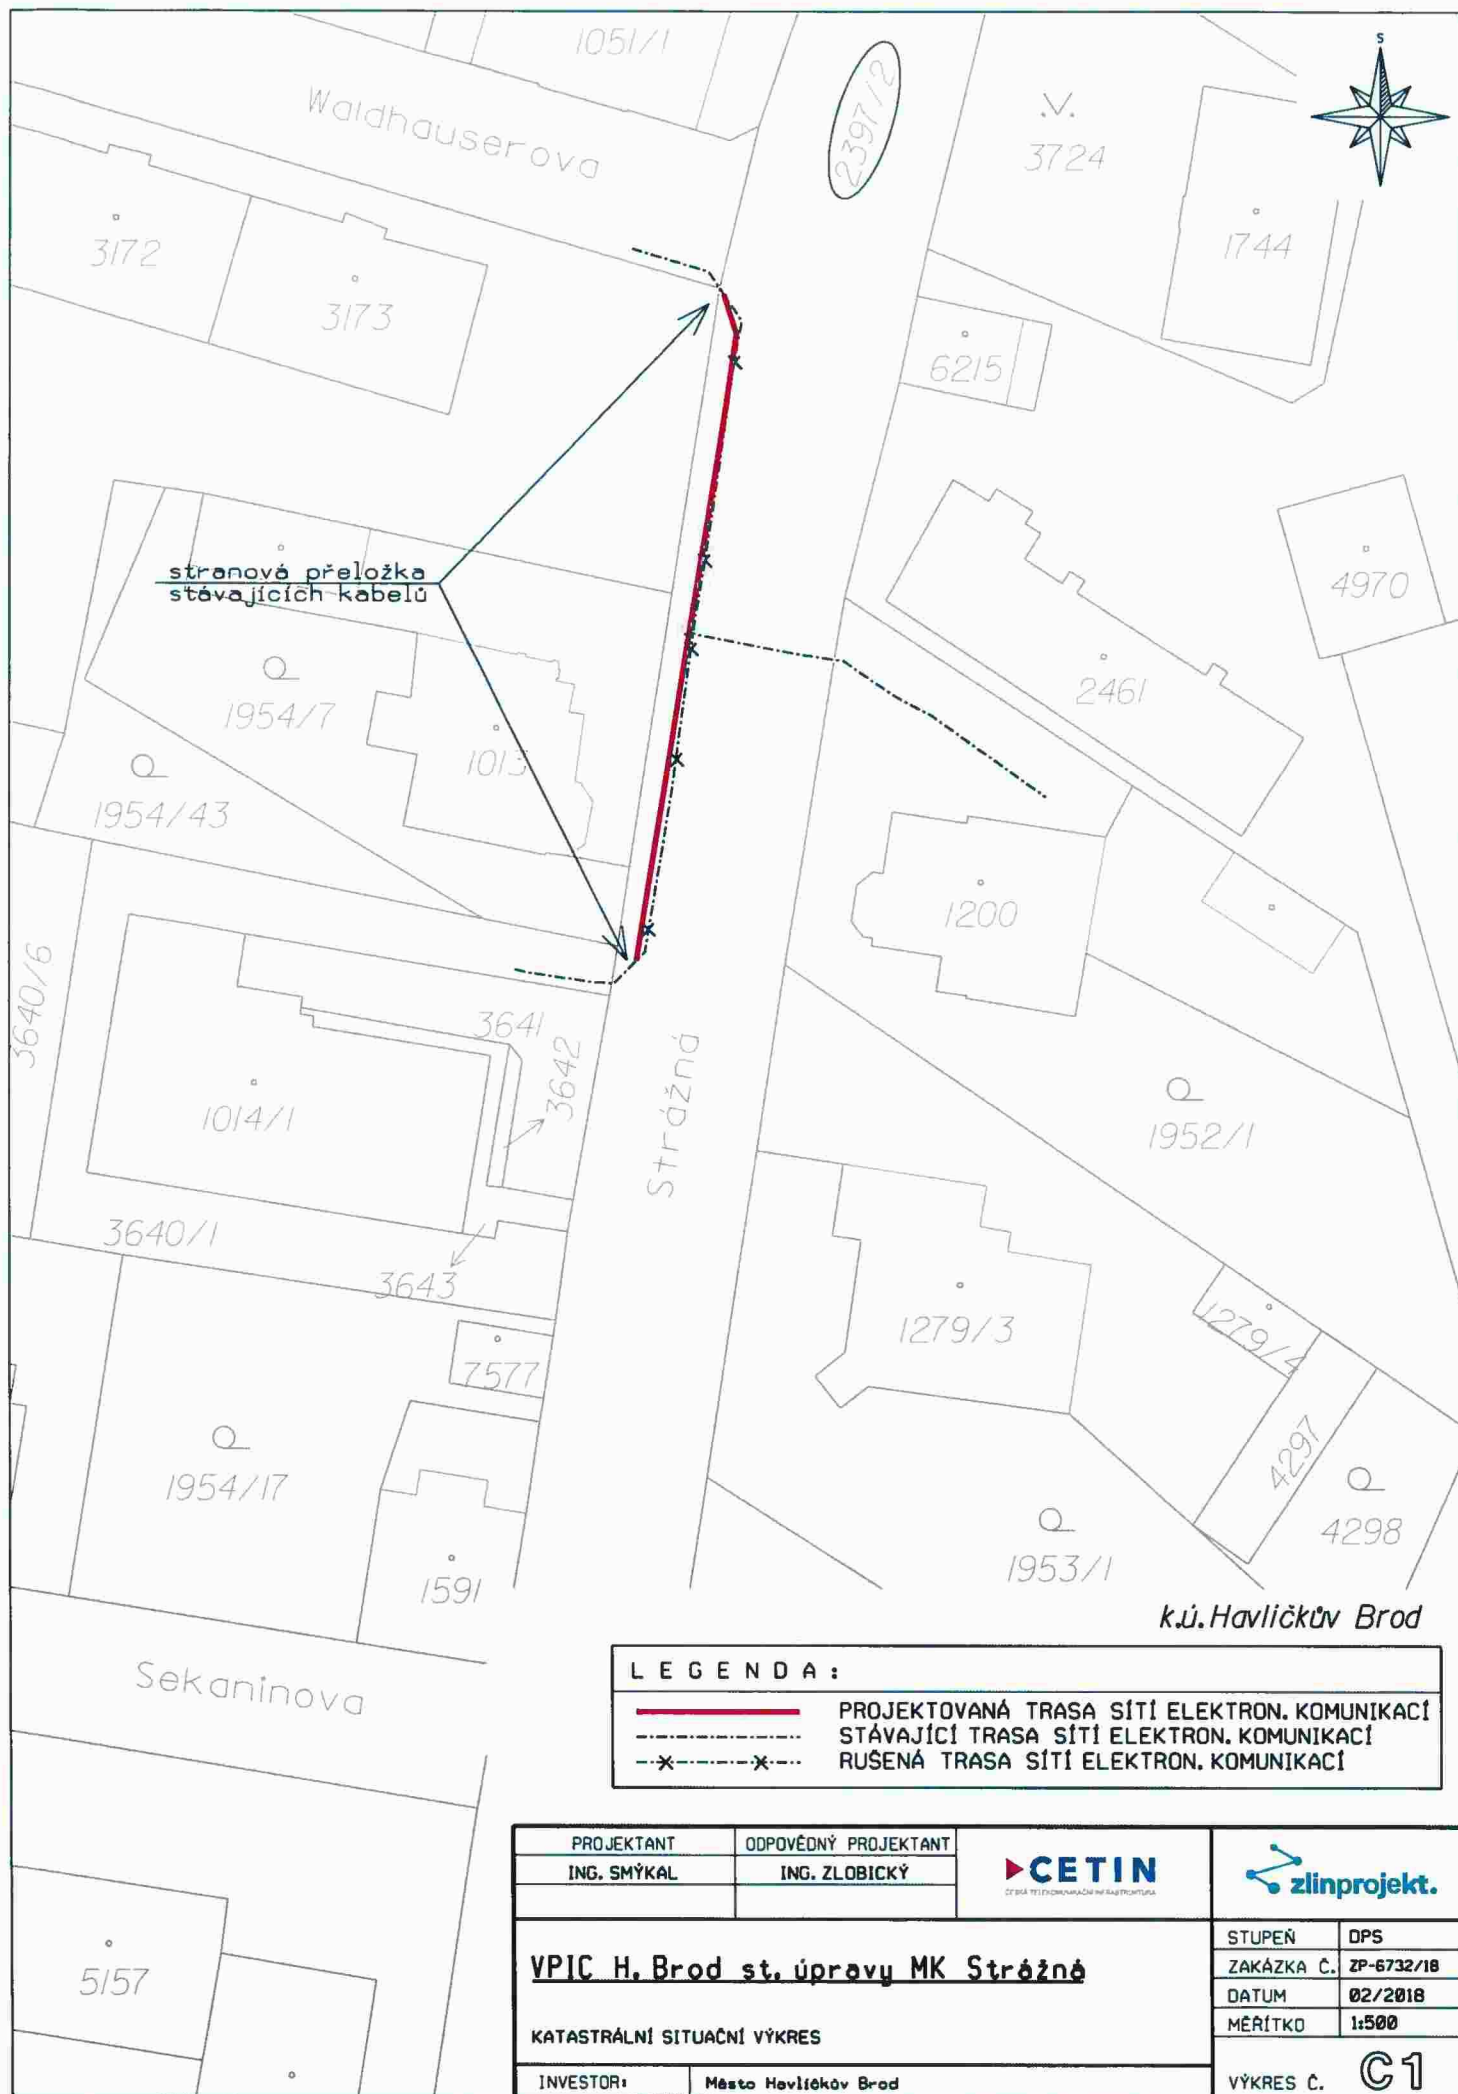


LEGENDA :

- PROJEKTOVANÁ TRASA SÍTÍ ELEKTRON. KOMUNIKACÍ
- - - STÁVAJÍCÍ TRASA SÍTÍ ELEKTRON. KOMUNIKACÍ
- x-x- RŮŠENÁ TRASA SÍTÍ ELEKTRON. KOMUNIKACÍ

PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	 ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INŽENÝRSTVÍ		
ING. SMÝKAL	ING. ZLOBICKÝ			
<u>VPIC H. Brod st. úpravy MK Strážná</u>			STUPEŇ	DPS
			ZAKÁZKA Č.	ZP-6732/18
			DATUM	02/2018
			MĚŘÍTKO	1:500
KATASTRÁLNÍ SITUACNÍ VÝKRES			VÝKRES Č. C1	
INVESTOR:	Město Havlíčkův Brod			




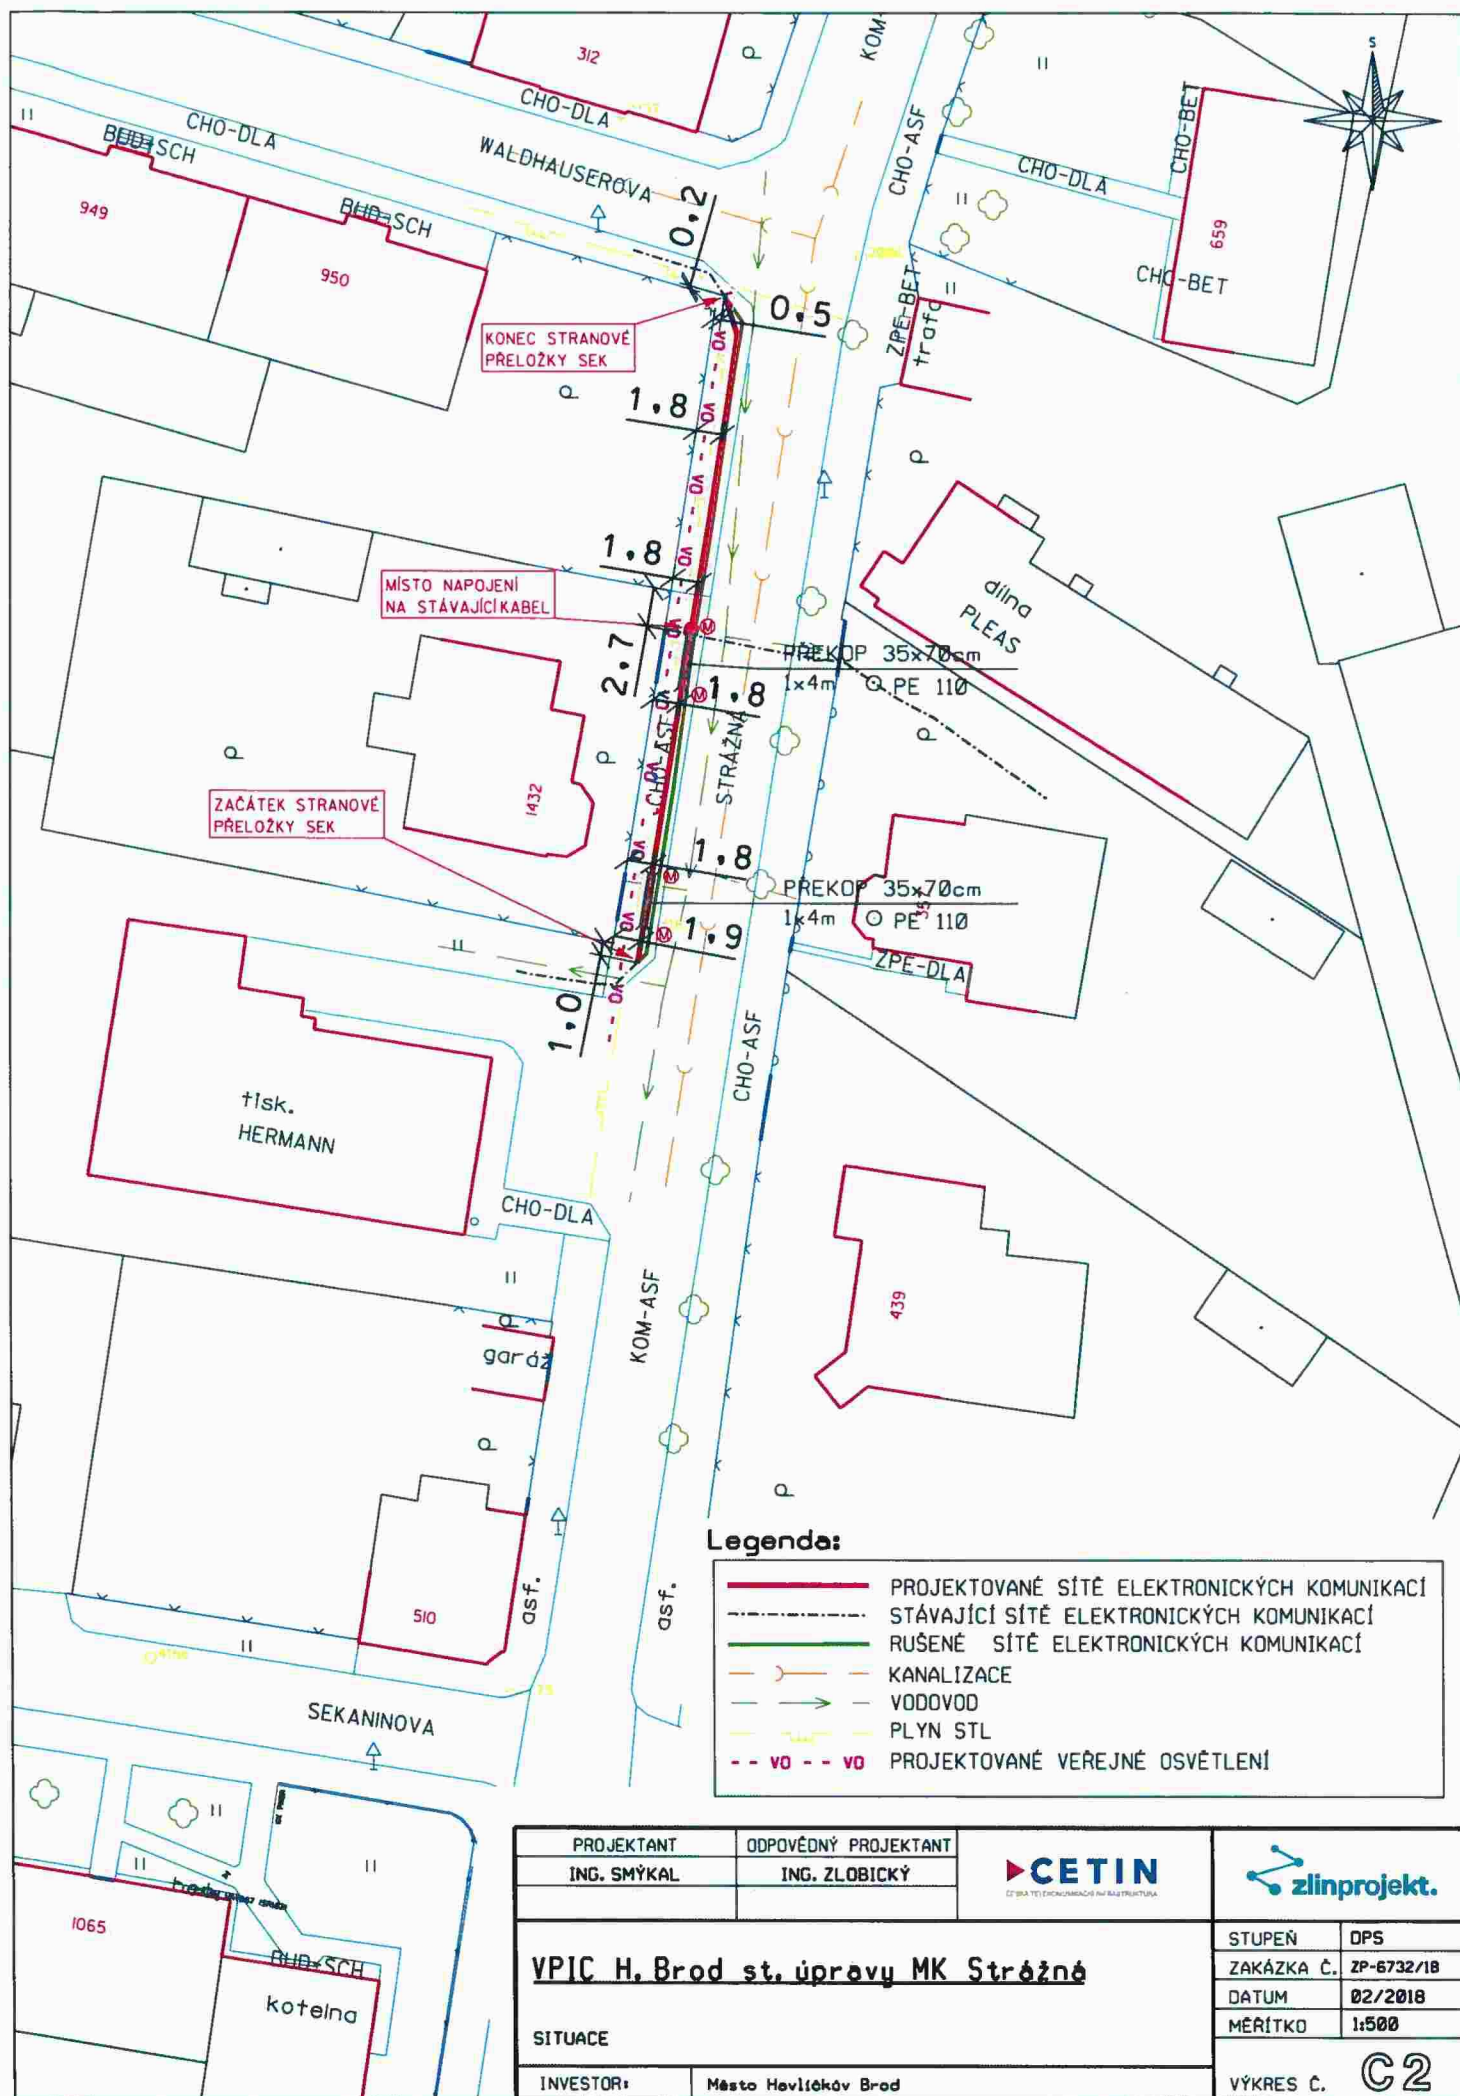


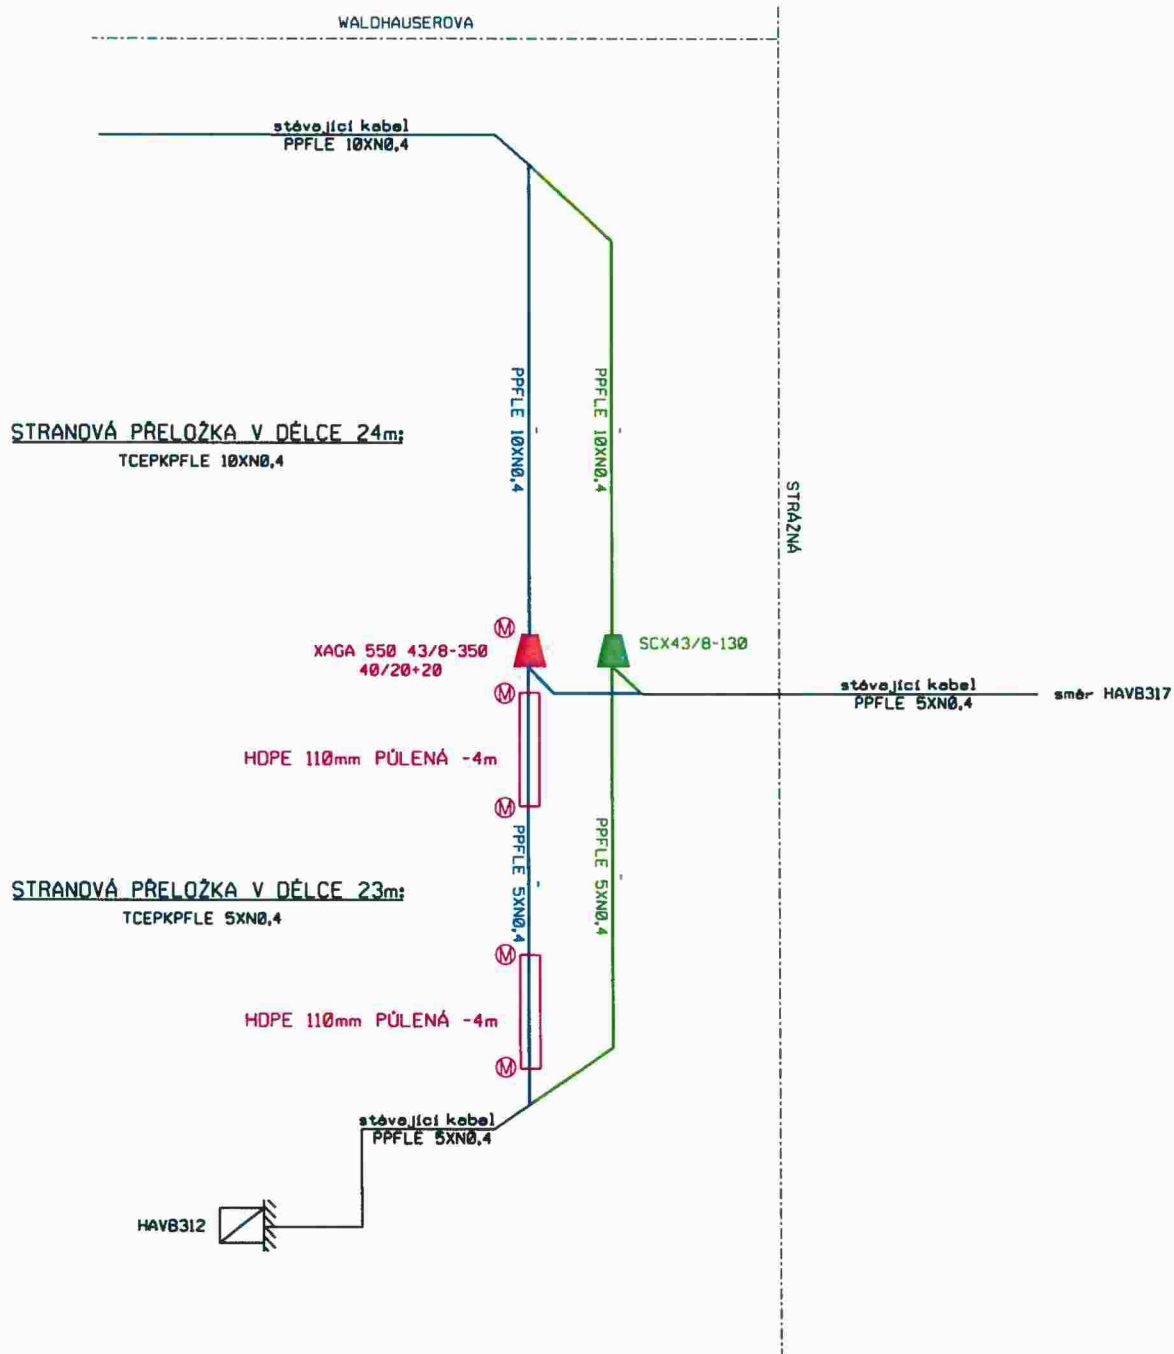

LEGENDA:

—	PROJEKTOVANÁ ZAŘÍZENÍ
—	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
—	RUŠENÁ ZAŘÍZENÍ
—	STRANOVÁ PŘELOŽKA ZAŘÍZENÍ

PROJEKTANT		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		 Č. 304 TEL: 563811111 FAX: 563811111		
ING. SMÝKAL		ING. ZLOBICKÝ				
<u>VPIC H. Brod st. úpravy MK Strážné</u>					STUPEŇ	DPS
SCHÉMA KABELŮ					ZAKÁZKA Č.	ZP-6732/18
					DATUM	02/2018
					MĚŘITKO	1:500
INVESTOR:		Město Havlíčkův Brod			VÝKRES Č.	D1

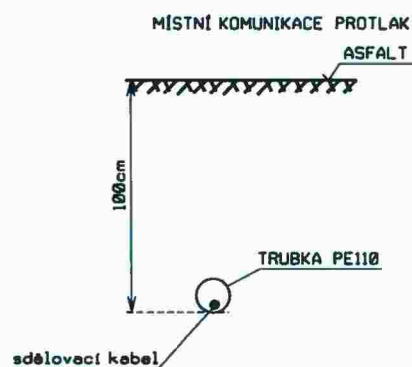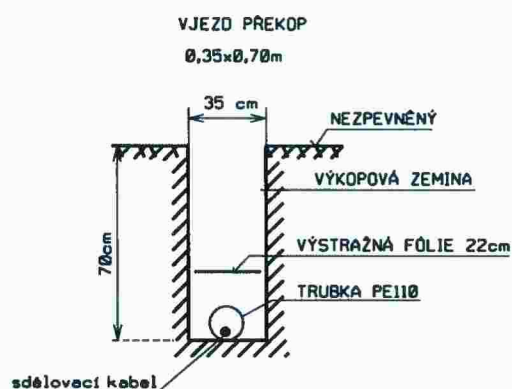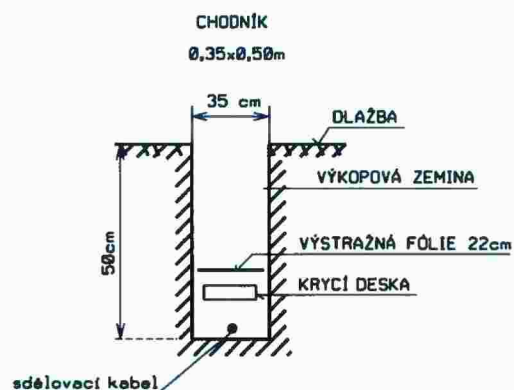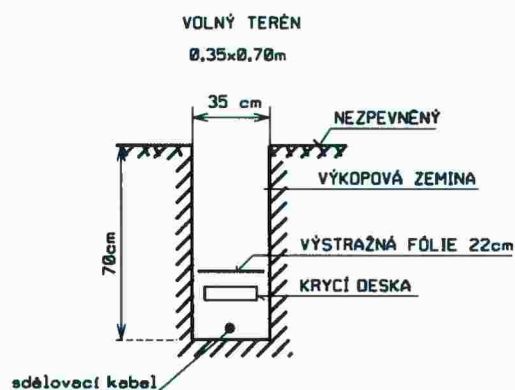

PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	 CZ NA TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA	
ING. SMÝKAL	ING. ZLOBICKÝ		
VPIC H. Brod st. úpravy MK Strážné		STUPEŇ	DPS
VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPU		ZAKÁZKA Č.	ZP-6732/18
INVESTOR:		DATUM	02/2018
Město Havlíčkův Brod		MĚRÍTKO	
		VÝKRES Č.	D2

PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2019.01
Spec.nákladů dle PD Položková databáze: 2019.01

Název stavby: VPIC H. Brod st. úpravy MK Strážná
Číslo SPP prvku: 16010-045268
Zhotovitel PD: Zlinprojekt,a.s., Pod Šternberkem 306, Zlín

Rekapitulace nákladů:
ZEMNÍ PRÁCE 41 508,70 Kč
MONTÁŽ 12 015,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 7 652,66 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 13 349,76 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 6 967,21 Kč

Celkové náklady: 81 493,33 Kč

Číslo SAP		Seznam položek	
ZEMNÍ PRÁCE		Název položky	Množství
	954970	Pokládka PE nebo vrapované chr 8.00 m	
	958554	Práce zemní do 50 m-ostatní čini 1.00 ks	
	954960	Rýha v chodn.bet.desky35/50-7C 9.00 m	
	952359	Rýha v chodníku betonové desky 50.00 m	
	955053	Vytyčení trasy v zastavěném ter 47.00 m	
MONTÁŽ			
	952649	Měření stejnosměrné během sta 2.00 ks	
	952650	Měření stejnosměrné během sta 8.00 ks	
	952644	Měření střídavé během stavby - 8.00 ks	
	952643	Měření střídavé během stavby - 2.00 ks	
	952647	Měření útlumu během stavby- p 2.00 ks	
	954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.č 20.00 ks	
	955281	Montáž spojky smrštiteľné do 50 3.00 ks	
	954990	Montáž úložných kabelů do 15 X 50.00 m	
	958469	Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV	
	958555	Zpracování dok. skut. provedení 1.00 ks	
	955066	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 1.00 ks	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
	955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(1.00 ks	
	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 10 1.00 ks	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
	954830	Projednání Smlouvy o zřízení věc 9400.00 JV	
		Náhrada za VBŘ	
	955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr. 1.00 ks	
	958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného 1.00 ks	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný		Limitka materiálu	
Číslo SAP		Název položky	Množství
	303857	Deska krycí plast. 250x1000 mm 47.00 ks	

303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	6.00 ks
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranž	53.00 m
303777	Fólie výstražná 80mm PE červen	100.00 m
300106	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x	24.00 m
300105	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0	26.00 m
302532	Mini Marker 1255 80-6102-2191	3.00 ks
312425	Modul konektor. 9700-10P	4.00 ks
407578	Souprava čistící 4413L	1.00 ks
320312	Souprava odbočovací BOKT-5S-4	1.00 ks
320296	Spojka smršťovací XAGA 550 43/	3.00 ks
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lank	8.00 m

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD
stavební úřad
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

Č.j.: MHB_ST/965/2017/Ha

Vyřizuje: Ing. Petr Hála, tel: 569 497 213, e-mail: phala@muhb.cz

Havlíčkův Brod, dne 11.5.2018

JID: 34381/2018/muhb

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

13.6.2018
13.6.2018
Rozhodnutí je vykonatelné dnem 13.6.2018

Výroková část:

Městský úřad Havlíčkův Brod, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 18.8.2017 podalo **Město Havlíčkův Brod, IČO 00267449, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

**Stavební úpravy MK ul. Strážná, Waldhauserova, Sekaninova
Havlíčkův Brod, Strážná, Sekaninova**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1013, parc. č. 1946/1, 1946/11, 1949/4, 1954/7, 1954/11, 1954/12, 1954/20, 1954/33, 1954/37, 1954/46, 1954/47, 1955/3, 1963/18, 1964/15, 1964/37, 2397/2, 3704, 3706, 3745 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

Popis stavby:

Stavba řeší celkovou rekonstrukci - stavební úpravy stávajících místních komunikací s chodníky a parkovacími stáními 46ks, vyvolanou přeložkou telekomunikačního vedení spol. CETIN a pokládku kabelového vedení veřejného osvětlení s příloží vedení optického kabelu spol. Metropolitní od křižovatky Strážná - Nad Tratí až do ulice Sekaninova.

Druh a účel umísťované stavby: změna stavby dopravní infrastruktury a umístění staveb telekomunikačního vedení a technické infrastruktury

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

SO 101 Komunikace a chodníky:

- I etapa - ulice Strážná - jedná se o stavební úpravy komunikace v délce 322m, šířka vozovky bude v části s obousměrným provozem 5,50m, v části s jednosměrným provozem pak 3,5m. Povrch vozovky je tvořen asfaltobetonem. Komunikace je vedena středem uličního prostoru a je lemována pravostrannými i levostrannými chodníky a parkovacími plochami
- II. etapa - ulice Waldhauserova - jedná se o stavební úpravy komunikace v délce 225,6m o jednotné šířce vozovky 5,95m s jednosměrným provozem a povrchem z asfaltobetonu. Komunikace je z obou stran lemována chodníkem min. šíře 2,0m.
- III. etapa - ulice Sekaninova - jedná se o stavební úpravy komunikace v délce 152,4m o jednotné šířce vozovky 6,0m. Jedná se o komunikaci s obousměrným provozem s asfaltobetonovým povrchem. Komunikace je z pravé strany lemována chodníkem, po levé straně je zachován zelený pruh.

Komunikace jsou odvodněny uličními vpustěmi stávajícími (rekonstruovanými) i novými.

SO 401 - Veřejné osvětlení - řeší odstranění stávajících 9 stožárů a provedení nových rozvodů s osazením nových 16 svítidel v ulici Strážná, Sekaninova a Waldhauserova, v příloži bude uloženo vedení optického kabelu spol. Metropolitní od křižovatky Strážná - Nad Trati až do ulice Sekaninova.

SO 402 - Přeložka kabelového vedení CETIN a.s. vyvolaná přeložka kabelového vedení v ulici Strážná v km 0,06377-0,10923 v délce 46m z místa pod obrubou do prostoru pod chodníkem.

Stavba komunikačního vedení nevyžaduje podle § 103 odst.1 písm.e) bodu 4. stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Stavba musí být prováděna v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Stavba vedení sítě veřejného osvětlení včetně stožárů nevyžaduje podle § 103 odst.1 písm.e) bodu 8. stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat dle § 119 odst.1 stavebního zákona na základě kolaudačního souhlasu.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou situací stavby, která obsahuje výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy se zakreslením požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit u správců a vlastníků podzemních sítí jejich vytyčení. Je třeba dodržovat předpisy pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení, zejména ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecné ustanovení. Jedná se zejména o tyto správce sítí:
 - GridServices, s r.o. vyjádření zn.:5001497359 ze dne 28.4.2017 (*nachází se NTL plynovody, plynovodní přípojky a neprovozované plynovody*)
 - ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření k projektové dokumentaci zn.:1092593247 ze dne 10.5.2017, souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zn.:1092959461 ze dne 1.6.2017 a sdělení o existenci zn.:0100698097 ze dne 16.2.2017 (*nachází se podzemní energetické zařízení nn*)
 - Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. vyjádření zn.:000385/2015/17/V ze dne 21.4.2017 a zn.:479/215/16/V ze dne 24.5.2016 (*nachází se vodovod a kanalizace*)
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření č.j.:611800/16 ze dne 16.5.2016 (*dojde ke střetu*)
 - SŽDC, s.o. vyjádření zn.:12400/2017-SŽDC-OR BNO-NT ze dne 5.5.2017 a zn.:10185/2016-SŽDC-OR BNO-OPS ze dne 3.6.2016 (*nachází se kabelová trasa 6 kV ve správě SEE Brno, nachází se inž. sítě ve správě SSZT Jihlava*)
 - ČD – Telematika a.s. vyjádření č.j.:1201706269 ze dne 20.4.2017 a č.j.:1201605345 ze dne 31.5.2016 (*dojde ke styku se sítí elektronických komunikací*)
 - Metropolitní s.r.o. vyjádření ze dne 20.4.2017 a ze dne 15.6.2016 (*plánovaná výstavba optických vedení*)
 - Technické služby Havlíčkův Brod vyjádření ze dne 10.5.2017 a ze dne 20.4.2017 (*nachází se rozvody veřejného osvětlení*)
 - Nej.cz s.r.o. vyjádření č.j.:HB 047/16 ze dne 17.5.2016 (*nedojde ke střetu*)
 - TEPLO HB s.r.o. vyjádření ev.č. 0000176216 ze dne 26.5.2016 (*nenachází se žádné naše zařízení*)
4. Stavebník oznámí před zahájením stavby stavebnímu úřadu název stavebního podnikatele oprávněného k provádění staveb, který bude stavbu provádět a jehož název bude vyznačen na štítku „STAVBA POVOLENA“ a termín zahájení stavby.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- a) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby
6. Bude splněna podmínka Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův Brod ze závazného stanoviska ev.č.:HB-234/1-2017 ze dne 26.4.2017:
- *při realizaci stavby je třeba splnit veškeré požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení opatřeného razítkem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův Brod.*
7. Budou splněny podmínky Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Praha ze závazného stanoviska souhlasu ke zřízení stavby zn.:DUCR-2942/17/Ka ze dne 23.5.2017:
- *stavbou nesmí být negativně ovlivněny drážní objekty a zařízení*
 - *při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu*
 - *všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy*
 - *na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy*
8. Budou splněny podmínky Českých drah, a.s. z vyjádření č.j.:1265/2017-RSMBRNO ze dne 28.4.2017.
9. Bude splněna podmínka Městského úřadu Havlíčkův Brod z vyjádření č.j.:OŽP/1039/2017/So ze dne 10.5.2017:
- *dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb. jsou všechny dřeviny chráněny před poškozením dle normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam). Veškeré výkopové práce v blízkosti dřevin v prostoru jejich kořenových systémů je nutno provádět s největší opatrností, nepoužívat výkopovou techniku (rýha), ale podvrť, případně zvolit ruční kopání. Při kácení dřevin je třeba postupovat v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., a související vyhlášky 189/2013 Sb., a podat žádost o povolení kácení dřevin u místně příslušného úřadu odboru ŽP*
 - *Dle PD bude zpracován projekt sadových úprav v dalším stupni dokumentace, proto požadujeme tento návrh předložit odboru ŽP ke konzultaci*
 - *po dokončení stavebních prací budou stávající travnaté plochy uvedeny do původního stavu, tzn. osety a urovnaný (dle normy ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Travníky a jejich zakládání.*
10. Budou splněny podmínky spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. z vyjádření zn.:POS/43/2017 ze dne 28.4.2017:
- *minimálně šest měsíců před zahájením realizace stavby objednejte u společnosti CETIN a.s. vypracování prováděcí projektové dokumentace na přeložku komunikačních sítí (kontaktní osoba: p. Pekař – 602120786, tomas.pekar@cetin.cz)*
 - *minimálně tři měsíce před zahájením realizace stavby je stavebník povinen se společností CETIN a.s. uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci překládky SEK (kontaktní osoba: p. Pekař – 602120786, tomas.pekar@cetin.cz)*
11. Budou splněny podmínky NIPI z vyjádření zn.:30/2017/TO ze dne 2.6.2017:
- *sloupy VO a PRIS nebudou zasahovat do prostoru u vodící linie*
 - *v dokumentaci pro stavební povolení budou dopracovány signální, varovné pásy a bezpečnostní odstupy vozovek*

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod I

Odůvodnění:

Dne 18.8.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stanovení okruhu účastníků územního řízení:

účastníci řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona (*žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn*):

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí č.p. 57, 580 01 Havlíčkův Brod I

účastníci řízení dle § 85 odst.2a stavebního zákona (*vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě*):

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Metropolitní s.r.o., Zdeněk Dvořák, Irena Dvořáková, Technické služby Havlíčkův Brod, Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Brno, České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, ČD - Telematika a.s., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., GasNet, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Metropolitní s.r.o., Jan Charouz, Jana Charouzová, Ing. Dušan Čapek, Aleš Fikar, Miloslava Fikarová, Ing. Jana Fischerová, CSc., Danuše Gašperáková, JUDr. Marcela Jiráková, Božena Kábelová, Martin Kocman, Vladimír Kučera, Pavel Liška, Zdeněk Mach, Ivana Matějková, Jiří Melena, Jindřiška Melounová, Ing. Petr Myslivec, Čkait 0700832 Projekt plus, s.r.o., Blanka Myslivcová, Ludmila Melenová, Petr Novák, Petr Posekaný, Irena Rázková, Tereza Rysová, Michal Souček, Ilona Součková, Marie Strejčková, Michal Štrobl, Magdalena Štroblova, Pavla Zápotočná, Hypoteční banka, a.s., Komerční banka, a.s., Raiffeisenbank a.s.

účastníci řízení (*podle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona*), *osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, které stavební úřad identifikuje pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti se v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou*) jsou vlastníci těchto nemovitostí:

st. p. 832, 833, 1051/1, 1051/4, 1279/3, 1425, 1591, 1696/2, 1992, 2403, 4207, 7577, 1051/1, 1051/3, 1051/2, 1520, 1519/1, 1518, 1055/1, 562/3, 7183, 6468, 1607, parc. č. 328/1, 328/6, 1943/1, 1946/3, 1946/4, 1951/1, 1953/1, 1954/16, 1954/17, 1954/18, 1954/30, 1954/35, 1955/4, 1955/5, 1963/2, 1963/17, 3640/1, 3641, 3643, 1954/9, 1954/24, 1954/42, 1954/14, 1954/2, 1954/26, 4222 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 4.9.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 30.1.2018. Stavební úřad oznámil dle § 87 odst.1 stavebního zákona oznámením z 28.2.2018 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 3.3.2018, přípisem ze dne 1.3.2018 byl opraven termín ústního jednání na den 3.4.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Na jednání žadatel rozšířil rozsah svého podání o rekonstrukci komunikace Waldhauserova a provedení přílože optického kabelu k vedení veřejného osvětlení. Stavební úřad dne 4.4.2018 oznámil zahájení řízení stavby v novém rozsahu včetně nových okruhů účastníků řízení a k projednání návrhu nařídil jednání na den 10.5.2018, o čemž byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – ÚZEMNÍM PLÁNEM HAVLÍČKŮV BROD, který byl vydán dne 15.9.2014 Opatřením obecné povahy Zastupitelstva města Havlíčkův Brod (usnesení č. 323/14), které nabylo účinnosti 23.10.2014, resp. se stavem po vydání změny č.2 (usnesení zastupitelstva č. 139/17), která nabyla účinnosti 28.4.2017. Stavba je navržena v ploše PV – plocha veřejného prostranství, kde jsou v přípustném způsobu využití stavby místních komunikací, parkoviště na terénu a nezbytné liniové trasy a plochy technické a dopravní infrastruktury. Navržené stavby komunikace a chodníků, parkoviště na terénu, sítě technické infrastruktury jsou v souladu s tímto přípustným způsobem využití. Dále se nejedná o nepřípustný způsob využití, neboť se jedná o stavby uvedené v přípustném způsobu využití ani jejich negativní účinky nepřekročí limity stanovené příslušnými právními předpisy což je doloženo souhlasnými stanovisky dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků (smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, smlouva s).

Dotčené orgány státní správy vydaly před vydáním územního rozhodnutí tato rozhodnutí ke stavbě:

- Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy vyjádření č.j.:DOP/1490/2017/JTE ze dne 26.4.2017
- Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát RPJ-43581-1/ČJ-2017-161606 ze dne 21.4.2017
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod závazné stanovisko zn.:KHSV/08590/2017/HB/HOK/Vel ze dne 24.4.2017

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad navrhovanou stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona. Přitom dospěl k těmto závěrům:

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavební záměr byl odsouhlasen dotčenými orgány složek ochrany životního prostředí, silničními správními úřady, dotčeným orgánem ochrany veřejného zdraví, požární ochrany, správcem dotčeného vodního toku i správci veřejných rozvodů inženýrských sítí. Dle stanovisek dotčených orgánů je stavba v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává ve třech stejnopisech tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, v případě projednávání umístění stavby veřejnou vyhláškou bude podáno odvolání ve 3 stejnopisech. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Upozornění:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu v Havlíčkově Brodě. Dnem doručení se rozumí 15-tý den ode dne vyvěšení na úřední desce.

Ing. Petr Hála
referent stavebního úřadu
otisk úředního razítka



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatel – žadatel (podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona)

Město Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje města, Havlíčkově náměstí č.p. 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1

účastníkům územního řízení (podle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona), kterým se v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou)

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Metropolitní s.r.o., IDDS: f2wmgeu

Zdeněk Dvořák, Strážná č.p. 1432, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Irena Dvořáková, Strážná č.p. 1432, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Technické služby Havlíčkův Brod, IDDS: 8wfk9w2
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, IDDS: e52cdsf
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IDDS: z9egxzy
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, kterou zastupuje GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Metropolitní s.r.o., IDDS: f2wmgeu
Jan Charouz, Waldhauserova č.p. 949, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Jana Charouzová, Reynkova č.p. 3643, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Ing. Dušan Čapek, Waldhauserova č.p. 950, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Aleš Fikar, Waldhauserova č.p. 950, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Miloslava Fikarová, Waldhauserova č.p. 950, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Ing. Jana Fischerová, CSc., Waldhauserova č.p. 949, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Danuše Gašperáková, Vysoká č.p. 65, 580 01 Havlíčkův Brod 1
JUDr. Marcela Jiráková, Waldhauserova č.p. 949, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Božena Kábelová, Waldhauserova č.p. 950, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Martin Kocman, Novotný Dvůr č.p. 116, Svatý Kříž, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Vladimír Kučera, Waldhauserova č.p. 950, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Pavel Liška, Waldhauserova č.p. 949, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Zdeněk Mach, V Rámech č.p. 269, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Ivana Matějková, Waldhauserova č.p. 949, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Jiří Melena, Michalovice č.p. 52, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Jindřiška Melounová, Waldhauserova č.p. 948, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Ing. Petr Myslivec, Čkai 0700832 Projekt plus, s.r.o., IDDS: vwtu6yf
Blanka Myslivcová, Waldhauserova č.p. 948, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Ludmila Melenová, Michalovice č.p. 52, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Petr Novák, Waldhauserova č.p. 949, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Petr Posekaný, Waldhauserova č.p. 948, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Irena Rázková, Rašínova č.p. 466, 396 01 Humpolec
Tereza Rysová, Jiráskova č.p. 3293, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Michal Souček, Waldhauserova č.p. 948, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Ilona Součková, Waldhauserova č.p. 948, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Marie Strejčková, Waldhauserova č.p. 948, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Michal Štrobl, Waldhauserova č.p. 949, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Magdalena Štrobllová, Kubova č.p. 1778/3, Řečkovice, 621 00 Brno 21
Pavla Zápotočná, Chotěbořská č.p. 1836, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u

účastníkům územního řízení (podle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona), které stavební úřad identifikuje pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti se v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou) jsou vlastníci těchto nemovitostí:
st. p. 832, 833, 1051/1, 1051/4, 1279/3, 1425, 1591, 1696/2, 1992, 2403, 4207, 7577, 1051/1, 1051/3, 1051/2, 1520, 1519/1, 1518, 1055/1, 562/3, 7183, 6468, 1607, parc. č. 328/1, 328/6, 1943/1, 1946/3, 1946/4, 1951/1, 1953/1, 1954/16, 1954/17, 1954/18, 1954/30, 1954/35, 1955/4, 1955/5, 1963/2, 1963/17, 3640/1, 3641, 3643, 1954/9, 1954/24, 1954/42, 1954/14, 1954/2, 1954/26, 4222 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

dotčené orgány

Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy, IDDS: 5uvbfub

Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, IDDS: 5uvbfub

Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, IDDS:

x9nhptc

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, IDDS:

4uuai3w

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, IDDS: ntdaa7v
Dražní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaa7d

K vyvěšení:

Městský úřad Havlíčkův Brod, podatelna – k bezodkladnému vyvěšení rozhodnutí č.j.:ST/965/2018/Ha ze dne 11.5.2018 na úřední desku podle § 25 odst. 2 a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, v platném znění. *Vyvěšení na dobu nejméně 15 dnů, rozhodnutí též zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, po lhůtě vyvěšení bezodkladně zaslat zpět.!!!*



CETIN

TELEKOMUNIKACE
INFRASTRUKTURA

Evidenční číslo: PŘ/1734/2019

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Ing. Miroslava Kota

Supervizor, Výstavba PPS Čechy/Morava jih

os. č. 3672, nar. dne 22. 2. 1960, bytem Starý Pelhřimov 89, Pelhřimov, PSČ 393 01 („**Zaměstnanec**“)

adresa pro doručování: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, reg. u Městského soudu v Praze spís. zn. B 20623

www.cetin.cz

- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítě elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 19.2.2020. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 19.2.2019

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Představenstvo

.....
Ing. Filip Čába
místopředseda představenstva

.....
Michal Frankl
člen představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: 0-I/207-208/2019
258-259/2019

Ověřuji, že:

Ing. Filip Cába, nar. 22.5.1974-----

bydlištěm Kaštanová 927, Buštěhrad-----

Mgr. Michal Frankl, nar. 13.12.1963-----

bydlištěm, Na břehu 260/1, Praha 9-----

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.----

V Praze dne 19.2.2019-----

JUDr. Maria Mandlerová

notářská kandidátka
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem,
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6



Česká tele
Olšanská z
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
219

1/5

DOLOŽKA

Prohlašuji, že Rada města Havlíčkův Brod projednala a schválila v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) uzavření smlouvy o realizaci překládky elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/516 v rámci stavby „Stavební úpravy MK ul. Strážná, Waldhauserova, Sekaninova, Havlíčkův Brod“ usnesením č. R 186/19 dne 25.02.2019.

V Havlíčkově Brodě dne 26.03.2019

Mgr. Jan Tecl MBA
starosta města



