



Č. j.: 54310/211/19

Vyřizuje: ██████████

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **19010 - I/11 Ostrava - Vítkovice, ul. Rudná 2019**, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele **P19V00151037** (dále jen „Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

JANKOSTAV s.r.o.

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

IČO: 25855581

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“) a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	16PU-003216
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	P19V00151037
Název veřejné zakázky	19010 - I/11 Ostrava - Vítkovice, ul. Rudná 2019
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	500 111 0007

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
JANKOSTAV s.r.o.	sídlo: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava IČO: 25855581

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokázal kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ: Výpis z evidence Rejstříku trestů pro: Fyzické osoby: - ██████████ ze dne 15.01.2019 Právníkové osoby: - JANKOSTAV s.r.o. ze dne 15.01.2019
§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ: Potvrzení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj ze dne 07.01.2019 Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podepsané jednatelem ██████████ ██████████ ze dne 21.02.2019
§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ: Písemné čestné prohlášení týkající se písm. c) podepsané jednatelem ██████████ ze dne 21.02.2019

§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ: Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava ze dne 21.12.2018

§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ: Výpis z obchodního rejstříku pro právnickou osobu JANKOSTAV s.r.o. ze dne 21.02.2019

2.2. Profesionální způsobilost dle § 77 ZZVZ

§ 77 odst. 1 ZZVZ: Výpis z obchodního rejstříku pro právnickou osobu JANKOSTAV s.r.o. ze dne 21.02.2019

§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ: Výpis ze živnostenského rejstříku pro JANKOSTAV s.r.o. ze dne 13.07.2004 – předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ: Čestné prohlášení, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobami, jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby pro osoby [REDAKCE] a [REDAKCE] podepsané jednatelem [REDAKCE] ze dne 28.02.2019

2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ: Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 21.02.2019 podepsaný [REDAKCE] jednatelem spol. JANKOSTAV s.r.o., včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce „**Oprava povrchu silnice III/4701 Šenov – Václavovice, I. etapa**“ ze dne 07.09.2018 vydané objednatelem Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Středisko Ostrava podepsané [REDAKCE], jejímž předmětem byla rekonstrukce dvoupruhové pozemní komunikace v délce 1,703 km, dokončené 31.08.2018;
- Refereční list na realizaci zakázky na stavební práce „**Silnice I/48 hr. kraje - Dub**“ ze dne 17.01.2018 vydané objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava podepsané [REDAKCE] jejímž předmětem byla rekonstrukce čtyřpruhové pozemní komunikace v délce 2,05 km, dokončené 30.11.2017;
- Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce „**Oprava povrchu silnice III/4753 Marklovice**“ ze dne 17.01.2018 vydané objednatelem Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, podepsané [REDAKCE], technickým referentem ředitelství Ostrava, jejímž předmětem byla rekonstrukce čtyřpruhové pozemní komunikace v délce 1,306 km, dokončené 30.07.2017;
- Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce „**Oprava povrchu silnice II/4739 Dolní Datyně**“ ze dne 17.01.2018 vydané objednatelem Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, podepsané [REDAKCE], technickým referentem ředitelství Ostrava, jejímž předmětem byla rekonstrukce čtyřpruhové pozemní komunikace v délce 2,728 km, dokončené 30.10.2017.

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

- Čestné prohlášení o odborném personálu za osobu I [REDAKCE] podepsané jednatelem [REDAKCE] ze dne 28.02.2019: při plnění veřejné zakázky v pozici stavbyvedoucí, roky odborné praxe 42 let, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, č. autorizace v ČKAIT 1100558, doložená praxe na pozici stavbyvedoucí při plnění zakázky na stavební práce s názvem „Silnice I/48 hr. okraje - Dub“ pro objednatele Ředitelství silnic a dálnic ČR ve finančním objemu 32 210 730,40 Kč bez DPH, vztah k dodavateli – zaměstnanec
- Čestné prohlášení o odborném personálu za osobu [REDAKCE], podepsané jednatelem [REDAKCE] ze dne 28.02.2019: při plnění veřejné zakázky v pozici zástupce stavbyvedoucího, roky odborné praxe 50 let, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, č. autorizace v ČKAIT 1101027, doložená praxe na pozici stavbyvedoucí při plnění zakázky na stavební práce s názvem „Oprava důlní škody silnice III/4749 v km 6,230-8,000 silničního staničení v obci Stonava“ pro objednatele OKD, a.s. ve finančním objemu 8 667 732,- Kč bez DPH, vztah k dodavateli – zaměstnanec

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Čestné prohlášení vydané jednatelem [REDAKCE] dne 21.02.2019 o zajištění dodávky směsi v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP z obalovny firmy Obalovna Ostrava s.r.o., s výkonem 160 t/hod., kterou spoluvlastní (doloženo Výpisem z obchodního rejstříku pro právnickou osobu Obalovna Ostrava s.r.o., IČO 28145704 ze dne 21.02.2019)

Čestné prohlášení o tom, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů

- **2 ks finišeru** pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku plné šířky vozovky na jeden pracovní záběr (tj. min. 3,5 m);
- **3 ks silničních válců** nad 3,5 t, s minimálním výkonem 250 m²/hod.

vydané jednatelem

dne 21.02.2019

Osvědčení o autorizaci č. 17604 podle zákona č. 360/1992 Sb. pro [REDAKCE] v oboru dopravní stavby vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dne 20.06.1997;

Osvědčení o autorizaci č. 15660 podle zákona č. 360/1992 Sb. pro [REDAKCE] v oboru dopravní stavby vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dne 27.03.1995.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.



ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	16PU-003216
Číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	P19V00151037
Název veřejné zakázky	19010 - I/11 Ostrava - Vítkovice, ul. Rudná 2019
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	500 111 0007

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídají kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)
1.	JANKOSTAV s.r.o.	Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava	25855581	25 370 982,90
2.	SILNICE MORAVA s.r.o.	Revoluční 904/30, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov	25357352	26 268 432,10
3.	EUROVIA CS, a.s.	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1	45274924	25 540 428,80
4.	ALPINE Bau CZ a.s.	Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí	02604795	25 881 281,00
5.	PORR a.s.	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10	43005560	25 658 916,80
6.	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno	25317628	26 591 565,00

7.	COLAS CZ, a.s.	Praha 9, Ke Klíčovu 9, 190 00	26177005	25 997 770,39
8.	Skanska a.s.	Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8	26271303	26 119 605,96
9.	KARETA s.r.o.	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál	62360213	27 681 528,80

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí - nejvýhodnější) po nejvyšší (nejméně vhodnou).

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Výsledek hodnocení nabídek - pořadí nabídek po provedeném hodnocení
1.	25 370 982,90	1.
2.	26 268 432,10	7.
3.	25 540 428,80	2.
4.	25 881 281,00	4.
5.	25 658 916,80	3.
6.	26 591 565,00	8.
7.	25 997 770,39	5.
8.	26 119 605,96	6.
9.	27 681 528,80	9.

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis
██████████████████	
██████████████	
██████████████████	
██████████████████	
██████████	

V Ostravě dne 15.02.2019

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III – Další požadavky objednatele
- D) Část IV – Specifikace zakázky

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě	č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23. 3. 2009	1. 4. 2009
Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1	č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. 10. 2016	1. 4. 2017
Kapitola 4 - Zemní práce	č.j. 143/2017-120-TN/1 ze dne 4. 8. 2017	7. 8. 2017
Kapitola 5 - Podkladní vrstvy	č.j. 4/2015-120-TN/2 ze dne 21. 1. 2015	1. 2. 2015
Kapitola 6 - Cementobetonový kryt	č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 21. 1. 2015	1. 2. 2015
Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008
Kapitola 8 - Litý asfalt	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008
Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců	č.j. 692/10-910-IPK/1 Ze dne 13. 8. 2010	1. 9. 2010
Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy	č.j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. 8. 2010	1. 9. 2010
Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu	č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010	1. 4. 2010
Kapitola 12 - Trvalé oplocení	č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008	1. 4. 2008
Kapitola 13 - Vegetační úpravy	č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3. 8. 2006	1. 9. 2006
Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení	č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015	1. 4. 2015

Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací	č.j. 9/2015-120-TN/3 ze dne 2. 2. 2015	15. 2. 2015
Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny	č.j. 1126/10-910-IPK/1 ze dne 16. 12. 2010	1. 1. 2011
Kapitola 18 - Beton pro konstrukce	č. j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. 1. 2016	15. 1. 2016
Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a konstrukce	č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13. 4. 2015	23. 4. 2015
Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí	č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 5. 9. 2018	10. 9. 2018
Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008
Kapitola 21 - Izolace proti vodě	č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010	1. 4. 2010
Kapitola 22 - Mostní ložiska	č.j. 124/2018-120-TN/1 ze dne 18. 5. 2018	1. 6. 2018
Kapitola 23 - Mostní závěry	č.j. 653/ 07/910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007	1. 9. 2007
Kapitola 24 - Tunely	č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4.2007	1. 5. 2007
Kapitola 25 - Protihlukové clony	č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23. 3. 2009	1. 4. 2009
Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek	č.j. 9/2015-120-TN/4 ze dne 2. 2. 2015	15. 2. 2015
Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy	č.j. 291/2016-120-TN/9 ze dne 7. 12. 2016	10. 12. 2016
Kapitola 29 - Zvláštní zakládání	č.j. 1126/10-910-IPK/1 ze dne 16. 12. 2010	1. 1. 2011
Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce	č.j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009	1. 1. 2010
Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

„19010 – I/11 Ostrava – Vítkovice, ul. Rudná 2019“

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GR č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

- 1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

čl. 1.8 STAVENIŠTĚ *se doplňuje:*

Stavba je situována na silničním pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu stavby, jeho překročení je možné jen z vážných technologických důvodů a po předchozím odsouhlasení stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo staveniště hradí zhotovitel.

čl. 1.8.1 Předání Staveniště *se doplňuje:*

Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a zajistí zhotovitel sám. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům podél celé stavby.

čl. 1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu *se doplňuje:*

Práce budou prováděny za omezeného silničního provozu (provizorní dopravní značení, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR a rozhodnutí KÚ o povolení uzavírky zajistí zhotovitel).

Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu zůstává během stavby majetkem zhotovitele.

čl. 1.8.10 Základní podmínky pro užívání Staveniště odst. 8 *se doplňuje:*

Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem neustále čištěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

čl. 1.9.4 Ochranná pásma a chráněná území se doplňuje:

Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů a respektovat ochranná pásma inženýrských sítí.

čl. 1.12 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se doplňuje:

Zhotovitel zpracuje havarijný plán pro případný únik závadných látek do toku nebo kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli.

čl. 1.12.5 Ochrana povrchových a podzemních vod

1. věta se upřesňuje:

V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod

čl. 1.12.6 Odpady se doplňuje:

Podmínkou je, že zhotovitel odkoupí vyzískanou vyfrézovanou asfaltovou směs (za cenu min. 85,08 Kč/t bez DPH) a ocelové konstrukce (cena za výkup v místě a čase obvyklá).

Pro odkoupení vytěženého materiálu bude uzavřena zvláštní smlouva o prodeji.

čl. 2.9.2 Deponie, mezideponie a ukládání na skládky se doplňuje:

Skladování sutin na veřejných prostranstvích mimo obvod staveniště je zakázáno.

čl. 7.5.2 Kontrolní zkoušky se doplňuje:

V rámci kontrolních zkoušek zhotovitel zahrne do Kontrolního zkušebního plánu mimo zkoušek uvedených v Tab. 4 měření IRI multifunkčním zařízením, které bude součástí souboru kontrolních zkoušek v rámci ověření kvality díla. Kontrolní zkoušky hotové asfaltové vrstvy ve smyslu provedení zkoušky spojení vrstev budou provedeny mimo jiné i mezi podkladem a první nově zřízenou asfaltovou vrstvou (parametry budou odpovídat spojení následujících asfaltových vrstev).

čl. 7.5.4 Zkušební postupy se doplňuje:

Zhotovitel provede odběr jádrových vývrtů ve dvou etapách, z ložné vrstvy a z vrstvy obrusné. Rozsah zkoušek a jejich četnost bude odpovídat požadavkům Tab. 4.

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění předmětu veřejné zakázky:

- vlastnit obalovnu nebo mít smluvně zajištěné dodávky směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, s minimálním výkonem 120 t/hod. Obalovna musí být schopna vyrobit asfaltové směsi tak, jak je uvedeno v Technické specifikaci (TKP kapitola 7) pro předmětnou stavbu, přičemž tyto vyráběné asfaltové směsi musí mít před zahájením pokládky platné průkazní zkoušky;
- disponovat níže uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů o následující typové specifikaci a parametrech, které bude v rámci realizace stavby používat:
 - **2 ks finišeru** pro pokládku asfaltové vozovky na jeden pracovní záběr v šířce min. 3,5 m;
 - **3 ks silničních válců** nad 3,5 t, s minimálním výkonem 250 m²/hod..

Objednatel se Zhotovitelem uzavře při uvedení stavby do provozu Dohodu o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla, jejíž závazný návrh je přílohou této Technické specifikace.]

[Pozn. pro účastníka: Dohoda o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla bude uzavřena dle závazného znění v listinné podobě. Tento text bude vymazán.]

ČÁST IV - SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Předmětem této veřejné zakázky je oprava silnice I/11 v Ostravě - Vítkovicích na ul. Rudná v úseku km 284,032 – 285,273 provozního staničení.

Důvodem opravy jsou provozní škody (staré vysprávkky, podélné trhliny, příčné trhliny, mozaikové trhliny, ztráta asfaltového tmele, výtluky, plošné deformace, síťové trhliny), které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu.


Plánovaná oprava bude provedena odfrézováním stávající obrusné živice vrstvy v tl. 110 mm a 40 mm (na mostě ev.č. 11-143), lokální sanací podkladní vrstvy (odstranění stávající podkladní vrstvy v tl. 200 mm a nahrazením vrstvou kameniva zpevněného cementem SC C_{8/10} tl. 200 mm), infiltračním postřikem mod. asfaltovou emulzí 0,60 kg/m², pokládkou asf. betonu ACL 22 S mod v tl. 70 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,25 kg/m² a pokládkou asf. koberce mastixového SMA 11 S mod. v tl. 40 mm.

Celková výměra nepřesáhne 26 510 m².

Součástí opravy bude provedení obnovy VDZ (barva, resp. plast-profil nehluchý a hladký), demontáž zapuštěných dopravních knoflíků, demontáž a montáž stávajících dopravních majáčků a demontáž a montáž křižovatkových smyček.

Napojení na stávající živici bude s patřičným ošetřením spáry.

Orientační mapka:

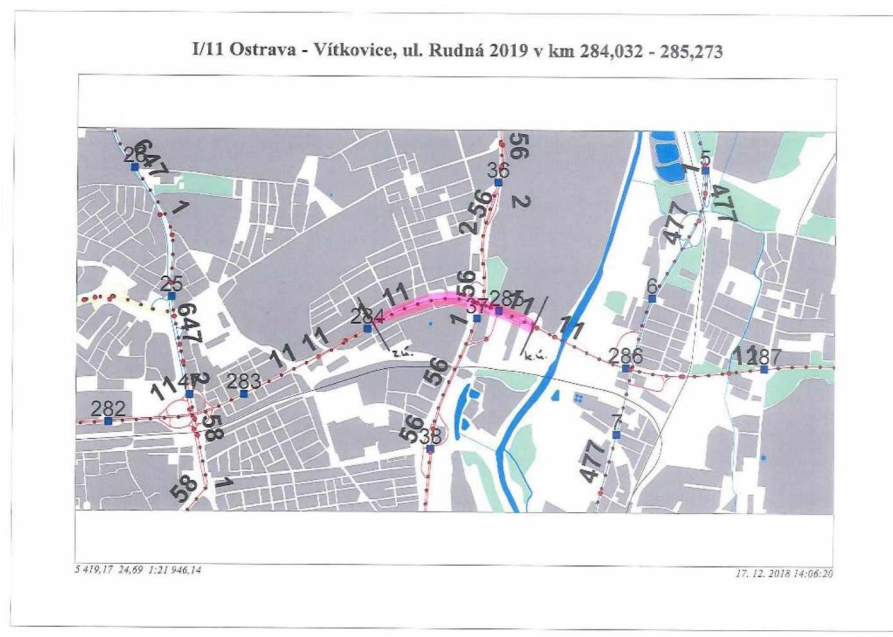

**PŘÍLOHA****Název stavby: I/11 Ostrava - Vítkovice, ul. Rudná 2019**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	JANKOSTAV s.r.o. Štěpaňákova 714/31 719 00 Ostrava- Kunčice
Doba pro dokončení	1.1.9	70 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	42 kalendářních dnů
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou: (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace (VDZ v plastu 36 měsíců, VDZ v barvě 12 měsíců)
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30 000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		60 700,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 12 100,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) 24 200,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 2 400,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? .2, 3, 4 a 5												
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; color: green;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce													
1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)													
2	Zhotovitel													
3	Projektant													
4	Supervize													
[doplňte dle potřeby]														
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]														
Popis Změny:														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem												
		0,00												
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:														
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis											
Supervize	jméno	datum	podpis											
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.														
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis											
Zhotovitel	jméno	datum	podpis											
			Číslo paré:											



FORMULÁŘ 2.3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost JANKOSTAV s.r.o.

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice

IČO: 25855581

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270 jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce **19010 - I/11 Ostrava - Vítkovice, ul. Rudná 2019**, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 16PU-003216 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
FREKOMOS, s.r.o.	619 42 618	Frézování živičného krytu
NVB LINE s.r.o.	269 79 675	Dopravní značení
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.	145 04 456	Infiltrační a spojovací postřiky
ELTODO, a.s.	452 74 517	Křižovatkové smyčky

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ¹

FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost JANKOSTAV s.r.o.

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice

IČO: 25855581

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270 jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce **19010 - I/11 Ostrava - Vítkovice, ul. Rudná 2019**, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 16PU-003216 (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
Asfaltové směsi frézované a vybourané	6 233,70 t	85,08
Ocelový konstrukce	0,08 t	cena za výkup šrotu (v místě a čase obvyklá)

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.
