



SMLOUVA O DÍLO NA DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ – VÝSTAVBU (P+R)

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1096/2019/PH

číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/VIT/1240

ISPROFOND: 500 351 0007

Název zakázky: „GSM-R Votice - České Budějovice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

Kapsch CarrierCom s.r.o.

se sídlem: Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

IČO: 45311005, DIČ: CZ45311005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8707

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: **Ing. Karlem Feixem**, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**GSM-R Votice – České Budějovice**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - a) Dopis o přijetí nabídky datovaný 07.03.2019
 - b) Dopis nabídky datovaný 04.02.2019
 - c) Smluvní podmínky [(i) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (FIDIC 1999) - Obecné podmínky (dále též jen Obecné podmínky); (ii) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně- technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 224/2018-520-DOP/1 účinné od 03.08.2018 (dále též jen Zvláštní podmínky)]
 - d) Požadavky objednatele
 - e) Formuláře:
 - Požadavky na výkon nebo funkci,
 - Posuzovací protokol DUR čj. čj: 25318/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1-Sve ze dne 16.10.2018.
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Požadavcích objednatele, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli následující sestavy v otevřeném datovém formátu (XML):
 - faktura,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
8. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

9. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
10. NEOBSAZENO.
11. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 18 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
12. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
13. Objednatel si vyhrazuje
- 13.1 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ) ve věci použití jednotného řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření (dále též následná úprava GPK). Nebude-li jednacím řízením bez uveřejnění ukončeno smluvním vztahem mezi Objednatelem a Zhotovitelem o zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit jiným zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel projevit součinnost při následné úpravě GPK tak, aby zůstala zachována záruka za jakost v Záruční době dle Podčlánku 11.1 Smluvních podmínek,
- 13.2 NEOBSAZENO.
- 13.3 NEOBSAZENO.
14. Závazky ze smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
15. NEOBSAZENO.
16. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem jako správce smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
17. Smlouva o dílo se vyhotovuje v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž **tři (3)** vyhotovení obdrží Objednatel a **tři (3)** vyhotovení Zhotovitel.
18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává pátý den po nabytí právní moci posledního vydaného Územního rozhodnutí, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Za Objednatele:

V Praze dne 9.4.2019

Za Zhotovitele:

V Praze dne 26.3.2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Karel Feix
jednatel společnosti
Kapsch CarrierCom s.r.o.

Příloha č. 1
Rekapitulace ceny

stavba:		Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]
GSM-R Votice - České Budějovice		251 988 840	251 988 840
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby			
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení		
PDP5	Projektová dokumentace pro provádění stavby		
Cena díla za autorský dozor			
Cena díla za zhotovení stavby			
Číslo objektu	Název objektu	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.2	Železniční sdělovací zařízení		
PS 101	BTS 726 Zast. Hosín		
PS 102	BTS 725 Hluboká nad Vltavou-Zámostí		
PS 103	BTS 724 Přejezd Hosín		
PS 104	BTS 723 Dobřevovice		
PS 105	BTS 722 Chotýčany		
PS 106	BTS 721 Ševětín		
PS 107	BTS 720 Dynín		
PS 108	BTS 719 Veselí nad Lužnicí		
PS 109	BTS 718 Soběslav		
PS 111	Uvedení do provozu úsek Nemanice – Soběslav		
PS 121	Úpravy a doplnění přenosového zařízení, úsek Nemanice – Soběslav		
PS 301	BTS 717 Zvěrotický tunel		
PS 302	BTS 716 Doubí u Tábora		
PS 311	Uvedení do provozu, úsek, Soběslav - Doubí u Tábora		
PS 321	Přenosové zařízení úsek, Soběslav - Doubí u Tábora		
PS 401	BTS 715 Planá nad Lužnicí		
PS 402	BTS 714 Tábor		
PS 403	BTS 713 Čekanice		
PS 404	BTS 712 Chotoviny		
PS 405	BTS 711 Tunel Sudoměřice		
PS 406	BTS 710 Tunel Mezno		
PS 407	BTS 709 Tunel Deboreč		
PS 408	BTS 708 Heřmaničky		
PS 411	Uvedení do provozu, úsek Doubí u Tábora - Sudoměřice u Tábora		
PS 412	Uvedení do provozu, úsek Sudoměřice u Tábora - Votice		
PS 421	Úpravy přenosového zařízení, úsek Doubí u Tábora - Sudoměřice u Tábora		
PS 422	Přenosové zařízení, úsek Sudoměřice u Tábora - Votice		
PS 501	BTS 727 Vlkov nad Lužnicí		
PS 502	BTS 728 Řípec		
PS 503	BTS 729 Tábor-Měšice		
PS 504	BTS 730 Balkova Lhota		
PS 511	Uvedení do provozu odbočné trati		
PS 521	Přenosové zařízení odbočné trati		
PS 601	Doplnění centrálních částí sítě GSM-R		
PS 602	Vybavení hnacích vozidel a uživatelů terminály		
PS 603	Radiovlčky		
PS 611	Úpravy zapojovačů v úseku Ševětín – Soběslav		
PS 612	Zapojovače v úseku Planá n. L - Tábor		
PS 613	Úpravy zapojovačů v úseku Chotoviny - Votice (mimo)		
PS 701	DOK v úseku Nemanice - Ševětín		
E	Železniční stavební část		
SO 801	ŽST Ševětín, doplnění klimatizace		
SO 811	Přechody mostů pro DOK v úseku Nemanice - Ševětín		
Všeobecné konstrukce a práce			
SO 98-98	Všeobecný objekt		

Příloha č. 2
Oprávněné osoby

**Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek,
včetně delegovaných osob dle čl.5, odst. (1), bod g. směrnice SŽDC 105 Změny během výstavby)**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- delegovaná osoba

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- projekt manager:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- odpovědný projektant:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- rádiový plánovač:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) pro systémové části GSM-R (NSS a BSS specialisté):

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) pro pokládku a montáž metalických a optických kabelů:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na zakládání staveb a výstavbu anténních stožárů technologických objektů:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, sídlo poddodavatele, IČO	Věcný popis části plnění uvažovaného zadat poddodavateli (označené dle čísel a názvů jednotlivých SO a PS, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	% hodnoty poddodávky z nabídkové ceny
Společnost AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, Praha 10, IČO: 480 29 483 a Vegacom a.s., Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201, IČO: 257 88 680	montážní práce a zajištění strojů a zařízeních vyžadovaných při plnění veřejné zakázky v dané části díla PS 101 BTS 726 Zast. Hosín, PS 102 BTS 725 Hluboká n. Vltavou - Zámostí, PS 103 BTS 724 přejezd Hosín, PS 104 BTS 723 Dobřejovice, PS 105 BTS 722 Chotýčany, PS 106 BTS 721 Ševětín, PS 107 BTS 720 Dynín, PS 108 BTS 719 Veselí n. Lužnicí, PS 109 BTS 718 Soběslav, PS 301 BTS 717 Tunel Zvěrotický, PS 302 BTS 716 Doubí u Tábora, PS 401 BTS 715 Planá n. Lužnicí, PS 402 BTS 714 Tábor, PS 403 BTS 713 Čekanice, PS 404 BTS 712 Chotoviny, PS 405 BTS 711 Tunel Sudoměřice, PS 406 BTS 710 Tunel Mezno, PS 407 BTS 709 Tunel Deboreč, PS 408 BTS 708 Heřmaničky, PS 501 BTS 727 Vlkov nad Lužnicí, PS 502 BTS 728 Řípec, PS 503 BTS 729 Tábor-Měšice, PS 504 BTS 730 Balkova Lhota, PS 603 Radiovníky, PS 701 DOK v úseku Nemanice – Ševětín, SO 801 ŽST Ševětín, doplnění klimatizace, SO 811 Přechody mostů pro DOK v úseku Nemanice – Ševětín	24%
ČD - Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, PSČ 130 00, Praha 3, IČO: 614 59 445	dodávka a montáž přenosové techniky, zajištění vstupů do drážních objektů PS 121 Úpravy a doplnění přenosového zařízení, úsek Nemanice – Soběslav, PS 321 Přenosové zařízení, úsek Soběslav - Doubí u Tábora, PS 421 Úpravy přenosového zařízení, úsek Doubí u Tábora - Sudoměřice u Tábora, PS 422 Přenosové zařízení, úsek Sudoměřice u Tábora – Votice, PS 521 Přenosové zařízení odbočné tratě	12%
BETONBAU, s.r.o, Průmyslová 566/5, PSČ 108 50, Praha 10, IČO: 496 14 819	výroba a montáž technologických objektů (domků) PS 103 BTS 724 přejezd Hosín, PS 106 BTS 721 Ševětín, PS 107 BTS 720 Dynín, PS 108 BTS 719 Veselí n. Lužnicí, PS 109 BTS 718 Soběslav, PS 301 BTS 717 Tunel Zvěrotický, PS 302 BTS 716 Doubí u Tábora, PS 401 BTS 715 Planá n. Lužnicí, PS 402 BTS 714 Tábor, PS 403 BTS 713 Čekanice, PS 404 BTS 712 Chotoviny, PS 405 BTS 711 Tunel Sudoměřice, PS 406 BTS 710 Tunel Mezno, PS 407 BTS 709 Tunel Deboreč, PS 408 BTS 708 Heřmaničky, PS 501 BTS 727 Vlkov nad Lužnicí, PS 502 BTS 728 Řípec, PS 503 BTS 729 Tábor-Měšice, PS 504 BTS 730 Balkova Lhota	3%
SUDOP PRAHA a.s, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3, IČO: 257 93 349	projektové a zeměměřické práce, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace realizační, dokumentace skutečného stavu PS 101 BTS 726 Zast. Hosín, PS 102 BTS 725 Hluboká n. Vltavou - Zámostí, PS 103 BTS 724 přejezd Hosín, PS 104 BTS 723 Dobřejovice, PS 105 BTS 722 Chotýčany, PS 106 BTS 721 Ševětín, PS 107 BTS 720 Dynín, PS 108 BTS 719 Veselí n. Lužnicí, PS 109 BTS 718 Soběslav, PS 301 BTS 717 Tunel Zvěrotický, PS 302 BTS 716 Doubí u Tábora, PS 401 BTS 715 Planá n. Lužnicí, PS 402 BTS 714 Tábor, PS 403 BTS 713 Čekanice, PS 404 BTS 712 Chotoviny, PS 405 BTS 711 Tunel Sudoměřice, PS 406 BTS 710 Tunel Mezno, PS 407 BTS 709 Tunel Deboreč, PS 408 BTS 708 Heřmaničky, PS 501 BTS 727 Vlkov nad Lužnicí, PS 502 BTS 728 Řípec, PS 503 BTS 729 Tábor-Měšice, PS 504 BTS 730 Balkova Lhota, PS 603 Radiovníky, PS 701 DOK v úseku Nemanice – Ševětín, SO 811 Přechody mostů pro DOK v úseku Nemanice – Ševětín	5%

TEPLOTCHNA Ostrava a.s., Šenovská 101/543, PSČ 716 12, Ostrava, IČO: 451 93 771	dodávka a montáž stožárů, anténních konstrukcí a kabelových lávek a zajištění strojů a zařízení vyžadovaných při plnění veřejné zakázky PS 101 BTS 726 Zast. Hosín, PS 102 BTS 725 Hluboká n. Vltavou - Zámostí, PS 103 BTS 724 přejezd Hosín, PS 104 BTS 723 Dobřejovice, PS 105 BTS 722 Chotýčany, PS 106 BTS 721 Ševětín, PS 107 BTS 720 Dynín, PS 108 BTS 719 Veselí n. Lužnicí, PS 109 BTS 718 Soběslav, PS 301 BTS 717 Tunel Zvěrotický, PS 302 BTS 716 Doubí u Tábora, PS 401 BTS 715 Planá n. Lužnicí, PS 402 BTS 714 Tábor, PS 403 BTS 713 Čekanice, PS 404 BTS 712 Chotoviny, PS 405 BTS 711 Tunel Sudoměřice, PS 406 BTS 710 Tunel Mezno, PS 407 BTS 709 Tunel Deboreč, PS 408 BTS 708 Heřmaničky, PS 501 BTS 727 Vlkov nad Lužnicí, PS 502 BTS 728 Řípec, PS 503 BTS 729 Tábor-Měšice, PS 504 BTS 730 Balkova Lhota	18%
EnerSys, s.r.o., Roztylské náměstí 649/19, PSČ 141 00, Praha 4, IČO: 452 41 759	dodávka a montáž baterií a dalších napájecích komponent PS 101 BTS 726 Zast. Hosín, PS 102 BTS 725 Hluboká n. Vltavou - Zámostí, PS 103 BTS 724 přejezd Hosín, PS 104 BTS 723 Dobřejovice, PS 105 BTS 722 Chotýčany, PS 106 BTS 721 Ševětín, PS 107 BTS 720 Dynín, PS 108 BTS 719 Veselí n. Lužnicí, PS 109 BTS 718 Soběslav, PS 301 BTS 717 Tunel Zvěrotický, PS 302 BTS 716 Doubí u Tábora, PS 401 BTS 715 Planá n. Lužnicí, PS 402 BTS 714 Tábor, PS 403 BTS 713 Čekanice, PS 404 BTS 712 Chotoviny, PS 405 BTS 711 Tunel Sudoměřice, PS 406 BTS 710 Tunel Mezno, PS 407 BTS 709 Tunel Deboreč, PS 408 BTS 708 Heřmaničky, PS 501 BTS 727 Vlkov nad Lužnicí, PS 502 BTS 728 Řípec, PS 503 BTS 729 Tábor-Měšice, PS 504 BTS 730 Balkova Lhota	3%
KABEL TRADE PRAHA s.r.o., Praha 4 - Kunratice, Dobronická 1257, PSČ 148 00, IČO: 25613383	Dodávka anténních systémů a komponent PS 101 BTS 726 Zast. Hosín, PS 102 BTS 725 Hluboká n. Vltavou - Zámostí, PS 103 BTS 724 přejezd Hosín, PS 104 BTS 723 Dobřejovice, PS 105 BTS 722 Chotýčany, PS 106 BTS 721 Ševětín, PS 107 BTS 720 Dynín, PS 108 BTS 719 Veselí n. Lužnicí, PS 109 BTS 718 Soběslav, PS 301 BTS 717 Tunel Zvěrotický, PS 302 BTS 716 Doubí u Tábora, PS 401 BTS 715 Planá n. Lužnicí, PS 402 BTS 714 Tábor, PS 403 BTS 713 Čekanice, PS 404 BTS 712 Chotoviny, PS 405 BTS 711 Tunel Sudoměřice, PS 406 BTS 710 Tunel Mezno, PS 407 BTS 709 Tunel Deboreč, PS 408 BTS 708 Heřmaničky, PS 501 BTS 727 Vlkov nad Lužnicí, PS 502 BTS 728 Řípec, PS 503 BTS 729 Tábor-Měšice, PS 504 BTS 730 Balkova Lhota	<1%
ELPRAMO s.r.o., Praha 9 - Hloubětín, Nademlejnská 600/1, PSČ 198 00, IČO: 28187903	Dodávka el. rozvaděčů, el. Instalace PS 101 BTS 726 Zast. Hosín, PS 102 BTS 725 Hluboká n. Vltavou - Zámostí, PS 103 BTS 724 přejezd Hosín, PS 104 BTS 723 Dobřejovice, PS 105 BTS 722 Chotýčany, PS 106 BTS 721 Ševětín, PS 107 BTS 720 Dynín, PS 108 BTS 719 Veselí n. Lužnicí, PS 109 BTS 718 Soběslav, PS 301 BTS 717 Tunel Zvěrotický, PS 302 BTS 716 Doubí u Tábora, PS 401 BTS 715 Planá n. Lužnicí, PS 402 BTS 714 Tábor, PS 403 BTS 713 Čekanice, PS 404 BTS 712 Chotoviny, PS 405 BTS 711 Tunel Sudoměřice, PS 406 BTS 710 Tunel Mezno, PS 407 BTS 709 Tunel Deboreč, PS 408 BTS 708 Heřmaničky, PS 501 BTS 727 Vlkov nad Lužnicí, PS 502 BTS 728 Řípec, PS 503 BTS 729 Tábor-Měšice, PS 504 BTS 730 Balkova Lhota	5%
Delta G s. r. o., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 02362538	Geodetické práce PS 101 BTS 726 Zast. Hosín, PS 102 BTS 725 Hluboká n. Vltavou - Zámostí, PS 103 BTS 724 přejezd Hosín, PS 104 BTS 723 Dobřejovice, PS 105 BTS 722 Chotýčany, PS 106 BTS 721 Ševětín, PS 107 BTS 720 Dynín, PS 108 BTS 719 Veselí n. Lužnicí, PS 109 BTS 718 Soběslav, PS 301 BTS 717 Tunel Zvěrotický, PS 302 BTS 716 Doubí u Tábora, PS 401 BTS 715 Planá n. Lužnicí, PS 402 BTS 714 Tábor, PS 403 BTS 713 Čekanice, PS 404 BTS 712 Chotoviny, PS 405 BTS 711 Tunel Sudoměřice, PS 406 BTS 710 Tunel Mezno, PS 407 BTS 709 Tunel Deboreč, PS 408 BTS 708 Heřmaničky, PS 501 BTS 727 Vlkov nad Lužnicí, PS 502 BTS 728 Řípec, PS 503 BTS 729 Tábor-Měšice, PS 504 BTS 730 Balkova Lhota	<1%

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Novodvorská 1698, Praha 4 - Braník, PSČ 14201, IČO: 27257258	Autorizovaná / Notifikovaná osoba, certifikace PS 101 BTS 726 Zast. Hosín, PS 102 BTS 725 Hluboká n. Vltavou - Zámostí, PS 103 BTS 724 přejezd Hosín, PS 104 BTS 723 Dobřejovice, PS 105 BTS 722 Chotýčany, PS 106 BTS 721 Ševětín, PS 107 BTS 720 Dynín, PS 108 BTS 719 Veselí n. Lužnicí, PS 109 BTS 718 Soběslav, PS 301 BTS 717 Tunel Zvěrotický, PS 302 BTS 716 Doubí u Tábora, PS 401 BTS 715 Planá n. Lužnicí, PS 402 BTS 714 Tábor, PS 403 BTS 713 Čekanice, PS 404 BTS 712 Chotoviny, PS 405 BTS 711 Tunel Sudoměřice, PS 406 BTS 710 Tunel Mezno, PS 407 BTS 709 Tunel Deboreč, PS 408 BTS 708 Heřmaničky, PS 501 BTS 727 Vlkov nad Lužnicí, PS 502 BTS 728 Řípec, PS 503 BTS 729 Tábor-Měšice, PS 504 BTS 730 Balkova Lhota	<1%
KATHREIN CS s.r.o., Praha 4, Na rovinách 6/390, PSČ 140 00, IČO: 61774812	Anténní systémy PS 101 BTS 726 Zast. Hosín, PS 102 BTS 725 Hluboká n. Vltavou - Zámostí, PS 103 BTS 724 přejezd Hosín, PS 104 BTS 723 Dobřejovice, PS 105 BTS 722 Chotýčany, PS 106 BTS 721 Ševětín, PS 107 BTS 720 Dynín, PS 108 BTS 719 Veselí n. Lužnicí, PS 109 BTS 718 Soběslav, PS 301 BTS 717 Tunel Zvěrotický, PS 302 BTS 716 Doubí u Tábora, PS 401 BTS 715 Planá n. Lužnicí, PS 402 BTS 714 Tábor, PS 403 BTS 713 Čekanice, PS 404 BTS 712 Chotoviny, PS 405 BTS 711 Tunel Sudoměřice, PS 406 BTS 710 Tunel Mezno, PS 407 BTS 709 Tunel Deboreč, PS 408 BTS 708 Heřmaničky, PS 501 BTS 727 Vlkov nad Lužnicí, PS 502 BTS 728 Řípec, PS 503 BTS 729 Tábor-Měšice, PS 504 BTS 730 Balkova Lhota	<1%
CELKEM %		74%

Příloha č. 4


Harmonogram postupu prací

Harmonogram prací


Název stavby: GSM-R Votice - České Budějovice

Název práce / činnosti	Doba trvání (ve dnech)	Předpokládaný začátek (ve dnech)	Předpokládaný konec (ve dnech)
Podpis smlouvy / zahájení stavby k 02/19	1	1	1
Přípravné práce	29	1	30
Úvodní porada	1	7	7
Zpracování rádiového plánování	60	30	90
Zpracování projektu stavby, odsouhlasení, projednání	30	30	60
Vydání stavebního povolení v právní moci	30	60	90
PS 101-109	620	90	710
PS 111 - Uvedení do provozu, úsek Nemanice - Soběslav	175	550	725
PS 121 - Úpravy a doplnění přenosového zařízení, úsek Nemanice - Soběslav	240	480	720
PS 301 - 302	350	330	680
PS 311 - Uvedení do provozu, úsek, Soběslav - Doubí u Tábora	50	640	690
PS 321 - Přenosové zařízení, úsek Soběslav - Doubí u Tábora	90	530	620
PS 401 - 408	459	530	989
PS 411 - Uvedení do provozu, úsek Doubí u Tábora - Sudoměřice u Tábora	40	960	1000
PS 412 - Uvedení do provozu, úsek Sudoměřice u Tábora - Votice	34	965	999
PS 421 - Úpravy přenosového zařízení, úsek Doubí u Tábora - Sudoměřice u Tábora	285	685	970
PS 422 - Přenosové zařízení, úsek Sudoměřice u Tábora - Votice	302	675	977
PS 501 - 504	600	850	1450
PS 511 - Uvedení do provozu odbočné tratě	120	1350	1470
PS 521 - Přenosové zařízení odbočné tratě	430	1000	1430
PS 601 - Doplnění centrálních částí sítě GSM-R	229	401	630
PS 602 - Vybavení hnacích vozidel a uživatelů terminály	200	1000	1200
PS 603 - Radiovlčky	180	1220	1400
PS 611 - Úpravy zapojovačů v úseku Ševětín – Soběslav	110	540	650
PS 612 - Zapojovače v úseku Planá n. L – Tábor	340	150	490
PS 613 - Úpravy zapojovačů v úseku Chotoviny – Votice (mimo)	140	120	260
PS 701 - DOK v úseku Nemanice - Ševětín	640	60	700
SO 801 - ŽST Ševětín, doplnění klimatizace	210	320	530
SO 811 - Přečody mostů pro DOK v úseku Nemanice – Ševětín	520	90	610
Provedení akceptačního měření	20	1470	1490
Autorský dozor + rezerva	1435	55	1490
Dokončení projekční a stavební části	1499	1	1500
Vyhotovení a předání dokumentace projektu	180	1500	1680
Lhůta pro dokončení projektu	1680	1	1680

Harmonogram GSM-R Votice - České Budějovice

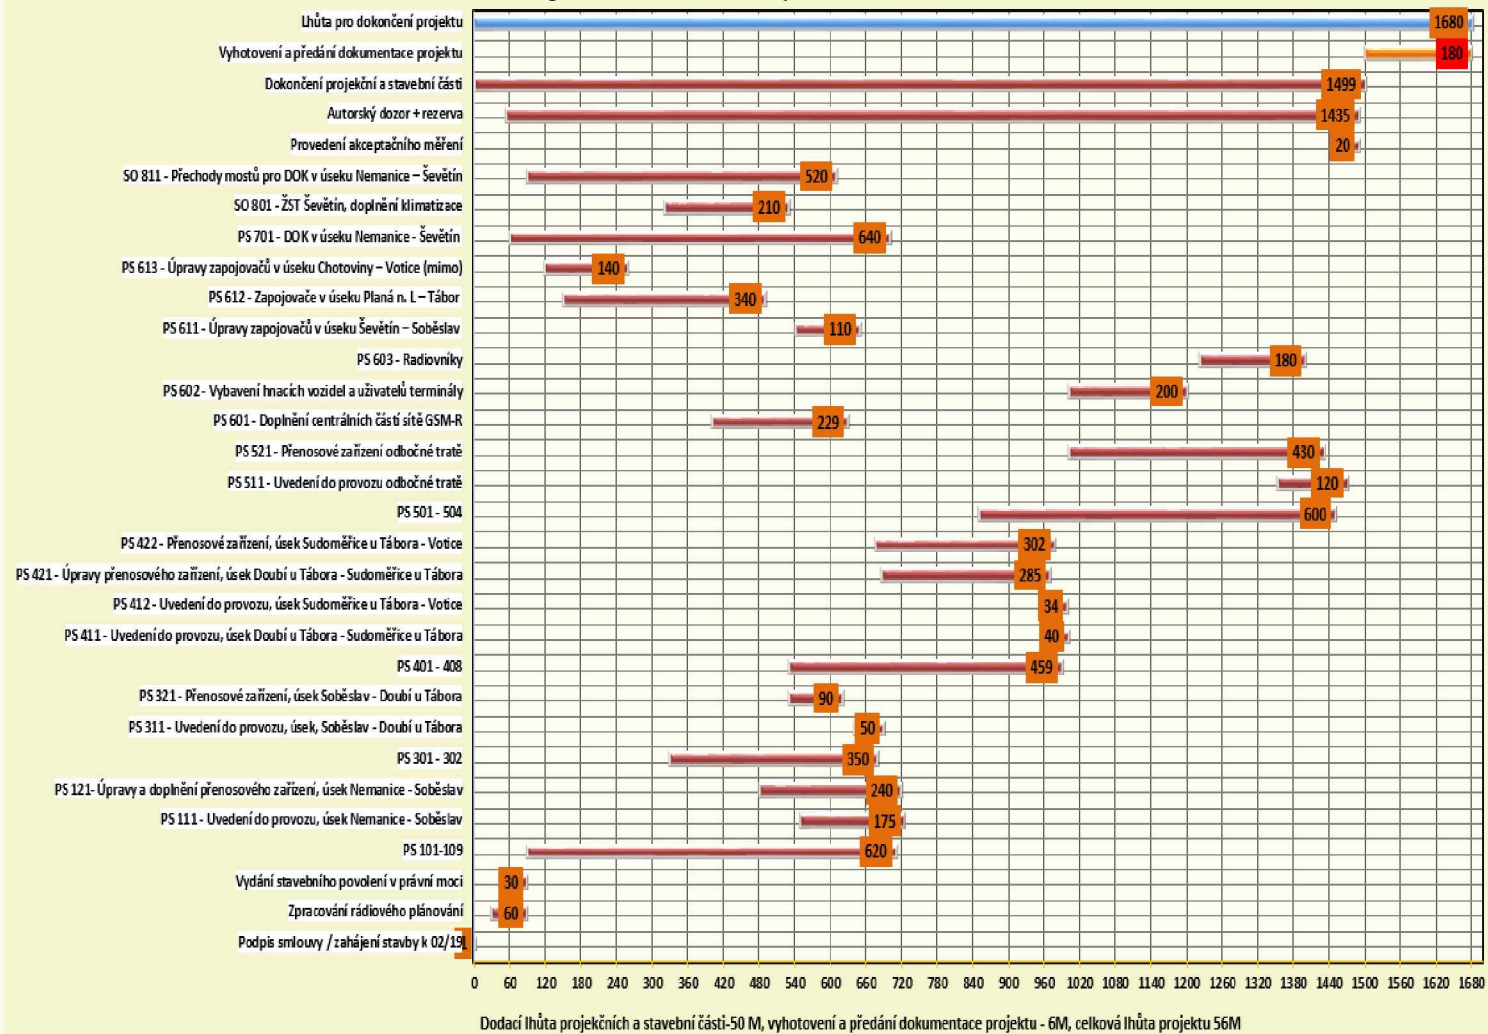

Měsíc	Procenta
1	0,00%
2	0,50%
3	0,70%
4	0,90%
5	0,99%
6	1,22%
7	1,30%
8	1,60%
9	1,70%
10	1,75%
11	1,80%
12	1,85%
13	1,90%
14	1,95%
15	1,99%
16	2,00%
17	2,10%
18	2,20%
19	2,30%
20	2,00%
21	2,08%
22	2,15%
23	2,22%
24	2,30%
25	2,38%
26	2,45%
27	2,60%
28	2,60%
29	2,68%
30	2,75%
31	2,83%
32	2,90%
33	2,98%
34	3,05%
35	3,10%
36	3,10%
37	3,28%
38	3,25%
39	2,00%
40	1,80%
41	1,60%
42	1,40%
43	1,50%
44	1,60%
45	1,70%
46	1,75%
47	1,85%
48	1,45%
49	1,18%
50	0,90%
51	0,80%
52	0,60%
53	0,30%
54	0,16%

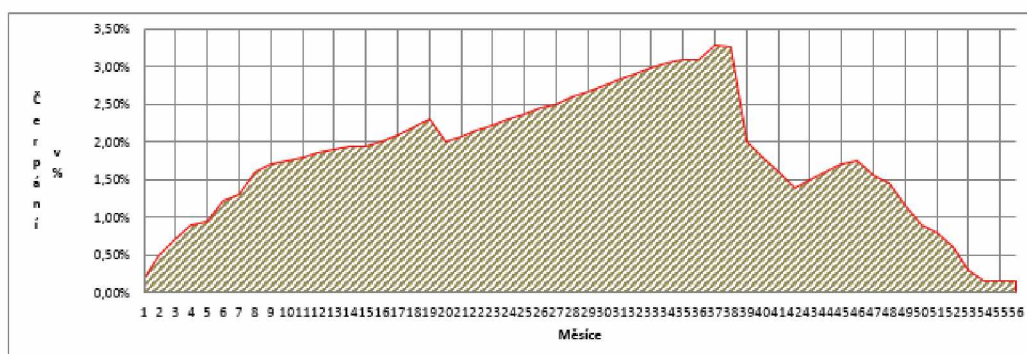

Příloha č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst. 2.3.25 přílohy č. 2 této Smlouvy o dílo.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údaj.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 249245

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eded1943-7288-492d-92f2-9b582838764d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.04.2019 12:58:04



c6d22fe7-4787-4c62-92ae-2471aa92da03
