



SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-891/2019/PAL**

ISPROFOND: 542 353 0004

a

Společnosti s názvem „**OLDA EŽ+EDIKT**“

založené Společenskou smlouvou 19. 11. 2018

Vedoucí účastník společnosti

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: **Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a**

IČO: **471 15 921**, DIČ: **CZ47115921**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. **B 1809**

bank. spojení:

zastoupena:

Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

a

Druhý účastník společnosti:

EDIKT a.s.

se sídlem: **Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice**

IČO: **25172328**, DIČ: **CZ25172328**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. Zn. B 904**

zastoupena: **Pavel Dolanský, předseda představenstva**

Korespondenční adresa a sídlo Společnosti je na adrese:

Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18/19-OZ/SOD**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“ nebo „**Smlouva o dílo**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - a) Dopis o přijetí nabídky;
 - b) Dopis nabídky datovaný 19. 11. 2018;
 - c) Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č.j. 78/2017-910-IZD/1 Stavba: „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“;
 - d) Technická specifikace;
 - e) Výkresy a;
 - f) Formuláře:
 - Soupis prací,
 - Posuzovací protokol dokumentace ke stavebnímu povolení č.j. 21386/2018-SŽDC-SSZ-ÚT2-Hal ze dne 24.08.2018.
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používání informační systém pro řízení a monitoring staveb.

- 5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní ode dne účinnosti Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a současně v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru <https://www.xc4.cz/oceneni/>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
- Faktura,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - zjišťovací protokoly,
 - měřicí protokoly skutečně provedeného množství prací.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Strany se dohodly, že ujednání Pod-článku 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby] Smluvních podmínek v části „*Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.*“ a ujednání Pod-článku 14.11 [Žádost o potvrzení závěrečné platby] Smluvních podmínek v části „*Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.*“ se nepoužije. Strany se dále dohodly, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vydání Potvrzení průběžné platby nebo den vydání Potvrzení závěrečné platby.
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatel ve smyslu pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatel.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. Neobsazeno.

13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 20 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje:
- 15.1 změnu závazku v souladu s § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ), ve věci použití jednacímho řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření (dále též následná úprava GPK). Nebude-li jednacím řízení bez uveřejnění ukončeno smluvním vztahem mezi Objednatel a Zhotovitelem o zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit jiným zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel projevit součinnost při následné úpravě GPK tak aby zůstala zachována záruka za jakost v Záruční době dle Podčlánku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] Smluvních podmínek.
- 15.2 požadavek v souladu s § 105, odst.2 ZZVZ, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:
- realizace SO 53-33-01 Osek – Louka u Litvínova, železniční svršek
 - realizace SO 53-33-02 Osek – Louka u Litvínova, železniční spodek
 - realizace SO 53-60-01 Osek – Louka u Litvínova, trakční vedení
- 15.3 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ ve věci činností prováděných v souvislosti s Pravidly pro publicitu v rámci OPD pro projekty spolufinancované z fondů EU. Specifikace činností a podmínky pro jejich provedení jsou uvedeny v Technické specifikaci – ZTP.
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat. Forma dodatku se nevyžaduje v případě změn provedených změnovými listy jakožto záznamy o změně závazku ze smlouvy, avšak s výjimkou změn zaříděných podle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ), a pro veřejné zakázky na dodatečné dodávky podle § 64 písm.b) ZZVZ zadávané postupem v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 a násl. ZZVZ.

Nové vystrojené betonové pražce/kolejnice, které jsou součástí SO 51-33-01, SO 52-33-01, SO 53-33-01, SO 54-33-01, SO 55-33-01 a SO 56-33-01 dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení Díla. Nákup vystrojených betonových pražců/kolejnic provede centrálně Objednatel včetně dodávky na místo a v čase určeném Zhotovitelem (dále jen „místo/místa předání“). Místem předání bude/budou

Etapy dodávek:			KOLEJNICE			
ROK:	období	úseky (SO)	kolejnice (m) výpočet	pasy dl. 75m	Betonový pražec	počet vozů (po 168ks)
2019	červen	54, 55, 56	7964	110	6384	38,00
2020 - 1. část	březen	53	10480	150	8736	52,00
2020 - 2. část	červen	52, 51	9791	117	7749	46,12

Místo/místa předání se musí nacházet v obvodu organizační jednotky Objednatele Oblastní ředitelství Ústí nad Labem a zajistí ho Zhotovitel.

17. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný, bezpodmínečný a neodvolatelný příslib banky, kterým prokázal, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši 115 milionů Kč. Príslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudrží v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
18. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatелеm jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
19. Smlouva o dílo se vyhotovuje v devíti vyhotoveních, z nich 5 vyhotovení obdrží Objednatel a 4 vyhotovení Zhotovitel.
20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 23.4.2019

V Praze dne 14.03- 2019

.....
Objednatel
Ing. Mojmír Nejezchleb
 náměstek GR pro modernizaci dráhy

Zhotovitel
Ing. Luděk Valtr
Elektrizace železnic Praha a.s.
 a.s.
 Předseda představenstva

Ing. Martin Janovský
Elektrizace železnic Praha a.s.
 Místopředseda představenstva

Pavel Dolanský
EDIKT a.s.
 Předseda představenstva

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov			898 847 737,00	898 847 737,00
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
Cena díla za zhotovení stavby				898 847 737,00
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)				
PS 50-21-01	Zavázání TZZ do ŽST Oldřichov u Duchcova			
PS 52-21-01	ŽST Osek, SZZ			
PS 54-21-01	ŽST Louka u Litvínova, SZZ			
PS 56-21-01	ŽST Litvínov, SZZ			
D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)				
PS 51-21-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, TZZ			
PS 53-21-01	Osek - Louka u Litvínova, TZZ			
PS 55-21-01	Louka u Litvínova - Litvínov, TZZ			
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 51-22-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, DOK a TK			
PS 51-22-02	Oldřichov u Duchcova - Osek, úprava stávající kabelizace			
PS 51-22-11	Oldřichov u Duchcova - Osek, přenosový systém			
PS 52-22-01	ŽST Osek, MK			
PS 53-22-01	Osek - Louka u Litvínova, DOK a TK			
PS 53-22-02	Osek - Louka u Litvínova, úprava stávající kabelizace			
PS 54-22-01	ŽST Louka u Litvínova, MK			
PS 54-22-02	ŽST Louka u Litvínova, úprava stávající kabelizace			
PS 55-22-01	Louka u Litvínova - Litvínov, DOK a TK			
PS 55-22-02	Louka u Litvínova - Litvínov, úprava stávající kabelizace			
PS 56-22-01	ŽST Litvínov, MK			
PS 52-22-31	ŽST Osek, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení			
PS 52-22-61	ŽST Osek, EZS			
PS 54-22-31	ŽST Louka u Litvínova, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení			
PS 54-22-61	ŽST Louka u Litvínova, EZS			
PS 56-22-31	ŽST Litvínov, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení			
PS 56-22-61	ŽST Litvínov, EZS			
PS 51-22-21	Zast. Háj u Duchcova, rozhlasové zařízení			
PS 52-22-21	ŽST Osek, rozhlasové zařízení			
PS 52-22-51	ŽST Osek, kamerový systém			
PS 53-22-21	Zast. Lom u Mostu, rozhlasové zařízení			
PS 54-22-21	ŽST Louka u Litvínova, rozhlasové zařízení			
PS 54-22-22	ŽST Louka u Litvínova, informační systém			
PS 54-22-51	ŽST Louka u Litvínova, kamerový systém			
PS 56-22-21	ŽST Litvínov, rozhlasové zařízení			
PS 56-22-51	ŽST Litvínov, kamerový systém			
PS 52-22-41	Osek - Louka u Litvínova, TRS			
PS 53-22-42	ŽST Osek, místní rádiové síť			
PS 54-22-41	ŽST Louka u Litvínova, místní rádiové síť			
PS 56-22-41	ŽST Litvínov, místní rádiové síť			
PS 54-22-81	ŽST Louka u Litvínova, integrační koncentrátor			
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT				
PS 52-26-31	ŽST Osek, DŘT			
PS 54-26-31	ŽST Louka u Litvínova, DŘT			
PS 56-26-31	ŽST Litvínov, DŘT			
PS 57-26-31	Elektrodispečink Ústí nad Labem, doplnění DŘT			
E.1.1 Železniční svršek a spodek				
SO 51-33-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční svršek			
SO 51-33-02	Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční spodek			
SO 52-33-01	ŽST Osek, železniční svršek			
SO 52-33-02	ŽST Osek, železniční spodek			
SO 53-33-01	Osek - Louka u Litvínova, železniční svršek			
SO 53-33-02	Osek - Louka u Litvínova, železniční spodek			
SO 53-33-02.1	Železniční propustek v ev. km 48,060			
SO 53-33-02.2	Železniční propustek v ev. km 48,350			
SO 53-33-02.3	Železniční propustek v ev. km 48,640			
SO 53-33-02.4	Železniční propustek v ev. km 49,180			
SO 53-33-02.6	Osek - Louka u Litvínova, opěrná konstrukce			
SO 53-33-02.7	Železniční most v ev. km 51,567			
SO 54-33-01	ŽST Louka u Litvínova, železniční svršek			
SO 54-33-02	ŽST Louka u Litvínova, železniční spodek			
SO 55-33-01	Louka u Litvínova - Litvínov, železniční svršek			
SO 55-33-02	Louka u Litvínova - Litvínov, železniční spodek			
SO 56-33-01	ŽST Litvínov, železniční svršek			
SO 56-33-02	ŽST Litvínov, železniční spodek			
SO 51-15-01	Oldřichov u Duchcova - Litvínov, vystrojení trati			
E.1.2 Nástupiště				
SO 51-14-01	Zast. Háj u Duchcova, nástupiště			
SO 52-14-01	ŽST Osek, nástupiště			
SO 53-14-01	Zast. Lom u Mostu, nástupiště			
SO 54-14-01	ŽST Louka u Litvínova, nástupiště			
SO 56-14-01	ŽST Litvínov, nástupiště			
E.1.2. Přejezdy				
SO 51-33-31	Přejezd ev. km 44,638			
SO 51-33-32	Přejezd ev. km 45,845			
SO 53-33-31	Přejezd ev. km 49,972			
SO 55-33-31	Přejezd ev. km 54,582			
SO 55-33-32	Přejezd ev. km 53,988			
SO 55-33-33	Přejezd ev. km 55,070			
E.1.4. Mosty, propustky a zdi				
SO 51-20-01	Železniční most v ev. km 43,774			
SO 51-20-02	Železniční most v ev. km 46,075			
SO 51-20-03	Železniční most v ev. km 46,242			
SO 52-20-01	Železniční most v ev. km 46,629			
SO 53-20-01	Železniční most v ev. km 47,684			
SO 53-20-02	Železniční most v ev. km 50,195			
SO 55-22-01	Silniční most v ev. km 54,710			
SO 55-20-01	Železniční most v ev. km 54,816 - přestavba na propustek			

SO 51-21-01	Propustek v ev. km 44,711			
SO 51-21-02	Propustek v ev. km 45 110			
SO 51-21-03	Propustek v ev. km 45 290			
SO 51-21-04	Propustek v ev. km 46 164 - demolice			
SO 52-21-01	Propustek v ev. km 46,585 - demolice			
SO 52-21-02	Propustek v ev. km 47 494			
SO 52-21-03	Propustek v ev. km 47 615			
SO 53-21-01	Propustek v ev. km 48,525			
SO 53-21-02	Propustek v ev. km 48,795			
SO 55-21-01	Propustek v ev. km 54,150			
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty				
SO 51-73-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, ochrana telekomunikačních sítí jiných operátorů			
SO 53-73-01	Osek - Louka u Litvínova, ochrana telekomunikačních sítí jiných operátorů			
SO 55-73-01	Louka u Litvínova - Litvínov, ochrana telekomunikačních sítí jiných operátorů			
SO 55-72-01	Louka u Litvínova - Litvínov, ochrana kabelových tras nn cizích správců			
SO 54-75-01	Louka u Litvínova, vodovodní přípojka			
E.2 Pozemní stavební objekty				
SO 52-31-01	ŽST Osek, přístupové komunikace na nástupiště			
SO 54-31-01	ŽST Louka u Litvínova, přístupové komunikace na nástupiště			
SO 56-31-01	ŽST Litvínov, přístupové komunikace a zpevněná plocha			
SO 52-40-01	ŽST Osek, technologický objekt			
SO 54-40-01	ŽST Louka u Litvínova, technologický objekt			
SO 56-40-01	ŽST Litvínov, technologický objekt			
SO 51-41-01	Zast.Háj u Duchcova, nástupištní přístřešky			
SO 52-41-01	ŽST Osek, nástupištní přístřešky			
SO 53-41-01	Zast. Lom u Mostu, nástupištní přístřešky			
SO 54-41-01	ŽST Louka u Litvínova, nástupištní přístřešky			
SO 56-41-01	ŽST Litvínov, nástupištní přístřešky			
SO 51-43-01	Zast.Háj u Duchcova, orientační systém			
SO 52-43-01	ŽST Osek, orientační systém			
SO 53-43-01	Zast. Lom u Mostu, orientační systém			
SO 54-43-01	ŽST Louka u Litvínova, orientační systém			
SO 56-43-01	ŽST Litvínov, orientační systém			
SO 54-44-01	ŽST Louka u Litvínova, demolice			
E.3. Trakční a energetická zařízení				
SO 51-60-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, trakční vedení			
SO 52-60-01	ŽST Osek, trakční vedení			
SO 53-60-01	Osek - Louka u Litvínova, trakční vedení			
SO 54-60-01	ŽST Louka u Litvínova, trakční vedení			
SO 55-60-01	Louka u Litvínova - Litvínov, trakční vedení			
SO 56-60-01	ŽST Litvínov, trakční vedení			
SO 52-64-01	ŽST Osek, EOv			
SO 54-64-01	ŽST Louka u Litvínova, EOv			
SO 56-64-01	ŽST Litvínov, EOv			
SO 51-62-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, demontáž rozvodu 6kV			
SO 51-62-02	Zast. Háj u Duchcova, úprava rozvodu NN a osvětlení			
SO 52-62-01	ŽST Osek, úprava rozvodu NN a osvětlení			
SO 52-62-02	ŽST Osek, úprava DOUO			
SO 53-62-01	Zast. Lom u Mostu, úprava rozvodu NN a osvětlení			
SO 54-62-01	ŽST Louka u Litvínova, úprava rozvodu NN a osvětlení			
SO 54-62-02	ŽST Louka u Litvínova, úprava DOUO			
SO 56-62-01	ŽST Litvínov, úprava rozvodu NN a osvětlení			
SO 51-61-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, trakční vedení			
SO 52-61-01	ŽST Osek, ukolejnění vodivých konstrukcí			
SO 53-61-01	Osek - Louka u Litvínova, ukolejnění vodivých konstrukcí			
SO 54(5)-61-01	ŽST Louka u Litvínova, ukolejnění vodivých konstrukcí + Louka u Litvínova - Litvínov, ukolejnění vodivých konstrukcí			
SO 56-61-01	ŽST Litvínov, ukolejnění vodivých konstrukcí			
SO 52-40-01.2	ŽST Osek, technologický objekt - elektroinstalace, hromosvod a uzemnění			
SO 54-40-01.2	ŽST Louka u Litvínova, technologický objekt - elektroinstalace, hromosvod a uzemnění			
SO 56-40-01.2	ŽST Litvínov, technologický objekt - elektroinstalace, hromosvod a uzemnění			
Všeobecný objekt				
SO 99-98-98	Všeobecný objekt			
Dělení majetku:				
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]			898 847 737,00
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			0,00
	Kontrolní součet [Kč]			898 847 737,00
	Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]			898 847 737,00

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně delegovaných osob dle čl. 5, odst. (1) bod g) Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- delegovaná osoba:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na železniční spodek:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce):

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za skladové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení:


Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Příloha č. 3
Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2 Záběhlice, 106 00 Praha 10 IČO 480 29 483	Zajištění realizace částí: D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) D.2 Železniční sdělovací zařízení E.1.5 Ostatní objekty – část	27 %
Skanska a.s. Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 IČO 262 71 303	Zajištění realizace částí: E.1.1 Železniční svršek a spodek – část E.1.2 Nástupiště E.1.2 Přejezdy E.1.4 Mosty, propustky a zdi E.1.5 Ostatní objekty – část E.2 Pozemní stavební objekty	30 %
4G consite s.r.o. Praha 6, Šlikova 406/29, PSČ 16900 IČO 276 24 218	Zajištění geologických prací a činností spojených s odpovědností za geotechnické práce.	0,1 %

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

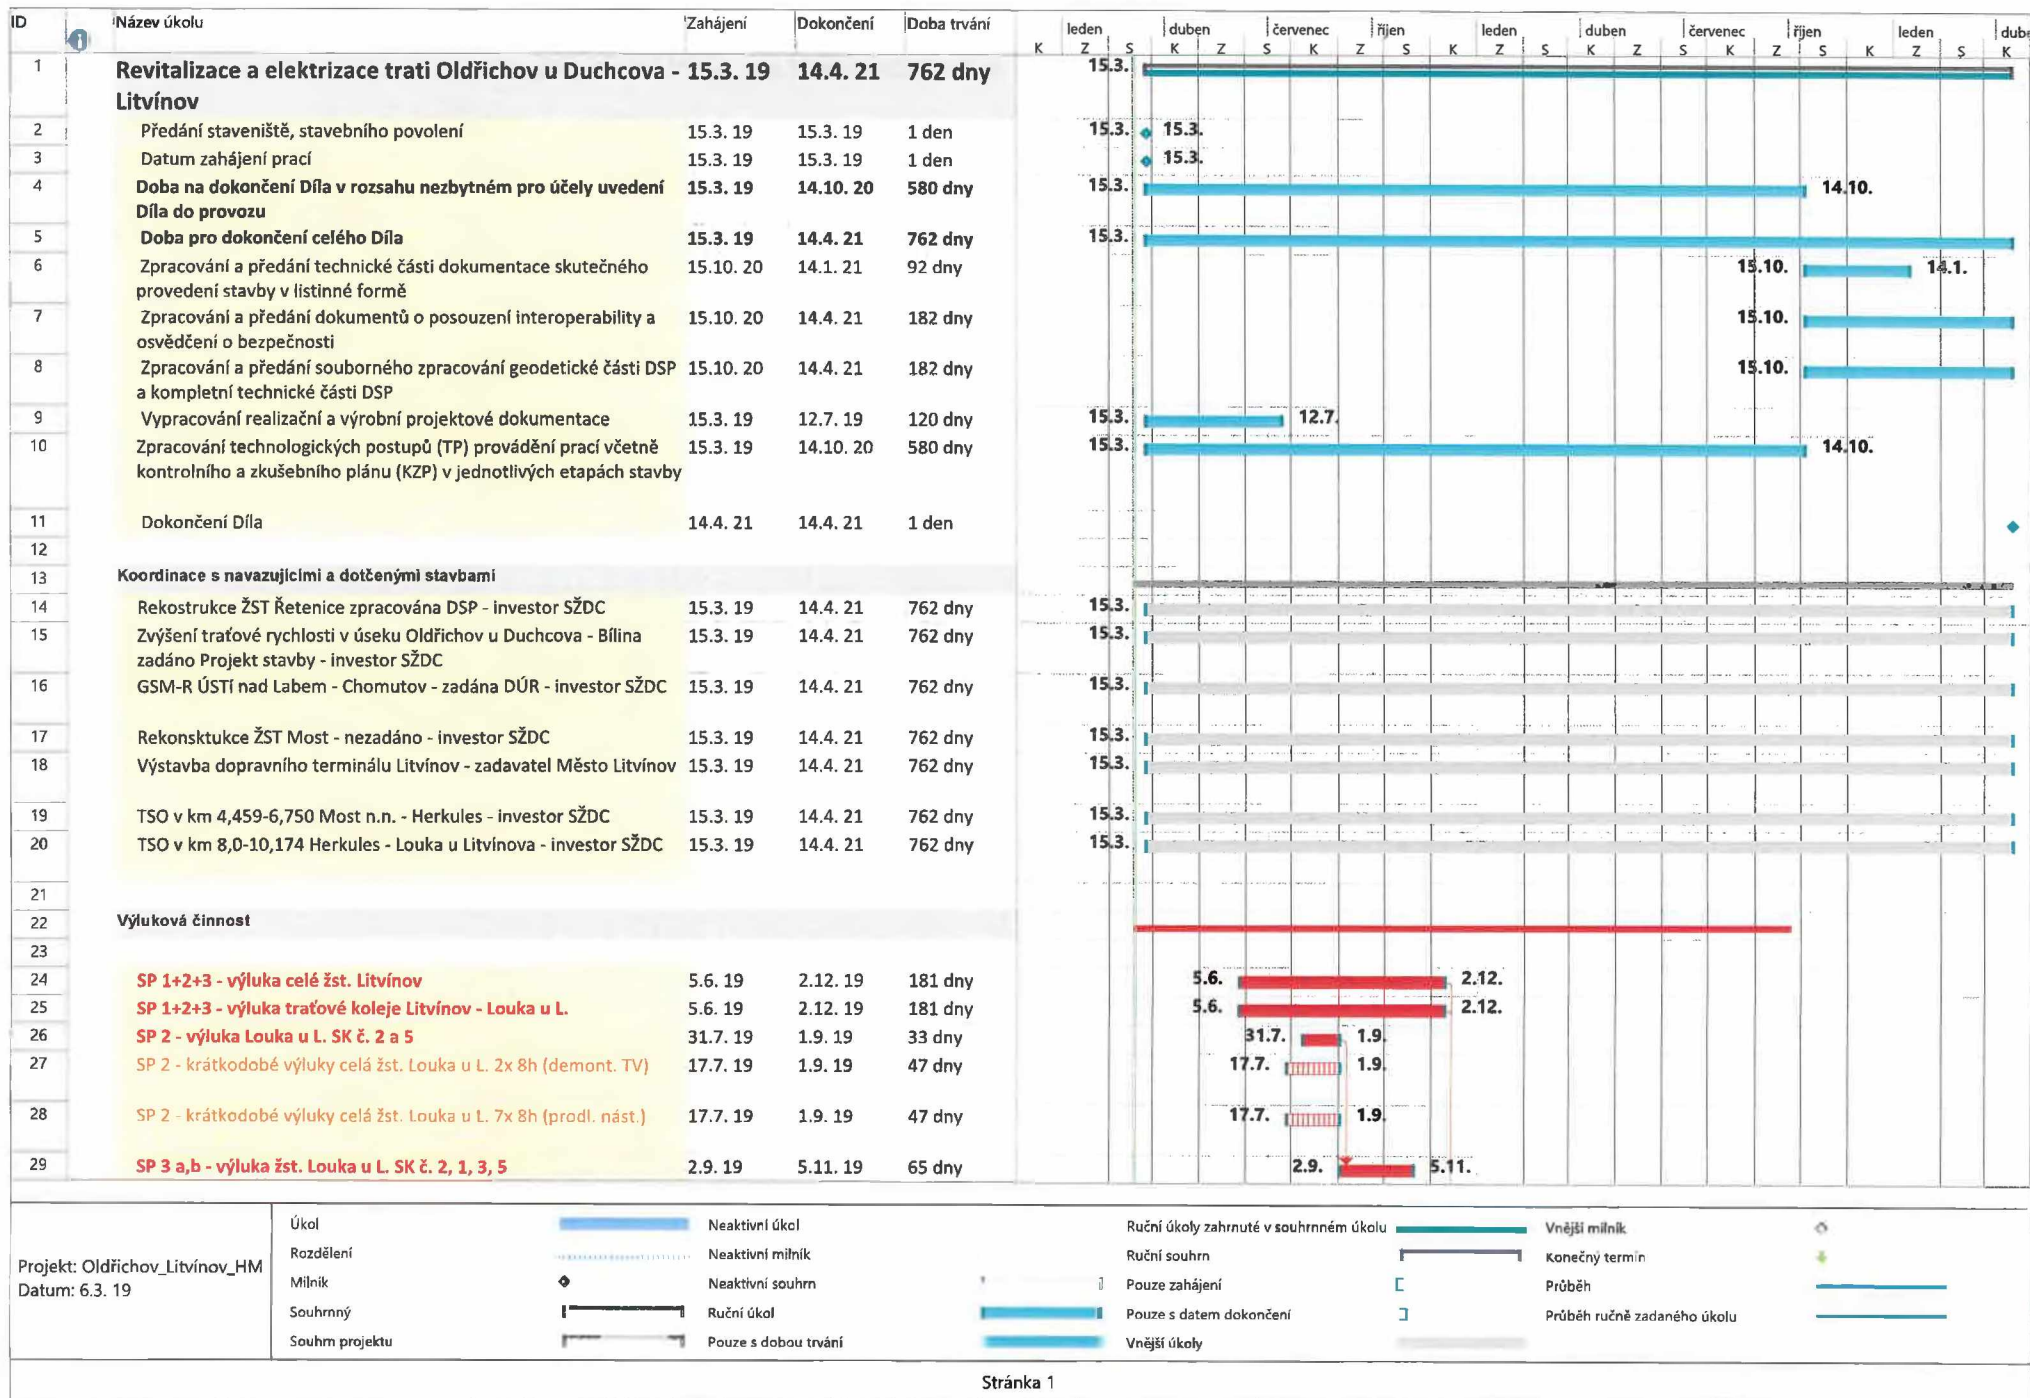

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání	leden	duben	červenec	říjen	leden	duben	červenec	říjen	leden	duben
30	SP 3a,b - krátkodobé výluky celá žst. Louka u L. 2x 8h (demont. TV)	2.9. 19	5.11. 19	65 dny	K	Z	S	K	Z	S	K	Z	S	K
31	SP 3c - výluka traťové koleje Osek - Louka u L.	6.11. 19	2.12. 19	27 dny				2.9.	6.11.	2.12.				
32	SP 3c - výluka trťové koleje Most nové n. - Louka u L. - Osek město	6.11. 19	2.12. 19	27 dny				2.9.	6.11.	2.12.				
33	TP 2019/2020 - krátkodobé výluky Osek - Oldřichov 21x6h - výstavba základů TV	3.12. 19	25.2. 20	85 dny				3.12.	25.2.					
34	SP 4a,b - výluka traťové koleje Osek (mimo) - Louka u L. (mimo)	26.2. 20	26.5. 20	91 dny					26.2.	26.5.				
35	SP 5+6 - výluka traťová kolej Osek - Louka u L. Mimo	27.5. 20	4.8. 20	70 dny						27.5.	4.8.			
36	SP 5+6 - výluka žst. Osek SK č. 1, 2, 3, 4	27.5. 20	4.8. 20	70 dny						27.5.	4.8.			
37	SP 7 - výluka traťové koleje Oldřichov - Osek	5.8. 20	8.9. 20	35 dny							5.8.	8.9.		
38	SP 7 - výluka žst. Osek SK č. 1,2,3a,5	5.8. 20	8.9. 20	35 dny							5.8.	8.9.		
39	SP 7 - výluka vlečka Kronospan	5.8. 20	8.9. 20	35 dny							5.8.	8.9.		
40	SP 8 - výluka traťové koleje Oldřichov - Osek	19.8. 20	1.10. 20	44 dny							19.8.	1.10.		
42	Stavební postupy - souhrn	15.3. 19	14.10. 20	580 dny	15.3.									14.10.
44	Přípravné práce	15.3. 19	4.6. 19	82 dny	15.3.									
45	Stavební postup č. 1	5.6. 19	16.7. 19	42 dny		5.6.	16.7.							
46	Stavební postup č. 2	17.7. 19	1.9. 19	47 dny		17.7.	1.9.							
47	Stavební postup č. 3a, 3b	2.9. 19	5.11. 19	65 dny			2.9.	5.11.						
48	Stavební postup č. 3c	6.11. 19	2.12. 19	27 dny			6.11.	2.12.						
49	Aktivace zabezpečovacího zařízení v objektu žst. Louka u Litvínova	2.12. 19	2.12. 19	0 dny				2.12.	2.12.					
50	Technologická přestávka 12/2019 - 02/2020	3.12. 19	25.2. 20	85 dny				3.12.	25.2.					
51	Stavební postup č. 4a, 4b	26.2. 20	26.5. 20	91 dny					26.2.	26.5.				
52	Stavební postup č. 5	27.5. 20	16.6. 20	21 dny						27.5.	16.6.			
53	Stavební postup č. 6	17.6. 20	4.8. 20	49 dny						17.6.	4.8.			
54	Stavební postup č. 7	5.8. 20	8.9. 20	35 dny							5.8.	8.9.		
55	Stavební postup č. 8	19.8. 20	1.10. 20	44 dny							19.8.	1.10.		
56	Aktivace zabezpečovacího zařízení v objektu žst. Osek	1.10. 20	1.10. 20	1 den							1.10.	1.10.		
57	Dokončovací práce	2.10. 20	14.10. 20	13 dny							2.10.	14.10.		
59	Výstavba technologického objektu žst. Louka u L.	18.3. 19	14.7. 19	119 dny										
62	Předání materiálu od SŽDC (kolejnice a betonové pražce)													
63	Předání v žst. Louka u L. Kolejnice a pražce na SO 56-33-01, SO 55-33-01 a SO 54-33-01 6384 ks betonových pražců, a 110 ks pasů kolejnic dl. 75m	26.6. 19				26.6.								

Projekt: Oldřichov_Litvínov_HM
Datum: 6.3. 19

Úkol		Neaktivní úkol
Rozdělení		Neaktivní milník
Milník		Neaktivní souhrn
Souhrnný		Ruční úkol
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Ruční souhrn		Konečný termín	
Pouze zahájení		Průběh	
Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadáného úkolu	
Vnější úkoly			

Příloha č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

I. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

1.1

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.

1.2

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

II. Rozsah zpracovávaných údajů

2.1

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst.2.3.25 přílohy č.2 této Smlouvy o dílo.

2.2

Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

III. Povinnosti Zhotovitele

3.1

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.

3.2

Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.

3.3

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

3.4

Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

3.5

Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a

poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.

3.6

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

3.7

Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovávaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

3.8

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

3.9

Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatele.

IV. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

4.1

V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.

4.2

Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.

4.3

Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

Příloha č. 6

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Název zakázky:
„Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

číslo smlouvy vedoucího účastníka společnosti: **21/18-OZ/OS**

číslo smlouvy druhého účastníka společnosti: **866/18 000/210**

I.
Smluvní strany

1. **Elektrizace železnic Praha a.s.**
společnost se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000
IČO: 471 15 921, DIČ: CZ 47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809,
zastoupená **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva a **Ing. Martinem Janovským**,
místopředsedou představenstva
jako vedoucí účastník společnosti
(dále též jako „**vedoucí účastník**“)

a
2. **EDIKT a.s.**
se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
IČO: 251 72 328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
zastoupená: **Pavlem Dolanským**, předsedou představenstva
jako druhý účastník společnosti
(dále též jako „**druhý účastník**“)

(vedoucí účastník společnosti a další účastník společnosti dále též společně jako „**účastníci společnosti**“ nebo „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**účastník**“)

uzavírají dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto společenskou smlouvu (dále jen „**společenská smlouva**“).

II.
Účel společnosti

1. Smluvní strany se touto smlouvou sdružují a ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku zakládají společnost s názvem „**OLDA EŽ+EDIKT**“ (dále jen jako „**společnost**“) za účelem společné účasti a podání společné nabídky ve smyslu § 82 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) v zadávacím řízení veřejné zakázky „**Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) vyhlášené zadavatelem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Dílžďená 1003/7, PSČ 110 00, Praha 1, IČO 709 94 234 (dále též jako „**Zadavatel**“) a v případě, že bude nabídka podána společností vybrána v zadávacím řízení Veřejné zakázky jako nejvhodnější, také za účelem společné realizace předmětu Veřejné zakázky v rozsahu, termínech a za podmínek daných zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a smlouvou o dílo uzavřenou se Zadavatelem na základě zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „**smlouva o dílo**“).

III.
Doba trvání společnosti

1. Společnost se zakládá na dobu určitou ode dne uzavření této společenské smlouvy do dne jejího zániku některým ze způsobů uvedených v odst. 2 tohoto čl. III společenské smlouvy.

2. Společnost zaniká:
 - a) dnem uzavření smlouvy na realizaci předmětu Veřejné zakázky mezi Zadavatelem a jiným uchazečem v zadávacím řízení Veřejné zakázky; nebo
 - b) dnem následujícím po dni, kdy byla s konečnou platností Zadavatelem zrušena Veřejná zakázka, nebo kdy byla Veřejná zakázka pravoplatně zrušena rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci; nebo
 - c) dnem následujícím po dni, kdy nastane ukončení účinnosti smlouvy o dílo splněním jejího předmětu, a to včetně trvání všech práv a povinností smluvních stran smlouvy o dílo včetně uplynutí záruční lhůty;
 - d) dnem ukončení účinnosti smlouvy o dílo jiným způsobem v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo.Společenská smlouva však v žádném případě nezanikne dříve, než budou mezi účastníky společnosti vypořádány náklady společnosti vzniklé za doby trvání společenské smlouvy.
3. V souladu s § 2739 občanského zákoníku se smluvní strany zavazují vynaložit své nejlepší úsilí nevystoupit ze společnosti založené touto společenskou smlouvou po uzavření smlouvy o dílo se Zadavatelem, neboť smluvní strany společně potvrzují, že v takovém případě nepředpokládají žádné vážné důvody pro takové vystoupení. Pokud se některá ze smluvních stran rozhodne z vážného důvodu, který nebylo možné nyní předvídat, vystoupit ze společnosti, ujednání a podmínky této společenské smlouvy budou aplikovány ve stejném rozsahu do doby, než budou závazky smluvních stran ze smlouvy o dílo zcela splněny.
4. S výjimkou případů výslovně sjednaných v předcházejících odstavcích tohoto článku bude Smlouva ukončena výlučně jejím splněním nebo rozhodnutím smluvních stran a úkonem učiněným v souladu s podmínkami této Smlouvy.

IV.

Název a sídlo společnosti

1. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem: “ **OLDA EŽ+EDIKT** “. Sídlem společnosti je sídlo vedoucího účastníka společnosti:
Praha 4, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

V.

Vedoucí účastník společnosti

1. Vedoucím účastníkem společnosti je: **Elektrizace železnic Praha a.s.**
2. Vedoucí účastník společnosti má ve vztahu k činnosti společnosti následující oprávnění, ke kterým jej zmocňují další účastníci společnosti:
 - podat společnou nabídku ve smyslu § 82 ZZVZ, včetně všech dokumentů nabídku tvořících a včetně této společenské smlouvy v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky;
 - zastupovat účastníky společnosti samostatně, jakož i všechny účastníky společnosti společně v jednání vůči Zadavateli, a to v rozsahu uvedeném v tomto článku V. společenské smlouvy;
 - jednat v ústním a písemném styku se Zadavatelem a činit právní jednání, a to ohledně jakýchkoliv závazků, záruk či odpovědnosti ve věcech týkajících se společné nabídky, provedení Veřejné zakázky, včetně uplatňování nároků vůči Zadavateli, změn předmětu plnění dle smlouvy o dílo, změn harmonogramů a reklamací vad na základě smlouvy o dílo;
 - přijímat závazky a pokyny pro a za účastníky společnosti a za celou společnost;
 - koordinovat činnosti při realizaci předmětu Veřejné zakázky a dohlížet na plnění smlouvy o dílo; tato role vedoucího účastníka nezprošťuje účastníky jeho odpovědnosti za plnění smlouvy o dílo uzavřené se Zadavatelem;
 - zajišťovat jeho správu;
 - vystavovat daňové doklady, na kterých bude identifikován vedoucí účastník společnosti jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“, a přijímat platby od Zadavatele;
 - svolávat zasedání orgánů společnosti.
3. Účastník společnosti, tj. **EDIKT a.s.**, tímto výslovně uděluje vedoucímu účastníku společnosti, tj. **Elektrizace železnic Praha a.s.** plnou moc ke všem úkonům vymezeným odst. 2 čl. V. této společenské smlouvy, zejména pak k podpisu a podání společné nabídky, včetně všech dalších dokumentů tvořících součást nabídky nebo s ní souvisejících. Na základě této plné moci je vedoucí účastník společnosti oprávněn činit jménem účastníků společnosti veškerá právní jednání související s činností účastníků v rámci společnosti a při provádění smlouvy o dílo.
4. Plná moc udělená vedoucímu účastníku společnosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na uzavření smlouvy o dílo včetně případných dodatků ke smlouvě o dílo.

5. Účastníci společnosti mají následující povinnosti vůči vedoucímu účastníkovi společnosti:
 - řádně a včas poskytovat veškeré doklady a informace požadované zadávací dokumentací Veřejné zakázky nebo Zadavatelem či dohodnuté s vedoucím účastníkem společnosti;
 - komunikovat se Zadavatelem jen prostřednictvím a cestou vedoucího účastníka společnosti, není-li ve smlouvě o dílo stanoveno jinak;
 - v případě, že Zadavatel adresuje dalšímu účastníkovi společnosti přímo nějakou informaci, pokyn nebo sdělení, pak další účastník společnosti o tom neprodleně informuje vedoucího účastníka společnosti, který sdělí Zadavateli odpovídající odpověď;
 - účastnit se prostřednictvím svých zástupců zasedání orgánů společnosti;
 - dělat vše, co je nezbytné pro to, aby umožnil vedoucímu účastníkovi společnosti včas splnit jeho oprávnění vyplývající z této společenské smlouvy.
6. Vedoucí účastník společnosti je určen po celou dobu trvání společnosti.
7. Případná změna vedoucího účastníka společnosti musí být oznámena Zadavateli spolu se sdělením souhlasu účastníků společnosti. Účinnost změny vedoucího účastníka společnosti vůči Zadavateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně.

VI.

Odpovědnost účastníků společnosti

1. Účastníci společnosti jsou a budou zavázáni vůči Zadavateli a třetím osobám společně a nerozdílně z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti Veřejnou zakázkou či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu Veřejné zakázky, a to po celou dobu plnění předmětu Veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo nebo zadávacích podmínek Veřejné zakázky.
2. Tím není dotčena vzájemná odpovědnost za škodu mezi účastníky společnosti; každý účastník společnosti odpovídá dalšímu účastníkovi za škodu, kterou způsobil porušením smluvně převzatých a právními předpisy stanovených povinností.
3. Účastníci společnosti jsou povinni jednat ve prospěch zájmů společnosti s náležitou odbornou péčí, chránit její dobré jméno, starat se o dosažení účelu společnosti a jednat v souladu se zásadami poctivého obchodního styku na základě dobré víry. Účastníci společnosti se budou po celou dobu trvání společnosti vzájemně podporovat a společný zájem společnosti podporovat jako svůj vlastní.
4. O společných věcech rozhodují účastníci společnosti jednomyslně prostřednictvím svých zástupců v Radě společnosti.
5. Žádný účastník společnosti nesmí postoupit, zastavit nebo jinak zatížit svá práva a závazky nebo jejich část dle této společenské smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dalšího účastníka společnosti.

VII.

Práva a povinnosti v rámci zadávacího řízení

1. Každý účastník společnosti se v souladu s § 2727 občanského zákoníku zavazuje, že nebude zároveň účastníkem jiné společnosti vzniklé za účelem účasti v zadávacím řízení Veřejné zakázky ani nepodá samostatně nabídku v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky.
2. Účastníci společnosti se zavazují kvalifikovaně prostudovat a prověřit zadávací dokumentaci a veškeré další dokumenty či podklady, které byly Zadavatelem účastníkům společnosti zpřístupněny nebo od něj převzaty, a to s vynaložením potřebné péče ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku.
3. Účastníci společnosti pověřují vedoucího účastníka přípravou, sestavením a podáním společné nabídky Zadavateli.
4. Účastníci společnosti jsou odpovědní za veškeré podklady jím dodané do společné nabídky, za jejich soulad se zadávací dokumentací Veřejné zakázky a za jejich obsahovou kvalitu a přesnost.
5. Náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním společné nabídky účastníků společnosti nesou účastníci společnosti každý sám.

VIII.

Práva a povinnosti v rámci realizace předmětu Veřejné zakázky

1. Účastníci společnosti se dohodli, že v případě uzavření smlouvy o dílo se Zadavatelem na realizaci Veřejné zakázky budou realizovat Veřejnou zakázku společně.

Podíl na realizaci Veřejné zakázky bude následovně:

Elektrizace železnic Praha a.s. 79.50 %

- Kompletní realizace D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ), D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) a D.2 Železniční sdělovací zařízení, D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT, E.1.2 Nástupišť, E.1.2 Přejezdy, E.1.4 Mosty, propustky a zdi, E.1.5 Ostatní inženýrské objekty, E.2 Pozemní stavební objekty, E.3 Trakční a energetické zařízení a Všeobecný objekt
- Realizace části E.1.1 Železniční svršek a spodek (SO 51-33-01, SO 51-33-02, SO 52-33-01, SO 52-33-02, SO 54-33-01, SO 54-33-02, SO 55-33-01, SO 55-33-02, SO 56-33-01, SO 56-33-02, SO 51-15-01)

EDIKT a.s. 20.50 %

- Realizace části E.1.1 Železniční svršek a spodek (SO 53-33-01, SO 53-33-02, SO 53-33-02.1, SO 53-33-02.2, SO 53-33-02.3, SO 53-33-02.4, SO 53-33-02.6 a SO 53-33-02.7)

2. neobsazeno
3. Náklady společnosti, což jsou náklady odsouhlasené účastníky společnosti jako společné, budou hradit účastníci společnosti společně, každý ve výši odpovídající jeho podílu ve společnosti uvedeného shora v odstavci 1. tohoto článku VIII společenské smlouvy.
4. Každý účastník společnosti se zavazuje ve vztahu k části Veřejné zakázky, která je mu touto společenskou smlouvou svěřena k realizaci, převzít závazky a povinnosti vůči Zadavateli, které vyplývají ze smlouvy o dílo uzavřené se Zadavatelem na provedení Veřejné zakázky a svěřenou část Veřejné zakázky za těchto podmínek realizovat sám, na svou odpovědnost a na své riziko řádně a včas. Každý z účastníků společnosti je plně odpovědný za realizaci jemu svěřené části Veřejné zakázky včetně nákladů s tím spojených, dosaženého zisku nebo ztráty, odstranění případných vad a nedodělků a odpovědnosti po celou dobu záruky za jakost.
5. Pokud bude jeden z účastníků společnosti provádět práce pro dalšího účastníka společnosti jako jeho podzhotovitel, budou tyto práce účtovány v cenách dle uzavřené hlavní smlouvy o dílo se Zadavatelem.
6. V rámci svěřeného rozsahu Zakázky jsou účastníci společnosti oprávněni se svými podzhotoviteli a dodavateli uzavírat příslušné smlouvy samostatně a jsou přitom povinni si předem vyžádat stanovisko dalšího účastníka společnosti k navrhovanému podzhotoviteli a předmětu jeho subdodávky.
7. V případě, že některý účastník společnosti porušením smluvních či zákonných povinností způsobí škodu dalšímu účastníkovi společnosti, pak účastník společnosti, který škodu způsobil, škodu nahradí a nebude tím zatěžovat jiného účastníka společnosti.
8. Společná a nerozdílná odpovědnost účastníků společnosti za veškeré závazky vůči Zadavateli není ustanoveními odst. 4 až 7 tohoto čl. VIII společenské smlouvy dotčena.
9. Vedoucí účastník společnosti sjedná pojištění předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Náklady budou vyúčtovány jako náklady společnosti a budou vypořádány v rámci hospodaření společnosti při realizaci předmětu Veřejné zakázky podle podílů jednotlivých účastníků společnosti na realizaci Veřejné zakázky uvedených v této společenské smlouvě.
10. Veškeré platby ve vztahu k Zadavateli v souvislosti s Veřejnou zakázkou budou prováděny prostřednictvím vedoucího účastníka společnosti. Platby od Zadavatele budou poukazovány na bankovní účet založený vedoucím účastníkem společnosti.
11. Vedoucí účastník společnosti odpovídá za vedení účetnictví společnosti a za oddělené vedení evidence o přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění společnosti podle ZoDPH.

IX.

Orgány společnosti

1. Činnost účastníků společnosti je koordinována prostřednictvím orgánů společnosti.
2. Orgány společnosti jsou:
 - a) **Rada společnosti**, která je nejvyšším orgánem společnosti s právem přijímat všechna rozhodnutí, potřebná pro dosažení účelu a cíle společnosti. Rada společnosti rozhoduje jednomyslně. Každý z účastníků společnosti jmenuje po jednom členovi Rady společnosti.
Rada společnosti jmenuje a odvolává jednotlivé členy Ředitelství stavby.
 - b) **Ředitelství stavby**, které je výkonným orgánem, kterému bude rozsah povinností a oprávnění určen Radou společnosti.
3. Členy Rady společnosti jsou:
za vedoucího účastníka společnosti: **Ing. Luděk Valtr**
za druhého účastníka společnosti: **Pavel Dolanský**
4. Člen Rady společnosti může jednorázově písemně pověřit jinou osobu zastupováním na zasedání Rady společnosti, vždy však musí jít o zaměstnance příslušného účastníka společnosti.

X.

Ujednání o mlčenlivosti

1. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících čtyřech letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany, které se dozvěděli v souvislosti s účastí ve společnosti nebo v souvislosti s plněním předmětu Veřejné zakázky, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán, nebo kdy jsou tyto informace v době jejich zpřístupnění veřejně dostupné alespoň v příslušných odborných kruzích. Pro účely této společenské smlouvy se důvěrnou informací rozumí informace, které účastník společnosti prokazatelně označil v nabídce nebo kdekoliv jinde jako důvěrné v souladu s § 1730 občanského zákoníku. Povinnost ochrany obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku platí po celou dobu jeho existence.
2. Účastník společnosti nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah odůvodněné potřeby.
3. V případě, že účastník společnosti poruší povinnost vyplývající z ustanovení tohoto článku společenské smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobil, a je povinen ji v celém rozsahu nahradit.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato společenská smlouva se řídí českým právním řádem.
2. Změny a doplňky této společenské smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Účastníci společnosti se zavazují, že v případě změny sídla či určených adres každého z nich pro korespondenci, budou o této změně druhého účastníka společnosti neprodleně písemně informovat. Do doby obdržení této informace se jakákoli písemná korespondence, odeslaná na dosavadní adresu, považuje za řádně odeslanou.
4. Tato společenská smlouva je vypracována ve 3 stejnopisech. Každý účastník společnosti obdrží po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení je určeno do společné nabídky pro Zadavatele.
5. Společenská smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisů osob, které jsou oprávněny za účastníky společnosti jednat.

V Praze, dne19-11-2019.....

Za Elektrizaci železnic Praha a.s.

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva

Elektrizace železnic Praha a.s.

náměstí Hrdinů 1693/4a

140 00 Praha 4 - Nusle

IČ 47115921

510/12

Za Elektrizaci železnic Praha a.s.

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva

V Českých Budějovicích, dne16-11-2019.....

Za EDIKT a.s.

Pavel Dolanský

předseda představenstva

Příloha č. 7

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“ žádáme o poskytnutí **zálohové platby na finanční plnění výši: VLOŽÍ ZHOTOVITEL Kč.**

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: **MM/RR – MM/RR VYPLNÍ ZHOTOVITEL** včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č.....**VYPLNÍ ZHOTOVITEL**

V dne

.....

Zhotovitel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 258841

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8ac40cf8-2f9e-438e-a345-3fbb68e6ca76

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.04.2019 12:31:04



926b1629-95a3-4b2f-9cfc-42d5bf26d9fd
