

Číslo smlouvy objednatele:.....

Číslo smlouvy zhotovitele: 19022

SMLOUVA O DÍLO

**na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor
na akci:**

Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II
uzavřenou dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : **Muzeum regionu Valašsko, p.o.**
Sídlo : Horní náměstí 2, Vsetín, 755 01
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
b) ve věcech technických : Ing. Jan Marek – vedoucí provozního oddělení
IČO : 00098574
DIČ : neplátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 3136851/0100
Tel. : 604 604 872
E-mail : marek@muzeumvalassko.cz

1.2. Zhotovitel : BP projekt, s. r. o.
Sídlo : Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí
Statutární orgán : Ing. Martin Zuštit, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud Ostrava, oddíl C, vl. 20285
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Martin Maňák
b) ve věcech technických : Ing. Martin Maňák, Ing. Milan Petrů
IČO : 25832395
DIČ : CZ25832395
Bankovní ústav : MONETA Money Bank
Číslo účtu : 81304734/0600
Tel. / Fax : 571 751 811
E-mail : archiv@bprojeekt.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro společné povolení (územní rozhodnutí + stavební povolení) v podrobnostech pro provádění stavby, inženýrskou činnost pro společné povolení a následný autorský dozor - (dále jen „dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci:

Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II

Rozsah a členění díla:

Realizace projektových činností bude členěna do 6 samostatných stavebních částí:

stavební část 1	oprava vstupů (hlavní a boční vstup do zámku Vsetín),
stavební část 2	oprava vnější fasády zámku Vsetín a s tím spojená výměna klempířských prvků fasády vč. okapových systémů a rekonstrukce hromosvodové soustavy,
stavební část 3	oprava zámecké zdi (omítky, koruny) a návrh drenážního systému,
stavební část 4	výstavba nového výtahu v atriu zámku Vsetín,
stavební část 5	doplnění evakuačně zhášecího systému ve věži zámku Vsetín,
stavební část 6	oprava, výměna a doplnění dveří ve vybraných prostorách zámku Vsetín.

Všechny výše popsané stavební části jsou detailněji popsány v příloze č. 1 této smlouvy o dílo.

Pro jednotlivé stavební části provede zhotovitel tyto dodávky a činnosti:

2.1. Projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby a pro vydání:

- **společného povolení (tj. územního rozhodnutí a stavebního povolení; stavební části 1, 2, 3 a 4),**
- **stavebního povolení (stavební části 5 a 6),**

v rozsahu a obsahu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., příloh č. 8 a č. 13 a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně:

- 2.1.1 zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace
 - pro společné povolení,
 - stavební povolení,a pro výběr dodavatele (např. vlhkost, koroze, soli, přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.), průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce;
- 2.1.2 projektová dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, bude-li tento požadavek součástí některé z uvedených stavebních činností v předmětu této smlouvy;
- 2.1.3 vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení stavby;
- 2.1.4 zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních;

- 2.1.5 písemné odsouhlasení projektové dokumentace s orgánem státní památkové péče a zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje – odbor investic;
- 2.1.6 zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů;
- 2.1.7 památkový a stavebně statický průzkum a diagnostika objektů dotčených výstavbou, vyhodnocení průzkumu (včetně případných sond a zkoušek);
- 2.1.8 inženýrsko-geologický průzkum u těch stavebních částí, které to vyžadují;- průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celé stavební části;
- 2.1.9 kontrola nebo vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících inženýrských sítí řešených objektů a dotčené lokality, bude-li tento požadavek součástí některé z uvedených stavebních činností v předmětu této smlouvy;
- 2.1.10 průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky apod.);
- 2.1.11 archeologického průzkumu staveniště (bude-li požadováno);
- 2.1.12 technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce;
- 2.1.13 koordinace postupu zpracování projektové dokumentace stavby a interiéru;
- 2.1.14 propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení akce do provozu; dále propočet celkových nákladů v členění na investice a neinvestice;
- 2.1.15 u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náležejí do snížené sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;
- 2.1.16 splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx;
- 2.1.17 soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové soustavě;
- 2.1.18 zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až po odsouhlasení ze strany objednatele;
- 2.1.19 v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických);
- 2.1.20 oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace;
- 2.1.21 v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby;
- 2.1.22 projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby;

- 2.1.23 projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit každý jednotlivý detail konstrukce;
- 2.1.24 projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.
- 2.1.25 výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění Nařízení vlády 136/2016 Sb., ve fázi přípravy stavby;
- 2.1.26 prezentace projektové dokumentace pro stavební povolení, bude-li požadována.

2.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání

- **společného povolení (tj. územního rozhodnutí a stavebního povolení; stavební části 1, 2, 3 a 4),**
- **stavebního povolení (stavební části 5 a 6),**

kteřá bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení) ve znění vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně:

- 2.2.1 zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání společného povolení, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro společné povolení nebo jen stavební povolení;
- 2.2.2 zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;
- 2.2.3 vyplnění žádosti o společném povolení a předložení žádosti včetně všech potřebných příloh k podpisu zástupcům objednatele;
- 2.2.4 podání žádosti o společném povolení na příslušný stavební úřad po podpisu žádosti o společném povolení zástupcem investora a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli;
- 2.2.5 zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o společném povolení a zabezpečení vydání společného povolení;
- 2.2.6 zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové dokumentace;
- 2.2.7 veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání společného povolení;
- 2.2.8 **úhrady poplatků** spojených s vydáním společného povolení a stavebního povolení jednotlivých stavebních částí **jsou** předmětem smlouvy a hradí je zhotovitel;
- 2.2.9 zhotovitel může po dohodě se stavebním úřadem a schválení objednatelem využít dalších možností sloučených, zjednodušených a dalších stavebních řízení;
- 2.2.10 stavební části 5 a 6 nevyžadují územní rozhodnutí, inženýrská činnost popsána v bodech 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 a 2.2.7 bude provedena pouze v rozsahu žádosti o stavební povolení.

2.3. Autorský dozor (dále jen AD)

V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby:

- 2.3.1 **zpracování odpovědí na dotazy** k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů po jejím obdržení;

- 2.3.2 **účast na jednáních hodnotící komise** ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li požadována;
- 2.3.3 vypracování **porovnání cenových nabídek** jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno;
- 2.3.4 **posouzení** případných zdůvodnění **mimořádně nízké nabídkové ceny** na dodávku stavby, bude-li požadováno.

V průběhu realizace akce:

- 2.3.5 AD bude vykonáván v rozsahu úplné **kvalitativní** kontroly souladu díla s projektovou dokumentací v rozsahu cca 4 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vši odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují;
- 2.3.6 pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;
- 2.3.7 účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.) zajistí AD účast architekta na kontrolních dnech stavby;
- 2.3.8 kontrola a odsouhlasení výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při uvedení díla do provozu;
- 2.3.9 poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;
- 2.3.10 zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky;
- 2.3.11 objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby;
- 2.3.12 AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;
- 2.3.13 AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;
- 2.3.14 autorským dozorem nejsou:

2.3.14.1 případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;

2.3.14.2 případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele;

2.3.15 AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit.

2.4 Součástí díla je rovněž:

2.4.1 **organizace výrobních výborů** v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry;

2.4.2 **výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništech, ve znění Nařízení vlády 136/2016 Sb., ve fázi přípravy stavby;

2.4.3 zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací;

2.4.4 součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nspecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. **Projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby** pro vydání společného povolení (stavební části 1, 2, 3 a 4) a projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (stavební části 5 a 6) dle odst. 0. v termínu **do 120** kalendářních dnů **od účinnosti** této smlouvy o dílo.

3.2. **Inženýrská činnost** pro vydání společného povolení (stavební části 1, 2, 3 a 4) a vydání stavebního povolení (stavební činnosti 5 a 6) dle odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..** (zajištění vydání společného povolení v právní moci a stavebního povolení v právní moci) v termínu do 120 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání společného povolení nebo jen stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo (př. jednání se státní památkovou péčí a podobně).

3.3. **Výkon AD** dle odst. 2.33 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. AD příslušné části

projektové dokumentace bude zahájen po dohodě se zhotovitelem PD na písemnou výzvu objednatele.

Předpokládaný termín veřejné zakázky: 12/2019.

Předpokládaný termín realizace stavby: 03/2020 – 12/2022.

- 3.4. **K převzetí díla** nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň **3 dny předem**. **Objednatel není povinen převzít dílo** nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 3.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů projektové dokumentace **delší jak 30 kalendářních dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele.
- 3.6. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatel **bez vad a nedodělků**.
- 3.7. Místem plnění je: Muzeum regionu Valašsko, p.o., Horní náměstí 2, Vsetín, PSČ 755 01. AD bude vykonáván v místě provádění stavby.

4. CENA DÍLA

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 1.236.000,- Kč (bez DPH)

DPH: 259.560,- Kč

Celkem s DPH 1.495.560,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: Jedenmiliončtyřistadevadesát pět tisíc pět set šedesát Kč)

4.1. Rozpis ceny:

4.2.1 stavební část 1 - oprava vstupů (hlavní a boční vstup do zámku Vsetín)

- 4.2.1.1 **Projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby pro společné povolení** dle odst. 0
107.000,- Kč (bez DPH), DPH 22.470,- Kč, cena včetně DPH 129.470,- Kč;
- 4.2.1.2 **Inženýrská činnost pro vydání společného povolení dle odst. 2.22** (zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci)
30.000,- Kč (bez DPH), DPH 6.300,- Kč, cena včetně DPH 36.300,- Kč;
- 4.2.1.3 **Výkon Autorského dozoru** dle odst. 2.3
13.000,- Kč (bez DPH), DPH 2.730,- Kč, cena včetně DPH 15.730,- Kč.

4.2.2 stavební část 2 - oprava vnější fasády zámku Vsetín a s tím spojená výměna klempířských prvků fasády vč. okapových systémů a rekonstrukce hromosvodové soustavy

- 4.2.2.1 **Projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby pro společné povolení** dle odst. 0
205.000,- Kč (bez DPH), DPH 43.050,- Kč, cena včetně DPH 248.050,- Kč;
- 4.2.2.2 **Inženýrská činnost pro vydání společného povolení dle odst. 2.22** (zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci)
30.000,- Kč (bez DPH), DPH 6.300,- Kč, cena včetně DPH 36.300,- Kč;
- 4.2.2.3 **Výkon Autorského dozoru** dle odst. 2.3
20.000,- Kč (bez DPH), DPH 4.200,- Kč, cena včetně DPH 24.200,- Kč.

4.2.3 stavební část 3 - oprava zámecké zdi (omítky, koruny) a návrh drenážního systému

4.2.3.1 **Projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby pro společné povolení** dle odst. 0

160.000,- Kč (bez DPH), DPH 33.600,- Kč , cena včetně DPH 193.600,- Kč;

4.2.3.2 **Inženýrská činnost pro vydání společného povolení dle odst. 2.22** (zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci)

40.000,- Kč (bez DPH), DPH 8.400,- Kč, cena včetně DPH ...48.400,- Kč;

4.2.3.3 **Výkon Autorského dozoru** dle odst. 2.3

10.000,- Kč (bez DPH), DPH 2.100,- Kč, cena včetně DPH 12.100,- Kč.

4.2.4 stavební část 4 - výstavba nového výtahu v atriu zámku Vsetín

4.2.4.1 **Projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby pro společné povolení** dle odst. 0

230.000,- Kč (bez DPH), DPH 48.300,- Kč , cena včetně DPH 278.300,- Kč;

4.2.4.2 **Inženýrská činnost pro vydání společného povolení dle odst. 2.22** (zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci)

50.000,- Kč (bez DPH), DPH 10.500,- Kč, cena včetně DPH 60.500,- Kč;

4.2.4.3 **Výkon Autorského dozoru** dle odst. 2.3

20.000,- Kč (bez DPH), DPH 4.200,- Kč, cena včetně DPH 24.200,- Kč.

4.2.5 stavební část 5 - doplnění evakuačně zhašecího systému ve věži zámku Vsetín

4.2.5.1 **Projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby pro společné povolení** dle odst. 0

161.000,- Kč (bez DPH), DPH 33.810,- Kč , cena včetně DPH 194.810,- Kč;

4.2.5.2 **Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení dle odst. 2.22** (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci)

30.000,- Kč (bez DPH), DPH 6.300,- Kč, cena včetně DPH 36.300,- Kč;

4.2.5.3 **Výkon Autorského dozoru** dle odst. 2.3

20.000,- Kč (bez DPH), DPH 4.200,- Kč, cena včetně DPH 24.200,- Kč.

4.2.6 stavební část 6 - oprava, výměna a doplnění dveří ve vybraných prostorách zámku Vsetín

4.2.6.1 **Projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby pro společné povolení** dle odst. 0

80.000,- Kč (bez DPH), DPH 16.800,- Kč, cena včetně DPH 96.800,- Kč;

4.2.6.2 **Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení dle odst. 2.22** (zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci)

20.000,- Kč (bez DPH), DPH 4.200,- Kč, cena včetně DPH 24.200,- Kč;

4.2.6.3 **Výkon Autorského dozoru** dle odst. 2.3

10.000,- Kč (bez DPH), DPH 2.100,- Kč, cena včetně DPH 12.100,- Kč;

4.2. Zhotovitel je plátcem DPH.

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

4.4. V ceně je zahrnuto:

4.4.1. **6 vyhotovení** kompletní projektové v podrobnostech pro provádění stavby pro vydání:

- společného povolení (stavební části 1, 2, 3 a 4),

- stavebního povolení (stavební části 5 a 6),

dle článku 0 v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD, z toho 1 x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc,

*.xlsx, *.xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržáním názvu a číslováním výkresů.

- 4.4.2. 1 x originál (nebo ověřená kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o vydání
- společného povolení (stavební části 1, 2, 3 a 4),
 - stavebního povolení (stavební části 5 a 6),
- 2 x v digitální formě na DVD, z toho 1 x ve formátu *.pdf a 1x předání vyplněné žádosti „společné povolení“ a jen „stavební povolení“ v digitální formě v editovatelném formátu na CD.
- 4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat **další vyhotovení** projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě **ceníku zhotovitele** za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisků včetně označení jednotlivých listů.
- 4.6. Dohodnutá cena zahrnuje **veškeré náklady** zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy.
- 4.7. **Změna dohodnuté ceny** je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje zálohy**.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) **po jednotlivých částech**. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení AD příslušné stavební části, podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD). Výkon AD bude ukončen po dokončení a předání dokončené stavební části (1-6).
- 5.3. Výkon **AD** dle odst. 2.33 bude fakturován po předání o převzetí stavební části stavby. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS.
- 5.4. Splatnost faktur je **30 dnů** od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
- 5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

- 5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli **vrátit, pokud neobsahuje náležitosti** dle uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí projektové dokumentace, protokol o ukončení IČ, nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.
- 5.8. Objednatel může **fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit** pouze v případě, když:
- 5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5.,
 - 5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje,
 - 5.8.3. neobsahuje přílohy
- 5.9. **Nárok zhotovitele na úhradu ceny** za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností:
- 5.9.1. faktické **provedení** fakturovaných činností a
 - 5.9.2. předání a **převzetí** díla nebo jeho části **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo jeho části, případně protokolu o **odstranění vad** a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat.
 - 5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že:
- 5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - 5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 5.10.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - 5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
 - 5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
 - 5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem,
 - 5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - 5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - 5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
- 5.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této

smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

- 6.2. Pokud se jedná o **další pokyny objednatele** učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.
- 6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší další ustanovení smlouvy.
- 6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat **v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.** a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
- 6.5. Projektová **dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem** daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;
- 6.6. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.8. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.9. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje a města Vsetín. Budou-li dotčeny cizí nebo další pozemky, bude taková činnost podložena platnou smlouvou (např. o umístění věcného břemene apod.). Tyto smlouvy zajistí na své náklady objednatel. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli podklady pro uzavření těchto smluv.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
- 7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo dle odst. 7.23
- 7.3. Seznam poskytovaných podkladů:
 - 7.3.1. Energetický audit budovy – TESPORA 2019,

- 7.3.2. Projektová dokumentace ke stavebním úpravám zámku Vsetín – etapa I, *DWG z roku 2015,
 - 7.3.3. Výškové a polohopisné zaměření p. č. 8 - k.ú. Vsetín – Eršil 2019,
 - 7.3.4. Stavebně historický průzkum budovy – Janiš, Vrla 2010,
 - 7.3.5. Restaurátorský průzkum sloupů hlavního vstupu – Mullerová 2014.
- 7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů.
- 7.5. **Nepředá-li objednatel podklady včas**, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.
- 7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
- 7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho **řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků**.
- 8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo **i před termínem plnění**.
- 8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „**Protokol o předání a převzetí díla**“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven **Protokol o odstranění vad a nedodělků**, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.
- 8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinelé **drobné vady** nebo ojedinelé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.
- 8.6. Zhotovitel prohlašuje, že **objednatel bude oprávněn** jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) **užít** k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli **nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv** či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (**práva autorská**, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto **poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít** ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a **oprávnění upravit či jinak měnit dílo** nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako **bezúplatná**.
- 8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např.

- ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu apod.).
- 8.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.
 - 8.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést **prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření**, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.
 - 8.10. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 9.1. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že **dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě**.
- 9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 9.3. **Záruční doba na dílo je 60 měsíců.**
- 9.4. **Za vadu se považuje** i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
 - 9.4.1. v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke **zvýšení ceny stavby**, která je předmětem projektové dokumentace,
 - 9.4.2. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke **zvýšení ceny stavby**, která je předmětem projektové dokumentace.

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA

- 10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, **nejpozději do uplynutí záruční doby**. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději **do 3 pracovních dnů** ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
- 10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky **bezplatné odstranění vady**. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
- 10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

11. SMLUVNÍ SANKCE

- 11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli

- zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon inženýrské činnosti) nebo jeho části dle čl. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši **0,2 % z celkové ceny stavební části včetně DPH** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - 11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši **500,-Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
 - 11.4. V případě, že se na díle vyskytnou **vady popsané v odst. 9.4.1** této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10%** z hodnoty zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele.
 - 11.5. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za **vadu projektu dle odst. 9.4.2**, na kterou může být objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100,- Kč vč. DPH za každých 1.000,- Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta stavebních prací.
 - 11.6. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.
 - 11.7. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.7. nebo odst. 6.8. je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).
 - 11.8. Objednatel zaplatí zhotoviteli **za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury**, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
 - 11.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
 - 11.10. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit**, na straně objednatele pouze po předchozím odsouhlasení **příslušným orgánem Zlínského kraje**.
 - 11.11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

12. POJIŠTĚNÍ

- 12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní **pojištění odpovědnosti za škody** způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u České podnikatelské pojišťovny, s limitem pojistného plnění 20 000 000,- Kč (minimálně 2 000 000 Kč). Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
- 13.2. Kterákoliv smluvní strana **je povinna oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána **písemně bez zbytečného odkladu** poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **lhůta 14 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **15 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje:
- 13.4.1. prodlení Zhotovitele s dodržáním termínů stanovených dle čl. 3 odst. 3.1, 3.2 a 3.3 smlouvy, delším než 30 dnů,
 - 13.4.2. zhotovitel se i přes písemné upozornění Objednatele neřídí jeho závaznými pokyny ve věci realizace díla. Nedodrží zadání, parametry IZ,
 - 13.4.3. ohledně Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení, jehož navrhovatelem bude sám Zhotovitel (tj. Zhotovitel na sebe podá insolvenční návrh).
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje:
- 13.5.1. nepředání podkladů pro zahájení práce do 15 dnů po stanoveném termínu,
 - 13.5.2. objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla, nebo jeho části, po dobu delší než 50 dnů.
- 13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. **Zhotovitelovy závazky** za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy **do 30 dnů** od odstoupení od smlouvy.
- 13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.

14. SPORY

- 14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody **do 30 dnů** ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu.

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze **písemnými průběžně číslovanými** smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

16. STYK MEZI STRANAMI

- 16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.
- 16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
- 16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního **systému Datových schránek** dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho prováděcích předpisů.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR, zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu smlouvy, včetně svých identifikačních údajů.
- 17.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 17.3. Zhotovitel potvrzuje **pravdivost svých údajů**, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
- 17.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 17.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.6. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.
- 17.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

17.8. Smlouva se vyhotovuje v **4** vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží **3** vyhotovení a zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.

17.9. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy:

17.9.1. Příloha č. 1 – Popis stavebních částí

17.9.2. Příloha č. 2 – Plná moc

17.9.3. Příloha č. 3 – Realizační tým (seznam techniků)

Ve Vsetíně dne 18. 6. 2019

Ve Valašském Meziříčí, dne 18. 6. 2019

Objednatel

Ing. Tomáš Vitásek
Muzeum regionu Valašsko, p.o.
ředitel muzea

Zhotovitel

Ing. Martin Maňák
BP projekt, s.r.o.
ředitel společnosti

Příloha č. 1 – soupis a popis stavebních částí

stavební část 1	oprava vstupů (hlavní a boční vstup do zámku Vsetín),
stavební část 2	oprava vnější fasády zámku Vsetín a s tím spojená výměna klempířských prvků fasády vč. okapových systémů a rekonstrukce hromosvodové soustavy,
stavební část 3	oprava zámecké zdi (omítky, koruny) a návrh drenážního systému,
stavební část 4	výstavba nového výtahu v atriu zámku Vsetín,
stavební část 5	doplnění evakuačně zhášecího systému ve věži zámku Vsetín,
stavební část 6	oprava, výměna a doplnění dveří ve vybraných prostorách zámku Vsetín.

Výchozí stav:

Již v rámci částečné rekonstrukce zámku Vsetín v roce 2015 byl řešen i záměr restaurování sloupů pod balkónem – vstup z parku pro návštěvníky. Vzhledem k tehdejšímu enormnímu zvlhčení bylo od restaurování ustoupeno. Namísto restaurování se provedly kroky, které vedly ke snížení vlhkosti sloupů. Sloupy byly zbaveny obkladu a bylo přistoupeno k odstranění betonu, po kterém vlhkost vzlínala do masivu sloupů.

Návrh opatření:

Aktuálně po 3 letech vysoušení lze konstatovat, že sloupy mají již sníženou vlhkost a lze přistoupit k jejich restaurování. Současně je ovšem nutno dořešit vzhled vstupu. Jednalo by se tedy o odstranění (demontáž) žulových (mramorových) schodů a jejich nahrazení novými, pískovcovými ovšem tak, aby nedocházelo, jako v minulosti ke vzlínání vlhkosti do tělesa sloupů. Schodiště bude odizolováno. Mramor pod balkónem bude přeskládán. Boční vjezdy budou doplněny o odvodňovací žlaby. Problém vlhkosti vstupu a sloupů z podstatné části způsobuje i nevhodně provedená drenáž atria a zřejmě poškozené splaškové potrubí v atriu, tyto nedostatky budou odstraněny opravou kanalizace a obnovou drenážního systému v atriu.

Oprava tedy počítá:

- s výrobou pískovcového schodiště mezi sloupy,
- restaurování 5 sloupů,
- přeskládáním mramorové dlažby pod balkónem (vstup do muzea),
- částečnou opravou balkónu,
- opravou kanalizace v atriu,
- obnovou (opravou) drenážního systému v atriu.

Výhody navrhovaného opatření:

- částečná obnova historického vzhledu,
- sjednocení použitých materiálů,
- vytvoření systému odvlhčení a izolace, skloubení s estetickým vzhledem vstupu zámku.

Zpracování restaurátorského záměru na kámen – schody, sloupy.



1. Detail zavlhčení sloupu 08/2015 po 24 hodinách



2. Stávající stav schodiště a sloupů 04/2018



3. Celkový pohled 04/2018



4. Původní stav z 20. let 20. století



5. Původní stav z 20. let 20. století



6. Stávající stav

stavební část 2

oprava vnější fasády zámku Vsetín a s tím spojená výměna klempířských prvků fasády vč. okapových systémů a rekonstrukce hromosvodové soustavy

Výchozí stav:

Součástí rekonstrukce zámku Vsetín v roce 2015 nebylo řešení fasády na obvodovém plášti zámku. Celkový stav je odpovídající zvláště klimatických podmínkám, tzn. v I. NP je zřejmé poškození omítky zvýšenou vlhkostí, v okolí věžiček dochází k masivnímu zvětrání, v okolí rýn je zřejmé poškození.

Stav rýn si zaslouží též zvýšenou pozornost. V mnoha místech jsou zoxidované, poškozené, ročně plánuje muzeum finanční prostředky na jejich opravy.

Atrium zámku má, díky zvýšené vlhkosti, částečně poškozené omítky a tím pádem i nátěr.

Návrh opatření:

Provést kompletní opravu fasády zámku Vsetín spolu s nátěrem. Věž zámku byla natřena v 90. letech minulého století a nátěr je dosud stabilní. Obvod zámku je cca. 210 m, výška omítka sahá do 10 m pod římsu. Opravou se rozumí: odstranění nesoudržných vrstev omítky, odstranění původní barvy, opravu omítky, finální štukové zarovnání nerovností, nátěr

Vyspravení omítek a nový nátěr po první, přízemní římsu, lokální vyspravení nátěru nad římsou.

Součástí údržby omítky by byla i výměna rýn a svodů včetně kotvení hromosvodů.

Součástí této akce by mělo být rozšíření stávajícího hromosvodu zámecké věže o další 2 svody, zaústění zřejmě k bočnímu vchodu směrem k soudu.



1. Balkón nad bočným vstupem



2. JV nároží zámku



3. Zavlhávaní zdiva



4. Pohled na JZJV stranu



5. Omítka atrium (původní poškození do 0,5 m vlhkostí – dnes opravená)

stavební část 3 oprava zámecké zdi (omítky, koruny) a návrh drenážního systému

Výchozí stav:

Zed' zámeckého parku má délku kolem 150 m s průměrnou výškou 2 m. Vykazuje poškození jak omítky, tak zdiva. Dochází k postupné degradaci, v některých místech se jedná o vážné poškození. Zed' je součástí zámku u dvora a z jedné strany uzavírá zámeckou zahradu. Zed' je poškozena jak zemní vlhkostí, tak dešťovými vodami. Zed' utváří estetický vzhled zámku a zámecké zahrady.

Návrh opatření:

zajistí provedení izolace zdiva a výstavbu drenážního systému okolo zdi, dále zajistí opravu zdiva, nové omítky a výstavbu plakátovacích ploch. Obsahuje i opravu kování a mříží dvoru, dále opravu a výměnu korun zdi. Koruny zajistí, aby do zdi nezatékalo shora (krytí proti vniknutí dešťových vod) a aby voda následně nezamrzala a netrhala zdivo.

Restaurátorský záměr na kámen – koruny zdi a kov – mříže (očistění a natření).



1. Zed' SV pohled



2. Zed' s mříží



3. Snímek poškození omítky



4. Poškození zdiva



5. Poškození zdiva

Výchozí stav:

Výstavba výtahu nebyla v roce 2015 součástí prováděných stavebních úprav. Zámek Vsetín je dnes nedostupný imobilním návštěvníkům. Oproti zámku Lešné u Valašského Meziříčí, nemá možnost bočního schodiště s pojízdnou rampou. Výstavba výtahu je tak jediné řešení tohoto stavu.

Návrh opatření:

Zpracování variantní, vyhledávací studie jako podklad pro vyjádření orgánu státní památkové péče.

Výhody navrhovaného opatření:

- plné zpřístupnění II. NP pro návštěvníky se zdravotním omezením,
- zvýšení atraktivity zámku jak pro imobilní návštěvníky, tak pro seniory.

Návrh umístění a vzhled výtahu.



stavební část 5 doplnění evakuačně záššecího systému v zámecké věži zámku Vsetín

Výchozí stav:

V rámci rekonstrukce zámku Vsetín v roce 2015 nebyly prováděny žádné úpravy ve věži zámku, kde je instalována expozice Příroda Valašska, financovaná z Operačního programu Životní prostředí. Věž má z běžných monitorovacích prostředků instalován pouze kamerový systém, **EZS a hlavně EPS chybí**. Problémy s uvažovanými návrhy řešení byly následující: ve věži není zdroj vody, stěny o tloušťce 1 m, nestabilní wifi signál, nevíle památkářů zasahovat do zdiva, věž je nevytápěna, v zimě promrzá.

Návrh opatření:

Vybudování monitorovacího a autonomního evakuačně hasebního systému (min. 5s minut).

Výhody navrhovaného opatření:

- plné pokrytí zámku Vsetín požární signalizací,
- zvýšení bezpečnosti návštěvníků věže.

Potřebné podklady – projektové dokumentace:

Projektová dokumentace včetně rozpočtu. Projekt bude sloužit jak pro výběr zhotovitele (proto včetně rozpočtu), tak pro orgán státní památkové péče k vydání závazného stanoviska.

Technologie:

Sprinklery a voda

Předpoklad:

Rezervoáry s vodou na půdě (dostatečný prostor), rozvod přiznaný po trámech, předjednáno s NPÚ.

stavební část 6 oprava, výměna a doplnění dveří ve vybraných prostorách zámku Vsetín

Výchozí stav:

Během rekonstrukce zámku Vsetín byly vynechány opravy dveří na obvodovém plášti zámku - boční vstupní dveře, balkonové dveře v expozici, dveře ve věži zámku (vstupní do věže a na ochoz) a sklepní dveře. Součástí rekonstrukce byla realizace protipožárních dveří (depozitáře, kotelna, byt správce, knihovna) a repase balkonových dveří v ředitelně. Míra poškození těchto dveří ovšem přesáhla možnosti zhotovitele na jejich opravu (prohnutá křídla, vysoká, až 1 cm velká netěsnost křídel).

Díky špatným izolačním vlastnostem netěsné dveře v zámku způsobují tzv. komínový efekt, zvláště v zimních měsících, což se projevuje jak úniky tepla, tak průvanem.

Návrh opatření:

- **balkonové dveře v ředitelně** - výroba repliky dveří s využitím a zachováním stávajících fazetovaných skel (foto 1a a 1b),
- **dveře na balkón v expozici** - celkové ošetření, izolace, nátěr (foto 2a a 2b),
- **boční dveře do zámku** - repase, resp. očištění, konzervace a nátěr dubových dveří (vrat) s doplněním izolace po obvodu křídel a dveří (foto 3a a 3b),
- **dveře ve věži** - železné dveře jak pro vstup do věže (foto 4a a 4b), tak na ochoz věže (foto 5). Výroba nových, požárních dveří. Způsob provedení nutno projednat s orgánem státní památkové péče.
- **dveře do podkroví** - naproti vstupních dveří do věže – nové, historizující dveře (foto 6),
- **dveře do podkroví** – boční schodiště, ke klimatizaci – repase, zatěsnění (foto 7),
- **dveře do sklepa** – utěsnění, ošetření (foto 8),
- **sklepní dveře** – výměna poškozených zárubní, ošetření, konzervace,
- **dveře do kotelny** – celková repase, nátěr.

Výhody navrhovaného opatření:

- snížení úniků tepla v zámku Vsetín,
- zvýšení bezpečnosti návštěvníků – zvláště věže.




1.a Dveře na balkón, ředitelna



1.b Deformované křídlo dveří spára



2.a Balkonové dveře, expozice

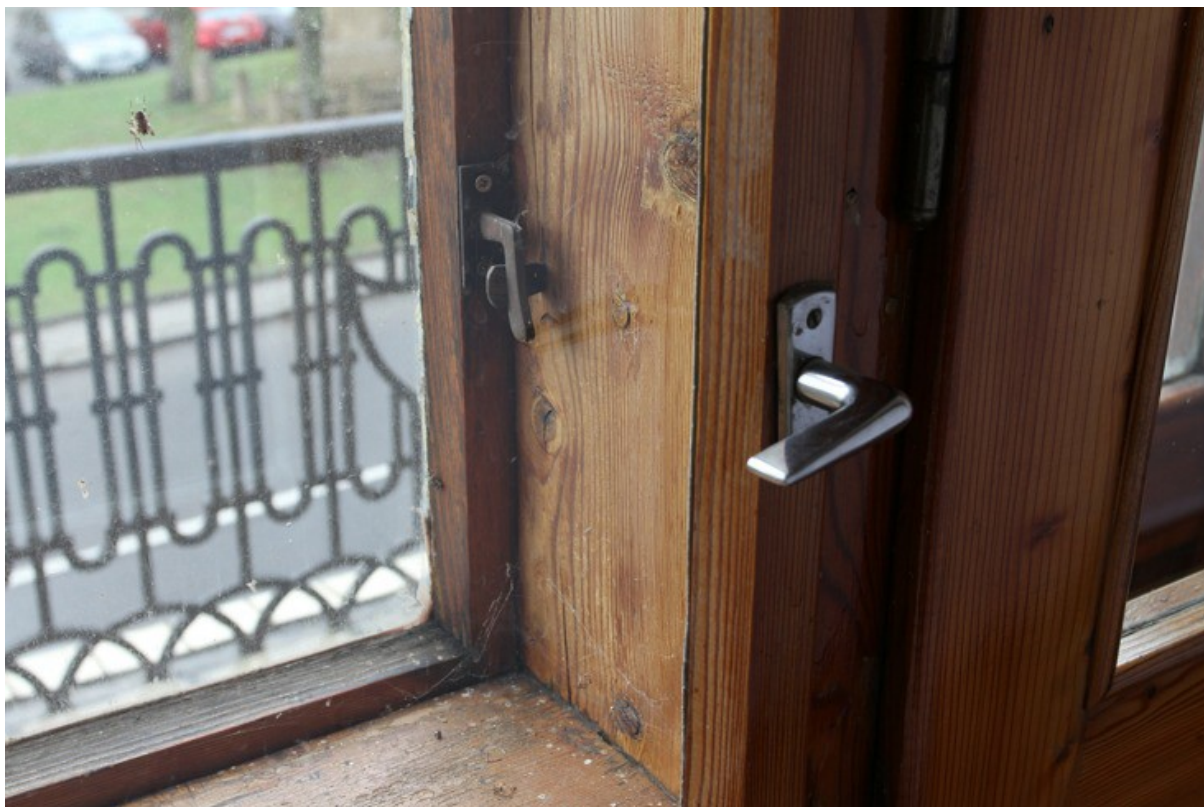

2.b Balkonové dveře, expozice, detail



3.a Boční vstupní dveře pohled z ulice



3.b Boční vstupní dveře pohled ze zámku



4.a Dveře do věže



4.b Dveře do věže



6. Dveře do podkroví



7. Dveře do podkroví klimatizace



8. Dveře do sklepa zámku



9a. Dveře ve sklepních prostorách



9b. Uvolněné zárubně, futra



10. Dveře do kotelny

Příloha č. 2 - Plná moc k zajištění inženýrské činnosti

PLNÁ MOC

v souladu s ust. § 441 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platné m znění

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ: 00098574

statutární zást.: Ing. Tomáš Vitásek – ředitel, tel. 571 411 690, vitasek@muzeumvalassko.cz

kontaktní osoba: Ing. Jan Marek, tel. 604 604 872, marek@muzeumvalassko.cz

(dále jen „zmocnitel“)

tímto uděluje plnou moc

BP projektu, s.r.o.

Havlíčková 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 20285

IČ 25832395

(dále jen „zmocněnec“)

I.

k tomu, aby jednal jménem a na účet zmocnitele při vykonávání inženýrské činnosti při projektové přípravě akce:

Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II

II.

Zmocněnec je oprávněn jménem zmocnitele právně jednat a vykonávat činnosti vedoucí k vydání příslušných pravomocných správních rozhodnutí dotčených správních orgánů, v souvislosti s výše uvedenou akcí.

III.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn činit zejména tato právní jednání:

1. Vést veškerá jednání s dotčenými správními orgány za účelem získání jejich stanovisek, vyjádření a souhlasů v souvislosti s výše uvedenou akcí.
2. Zmocněnec má právo v souvislosti s výše uvedenou akcí vystupovat jménem zmocnitele při projednání projektové dokumentace v rozsahu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a zastupování před dotčenými orgány státní správy a před účastníky řízení za účelem vydání územního

souhlasu, územního rozhodnutí, ohlášení stavby, stavebního povolení stavby a veřejnoprávní smlouvy až do doby nabytí právní moci.

3. Zmocnitel dále zplnomocňuje zmocněnce, aby přijímal veškeré doručované písemnosti.

IV.

Zmocněnec **není oprávněn** vstupovat do žádných závazkových právních vztahů s účinky pro zmocnitele, ani není oprávněn vzdát se práva odvolání ve správních řízeních vedených v souvislosti se shora uvedenou akcí.

V.

Výkonem inženýrské činnosti je za zmocněnce pověřen:
Ing. Martin Maňák

VI.

Tato plná moc se řídí právním řádem České republiky a je možné ji kdykoli odvolat.

Ve Vsetíně, dne 18. 6. 2019

.....
Ing. Tomáš Vitásek
ředitel příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko

Ve Valašském Meziříčí, dne 18. 6. 2019

Tuto plnou moc přijímám

.....
Ing. Martin Maňák
zmocněnec

Příloha č. 3 - Realizační tým (seznam techniků)

Architekt:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Arch. Ivo Švábenský
Telefon: 605 928 033
E-mail: isvabensky@seznam.cz

Projektant:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Martin Maňák
Telefon: 606 678 136
E-mail: m.manak@bprojezt.cz
