



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice

zastoupený: Ing. Františkem Štanglem, předsedou představenstva

Václavem Kučerou, členem představenstva

IČ / DIČ: 28080581 / CZ28080571

bankovní spojení: 220255849/0300

(dále jen "**Objednatel**") na straně jedné

a

Lewest s.r.o.

se sídlem Kostelní 942/46, České Budějovice 3 370 04

zastoupená:

IČ / DIČ: 07278781/CZ07278781

bankovní spojení:

(dále jen "**Zhotovitel**") na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně a do textu této smlouvy je zapracují dodatkem smlouvy.

A/ Objednatel má zájem, aby pro něj Zhotovitel vyvinul aplikaci „**Monitorovací systém Jihočeské RIS3 v on-line podobě**“ (dale jen **monitorovací systém RIS 3**).

Zakázka je zadávána v rámci projektu Smart Akcelerátor v Jihočeském kraji č. projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000676.

B/ Zhotovitel má zájem vyvinout pro Objednatele aplikaci Monitorovací systém RIS3 formou agilní metodiky vývoje aplikací (Scrum/Kanban), tj. vývoj aplikace má být iterativní, flexibilní, dbát na rychlé dodávky částí aplikace nebo prototypů, za následného

sbírání zpětné vazby od zákazníka za účelem rychlé reakce na měnící se požadavky a změny během vývoje;

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1 Definice v této smlouvě

- 1.1** „**Akceptační protokol**“ je potvrzení o splnění akceptačních kritérií, tedy o předání a přijetí (převzetí) Díla. Jeho vzor je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 1.2** „**Dílo**“ je aplikace Monitorovací systém RIS3 vyvinutá Zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou. Bližší specifikace Díla je uvedena v této smlouvě.
- 1.3** „**Důvěrná informace**“ je jakákoliv informace (i) označená smluvními stranami jako důvěrná, (ii) informace o existenci a obsahu této smlouvy, a (iii) veškeré jiné informace a materiály, které se týkají duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, know-how, obchodních tajemství, účetnictví, obchodních transakcí, současných nebo budoucích podnikatelských plánů, obchodních jednání nebo záležitostí, informací o zákaznících nebo výrobcích a službách smluvních stran nebo jejich zákazníků (včetně jakýchkoli dat náležících jejím zákazníkům).
- 1.4** „**Licence**“ je licence k užití Díla, udělená Zhotovitelem Objednateli v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou, zejména v čl. 8.1 smlouvy.
- 1.5** „**Plánovací schůzka**“ je jednání mezi Zhotovitelem a Objednatelem, příp. jejich zástupci, které bude probíhat osobně, telefonicky nebo jako online jednání prostřednictvím Skype, Hangout či jiných obdobných aplikací pro online schůzky.

2 Předmět smlouvy

- 2.1** Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro Objednatele zhotovit Dílo na základě této smlouvy v rozsahu dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy a udělit k Dílu Licenci, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 2.2** Místem plnění je sídlo Zhotovitele, případně jiné dohodnuté místo.
- 2.3** Smluvní strany předpokládají, že Dílo bude zhotoveno ve fázích specifikovaných v čl. 5.1. Tam, kde tato smlouva hovoří o Díle a nevyplývá-li ze smyslu konkrétního ustanovení jinak, je myšleno rovněž dílčí dílo jakožto výsledek (výstup) jednotlivých fází. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že na dílčí dílo se plně uplatní všechna ustanovení této smlouvy, která upravují práva a povinnosti související s Dílem (zejména licenční ujednání, akceptační řízení, odpovědnost za vady, zaplacení sjednané ceny apod.).
- 2.4** Objednatel se zavazuje dokončené Dílo v každé fázi převzít. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za zhotovení Díla, která zahrnuje rovněž cenu za poskytnutí Licence, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem.

3 Práva a povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Při zhotovení Díla bude Zhotovitel respektovat všechny platné právní předpisy.
- 3.2 Členové týmu Zhotovitele budou využívat vlastní pracovní stanice/notebooky včetně základního software.
- 3.3 Zhotovitel zaručuje, že Dílo bude zhotoveno kvalifikovaným personálem Zhotovitele a odborným způsobem, který je všeobecně akceptován v rámci průmyslových standardů a praxe.
- 3.4 Zhotovitel je oprávněn uvádět logo Objednatele a informaci o zhotovení Díla pro Objednatele a popis základních charakteristik Díla pro své marketingové účely, včetně zveřejnění této informace na svých webových stránkách.
- 3.5 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by bránily řádnému zhotovení Díla ve stanovených termínech a kvalitě neprodleně po tom, co takovou skutečnost zjistí.

4 Práva a povinnosti Objednatele

- 4.1 Objednatel poskytne nezbytnou součinnost požadovanou Zhotovitelem ke splnění této smlouvy a poskytne Zhotoviteli informace nebo údaje, které budou nutné nebo užitečné pro plnění předmětu této smlouvy v termínu dohodnutém oprávněnými osobami obou stran. Pokud pro dílčí plnění součinnosti není dohodnut termín, poskytne Objednatel informace nebo součinnost bez zbytečného odkladu, avšak v termínu přiměřeném rozsahu požadavku.
- 4.2 Dohodnuté informace budou předávány vždy jednorázově a uceleně. Objednatel odpovídá za přesnost a úplnost jakékoli informace nebo údajů takto jím poskytnutých a za to, že informace poskytnuté různými osobami budou v souladu.
- 4.3 Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o všech skutečnostech, které by bránily řádnému zhotovení Díla ve stanovených termínech a kvalitě neprodleně po tom, co takovou skutečnost zjistí.

5 Termín a Zhotovení Díla

- 5.1 Dílo bude zhotoveno nejpozději v termínu do 19.8.2019 a to v následujících fázích:

- 5.1.1 Fáze 1 - Vytvoření produkční verze (PROD).

Na začátku této fáze proběhne Plánovací schůzka, kde se odsouhlasí požadavky na funkcionality Díla dle specifikace zakázky.

Na základě této schůzky budou konkretizovány/zpřesněny požadavky na Dílo, jeho funkcionality a rozsah v rámci specifikace zakázky.

- 5.1.2 Fáze 2 Konkretizace Díla, zpřesnění požadavků na Dílo, jeho funkcionality a rozsah;

5.1.3 Akceptační kritéria pro Dílo (definice stavu, kdy je hotovo);

- 5.2 V průběhu jednotlivých fází a dle potřeby budou Zhotovitelem svolávány hodnotící schůzky oprávněných zástupců obou smluvních stran. Jejich úkolem je prezentovat odvedenou práci, většinou formou demoverze. Objednatel je povinen se schůzek aktivně účastnit, poskytnout Zhotoviteli zpětnou vazbu, případně může přidat svoje připomínky apod.

6 Akceptace Díla

- 6.1 Na konci každé fáze Zhotovitel předá Objednateli ve lhůtě pro zhotovení Díla Dílo k akceptačním testům. Objednatel je povinen podrobit Dílo akceptačním testům ve lhůtě 5-ti dnů ode dne jeho předání.

- 6.2 Pro potřeby akceptačního řízení jsou stanoveny tyto kategorie vad:

Kategorie A – kritická vada, která způsobuje nefunkčnost Díla jako celku nebo nefunkčnost klíčové funkcionality Díla. Zároveň neexistuje postup pro náhradní řešení a problém ani nelze dočasně překlenout užitím běžných postupů.

Kategorie B – ostatní vady.

Kategorii vady navrhuje Objednatel, Zhotovitel návrh kategorie schvaluje. Pokud nedojde ke shodě ohledně kategorie v přiměřené lhůtě, platí určení kategorie Zhotovitelem, přičemž je třeba zohlednit akceptační kritéria.

- 6.3 Objednatel se zavazuje akceptovat Dílo či jeho část dle akceptačních kritérií. Dílo musí být Objednatelům akceptováno, vyskytuje-li se u něj maximálně 0 vad kategorie A a 4 vady kategorie B.
- 6.4 Je-li Dílo v souladu s touto smlouvou, je Objednatel povinen Dílo akceptovat ve lhůtě do 5-ti dnů ode dne jeho předání k akceptačním testům. V opačném případě je povinen ve stejné lhůtě zaslat Zhotoviteli výhrady specifikující vady.
- 6.5 Výhrady zašle Objednatel elektronicky, pokud není dohodnuto jinak. Veškerá komunikace týkající se předávání a přebírání Díla bude probíhat v dohodnutém systému pro správu požadavků (např. Bugzilla, Freshdesk, Jira apod.).
- 6.6 Zhotovitel je povinen vady opravit a předat Objednateli opravené Dílo k opakování akceptačních testů v dohodnuté lhůtě.
- 6.7 Objednatel je povinen podrobit Dílo k akceptačním testům ve lhůtě 5 dnů od převzetí opraveného Díla. Postup dle předchozích odstavců tohoto článku se opakuje až do bezvýhradné akceptace Díla.
- 6.8 V případě, že Objednatel neakceptuje Dílo do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo předáno k akceptačním testům, ani v této lhůtě nespecifikuje vady Díla, považuje se Dílo za akceptované dnem následujícím po uplynutí této lhůty. Je-li Dílo uvedeno u Objednatelů do provozu (produkce), považuje se Dílo za akceptované dnem, kdy bylo uvedeno do provozu.

- 6.9 Splněním akceptačních kritérií této smlouvy je Dílo považováno za předané a převzaté. O tom smluvní strany sepíše Akceptační protokol. Zhotovitel bez zbytečného odkladu po předání/převzetí Díla předá Objednateli zdrojový kód a dokumentaci k Dílu.

7 Vady Díla

- 7.1 Vadou Díla se rozumí neshoda výstupu nebo jeho části s rozsahem Díla dohodnutým v této smlouvě, nedostatky či chyby ve sjednané funkcionalitě Díla a dále neplnění sjednaných funkcí Díla.
- 7.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny Objednatelem nebo neoprávněným zásahem třetí osoby, nebo zásahem třetí osoby, ke kterému dal Objednatel souhlas. Objednatel se výslovně vzdává práv z vadného plnění, které z této příčiny vzniklo.

8 Licence

- 8.1 Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli k okamžiku převzetí Díla či jakékoliv jeho části vytvořené v rámci jednotlivých fází, které je svou povahou samostatným dílem, nevýhradní Licenci.
- 8.2 Licence je poskytována ke všem známým způsobům užití Díla a v následujícím rozsahu:
- 8.2.1 časový rozsah: neomezený (na celou dobu trvání majetkových práv k Dílu);
 - 8.2.2 teritoriálního rozsah: neomezený (celosvětově);
 - 8.2.3 množství rozsah: neomezený (bez omezení co do množství či počtu užití).
- 8.3 Objednatel není oprávněn poskytnout práva z Licence zcela nebo zčásti třetí osobě, a to jak poskytnutím podlicence, tak postoupením Licence, bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.
- 8.4 Zhotovitel je oprávněn užít Dílo stejným způsobem jako Objednatel. Zhotovitel však není oprávněn poskytnout práva z Licence zcela nebo zčásti třetí osobě, a to jak poskytnutím podlicence, tak postoupením Licence, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

9 Cena a platební podmínky

- 9.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za vytvoření Díla zahrnující rovněž cenu za poskytnutí Licence, jejíž výše činí:

bez DPH 138 000, DPH 28 980, cena celkem 166 980 Kč

- 9.2 Dohodnutá cena bude zaplacená na základě faktury vystavené Zhotovitelem po akceptaci Díla ve smyslu čl. 6 této smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že podpis Akceptačního protokolu není podmínkou pro vystavení faktury ze strany Zhotovitele.
- 9.3 Faktura bude zaslána na emailovou adresu Objednatele.
- 9.4 Platby podle této smlouvy jsou splatné do 14 dnů od data doručení příslušné faktury Objednateli.
- 9.5 Nebude-li faktura obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy pro fakturu a daňový doklad, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Lhůta k plnění v takovém případě začíná běžet až doručením řádné faktury.

10 Oprávněné osoby

- 10.1 Osoby oprávněné za Zhotovitele ve věci smlouvy jednat:
- 10.2 Osoba oprávněná za Objednatele ve věci smlouvy jednat (kontaktní osoba): Mgr. František Mičák, reditel@jvtp.cz, 602 164 100

11 Mlčenlivost

- 11.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích.
- 11.2 Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje (i) na skutečnosti, které jsou obecně známy, nikoliv však v důsledku porušení povinnosti mlčenlivosti stanoveném v tomto článku, (ii) na skutečnosti, které jsou veřejně přístupné, (iii) na skutečnosti sdělené v nezbytné míře odborným poradcům, za podmínky, že tito poradci jsou vázáni povinností mlčenlivosti alespoň v takovém rozsahu jako smluvní strany, nebo (iv) na skutečnosti, u nichž je mlčenlivost omezena nebo vyloučena platnými právními předpisy nebo povahou plnění smlouvy.
- 11.3 Povinnosti mlčenlivosti může být smluvní strana zproštěna pouze předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují učinit vhodná opatření k tomu, aby Důvěrné informace nebyly jakkoliv zneužity nebo k nim neměly přístup neoprávněné osoby.

12 Odpovědnost za škodu a sankce

- 12.1 Každá ze smluvních stran odpovídá za škody vzniklé porušením povinností stanovených smlouvou a z ní vyplývajících.
- 12.2 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností stanovených smlouvou a z ní vyplývajících jinou smluvní stranou.

- 12.3** Smluvní strany se výslovně dohodly, že odpovědnost Zhotovitele za škodu způsobenou Objednateli se omezuje na celkovou cenu Díla zaplacenou Objednatel dle této smlouvy. Objednatel se tímto vzdává práva domáhat se po Zhotoviteli náhrady škody vzniklé v souvislosti s touto smlouvou nad tento limit. Toto omezení se neuplatní pro případy újmy na přirozených právech, újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
- 12.4** V případě prodlení Objednatele s jakoukoliv platbou dle této smlouvy má Zhotovitel právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do čtrnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování. Zaplacením úroku z prodlení není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
- 12.5** Zhotovitel se zproští povinnosti k náhradě škody, pokud prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno
- 12.5.1 nepředvídatelnými a nepřekonatelnými překážkami; nebo
 - 12.5.2 nedostatečně zabezpečeným HW či SW; nebo
 - 12.5.3 jednáním Objednatele v rozporu s instrukcemi v dokumentaci k Dílu;
 - 12.5.4 prodlením Objednatele; nebo
 - 12.5.5 nedostatkem součinnosti, ke které byl Objednatel povinen; nebo
 - 12.5.6 zásahem třetí osoby do Díla.

13 Trvání a zánik smlouvy

- 13.1** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.2** Zánikem smlouvy není dotčena povinnost mlčenlivosti, právo na náhradu škody a právo na zaplacení úroků z prodlení.

14 Závěrečná ustanovení

- 14.1** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, není-li pro některá ustanovení stanoveno jinak.
- 14.2** Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy, ledaže se jedná o ustanovení, které od ostatního obsahu smlouvy nelze oddělit.
- 14.3** Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.4** Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

14.5 Smluvní strany si smlouvu důkladně přečetly, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

15 Přílohy

15.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Vzor Akceptačního protokolu

V Č. Budějovicích dne 15.7.2019

za Zhotovitele

Jméno
Pozice: jednatel
Podpis: _____

za Objednatele

Jméno Ing. František Štangel
Pozice: předseda představenstva
Podpis: _____

Jméno Václav Kučera
Pozice: člen představenstva
Podpis: _____

PŘÍLOHA Č. 1 – Specifikace Díla

Monitorovací systém Jihočeské RIS3

Shrnutí funkčnosti

Monitorovací systém je systém, který po přihlášení (on-line přístup) umožní uživateli zaznamenávat informace o projektech v Jihočeském kraji, data průběžně aktualizovat a umožní zobrazovat níže popsaná schémata, sestavy a přehledy, které uceleně hodnotí jejich stav v různých fázích jejich životního cyklu a jejich přínos k Jihočeské RIS3 strategii. Monitorovací systém tvoří primárně **databáze o projektech** a informace o těchto projektech. Data, která uživatelé k projektům zadávají, jsou definována v Tabulce 1. Kromě hodnot typu krátký text, dlouhý text, číslo, boolean mohou uživatelé k projektům přiřazovat informace ze seznamů (zvolí 1 výběr nebo více výběrů), které se v této specifikaci nazývají jako **vedlejší databáze**. Seznam vedlejších databází je rovněž definován v Tabulce č.1.

Uživatelé Monitorovacího systému budou především členové RIS3 týmu v Jihočeském kraji, kteří budou zajišťovat jeho funkčnost a aktualizovat informace a data o projektech, které Monitorovací systém naplňuje. Výstupy systému budou využívat i další stakeholderi a instituce zapojené do inovační politiky v Jihočeském kraji.

Požadavky na funkčnost, tj. systém bude umět nebo umožňovat:

- Aktualizaci stávajících záznamů z databáze projektů a vedlejších databází
- Odebírání stávajících záznamů z databáze projektů a vedlejších databází
- Přidávání nových záznamů z databáze projektů a vedlejších databází
- Zobrazovat údaje z jakékoliv databáze a filtrovat hodnoty ve sloupcích
- Vygenerovat akční plán z údajů v databázi o projektech (sestava, náhled viz příloha)
- Vygenerovat fiši projektu z údajů v databázi o projektech (sestava, náhled viz příloha)
- Zobrazit graf strategičnosti vs. fází projektu - bez filtru pro všechny projekty
- Zobrazit graf strategičnosti vs. fází projektu - s filtrem - Klíčová oblast změn, Specifický cíl, Strategická intervence, Tematická oblast SAI, Volitelná tematická oblast
- Zobrazit součet hodnot zadaných Výstupních indikátorů za vybranou oblast [Projekt, Klíčová oblast změn, Specifický cíl, Strategická intervence, Tematická oblast SAI, Volitelná tematická oblast]
- Exportovat do .xls (Excel) jakoukoliv databázi (projektů i vedlejší)
- Login uživatelů (max. 20 různých uživatelů)
- Systém vyžaduje po uživatelích průběžnou aktualizaci o jednotlivých projektech každých 6 měsíců (vyžaduje alespoň 1 jakoukoliv úpravu).

Způsob používání Monitorovacího systému


Uživatel systému může primárně:

1. **Přidávat, upravovat a mazat projekty (očekáváme až 200 projektů).**
2. **Přidávat, upravovat a mazat údaje z vedlejších databází, které jsou s projekty propojeny.** Jde o databáze, které se k projektům připojují, např. Tematické oblasti SA II, Volitelné tematické oblasti, Specifické cíle, Stakeholderi. Tyto databáze slouží jako seznamy, ze kterých uživatelé volí při zadávání nových Projektů a které je možné dále použít jako filtry pro zobrazování přehledů a sestav. Vedlejší databáze jsou definovány níže. V případě, že uživatel smaže položku vedlejší databáze, která byla již zvolena v některém z projektů, systém upozorní na názvy všech projektů, ve kterých byla mazaná položka použita a tedy kde bude potřeba provést aktualizaci.
3. **Zobrazovat a reportovat přehledy**

Systém umožňuje zobrazovat přehledy projektů. Hlavním přehledem je Graf zobrazující projekty dle jejich strategičnosti a fázi životního cyklu, ve které se nacházejí. Velikost kruhu odpovídá rozpočtu projektu za Jihočeský kraj za celou dobu trvání projektu, osa X určuje fázi životního cyklu a osa Y strategičnost Projektu. Pro určení počtu bodů pro strategičnost i fázi se užije vodítko uvedené dále v této metodice.

Uživatel Monitorovacího systému může zobrazit všechny projekty nebo jen některé dle filtru - Klíčová oblast změn, Specifický cíl, Strategická intervenci, Tematická oblast SAII, Volitelná tematická oblast. Graf tak přehlednou formou ukazuje, v jakém stavu je konkrétní portfolio projektů v rámci RIS3 strategie a dává vodítko, jakým směrem upřít pozornost a úsilí tak, aby vybrané projekty v co nejkratším čase přinesly potřebné výsledky inovačnímu prostředí v regionu.

Graf 1: Náhled na ukázkou grafu Strategičnosti vs. Životní cyklus projektů

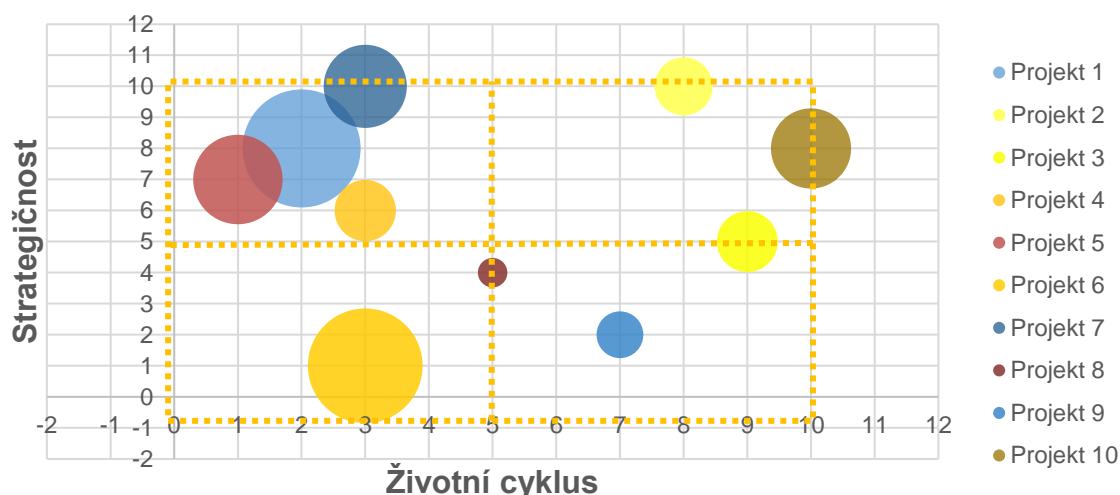

Zdroj: vlastní zpracování

Zadavatel obdobně definuje další 2-4 přehledy, které bude systém umět zobrazit na základě dat o projektech.

4. **Zobrazovat a exportovat tabulku dat k zadanými projektům** (tzv. Akční plán) – viz vzor „Vzorový akční plán.xlsx“
5. **Generovat projektové fiše** – systém umožní vytvářet PDF soubory na základě dat vložených do systému o projektech. Vzhledové rozvržení fiše je odvozeno z dosavadních fiší Strategický projektů z Akčního plánu. Viz vzor „Vzorová projektová fiše.docx“.

Co tvoří Monitorovací systém Jihočeské RIS3

Monitorovací systém tvoří propojené databáze. **Hlavní databází je databáze Projektů** a poté související **vedlejší databáze**, které jsou zapotřebí k vyplnění informací o Projektech, zobrazování sestav a přehledů.

O každém projektu, který je součástí Monitorovacího systému, se zadávají následující údaje:

Tabulka 1: Údaje o Projektu vkládané do systému

Údaj	Vedlejší databáze?	Povinné vyplnit?	Typ	Počet možných výběrů	Poznámka
Číslo projektu	Ne	Ano	Automaticky generované číslo	-	-
Klíčová oblast změn	Ano	Ano	Výběr ze seznamu	1 a více	Za každou přidanou oblast musí být přidán minimálně 1 specifický cíl.
Specifické cíle	Ano	Ano	Výběr ze seznamu	1 a více	Za každý specifický cíl musí být přidán minimálně 1 Výstupní indikátor. Specifický cíl je vázán na Klíčovou oblast.
Strategické intervence	Ano	Ne	Výběr ze seznamu	1 a více	Samostatná tabulka
Název projektu	Ne	Ano	Krátký text	-	--
Anotace	Ne	Ano	Dlouhý text	-	Popis projektu
Typ projektu	Ano	Ano	Výběr ze seznamu	1	Externí/interní
Fáze projektu	Ne	Ano	Celé číslo [1-10]	-	Proměnlivá hodnota, vstupuje do hlavního přehledového grafu
Strategičnost projektu	Ne	Ano	Celé číslo [1-10]	1	Pevná hodnota, vstupuje do hlavního přehledového grafu
Tematická oblast SA II	Ano	Ne	Výběr ze seznamu	1	Za každou přidanou oblast musí být přidán minimálně 1 Výstupní indikátor.
Volitelná tematická oblast	Ano	Ne	Výběr ze seznamu	1	Volitelná kategorie dle vlastního výběru
Hlavní nositel projektu	Ano, viz poznámka	Ano	Výběr ze seznamu	1	Čerpá z databáze partnerů
Významní partneři	Ano, viz poznámka	Ano	Výběr ze seznamu	1 a více	Čerpá z databáze partnerů
Kontaktní osoba	Ne	Ne	Krátký text	1	Kontaktní osoba na projekt, nikoliv hlavního nositele
Email	Ne	Ne	Krátký text	1 a více	Email na kontaktní osobu
Telefon	Ne	Ne	Krátký text	1 a více	Telefon na kontaktní osobu

Developer	Ne	Ano	Přiřazeno dle zadavatele	1	Osoba, která přidala projekt a spravuje jej
Výstup	Ano	Ano	Výběr ze seznamu	Min. 1, optimálně 3, max. 15.	Dílčí aktivita, modul, část projektu
Výstupní indikátor	Ano	Ano	Výběr ze seznamu	Min. 1 za Výstup	Měřitelný výstup v dílčí aktivitě, modulu, části projektu
Výsledek	Ano	Ne	Výběr ze seznamu	Min. 1, optimálně 3, max. 15.	Efekt mající sociální a ekonomické dopady.
Výsledkový indikátor	Ano	Ne	Výběr ze seznamu	Min. 1 za Výsledek	Měřitelný efekt mající sociální a ekonomické dopady.
Celkový rozpočet	Ne	Ne	Celé číslo	-	Rozpočet připadající na partnery v Jihočeském kraji, částka v Kč ke dni zahájení projektu
Částka financovaná z dotací	Ne	Ne	Celé číslo	-	Částka z celkového rozpočtu, která je poskytnuta ve formě dotace
Dotační titul	Ne	Ne	Krátký text	-	-
Aktivita	Ne	Ano	Binární	1	Aktivní/neaktivní
Období realizace	Ne	Ne	Datum	-	Specifikace konkrétního data od - do
Schváleno komisí pro inovace	Ano	Ano	Výběr ze seznamu	1	Možnosti: Schváleno / Ke schválení / Neschváleno
Poznámka	Ne	Ne	Dlouhý text	-	Poznámka zadavatele.

Zdroj: vlastní zpracování

Položky, které jsou označeny jako Výběr ze seznamu, čerpají z vedlejších databází. Tyto je možné upravovat, přidávat a mazat, podobně jako projekty.

PŘÍLOHA Č. 2 - VZOR

Akceptační protokol

ke smlouvě o dílo (dále „smlouva“), která byla uzavřena dne _____ mezi smluvními stranami uvedenými níže ze dne _____.

..... IČO:,

se sídlem společnosti.....

(dále „Zhotovitel“),

a

(2) **Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.**, IČO: 280 80 581, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, email: info@jvtp.cz

(dále „Objednatel“)

Podpisem tohoto akceptačního protokolu potvrzují Zhotovitel a Objednatel, že Dílo dodané v rámci smlouvy je plně funkční podle požadavků Objednatele specifikovaných ve shora uvedené smlouvě, testování bylo řádně dokončeno a Dílo bylo předáno (uvedeno do ostrého provozu) dne

Podpisem tohoto akceptačního protokolu Objednatel potvrzuje, že testování bylo úspěšné a Dílo splňuje podmínky pro převzetí, zejména akceptační kritéria, stanovené smlouvou.

V Č. Budějovicích dne

V Č. Budějovicích dne

za Zhotovitele

za Objednatele

Jméno

Jméno

Pozice:

Pozice:

Podpis: _____

Podpis: _____
