

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: SML/1191/2019

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Statutární město Přerov

se sídlem: Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

zastoupené: [redacted] náměstkem primátora

IČ: 00301825

DIČ: CZ 00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: [redacted] - transparentní účet

1.2. Zhotovitel:

Technické služby města Přerova, s.r.o

se sídlem: Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I-město

Zastoupené: [redacted] jednatelem společnosti

IČ: 27841090

DIČ: CZ27841090

Bankovní účet: [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Zápis v Obchodním rejstříku, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43227

2. Smluvní údaje a ujednání

2.1. Název stavby: „Rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem na ulici Kosmákova“

2.2. Vymezení činnosti:

Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:

Objednatel:

ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických a realizace díla: [redacted]

Zhotovitel:

ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických a realizace díla: [redacted]

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

3. Předmět plnění díla

- 3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla dle projektové dokumentace zpracované společností ITAKO Development s.r.o., Škrobálkova 200/42, Ostrava – Kunčičky, IČ: 28631102 v souladu zadávacích podmínek, dodávek a montáží stavby:

**„Rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem
na ulici Kosmákova “**

- 3.2. V souladu se zadávací dokumentací je rozsah dodávky specifikován v rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.1. Je-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.
- 3.3. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN, stavebního povolení, projektu stavby a ve shodě s požadavky objednatele.
- 3.4. Rozsah díla je vymezen schválenou projektovou dokumentací stavby pro provedení stavby zajištěnou objednatelem.
- 3.5. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel umožní odběr elektrické energie za úhradu na základě předem uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
- 3.6. Součástí plnění jsou dále:
- doklady: prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů a zařízení, potřebné revize a zkoušky
 - vytyčení podzemních inženýrských sítí u jejich správců
 - dokumentace skutečného provedení ve vyhotovení formou ručního zakreslení
- 3.7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 3.8. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy.
- 3.9. Objednatel při podpisu smlouvy předal zhotoviteli platnou projektovou dokumentaci pro zhotovení díla.

4. Termíny, doba plnění díla

- 4.1. Zahájení realizace díla: **dnem protokolárního předání a převzetí staveniště (červenec 2019)**
- 4.2. Ukončení realizace díla: **do 40 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla**
- 4.3. Změna termínu dokončení díla je možná pouze:
- a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla dodržet,
-

- b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem objednatele,
- c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6.-13.9. této smlouvy,
- d) pokud objednatel pozastaví stavební práce na díle na základě vlastního pokynu.

Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo v důsledku výše uvedených událostí.

5. Místo plnění díla

5.1. Místem plnění je **Přerov, ulice Kozlovská , Kosmákova**

6. Cena díla

6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:

6.1.1.	CELKEM bez DPH:	511 185,26 Kč
6.1.2.	DPH 21%:	107 348,90 Kč
	CELKEM s DPH	618 534,16 Kč

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu Klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz. § 5 odst. 3 Zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesené daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

- 6.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Pro ocenění je rozhodující textová a výkresová část dokumentace. Zhotovitel ocenil práce, které považuje za nutné provést (např. vyplývající z použitého technologického postupu) a podle jeho názoru nejsou v zadávací dokumentaci obsaženy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění včetně vybudování zařízení staveniště, dopravy materiálu a techniky do místa plnění, zpracování dokumentace skutečného provedení, předání dokladů od použitých materiálů, a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. Taktéž je započten vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd.
- 6.3. Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na rozšíření dodávek a prací oproti předané prováděcí dokumentaci a dodatečného zadání. V tomto případě zhotovitel předloží objednateli oceněný položkový rozpočet k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a po jejich provedení vyúčtování.

- 6.4. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé dodávky a práce obsažené v položkovém rozpočtu, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek v cenách dle položkového rozpočtu.

7. Platební podmínky

- 7.1. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele (technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek, a to až do výše 90% z celkové smluvní ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány nebudou.
- 7.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 7.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.4. Částka rovnající se 10% z celkové smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude proplacena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.
- 7.5. Faktura, daňový doklad bude obsahovat, kromě výše zmíněných náležitostí dle zákona o DPH zejména následující údaje:
- označení a číslo faktury
 - název díla
 - obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - datum vystavení faktury
 - lhůta splatnosti
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - bankovní spojení včetně identifikace banky
 - další náležitosti podle § 28 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH
 - razítko a podpis zhotovitele
- 7.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
- 7.7. Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení:

- 8.1. V případě prodlení s termínem realizace díla dle bodu 4.2. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době nebo vadu či nedodělek z přejímacího protokolu, uhradí objednateli 2000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
- 8.4. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 14 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

9. Náhrada škody, odpovědnost

- 9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní pokuty vztahovaly.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Výhrady ke zjevným vadám díla запиše Objednatel do písemného protokolu, Zhotovitel sdělí Objednateli - pověřenému zaměstnanci Magistrátu města Přerova - [redacted] tel: [redacted] do 7 kalendářních dnů po předání díla, zda výhrady k vadám díla uznává a jakým způsobem budou tyto vypořádány. Případné spory budou řešeny dle ust. odstavce 13.10. této smlouvy. Pokud bylo dílo Objednatelům převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.
- 10.2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 10.3. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad sepíše smluvní strany písemný protokol.

11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.

-
- 11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
- 11.3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami.
- 11.4. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
- 11.5. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.6. V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na místo díla do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady.
- 11.7. Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení dalších škod, nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající bezprostřední ohrožení zdraví nebo majetku, od nahlášení závady.

12. Rizika a pojištění

- 12.1. Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn předmět činnosti v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku.

13. Způsob provádění díla a ostatní ujednání

- 13.1. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem vede zhotovitel stavební deník. Tento bude během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel bude každý pracovní den zapisovat skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa.

- 13.2. Mimo zhotovitele a objednatele může provádět záznamy do deníku:

- technický dozor objednatele
- příslušný orgán státní správy
- pověření zástupci objednatele

Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se do stavebního deníku k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Zhotovitel povede stavební deník ode dne zahájení prací na místě realizace díla. Povinnost vedení deníku končí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí.

- 13.3. Zhotovitel umožní přístup na místo realizace díla technickému dozoru objednatele k provádění kontroly činnosti zhotovitele, související s dílem. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od zadání.
- 13.4. Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost
-

prováděného díla, kvalita prací, život nebo zdraví pracovníků na místě realizace oprav. V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- 13.5.** Všichni pracovníci pověřeni dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na vlastní riziko a nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při předání pracoviště si smluvní strany předají identifikaci nebezpečí a stanovení rizik na pracovišti a budou seznámeni se všemi riziky.
- 13.6.** Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídaný.
- 13.7.** Za okolnosti „vyšší moci“, budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.
- 13.8.** Za okolnosti „vyšší moci“, se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů.
- 13.9.** Nastane-li situace „vyšší moci“, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny skutečnosti je povinen zaznamenat do stavebního deníku. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci“, na plnění smlouvy.
- 13.10.** Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou rozhodovány příslušným soudem podle místa realizace díla.
- 13.11.** Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených zadáním. Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé z důvodů nesprávných nebo neúplných údajů v místech, kde bude zhotovitel provádět práce.
- 13.12.** Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.
- 13.13.** Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
- 13.14.** Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.
-

h

13.15. Objednatel prohlašuje, že veškeré odpady, vyrobené v rámci předmětné zakázky, jsou jeho vlastnictvím a bude tedy u jednotlivých návozů evidován jako původce odpadů.

14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

- 14.1.** Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody /havarijní soupravy, zachytivé vaničky, sorbent/.
- 14.2.** Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.
- 14.3.** Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabráni zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
- 14.4.** Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby, jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
- 14.5.** Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.
- 14.6.** Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců /a svých poddodavatelů/ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.
- 14.7.** Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při svých činnostech v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- 14.8.** Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.
-

- 14.9. Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 14.10. Poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahlívání živců v tavných nádobách.
- 14.11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
- 14.12. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem /nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasilání záznamu o úrazu apod./


15. Závěrečná ujednání

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
- 15.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským zákoníkem.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 15.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne 24.7.2019


Objednatel



Náměstek primátora

V Přerově dne 25.7.2019

Zhotovitel



Jednatel společnosti

Technické služby
města Přerova, s.r.o.
Na Hrázi 3165/17
Přerov I - Město, PSČ 750 02
IČ: 27841090 DIČ: CZ27841090

Firma: Kulhavý s.r.o.



Soupis objektů s DPH

Stavba: 17029 - REKONSTRUKCE STEZKY PRO CHODCI

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena:
OC+DPH:

511 185,26
618 534,16

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
So 001	Vedlejší a ostatní náklady	52 500,00	11 025,00	63 525,00
SO 101	Rekonstrukce chodníku	458 685,26	96 323,90	555 009,16

Firma: Kulhavý s.r.o.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

St 17029 REKONSTRUKCE STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY SE SPOLEČNÝM PROVOZEM NA ULIC

So 001 52 500,00

Rc So 001 Vedlejší a ostatní náklady

P		Kód	V	Název položky		MJ	Množství	Cena	
oř		položky	a					Jednotková	Celkem
1	2	3		4		5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce									
1	02620			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU		KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
				Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech testů potřebných pro					
2	02910			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ		KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
				ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA ke kolaudaci stavby					
3	02911			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ		KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
				veškeré geometrické měření v průběhu stavby					
4	02944			OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ		KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
				DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ve 3 vyhotoveních					
5	02946			OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE		KČ	1,000	2 500,00	2 500,00
				1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě					
				3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě					
6	02991			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE		KUS	1,000	5 000,00	5 000,00
				náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele					
7	03100			ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ		KPL	0,000	5 000,00	0,00



Firma: Kulhavý s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stla 17029 REKONSTRUKCE STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY SE SPOLEČNÝM PROVOZEM NA U SO 101 458 685,26

Ro: SO 101 Rekonstrukce chodníku

Poř. číslo	Kód položky	Va	Název položky	MJ	Množství	Jednotkov	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10

0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	1014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	209,048	300,00	62 714,40

pol. 11332							
104,524*2,0 t/m3=209,0480 [A]							
2	1014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	49,483	350,00	17 319,05

pol. 11317, 11318, 11352, 11353, 96611							
(0,05*348,411+(73,78+36,5+24,1+4,6)*0,08*0,15+4,65*0,3*0,2+0,426)*2,5 t/m3=49,4833 [A]							
1 Zemní práce							
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	57,350	63,90	3 664,67

podél chodníku 0,5*(26,0+23,5+36,5+24,1+4,6)=57,3500 [A]							
4	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	17,421	1 028,00	17 908,79

odstranění stávajících dlažby 0,05*348,411=17,4206 [A]							
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA	M3	104,523	210,33	21 984,32

odstranění podkladu stávající dlažby 0,3*348,411=104,5233 [A]							
6	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	138,980	103,50	14 384,43

betonový obrubník podél komunikace 73,78+36,5+24,1+4,6=138,9800 [A]							
7	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	4,650	185,30	861,65

kamenné obrubníky šířky cca 300 mm 4,65=4,6500 [A]							
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,250	920,00	230,00
frézování asfaltobetonového krytu							
uložení materiálu po dohodě s investorem							

9	12110	podél obrub 0,5*0,1*5,0=0,2500 [A]	M3	11,470	68,20	782,25
		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY				
10	12573	podél chodníku 0,2*0,5*(26,0+23,5+36,5+24,1+4,6)=11,4700 [A]	M3	11,470	86,20	988,71
		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I				
11	18233	ornice 0,2*0,5*(26,0+23,5+36,5+24,1+4,6)=11,4700 [A]	M2	57,350	89,55	5 135,69
		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M				
12	18241	podél chodníku 0,5*(26,0+23,5+36,5+24,1+4,6)=57,3500 [A]	M2	57,350	20,00	1 147,00
		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM				
13	18247	podél chodníku 0,5*(26,0+23,5+36,5+24,1+4,6)=57,3500 [A]	M2	57,350	4,25	243,74
		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU				
		podél chodníku 0,5*(26,0+23,5+36,5+24,1+4,6)=57,3500 [A]				
5		Komunikace				240 816,19
14	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	348,411	207,50	72 295,28
15	572133	pod zámkovou dlažbu 28,831+181,25+123,674+3,052+11,604=348,4110 [A]	M2	2,500	45,20	113,00
		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2				
16	572213	0,5*5,0=2,5000 [A]	M2	2,500	10,00	25,00
		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
17	574A33	0,5*5,0=2,5000 [A]	M2	2,500	228,50	571,25
		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM				
18	574C57	0,5*5,0=2,5000 [A]	M2	2,500	342,00	855,00
		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 60MM				
19	58260B	0,5*5,0=2,5000 [A]	M2	18,320	607,00	11 120,24
		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEFŇÍCH TL 80MM BEZ reliefní zámkové dlažby (bublinky) červené barvy včetně kamenného lože fr. 4-8 tl. 40 mm				

varovný pás 4,69*0,4+2,94*0,4=3,0520 [A] signální pás 2,0*0,8+3,09*0,4+0,8*(0,8+(2,79+2,3)/2)+2,03*0,8+3,7*0,4+0,8*(1,19+(2,79+2,3)/2)=11,6040 [B] rezerva na prořez 25% 0,25*(A+B)=3,6640 [C] Celkem: A+B+C=18,3200 [D]						
20	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z	M2	132,331	392,60	51 953,15
včetně kamenného lože fr. 4-8 tl. 40 mm						
71,87*1,75+1,5*1,5/2-2,0*0,8-2,03*0,8=123,6735 [A] "- komunikace pro pěší"						
rezerva na prořez 7% 0,07*A=8,6571 [B]						
Celkem: A+B=132,3306 [C]						
21	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	193,938	448,80	87 039,37
včetně kamenného lože fr. 4-8 tl. 40 mm						
barvy pískovcové						
(72,08+72,92)/2*2,5=181,2500 [A] "- komunikace pro cyklisty"						
rezerva na prořez 7% 0,07*A=12,6875 [B]						
Celkem: A+B=193,9375 [C]						
22	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO	M2	30,273	556,40	16 843,90
včetně kamenného lože fr. 4-8 tl. 40 mm						
Hmatný pás						
72,078*0,4=28,8312 [A]						
rezerva na prořez 5% 0,05*A=1,4416 [B]						
Celkem: A+B=30,2728 [C]						
8 Potrubí						
23	9911E	LITINOVÝ POKLOP B125	KUS	1,000	4 840,00	4 840,00
Výměna poklopu včetně odsranění stavajícího						
1=1,0000 [A]						
24	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	2 115,00	2 115,00
1=1,0000 [A]						
9 Ostatní konstrukce a práce						
25	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD	KUS	4,000	2 005,00	8 020,00
C10a 2=2,0000 [A]						
C10b 2=2,0000 [B]						
Celkem: A+B=4,0000 [C]						

26	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S	KUS	1,000	186,00	186,00
		1=1,0000 [A]				
27	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -	KUS	4,000	186,00	744,00
		3+1=4,0000 [A]				
28	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE	KUS	1,000	905,00	905,00
		1 ks =1,0000 [A]				
29	914914	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD, MONT,	KUS	3,000	905,00	2 715,00
		3 ks =3,0000 [A]				
30	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A	M2	7,400	324,00	2 397,60
		přechod pro chodce 2*2*3,7*0,5=7,4000 [A]				
31	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	15,000	826,50	12 397,50
		piktogramy chodce 5=5,0000 [A] cyklisty 5=5,0000 [B] obousměrný provoz 5=5,0000 [C] Celkem: A+B+C=15,0000 [D]				
32	916A2	PARKOVACÍ SLOUPKY A ZABRANY PLASTOVÉ	KUS	0,000	2 870,00	0,00
		Flexi sloupky 5ks				
33	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	145,450	226,30	32 915,34
		do betonu C20/25nXF3 zapuštěný 73,78+2,57+3,9=80,2500 [A] výšky 80 mm nad chodníkem 36,5+24,1+4,6=65,2000 [B] Celkem: A+B=145,4500 [C]				
34	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M	4,680	237,70	1 112,44
		do betonu C20/25nXF3 zapuštěná betonová obruba 4,68=4,6800 [A] ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM				
35	919112	Napojení na stávající komunikace podél obrub 5,0=5,0000 [A]	M	5,000	75,20	376,00


36	31313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2	M	5,000	112,00	560,00
		navázení na stávající asfalt podél obrub 5,0=5,0000 [A]				
37	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	0,426	2 865,00	1 220,49
		Odstranění betonových sloupků 4*(0,5*0,5*0,2+0,3*0,3*0,3*3,14/4*0,8)=0,4261 [A]				

458685,3

0,01



Stavba Rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem, ulice Kosmákova

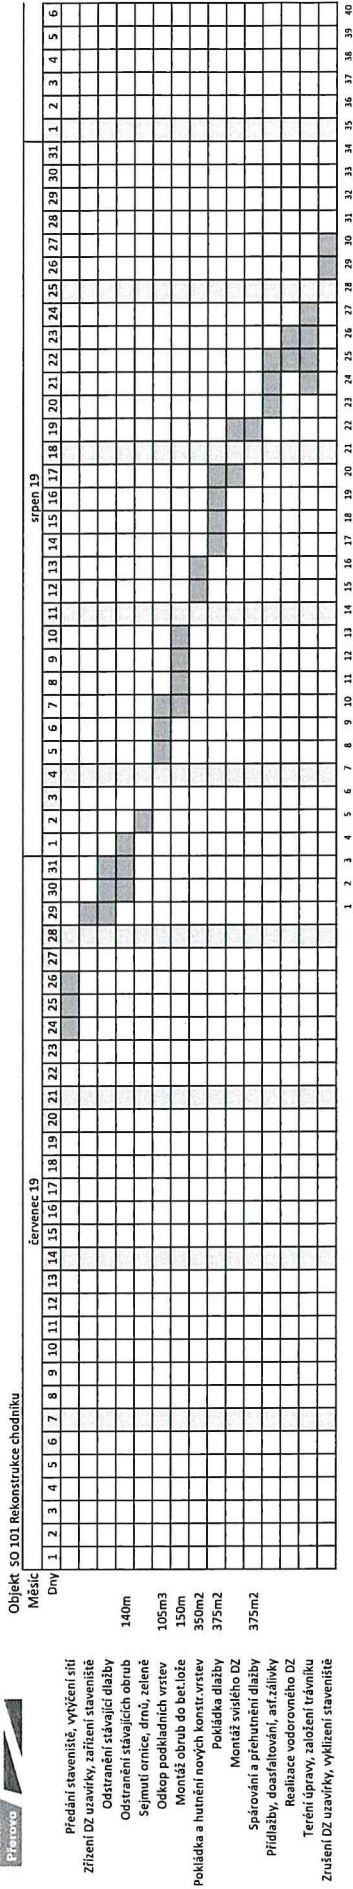

Termín realizace:	29.7.2019 - 31.8.2019
	ČERVENEC - SRPEN 2019 (40 DNŮ)
	Realizace bude probíhat souběžně a při ucelené stavební akci se zakázkou "Rekonstrukce chodníku u přechodu pro chodce přes ulici Kozlovská"

Zvláštní užívání	29.7.2019 - 8.9.2019
------------------	----------------------

