

SMLOUVA O DÍLO

„REALIZACE DATOVÝCH ROZVODŮ NA CESTMISTROVSTVÍ LIBEREC, NOVÁ VES A SOSNOVÁ“

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Silnice LK a.s., se sídlem Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ 466 05, IČ: 287 46 503, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2197, zastoupená _____, předsedou představenstva a _____, místopředsedou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

Oaza - net spol. s r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 117/81, Liberec VI-Rochlice, PSČ 460 06 Liberec, IČ: 472 82 711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 2828, e-mail: _____, zastoupená _____, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující Smluvní strany jsou v době podepsání Smlouvy platné. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů Smluvních stran není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek.
- 1.2. Smlouva je uzavřena na plnění veřejné zakázky s názvem „Realizace datových rozvodů na cestmistrovství Liberec, Nová Ves a Sosnová“ zadávané Objednatelem jako zadavatelem (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje:
 - 1.3.1. že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu Veřejné zakázky,
 - 1.3.2. že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy,
 - 1.3.3. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění Smlouvy provedl řádně, za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele níže specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu.

3. SPECIFIKACE DÍLA

- 3.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány Přílohou č. 1, Přílohou č. 5 a Přílohou č. 9 této Smlouvy, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které Objednatel potřebuje k užívání Díla, nebo které požadují právní předpisy (dále jen „**Doklady**“). Jedná se zejména o stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celého Díla, doklady o likvidaci odpadů (doklady o likvidaci odpadů mohou být nahrazeny čestným prohlášením Zhotovitele) a příslušná prohlášení o shodě.

4. LHŮTY PLNĚNÍ

- 4.1. Lhůta pro předání a převzetí staveniště a zahájení provádění Díla:

Do **5 pracovních dní** od doručení výzvy ze strany Objednatele. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí příslušného staveniště (místa určeného k realizaci Díla; dále jen „**Staveniště**“) a zahájení provádění Díla písemně na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou na titulní straně Smlouvy. O předání a převzetí příslušného Staveniště bude mezi Smluvními stranami v souladu s čl. 8 odst. 8.1. Smlouvy pořízen písemný předávací protokol.
- 4.2. Lhůta pro provedení Díla (pro dokončení a předání a převzetí Díla včetně Dokladů):

Do **90 pracovních dní** od předání a převzetí příslušného Staveniště Zhotoviteli.
- 4.3. Změna výše uvedených lhůt je možná pouze na základě změny Smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele. V případě nevhodných klimatických podmínek vydá Objednatel pokyn k přerušení provádění Díla (dle čl. 4 odst. 4.5. Smlouvy), uzná-li to za vhodné.
- 4.4. Pro účely Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na Smluvních stranách, ani Smluvními stranami ovlivnitelné, a které svou povahou brání Smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Příslušné lhůty se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
- 4.5. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele, který mu Objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku Objednatelům či jeho oprávněným zástupcem. Jestliže Dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu, je Zhotovitel povinen provádění Díla těmito podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů Objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny Díla. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel na základě písemného pokynu Objednatele přerušil provádění Díla.

5. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k řádnému provedení Díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s požadavky Objednatele, případnými požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby Dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si Smluvní strany tímto sjednávají.

- 5.2. Zhotovitel je povinen nakládat se všemi odpady, které při provádění anebo v souvislosti s prováděním Díla vzniknou, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a především zajistit, aby při provádění Díla nedošlo ke vzniku jakékoliv ekologické zátěže nebo újmy. Zhotovitel je povinen veškerý odpad odvézt anebo zajistit jeho odvezení na skládku nebo k druhotnému využití, a to na náklady Zhotovitele.
- 5.3. V souvislosti s likvidací odpadu Zhotovitel doloží Objednateli v rámci Díla doklad o likvidaci a uložení odpadu na skládku nebo k druhotnému využití vážnými listky s potvrzením o odběru oprávněnou osobou, případně je oprávněn nahradit tyto doklady čestným prohlášením Zhotovitele. Získané peněžní prostředky za odpad vhodný k druhotnému využití Zhotovitel bez zbytečného odkladu uhradí Objednateli.
- 5.4. Neurčuje-li způsob provedení konkrétních prací Smlouva, bude Dílo zhotoveno v souladu se standardy platných ČSN norem. Neurčí-li způsob provedení konkrétních prací ani tyto platné ČSN normy, platí, že práce mají být provedeny způsobem obvyklým při zachování odborné péče.
- 5.5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a dále je povinen provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním Díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- 5.6. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat Objednateli příslušné atesty na veškeré materiály, které zamýšlí pro provedení Díla použít.
- 5.7. Po celou dobu plnění podle Smlouvy je Zhotovitel povinen disponovat kvalifikací potřebnou pro zhotovení Díla. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci Objednateli prokázat ve lhůtě stanovené Objednatelem a způsobem dle požadavku Objednatele.
- 5.8. Dílo může Zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, Zhotovitel však odpovídá, jako by plnil sám.
- 5.9. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci řízení na Veřejnou zakázku, jen ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, než kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.

6. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění Díla Objednateli, popř. dalším oprávněným osobám určeným Objednatelem, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních dnů v termínech určených Objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho oprávněného zástupce. Z každého kontrolního dne Objednatel sepíše zápis.
- 6.2. Zjistí-li se při kontrole, že Zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl Dílo řádným

způsobem a v souladu se Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době stanovené Objednatelem, může Objednatel odstoupit od této Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k porušení Smlouvy.

- 6.3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé či poddodavatelé.
- 6.4. Zhotovitel je povinen u všech částí Díla, které budou dalším postupem zakryty, zajistit bez zbytečného odkladu odsouhlasení a kontrolu Objednatelem. O provedení kontroly těchto částí Díla se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí Díla a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení Objednatelem mohou být zakryty.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele nejméně tři kalendářní dny předem ke kontrole části Díla, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stane nepřístupnou. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.
- 6.6. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí Díla nebo částí jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části Díla nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně. Za řádné provedení Díla se považuje předání dokončeného Díla Objednateli včetně předání všech Dokladů v termínech dle Smlouvy a to bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Předání a převzetí Díla i předání a převzetí Dokladů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu dokončení Díla či dodání Dokladů.
- 7.2. Zhotovitel alespoň 2 pracovní dny předem vyzve Objednatele písemně a zároveň i zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla i před uplynutím sjednané lhůty pro dokončení realizace Díla.
- 7.3. Předání a převzetí Díla zorganizuje Objednatel. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 7.4. Povinností Zhotovitele je předat Objednateli dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků a odpovídající všem příslušným právním i technickým předpisům. Pokud se při předání a převzetí Díla prokáže, že Dílo není řádně dokončeno, prohlásí Objednatel do protokolu o předání a převzetí Díla, že Dílo nepřijímá.
- 7.5. Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li jakékoliv vady nebo nedodělky. Pokud se při předání a převzetí Díla prokáže, že Dílo je řádně dokončeno nebo má vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými dle názoru Objednatele nebrání jeho užívání, může Objednatel prohlásit, že Dílo přijímá. Převzít Dílo s vadami nebo nedodělkami, které dle názoru Objednatele nebrání jeho užívání, je právem, nikoli povinností Objednatele. Převezme-li Objednatel Dílo s vadami nebo nedodělkami nebránícími užívání, uvede se v protokolu o předání a převzetí Díla soupis těchto vad a nedodělků s určením lhůty dle čl. 7 odst. 7.6. Smlouvy, ve které je Zhotovitel

povinen vady a nedodělky odstranit. Do doby odstranění vad a nedodělků Zhotoviteli nevzniká nárok na zaplacení sjednané ceny za Dílo, ani není Dílo považováno za splněné řádně a včas.

- 7.6. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě, na které se obě Smluvní strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní Zhotovitel vady a nedodělky ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu (nebude-li předávací protokol vyhotoven či podepsán, počne lhůta běžet od okamžiku vytknutí vad Zhotovitelem). Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel.
- 7.7. O předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen sepsat předávací protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s platnými právními předpisy. Předávací protokol musí obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (Díla), označení a identifikaci Objednatele a Zhotovitele, číslo smlouvy, či jiné její označení, a datum jejího uzavření, prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, včetně zdůvodnění či vytknutí případných vad a nedodělků, soupis provedených prací, datum a místo sepsání, jména a podpisy oprávněných zástupců Objednatele a Zhotovitele. Má-li Dílo jakékoliv vady nebo nedodělky, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu i důvody.
- 7.8. Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
- 7.9. Zhotovitel je oprávněn předat Objednateli Dílo i po částech, a to po částech vymezených jednotlivými soupisy prací, které tvoří přílohy č. 1, 5 a 9 této Smlouvy. V takovém případě budou Doklady předány Objednateli spolu s poslední předávanou částí Díla. V ostatním se postup pro předání Díla uvedený v tomto článku Smlouvy uplatní i pro předání jednotlivých částí Díla.

8. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 8.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušné Staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. O předání a převzetí prostoru Staveniště je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s platnými právními předpisy. Předání a převzetí prostoru Staveniště probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru Staveniště.
- 8.2. Zhotovitel je povinen řádně označit Staveniště v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na Staveniště ani v jeho okolí jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení Objednatele.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení Staveniště včetně jeho ochrany, a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dalšími požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon kontroly.
- 8.4. Zhotovitel je oprávněn prostory Staveniště užívat jen pro účely související s prováděním Díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na Staveništi a v jeho okolí, a v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd ke Staveništi a výjezd ze Staveniště.

- 8.5. Všechny plochy dotčené Dílem a eventuální škody způsobené v souvislosti s Dílem musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací řádně zahlazeny a uvedeny do původního stavu na náklady Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Díla za pořádek a čistotu na Staveništi a průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození Staveniště, jeho okolí a komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
- 8.6. Zhotovitel je povinen odstranit veškerá zařízení z příslušného Staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí Díla. Dohodne-li se na tom s Objednatelem, může na Staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Po odstranění těchto vad a nedodělků pak Zhotovitel bez zbytečného odkladu odstraní ze Staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a Staveniště zcela vyklidí a s Objednatelem bude neprodleně sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy Staveniště.

9. NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉ PRÁVO

- 9.1. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za provedení Díla v souladu se Smlouvou. Odchýlí-li se Zhotovitel od uvedeného vymezení, aniž by mu Objednatel dal svůj předchozí písemný souhlas, odpovídá za veškerou škodu a je povinen uvést Dílo do řádného a Smlouvě odpovídajícího stavu.
- 9.2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení Díla, jakož i za sledování a dodržování dalších právních předpisů týkajících se provádění Díla.
- 9.3. Zhotovitel od okamžiku převzetí Staveniště odpovídá za veškeré škody či ztráty, které vzniknou na Díle, Staveništi a věcech, zařízení a materiálu, které se na Staveništi nacházejí, jakož i za všechny škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla třetím osobám a Objednateli. Škodou se rozumí rovněž jakékoliv pokuty či jiné sankce uložené veřejnými orgány Objednateli za porušení právních předpisů v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právním řádem a/nebo Smlouvou.
- 9.4. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami anebo nedodělků, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na Staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení a předání Staveniště Zhotovitelem ve smyslu čl. 8 odst. 8.6. Smlouvy.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 10.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost, kterou lze po něm rozumně požadovat, za účelem řádného provedení Díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit lhůty stanovené Smlouvou a o vadách předaného Díla.
- 10.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník, a to v rozsahu daném příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na Staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek

prováděných prací od pokynů Objednatele a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem.

- 10.4. V případě, že dojde k přerušení provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozpracovanosti zabezpečit již provedenou část Díla tak, aby nedošlo ke škodě na této části Díla, ani ke škodám na majetku nebo zdraví.
- 10.5. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro zamezení (resp. snížení) vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo provádění Díla a znemožnit přístup na Staveniště neoprávněným osobám.
- 10.6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění Díla sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností Zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 1.000.000,- Kč na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené Objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení provádění Díla je Zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění před uzavřením příslušného dodatku.

11. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena za Dílo je Smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH: 454 392,- Kč (slovy: čtyři sta padesát čtyři tisíc tři sta devadesát dva korun českých)

DPH: sazba 21 %, tj. 95 422,32 Kč (slovy: devadesát pět tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých třicet dva haléřů)

Cena celkem včetně DPH: 549 814,32 Kč (slovy: pět set čtyřicet devět tisíc osm set čtrnáct korun českých třicet dva haléřů)

(dále jen „Cena“)

- 11.2. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. Podrobný rozpis Ceny Díla je uveden ve třech oceněných výkazech prací, které společně tvoří přílohu č. 1, 5 a 9 této Smlouvy. Ceny uvedené Zhotovitelem v příloze č. 1, 5 a 9 Smlouvy obsahují všechny náklady související se zhotovením Díla, zařízením Staveniště a také veškeré ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek této Smlouvy.
- 11.3. Cena za Dílo je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků Zhotovitele, včetně inflace.
- 11.4. Cena za Dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po řádném provedení Díla, tj. Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž datem zdanitelného plnění je den předání řádně provedeného Díla. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí Díla (včetně Dokladů) podepsaný oběma Smluvními stranami.
- 11.5. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu Ceny až po řádném provedení Díla bez vad a nedodělků, tj. po jeho dokončení a předání Objednateli (včetně předání Dokladů). Pokud Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělky nebo Zhotovitel nepředá Objednateli všechny Doklady, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu až po odstranění veškerých vad Díla a nedodělků a doplnění chybějících Dokladů.

- 11.6. Za předpokladu, že dojde k předání části Díla dle článku 7.9 této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na část Ceny odpovídající ceně provedené části Díla. Pokud Objednatel převezme část Díla s vadami nebo nedodělkami, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu až po odstranění vad nebo nedodělků části Díla. V případě poslední předané části Díla platí, že pokud Objednatel převezme část Díla s vadami nebo nedodělkami nebo Zhotovitel nepředá Objednateli všechny Doklady, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu až po odstranění vad a nedodělků části Díla a doplnění chybějících Dokladů. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí části Díla (v případě poslední části Díla včetně Dokladů) podepsaný oběma Smluvními stranami.
- 11.7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních. Faktura bude doručena Objednateli do 5 dnů od jejího vystavení.
- 11.8. Faktura musí obsahovat zejména:
- 11.8.1. označení osoby Zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - 11.8.2. označení osoby Objednatele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - 11.8.3. evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - 11.8.4. rozsah a předmět plnění,
 - 11.8.5. den uskutečnění plnění,
 - 11.8.6. označení Smlouvy,
 - 11.8.7. lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - 11.8.8. označení banky a číslo účtu, na který má být fakturovaná částka poukázána.
- 11.9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
- 11.10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené a již bezvadné faktury.
- 11.11. Fakturovanou částku uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený ve faktuře.
- 11.12. V případě, že bude Objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu Díla zahrnuty, nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl nijak předvídat, postupuje se způsobem uvedeným v článku 16 této Smlouvy. Tento postup bude vždy proveden pouze za předpokladu, že bude v souladu s právními předpisy.
- 11.13. V případě, že bude Objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu Díla, nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, snižuje se Cena za Dílo o cenu položek, které nebyly provedeny.

12. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá za vady a nedodělky Díla zjištěné po celou dobu záruční doby (záruka za jakost). Dílo má vadu, pokud neodpovídá Smlouvě a pokud nelze Dílo řádně užívat obvyklým způsobem. Za vadu se považuje také nedostatek na jakosti a vzhledu Díla. V případě sporu mezi Objednatel a Zhotovitelem o tom, zda Dílo má anebo nemá vady, je rozhodující názor Objednatele.
- 12.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo Dílo při předání a převzetí, nebo kterou Objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
- 12.3. Zhotovitel je povinen odstranit vady na Díle ve lhůtě, na které se obě Smluvní strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní Zhotovitel vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne jejich oznámení. Odstranění veškerých vad a nedodělků je Zhotovitel povinen provést takovým způsobem, aby tím Objednateli nevznikly žádné náklady. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost Díla, je Zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takové vady.
- 12.4. O odstranění vady sepiší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v rozsahu provedených prací po dobu 60 měsíců. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v rozsahu použitého materiálu po dobu 24 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí Díla, ne však dříve než po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání Díla.
- 12.6. Jestliže závazek Zhotovitele provést Dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá Zhotovitel za vady plnění, která při provádění Díla již uskutečnil a Objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek Zhotovitele provést Dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.
- 12.7. Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady Díla o více jak 5 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré vzniklé výdaje spojené s náhradním plněním, a to na základě výzvy Objednatele a v jím určené lhůtě.

13. SANKCE, NÁHRADA ŠKODY

- 13.1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením nebo předáním Díla vyjma Dokladů, včetně prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště, se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Dokladů se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků Díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě stanovené Smlouvou se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a nedodělek a za každý započatý den prodlení.

- 13.4. V případě prodlení Zhotovitele s předložením oznámení dle čl. 16 odst. 16.6. Smlouvy v požadovaném rozsahu se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.5. V případě nedodržení lhůty pro vyklizení Staveniště a uvedení do náležitého stavu se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.6. Poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění dle této Smlouvy nebo nepředloží na žádost Objednatele v Objednatelem stanovené lhůtě doklad o jeho existenci, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý započatý den, kdy tento stav trvá.
- 13.7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne prokazatelného odeslání písemného vyúčtování její výše Zhotoviteli.
- 13.8. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je splatný ihned po jeho vzniku.
- 13.9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením úplné faktury zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
- 13.10. Smluvní pokuty, jakož i případné úroky z prodlení, budou vyúčtovány v měně Kč.
- 13.11. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno či omezeno právo Objednatele na náhradu jakékoliv škody. Uhrazením Smluvní pokuty nezaniká sankcionovaná povinnost Zhotovitele.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této Smlouvy.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit mimo jiné i v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je pravomocně prohlášen úpadek Zhotovitele v insolvenčním řízení.
- 14.3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran, je Zhotovitel povinen zabezpečit místo provádění Díla po celou dobu přerušení prací.

15. Zástupci smluvních stran a doručování písemností

- 15.1. Ve věcech technických je při plnění Smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně Objednatele:
-
- 15.2. Ve věcech technických je při plnění Smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně Zhotovitele:
-
- 15.3. Určení zástupci Smluvních stran jednají každý samostatně za Smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním Smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání Smluvních stran a předávací protokoly. Určený zástupce Objednatele též vykonává kontrolu Zhotovitele při provádění Díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí Díla, oznamovat vady Díla,

jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad Díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle Smlouvy.

- 15.4. Změna určení výše uvedených zástupců Smluvních stran nevyžaduje změnu Smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
- 15.5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje Smluvních stran a jejich zástupců uvedené ve Smlouvě nebo kontaktní údaje, které si Smluvní strany po uzavření Smlouvy písemně oznámily.

16. VÍCEPRÁCE

- 16.1. Pokud se v průběhu provádění Díla vyskytne překážka, která znemožňuje provést Dílo dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést dodatečné práce (dále jen „Vícepráce“), je Zhotovitel povinen výskyt překážky Objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá překážka.
- 16.2. Podmínkou pro zadání a provedení Víceprací je, že je Zhotovitel nezavinil ani nemohl předvídat. Případné opomenutí části předmětu plnění dle této Smlouvy Zhotovitelem v ocenění nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny Díla.
- 16.3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je Objednatel vázán (zejména dle podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění), dohodly se Smluvní strany na tom, že Zhotovitel je povinen Vícepráce provést.
- 16.4. Vícepráce budou Zhotovitelem prováděny pouze na základě předchozího písemného dodatku Smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů na provedení Víceprací, pokud k těmto Vícepracím nebyl předem uzavřen písemný dodatek Smlouvy.
- 16.5. Zhotovitel je povinen Vícepráce provést v co nejkratším možném čase a je při tom povinen dbát toho, aby bylo Dílo dokončeno ve lhůtě stanovené Smlouvou, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 16.6. Za účelem uzavření dodatku o provedení Víceprací je Zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky předložit Objednateli oznámení, které bude obsahovat:
- 16.6.1. rozsah potřebných Víceprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a účelnosti jejich provedení;
 - 16.6.2. oceněný položkový soupis Víceprací s výkazy výměr, který je Zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací sloužícím pro provádění Díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící Vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, použije Zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni;

16.6.3. informace o dopadu Víceprací na termín pro dokončení Díla.

- 16.7. Pokud v důsledku rozsahu Víceprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky začít jednat s Objednatelem a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah Víceprací stanoví Objednatel. Lhůtou, kterou určí Objednatel, je Zhotovitel vázán.
- 16.8. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se Objednatel zavazuje se Zhotovitelem jednat o obsahu dodatku ke Smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují Smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.
- 16.9. Zhotovitel je povinen o provádění Víceprací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci.

17. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 340/2015“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy dle příslušných právních předpisů (zejména v registru smluv dle Zákona č. 340/2015).
- 17.2. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této Smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním Smlouvy.
- 17.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním Smlouvy, a to po dobu 10 let.
- 17.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá ze Smlouvy.
- 17.5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé na základě anebo v souvislosti s touto Smlouvou.
- 17.6. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
- 17.7. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, dohodly se Smluvní strany, že právní vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí úpravou Občanského zákoníku.
- 17.8. Smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření Smlouvy.
- 17.9. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení Smlouvy a jejích příloh tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení Smlouvy.
- 17.10. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

17.11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- 17.11.1. Příloha č. 1 – Liberec - výkaz
- 17.11.2. Příloha č. 2 – Liberec – Půdorys 1. NP
- 17.11.3. Příloha č. 3 – Liberec – Půdorys 2. NP
- 17.11.4. Příloha č. 4 – Liberec – Garáže - sklad
- 17.11.5. Příloha č. 5 – Nová Ves - výkaz
- 17.11.6. Příloha č. 6 – Nová Ves – situace 1. NP
- 17.11.7. Příloha č. 7 – Nová Ves – situace 2. NP
- 17.11.8. Příloha č. 8 – Nová Ves – situace - podkroví
- 17.11.9. Příloha č. 9 – Sosnová - výkaz
- 17.11.10. Příloha č. 9 – Sosnová - situace

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

OBJEDNATEL

V Jablonci nad Nisou dne 2.8.2019

za Silnice LK a.s.

předseda představenstva

místopředseda představenstva

ZHOTOVITEL

V LIBERECI dne 12.7.2019

za oaza - net spol. s r.o.




oaza-net spol. s r.o.
Dr. M. Horákové 81
460 06 Liberec 6
IČ: 47282711 DIČ:
1et.cz

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK SILNICE LIBEREC

č.p.	Položka	Jedn.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Strukturovaná kabeláž							
Datový RACK rozvaděč a zásuvky							
1	Serverový 19" rozvaděč rozebíratelný RZA, šířka 800 mm, hloubka 1000 mm, perforované přední dveře 42U (1970 mm)	ks					
2	KELine, modulární patch panel neosazený pro 24xRJ45 1U černý	ks					
3	Napájecí panel 8x230V	ks					
4	Rozvodný panel 19", 8 x IEC320 C13	ks					
5	Pevná police 19" 750 mm	ks					
6	Ventilační jednotka s termostatem střešní, podlahová	ks					
7	KELine, 19" vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt velký 40 x 80 mm	ks					
8	KELine, zásuvka Modulo 45 pro 2xRJ45 45x45mm bílá šikmá s dvířky	ks					
9	Zásuvka datová TANGO bílá 1xRJ45	ks					
10	KeyStone modul KELine Giga 1xRJ45 Cat.6 UTP beznástrojový	ks					
11	Měření metalické kabeláže včetně vystavení protokolů	ks					
12	Instalační materiál(kovtvicí materiál, montážní sady, pomocný materiál, sádra,atd)	set					
13	Instalace datového rozvaděče	set					
14	Dokumentace skutečného provedení	set					
15	Doprava a přesun materiálů	set					
16	Datový RACK rozvaděč - celkem						
Kabely							
18	Parapetní kanál dutý PVC,160x65, včetně montážního příslušenství(spojky, rohy, přechody, víka atd.)	m					
19	Parapetní kanál dutý PVC,40x40, včetně montážního příslušenství(spojky, rohy, přechody, víka atd.)	m					
20	Parapetní kanál dutý PVC,110x70, včetně montážního příslušenství(spojky, rohy, přechody, víka atd.)	m					
21	Parapetní kanál dutý PVC,40x20, včetně montážního příslušenství(spojky, rohy, přechody, víka atd.)	m					
22	Instalační kabel KELine Giga 4x2xAWG23 Cat.6 U/UTP LSOH	m					
23	Instalační materiál(kovtvicí materiál, montážní sady, pomocný materiál, sádra,atd)	set					
24	Doprava a přesun materiálů	set					
25	Kabely - celkem						
26							
27							
Rozvaděč Hřabačov							
29	Serverový 19" rozvaděč rozebíratelný RZA, šířka 800 mm, hloubka 1000 mm, perforované přední dveře 27U	kpl					
30	Instalace rozvaděče	set					
31	doprava a přesun rozvaděče	set					
32	Ostatní - celkem						
33	Strukturovaná kabeláž - celkem				90 982,00		60 969,20


■ ZÁSUVKA ETHERNET
■ OPTICKÝ PROPOJ S KKS LK

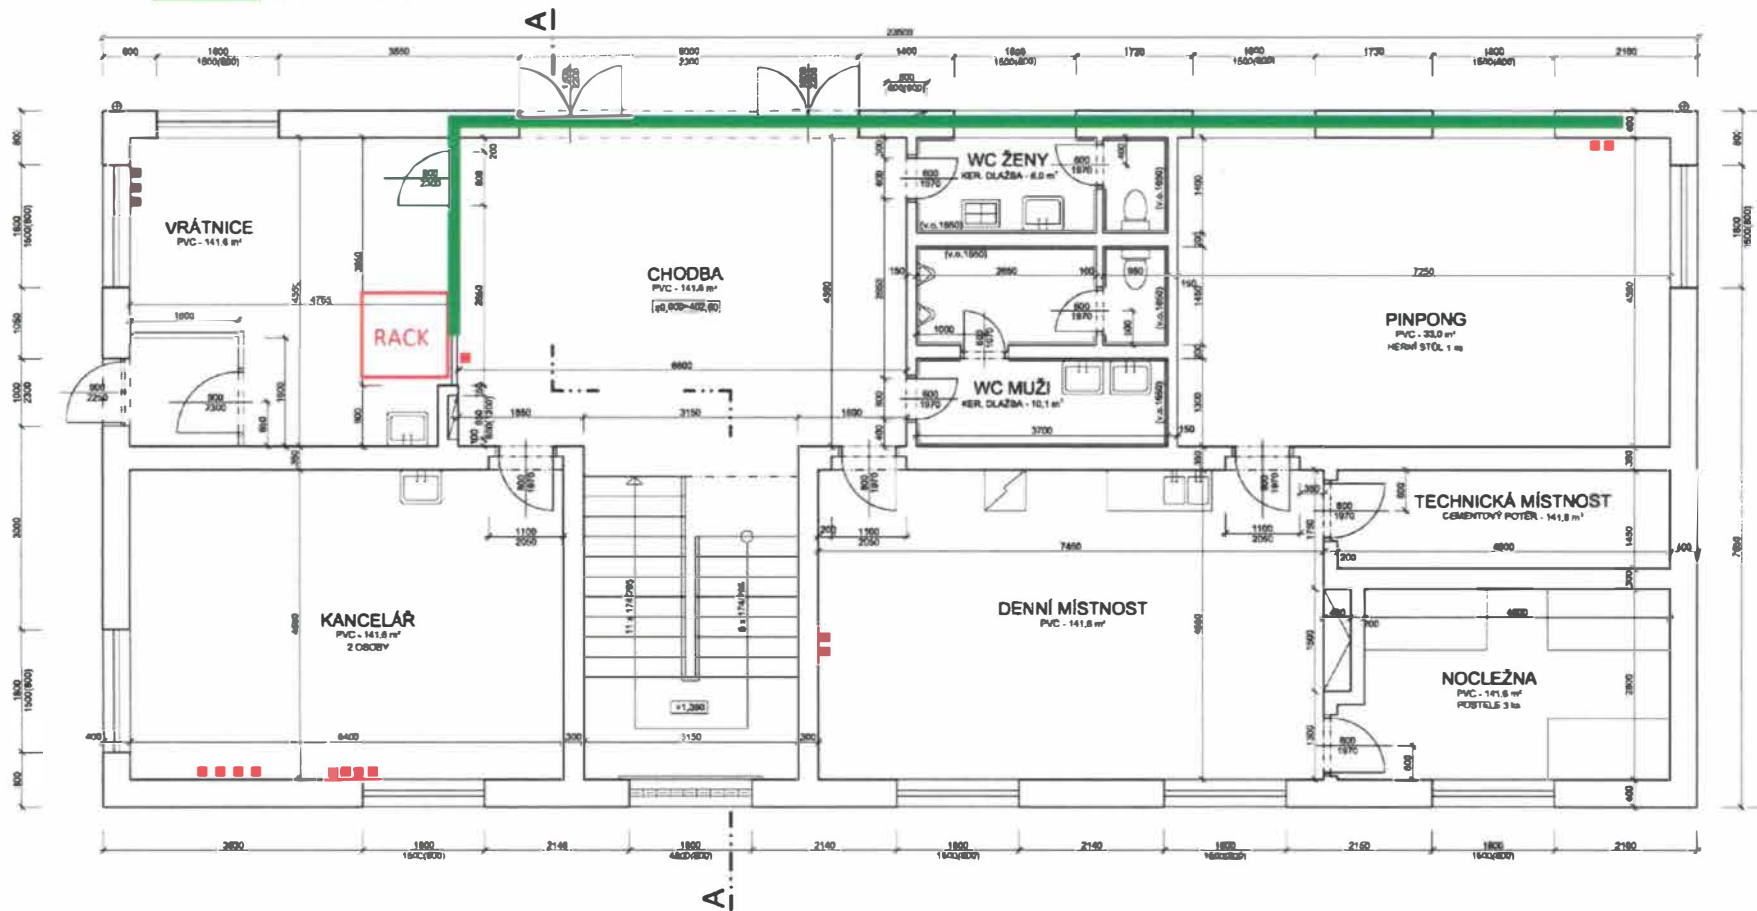

S
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1


P
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

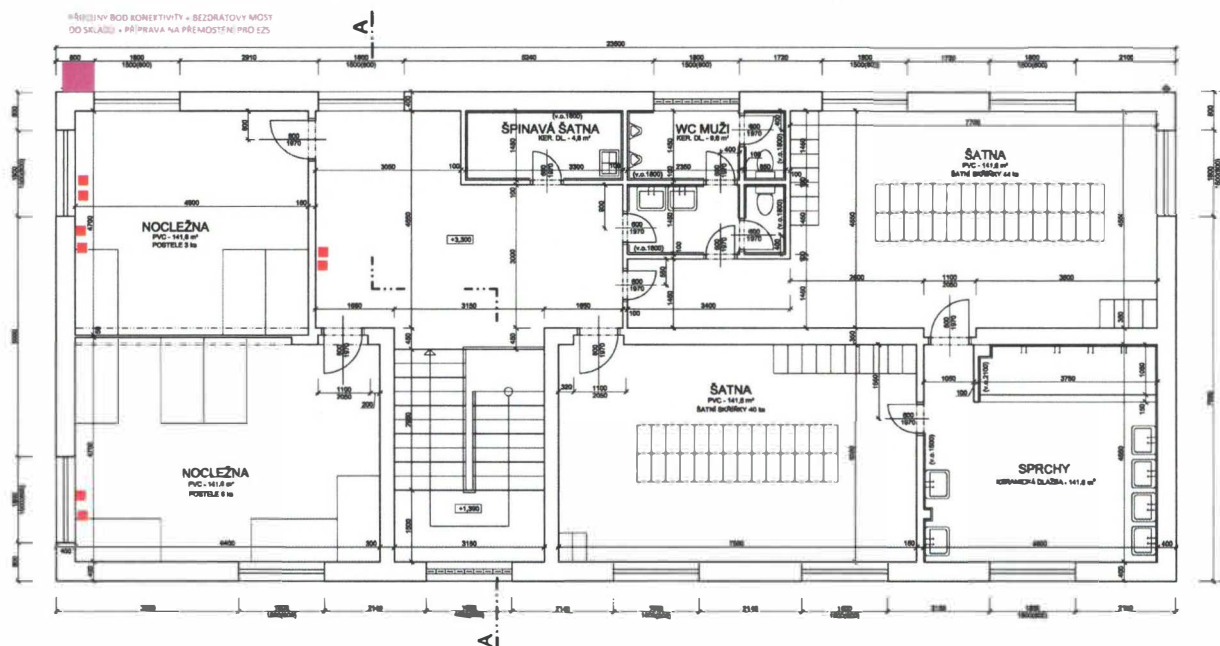

SCHEMA AREÁLU:

- 3.1.1. CESTNÍ MÍSTNOSTI
- 3.1.2. ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
- 3.1.3. GARÁŽE A OLUVY
- 3.1.4. GARÁŽE A SKLAD
- 3.1.5. HALA PRO ÚDRŽBU
- 3.1.6. MYČKA
- 3.1.7. PŘÍSTŘEŠEK
- 3.1.8. SKLADY




KLASIFIKACE PROJEKTU	PROJEKTANT	STAVBA	STAVBA
OBJEKT	OBJEKT	OBJEKT	OBJEKT
ZPRACOVÁNÍ GENERELU A PASPORTIZACE AREÁLU VE SPRÁVĚ KSS LK			
STAV	2 - PASPORTIZACE AREÁLU	STAV	STAV
STAV	3.1. ROZHLED	STAV	STAV
STAV	3.1.1. CESTNÍ MÍSTNOSTI	STAV	STAV
STAV	PŮDORYS 2.NP	STAV	STAV
STAV	1:50	STAV	STAV

PŮDORYS 1.NP

The floor plan shows a rectangular building layout with the following areas and dimensions:



- SKLAD (Storage):**
 - Top Left: SKLAD, OBS. PLOŠŤ: 718,8 m², [5,985]
 - Top Right: SKLAD, OBS. PLOŠŤ: 141,8 m², [5,985]
 - Bottom Right: SKLAD, OBS. PLOŠŤ: 93,4 m², [5,985]
- CHODBA (Corridor):**
 - Top Center: CHODBA, OBS. PLOŠŤ: 94,8 m², [5,985]
 - Top Right: CHODBA, PLOŠŤ: 73,3 m², OBS. PLOŠŤ: 5,985
 - Center Right: SKLADNIK, PLOŠŤ: 30,3 m², OBS. PLOŠŤ: 5,985
- GARAZE (Garage):**
 - Bottom Left: GARAZE, OBS. PLOŠŤ: 914,8 m², [5,985]
 - Bottom Center: GARAZE, OBS. PLOŠŤ: 650,5 m², [5,985]
 - Bottom Right: GARAZE, OBS. PLOŠŤ: 159,8 m², [5,985]

The plan is oriented with a North arrow pointing towards the top right. The grid system consists of vertical lines labeled 1 through 8 and horizontal lines labeled A through E. Dimensions are provided for various sections and overall building measurements.

[illegible]

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK SILNICE NOVÁ VES

č.p.	Položka	Jedn.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Strukturovaná kabeláž							
Datový RACK rozvaděč a zásuvky							
1	Serverový 19" rozvaděč rozebíratelný RZA, šířka 800 mm, hloubka 1000 mm, perforované přední dveře 42U (1970 mm)	ks					
2	KELine, modulární patch panel neosazený pro 24xRJ45 1U černý	ks					
3	Napájecí panel 8x230V	ks					
4	Rozvodný panel 19", 8 x IEC320 C13	ks					
5	Pevná police 19" 750 mm	ks					
6	Ventilační jednotka s termostatem střešní, podlahová	ks					
7	KELine, 19" vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt velký 40 x 80 mm	ks					
8	KELine, zásuvka Modulo 45 pro 2xRJ45 45x45mm bílá šikmá s dvířky	ks					
9	Zásuvka datová TANGO bílá 2xRJ45	ks					
10	Keystone modul KELine Giga 1xRJ45 Cat.6 UTP beznástrojový	ks					
	Měření metalické kabeláže včetně vystavení protokolů	ks					
	Instalační materiál(kovtvicí materiál, montážní sady, pomocný materiál, sádra,atd)	set					
	Instalace datového rozvaděče	set					
	Dokumentace skutečného provedení	set					
	Doprava a přesun materiálů	set					
17	Datový RACK rozvaděč - celkem						
23	Kabely						
24	Parapetní kanál dutý PVC,160x65, včetně montážního příslušenství(spojky, rohy, přechody, víka atd.)	m					
	Parapetní kanál dutý PVC,40x40, včetně montážního příslušenství(spojky, rohy, přechody, víka atd.)	m					
	Parapetní kanál dutý PVC,110x70, včetně montážního příslušenství(spojky, rohy, přechody, víka atd.)	m					
	Parapetní kanál dutý PVC,40x20, včetně montážního příslušenství(spojky, rohy, přechody, víka atd.)	m					
	Instalační kabel KELine 10Giga Cat.5 4x2xAWG23 U/FTP LSOH	m					
	Instalační materiál(kovtvicí materiál, montážní sady, pomocný materiál, sádra,atd)	set					
	Doprava a přesun materiálů	set					
28	Kabely - celkem						
49	Strukturovaná kabeláž - celkem				81 247,00		61 779,00

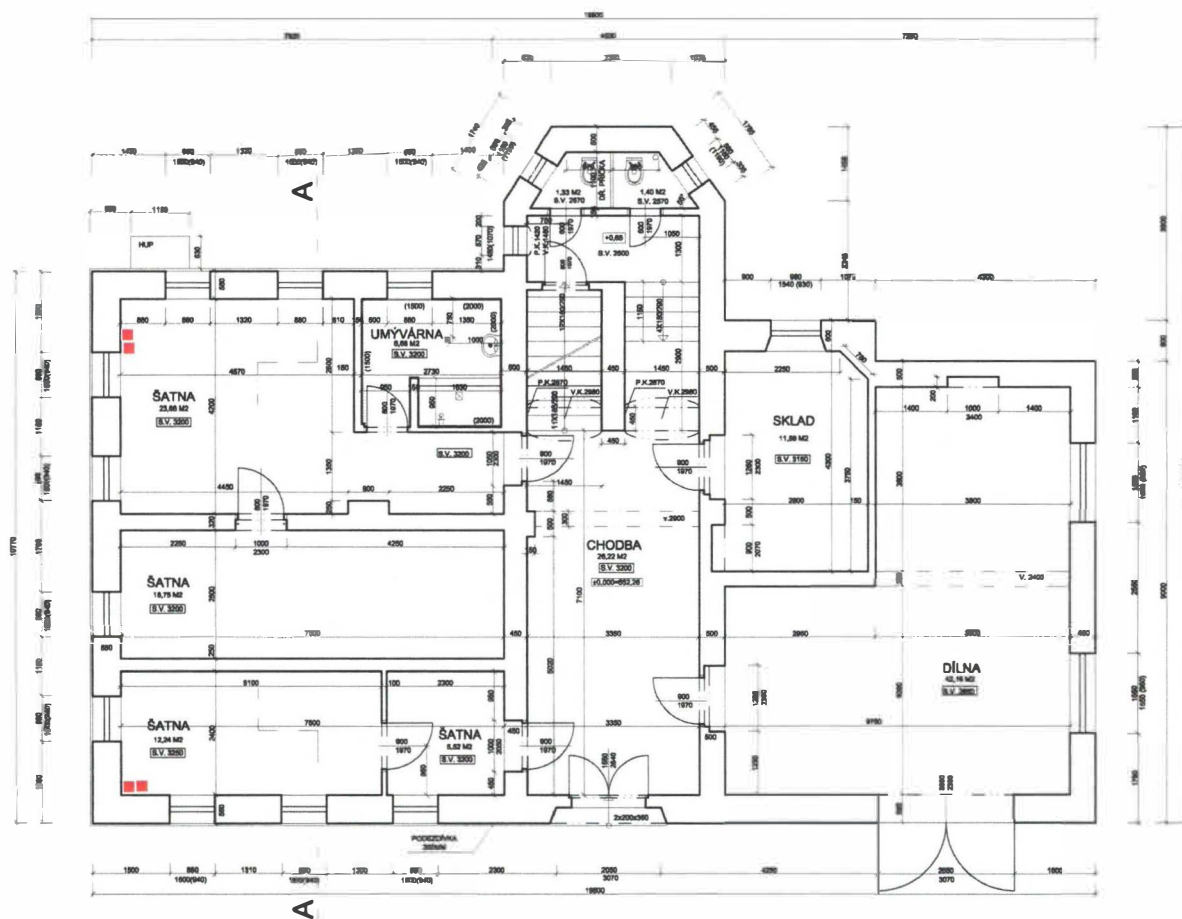

±0,000 = 652,26

SCHEMA AREÁLU:

2.3.1.


2.3.1. CESTNÍSTROVSTVÍ (CHIRANA)
2.3.2. GARÁŽOVÁ HALA
2.3.3. KRYTÁ STÁNÍ

2.3.2.


2.3.3.



NÁZEV PROJEKTU		KONTAKT	
ZPRACOVÁNÍ GENERELU A PASPORTIZACE AREÁLU VE SPRÁVĚ KČS LK		ZAMĚŘENÍ STÁRNĚHO STAVU	
2.3.1. CESTNÍSTROVSTVÍ (CHIRANA)		2.3.1.2.	
2.3.2. GARÁŽOVÁ HALA		2.3.2.1.	
2.3.3. KRYTÁ STÁNÍ		2.3.3.1.	



SCHEMA AREALU:



2.3.1. CESTMISTROVSTVÍ (CHIRANA)
2.3.2. GARÁŽOVÁ HALA
2.3.3. KRYTÁ STÁNÍ

[illegible]




$$\pm 0,000 = 652,26$$

SCHÉMA AREÁLU:



2.3.1. CESTMISTROVSTVÍ (CHIRANA)
2.3.2. GARÁŽOVÁ HALA
2.3.3. KRYTÁ STÁNÍ

[illegible]

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK SILNICE SOSNOVÁ

č.p.	Položka	Jedn.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Strukturovaná kabeláž							
Datový RACK rozvaděč a zásuvky							
1	Serverový 19" rozvaděč rozebíratelný RZA, šířka 800 mm, hloubka 1000 mm, perforované přední dveře 42U (1970 mm)	ks					
2	KELine, modulární patch panel neosazený pro 24xRJ45 1U černý	ks					
3	Napájecí panel 8x230V	ks					
4	Rozvodný panel 19", 8 x IEC320 C13	ks					
5	Pevná police 19" 750 mm	ks					
6	Ventilační jednotka s termostatem střešní, podlahová	ks					
7	KELine, 19" vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt velký 40 x 80 mm	ks					
8	KELine, zásuvka Modulo 45 pro 2xRJ45 45x45mm bílá šikmá s dvířky	ks					
9	Zásuvka datová TANGO bílá 2xRJ45	ks					
10	Keystone modul KELine Giga 1xRJ45 Cat.6 UTP beznástrojový	ks					
11	Měření metalické kabeláže včetně vystavení protokolů	ks					
12	Instalační materiál(kovtvíci materiál, montážní sady, pomocný materiál, sádra, atd)	set					
13	Instalace datového rozvaděče	set					
14	Dokumentace skutečného provedení	set					
15	Doprava a přesun materiálů	set					
16	Datový RACK rozvaděč - celkem						
Kabely							
18	Parapetní kanál dutý PVC,160x65, včetně montážního příslušenství(spojky, rohy, přechody, víka atd.)	m					
19	Parapetní kanál dutý PVC,40x40, včetně montážního příslušenství(spojky, rohy, přechody, víka atd.)	m					
20	Parapetní kanál dutý PVC,40x20, včetně montážního příslušenství(spojky, rohy, přechody, víka atd.)	m					
21	Krabice do parapetního žlabu	m					
22	Instalační kabel KELine Giga 4x2xAWG23 Cat.6 U/UTP LSOH	m					
23	Instalační materiál(kovtvíci materiál, montážní sady, pomocný materiál, sádra, atd)	set					
24	Doprava a přesun materiálů	set					
25	Kabely - celkem						
26	Strukturovaná kabeláž - celkem				75 756,00		83 658,80

[illegible]

187 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684

[illegible]

SILNICE LK a.s. **SILNICE** | **L**
Československé armády 40
466 05 Jablonec nad M.
18.02.2019
