

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2018/159
Číslo smlouvy stavebníka: 663/00066001/2019
Externí číslo: S-0126/DOPPO/2019

SRM: 8020000514
Registr smluv: Ano

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍŤE ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ č. VPI/PH/2018/159**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Středočeský kraj

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2018/159
Číslo smlouvy stavebníka: 663/00066001/2019
Externí číslo: S-0126/DOPPO/2019

SRM: 8020000514
Registr smluv: Ano

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B 20623

(dále „**CETIN**“)

a

Středočeský kraj

se sídlem Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, PSČ 150 21

IČO : 70891095

DIČ : CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 4440000221/6000

Zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací,

IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001

se sídlem: Praha 5 – Smíchov , Zborovská 11, PSČ 150 21

zastoupená na základě písemného pověření ze dne 1.4.2011 Ludmilou Poupětovou, technickou náměstkyní Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje – příspěvkové organizace, oprávněnou k výkonu práva a povinností Středočeského kraje podle zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

(dále „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti související s Překládkou a nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, jedná se o zpracování CTN a činnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.1 písm. a) této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 19. 9. 2017 vydané společností CETIN pod čj. 720451/17, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPI_II_610_Podolanka-Dřevčice“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění veřejnoprávního titulu k umístění realizace Překládky (tj. územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, ev. stavebního povolení, je-li Překládka prováděna v rámci souboru staveb),
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení Projektu,
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkem Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.),
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

- 4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje před realizací Překládky:

- i) zajistit veřejnoprávního titulu k umístění stavby Překládky (tj. územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, ev. stavebního povolení, je-li Překládka prováděna v rámci souboru staveb),
- ii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka“) s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve 5 měsíců po předání veřejnoprávního titulu dle předchozího bodu, včetně jeho dokladové části,
- iii) Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN následující práva a povinnosti ze Stavebního povolení „II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs nad Labem (rekonstrukce)“, č.j. OD-19511/2018-BARRO ze dne 9.5.2018, které nabylo právní moci dne 13.6.2018: (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto stavebním povolení stanovených, a (ii) dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto stavebním povolení stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto stavební povolení.

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 7 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 7 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízení.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy **1.802.606,- Kč** (slovy: jeden milion osm set dva tisíc šest set šest tisíc korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do 5 měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.
- Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnouch na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

- a) Fakturu č. 1 za Přípravu Překládky ve výši **89.275,- Kč** (slovy: osmdesát devět tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých) do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
- b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů souvisejících s Překládkou do 30 dnů od jejího vystavení.

6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.

- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1

8.2

- 8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn

odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.

- 9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

- 10.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i

s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
 - e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).
- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- 12.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 12.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.13 CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnost CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2018/159
Číslo smlouvy stavebníka: 663/00066001/2019
Externí číslo: S-0126/DOPPO/2019

SRM: 8020000514
Registr smluv: Ano

12.14 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:


Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;
Příloha č. 3 – Stavební povolení č.j. OD-19511/2018-BARRO ze dne 9.5.2018


CETIN:

Stavebník:

V Praze dne 26-07-2019

V Žitánek dne 01. 08. 2019

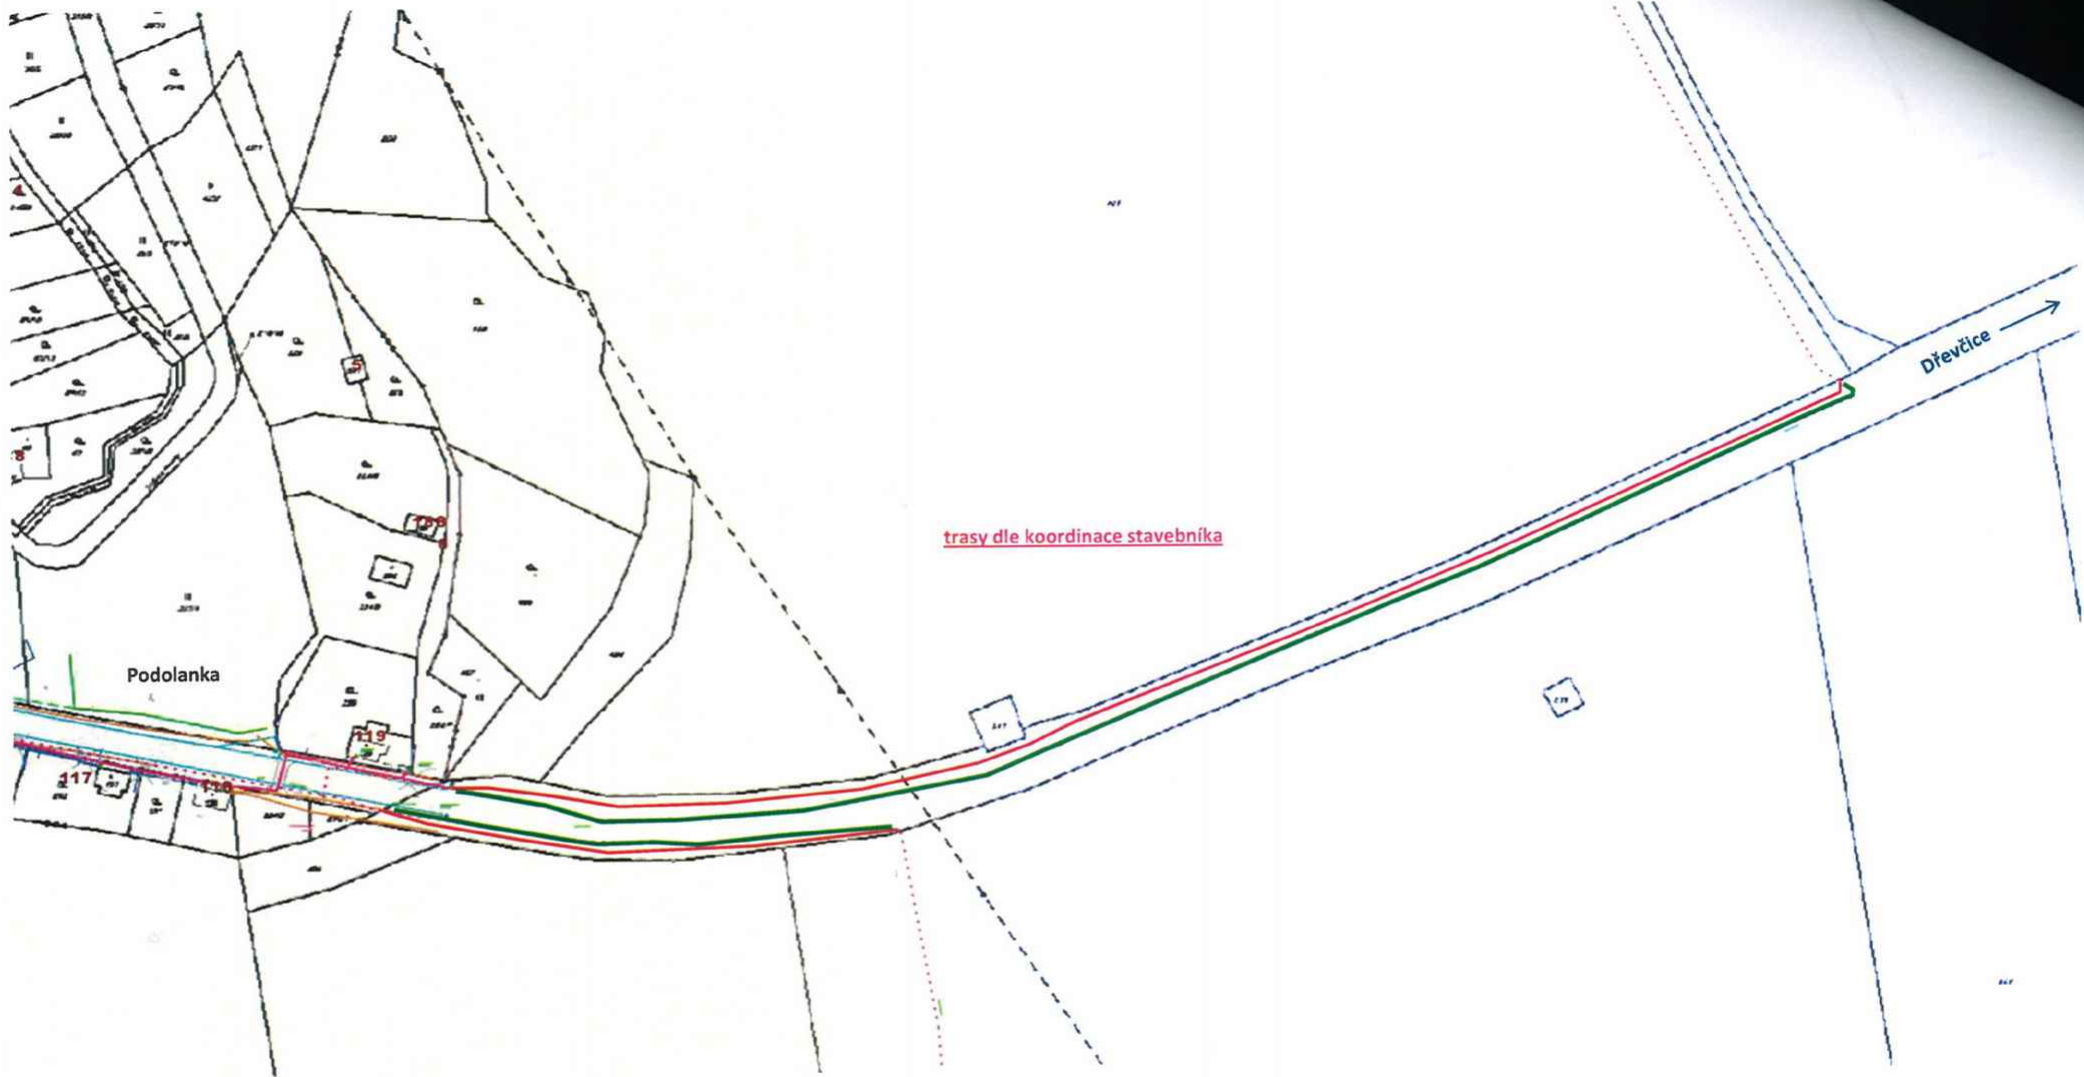

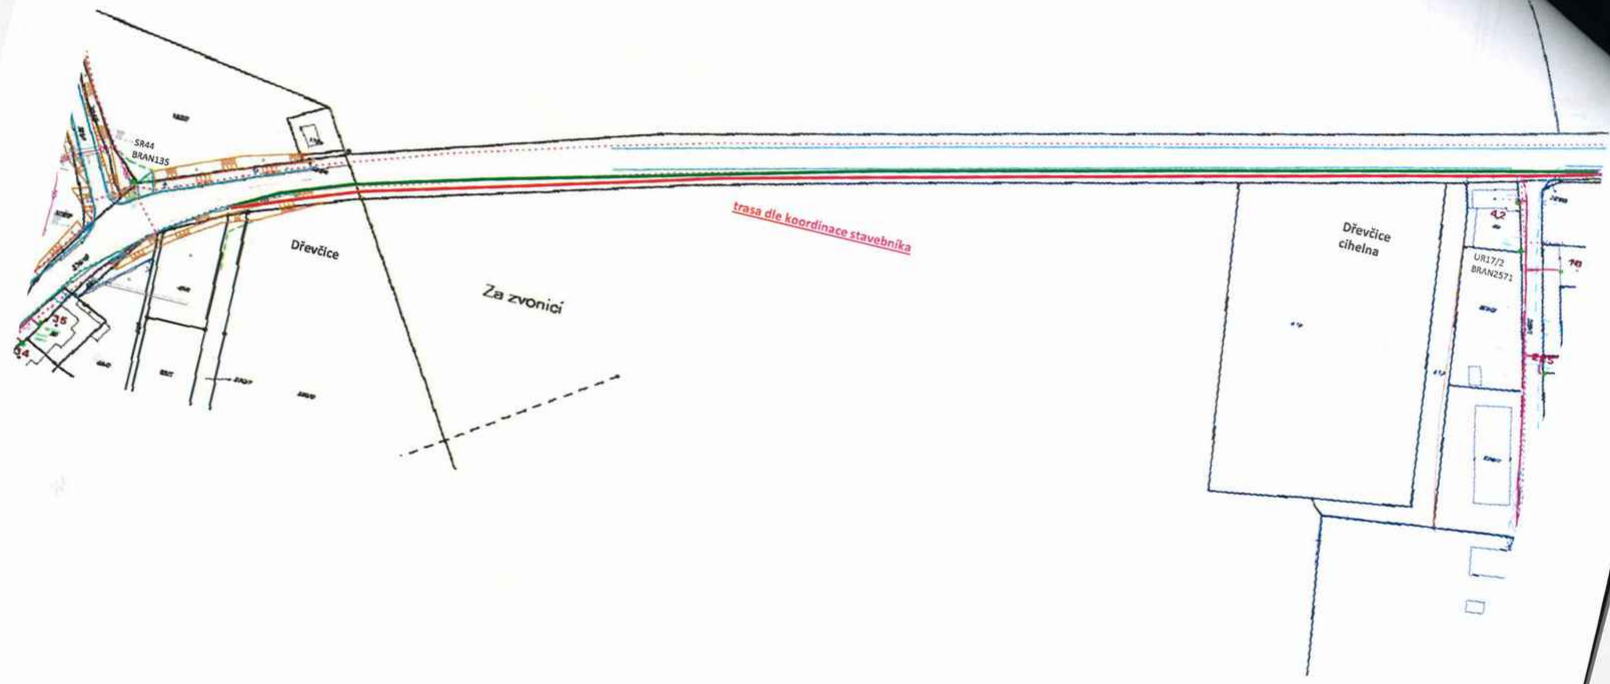

SR44
BRAN133


Dřevčice

Za zvonici

Dřevčice
cihelna

UR17/2
BRAN2571

trasa dle koordinace stavebníka

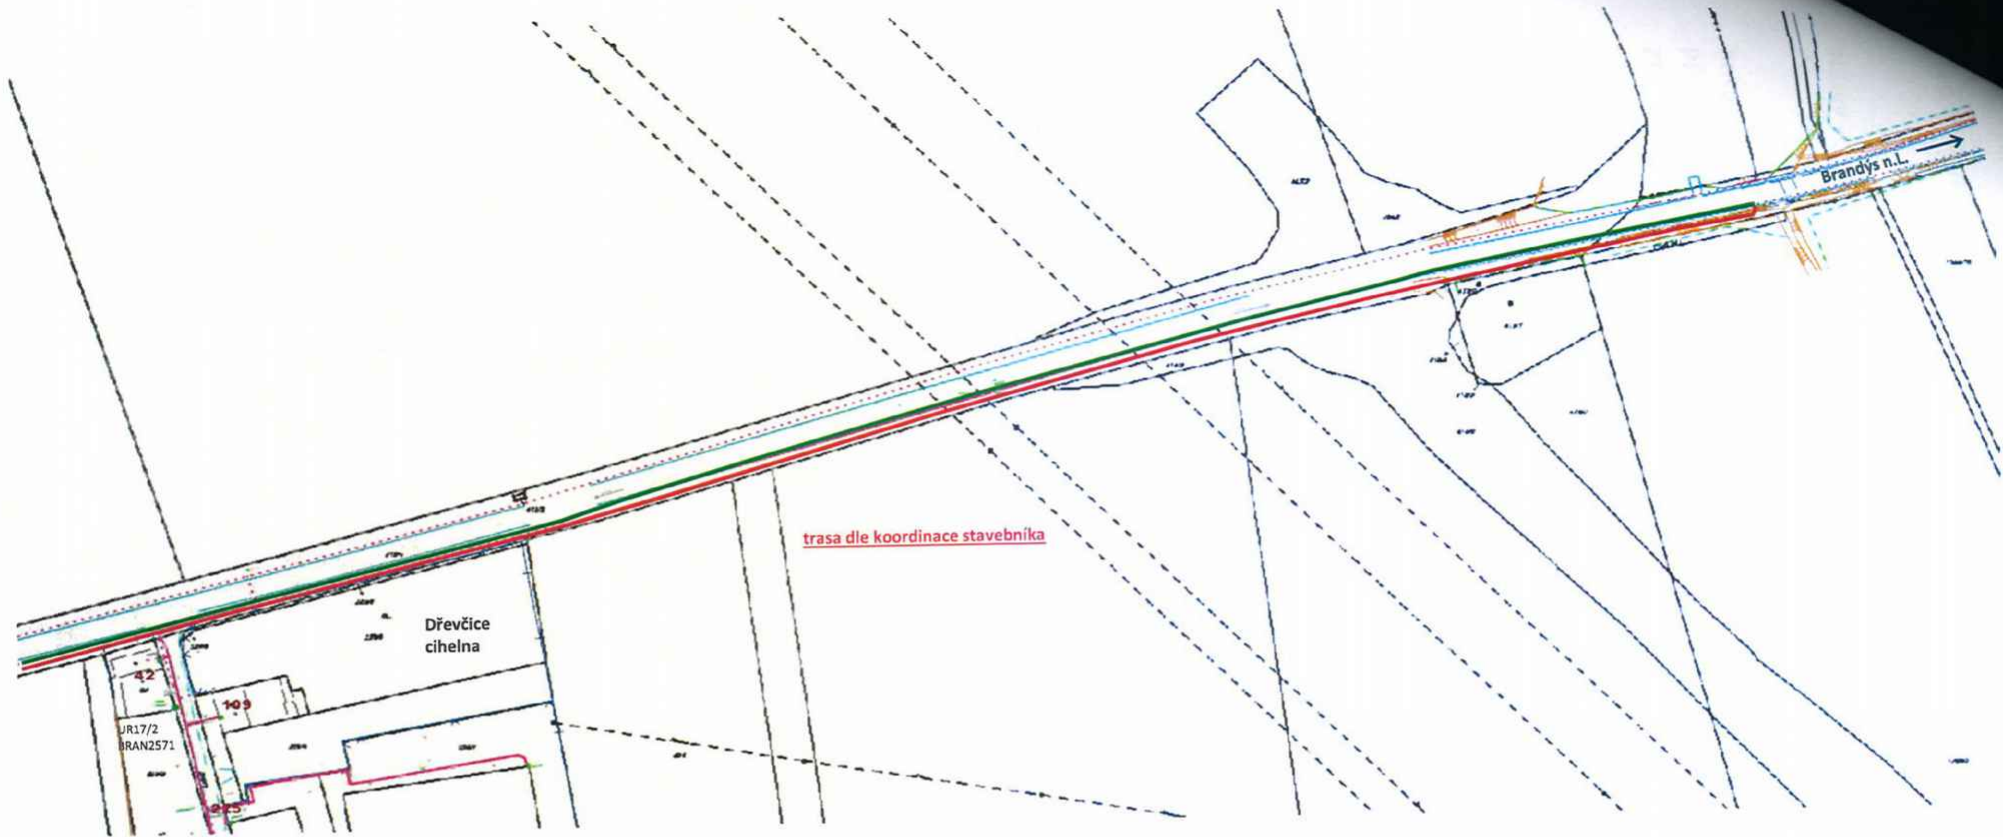

trasa dle koordinace stavebníka

Dřevčice
cihelna

JR17/2
BRAN2571

Brandys n.L.

Název stavby: **VPI_II_610_Podolanka-Dřevčice**
Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| PŘÍPRAVA | 52 827,63 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | 688 618,62 Kč |
| MONTÁŽ | 156 585,72 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA | 32 744,40 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | 62 464,16 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | 3 702,90 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | 7 765,22 Kč |
| PROVOZNÍ PRÁCE | 0,00 Kč |
| MATERIÁL DOD. CETIN | 0,00 Kč |
| MATERIÁL VYŘAZENÝ | 0,00 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazc | 793 897,43 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyk: | 0,00 Kč |
| POPLATKY | 4 000,00 Kč |

Celkové náklady: 1 802 606,08 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 701 565,93 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 101 040,15 Kč

PŘÍPRAVA 52 827,63 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 32 744,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 702,90 Kč
Příprava celkem 89 274,93 Kč

Seznam položek

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství |
|--------------------|------------------|---|-------------|
| PŘÍPRAVA | | | |
| 958084 | | Návrh cenový a technický | 1.00 ks |
| 953634 | | Projekt tlkm liniové metalické sítě | 42336.08 JV |
| ZEMNÍ PRÁCE | | | |
| 954970 S | | Pokládka PE nebo vrapované chráničky | 180.00 m |
| 958554 S | | Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti | 1.00 ks |
| 952353 S | | Rýha v poli 50/110 | 1554.00 m |
| 955570 S | | Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 | 6.00 m |
| 955054 S | | Vytyčení trasy podél silnice,železnice | 1560.00 m |
| MONTÁŽ | | | |
| 952649 S | | Měření stejnosměrné během stavby- první í | 5.00 ks |
| 952650 S | | Měření stejnosměrné během stavby - další í | 205.00 ks |
| 952644 S | | Měření střídavé během stavby - další čtyřka | 205.00 ks |
| 952643 S | | Měření střídavé během stavby - první čtyřka | 5.00 ks |

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| 952647 S | Měření útlumu během stavby- první čtyřka | 5.00 ks |
| 954999 S | Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování | 1025.00 ks |
| 955288 S | Montáž koncovky SKH | 10.00 ks |
| 955279 S | Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř. | 5.00 ks |
| 955282 S | Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek | 10.00 ks |
| 954990 S | Montáž úložných kabelů do 15 XN | 580.00 m |
| 954992 S | Montáž úložných kabelů do 300 XN | 985.00 m |
| 954991 S | Montáž úložných kabelů do 50 XN | 990.00 m |
| 958469 S | Uvedení stavby do provozu | 3720.00 JV |
| kolaudace | | |
| 955630 S | Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě | 6.00 ks |
| 958556 S | Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m | 2.00 ks |
| 955066 S | Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. | 1.00 ks |
| GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA | | |
| 955191 | Předměření trasy nad 1km | 1560.00 m |
| GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE | | |
| 955194 S | Doměření trasy nad 1km | 1560.00 m |
| 955200 S | Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100r | 16.00 ks |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | | |
| 955313 | Uzavření sml. o SB o VBŘ | 2.00 ks |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | | |
| 954830 | Projednání Smlouvy o zřízení věcného břem | 1100.00 JV |
| náhrady | | |
| 955315 | Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ | 2.00 ks |
| 958085 | Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene | 2.00 ks |
| POPLATKY | | |
| 955367 | Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. | 4000.00 JV |
| zábory | | |

Limitka materiálu

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství |
|-----------------------------------|------------------|---|------------|
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | | | |
| 303795 S | | Fólie výstražná 220mm PE oranžová | 1566.00 m |
| 303813 S | | Fólie výstražná 330mm PE oranžová | 1554.00 m |
| 300272 S | | Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,6 | 985.00 m |
| 300121 S | | Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6 | 990.00 m |
| 300126 S | | Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,8 | 580.00 m |
| 316534 S | | Koncovka smršt. SKH 2 9/20 mm | 10.00 ks |
| 320879 S | | Materiál pro tratě síťové | 2480.00 ks |
| 302550 S | | Mini Marker 1401 3M Ball | 25.00 ks |
| 312425 S | | Modul konektor. 9700-10P | 200.00 ks |
| 407578 S | | Souprava čistící 4413L | 2.00 ks |
| 320312 S | | Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 | 1.00 ks |
| 312889 S | | Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE | 5.00 ks |
| 320294 S | | Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 | 5.00 ks |
| 322268 S | | Spojka XAGA 500-43/8-300/EZE | 5.00 ks |
| 302655 S | | Trubka PE 110/3,5/6000mm | 30.00 ks |



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pracoviště Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28

Odbor dopravy/Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Váš dopis čj.:

Ze dne:

Naše čj.: OD-19511/2018-BARRO

Naše sp. zn.: OD-6769/2018-BARRO

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Brandýs n.L. – St. Boleslav odbor dopravy, jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon) v platném znění, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou podal dne 28.2.2018 žadatel **KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 00 Praha 5, IČ 000 66 001**, kterou zastupuje firma **Mott MacDonald CZ, spol.s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 485 88 733** (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs nad Labem
(rekonstrukce)

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 246 v katastrálním území Podolanka, p.č. 316/1, 316/10, 412/1, 495 v katastrálním území Dřevčice u Brandýsa nad Labem a p.č. 1041/5 v katastrálním území Brandýs nad Labem.



Platný podpis
Digitálně podepsáno
Jmórn. Roman Bárta
Datum: 05.05.2018
14:48:17

Rekonstrukce stávající silnice II/610 není v rozporu s územně plánovacími podklady, jedná se o stávající komunikaci II. třídy. Komunikace je vedena po stávajícím silničním pozemku.

Základní identifikační údaje:

| | |
|---------------------------|---|
| NÁZEV STAVBY: | II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs nad Labem, rekonstrukce |
| ČÍSLO KOMUNIKACE: | II/610 |
| KRAJ: | Středočeský |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: | Podolanka, 724149, Dřevčice u Brandýsa nad Labem, 632937, Brandýs nad Labem, 609048 |
| INVESTOR: | Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095 |
| PROJEKTANT: | Mott MacDonald CZ, spol.s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1 IČ: 48588733 |

Stručná charakteristika stavby:

Rekonstrukce silnice II/610 je hlavním objektem stavby. Rekonstrukce vychází ze stávajícího technického stavu a reflektuje ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic – říjen 2004. Náplní objektu je rekonstrukce silnice v celé šíři koruny – cca 8.00-9.00 m, pročištění podélného systému odvodnění a doplnění zádržného systému. V trase rekonstruované silnice se nachází dvě úrovně křižovatky. Objekt je rozdělen na dvě části: Podolanka – Dřevčice a Dřevčice – Brandýs nad Labem. Celková délka je 1,580 (úsek číslo 1) + 0,964 (úsek číslo 2) = 2,544 km. Začátek úseku číslo 1 km 1,00, konec úseku číslo 1 je v km 2,580, začátek úseku 2 km 3,410, konec úseku 2 je v km 4,374. Navrhovaná rychlost je 70 km/h.

Kategorie silnice II/610: S7, 5/70 – odvozená:

- jízdní pruhy 2x3,25 m
- vodící proužky 0,25 m
- zpevněná krajnice proměnlivá
- nezpevněná krajnice 0,75 m /z toho 0,50 m se započítává do volné šířky)
- v případě osazení silničního svodidla se nezpevněná krajnice rozšíří o 0,75 m

Podrobné popisy navrhovaných řešení, konstrukcí jednotlivých SO a zásady organizace výstavby jsou uvedeny ve stavební části schválené projektové dokumentace.

Stanovení závazných podmínek pro provedení stavby:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené speciálním stavebním úřadem, kterou vypracoval Ing. Martin Daniel, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,

- ČKAIT 0010679. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Při provádění stavby musí být dodrženy Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
 - 3) V průběhu provádění stavebních prací budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny osobními ochrannými prostředky v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění prací vyplývají. Dodavatel stavebních prací se musí řídit zejména pátou částí zákona 262/2006, Sb. v platném znění (zákoník práce), nařízením vlády 591/2006 (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), zákonem 309/2006, Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a další související legislativou.
 - 4) Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který je oprávněn k provádění stavebních nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti, podle zvláštních předpisů. Dodavatel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení.
 - 5) Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 - 6) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace osobou k tomu oprávněnou.
 - 7) Na staveništi bude stavebníkem zajištěno na viditelném místě vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby (dodavatele), který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby.
 - 8) Stavbou nesmí být narušena zařízení cizích vlastníků (správců) a musí být respektovány jejich bližší podmínky. Stavebník je povinen jim oznámit, nejméně v týdenním předstihu započetí stavebních prací. Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor.
 - 9) Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytyčena poloha veškerých sítí a s tímto vytyčením musí být seznámeni pracovníci stavebního podniku, kteří budou provádět stavební práce. Vytyčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců), v souladu s jejich vyjádřením. Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením. Dále bude jejich odpovědný pracovník přizván ke kontrole a souhlasu před záhozem vedení ve výkopu.
 - 10) Vyskytnou-li se při provádění prací vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
 - 11) V rámci výstavby bude v maximální míře eliminováno znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých hmot. Stavebník zajistí pravidelné čištění a kropení komunikací, používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti.
 - 12) Stavebník zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
 - 13) U výjezdu ze staveniště na pozemní komunikaci stavebník zajistí účinná opatření k čištění vozidel, aby pozemní komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu Zák.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a Zák. č. 361/2000 Sb. ve znění Zák. č. 411/2005 Sb. o provozu na pozemních komunikacích).
 - 14) Staveniště bude organizováno v souladu s ust. § 14 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Zařízení staveniště bude nejpozději k datu dokončení stavby odstraněno.

- 15) Odpady vznikající při provádění stavby budou zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, především jeho §§ 11 a 16.
- 16) Před zahájením stavby bude předáno staveniště se zadokumentováním jeho stavu. Po ukončení prací budou dotčené pozemky stavebníkem uvedeny do původního stavu.
- 17) Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádřeních všech správců inženýrských sítí.
- 18) Stavebník požádá v dostatečném předstihu (min. 30 dní) před zahájením stavby o povolení částečné uzavírky a stanovení přechodné úpravy silničního provozu příslušný silniční správní úřad, kterým je pro silnici č. II/610 MěÚ Brandýs n/L-Stará Boleslav, odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs n/L-Stará Boleslav. Jednotlivé části stavby lze užívat jen na základě časově omezeného povolení o předčasném užívání stavby, před jejím úplným dokončením. O rozhodnutí o povolení předčasného užívání jednotlivých částí stavby požádá stavebník ve smyslu § 123 stavebního zákona. Stavbu jako celek lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. O vydání kolaudačního souhlasu požádá stavebník ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Vypořádání se s námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci neuplatnili

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Obec Dřevčice
Obec Polanka
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Odůvodnění:

Dne 27.2.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 9.4.2018. Vzhledem ke skutečnosti, že žádost doložená příslušnými doklady poskytuje dostatečný podklad pro posouzení výše uvedené stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od místního šetření a ústního jednání. Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, zákonem o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu Brandýs n.L. – St. Boleslav, pracoviště Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, 250 02 Stará Boleslav.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle § 115, odst.4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci.



Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav, OÚ Dřevčice a OÚ Podolanka po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

Písemnost /nebo oznámení/ se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vrátit potvrzení zdejšímu odboru.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 109 písm. a), b) - doručováno jednotlivě

Mott MacDonald CZ, spol.s r.o., IDDS: bebs53h
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Obec Dřevčice
Obec Polanka
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Účastníci řízení dle § 109 písm. c) až f) - doručováno veřejnou vyhláškou

Majitelé pozemků v k.ú. Podolanka: st.129, 224/7, 230/1
Majitelé pozemků k.ú. Brandýs nad Labem: 1637/1, 1746/3
Majitelé pozemků k.ú. Dřevčice u Brandýsa nad Labem: st.59. st.178, 45/3, 68/2, 123/1, 182/2, 182/4, 229/3, 229/5, 229/8, 229/9, 230/5, 230/7, 311/1, 336/2, 402, 404, 407, 408, 412/2, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 472, 474, 475, 478, 479, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 501, 503, 505, 506, 507, 513, 517

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP, IDDS: c5hb7xy
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OSÚÚPPP, IDDS: c5hb7xy
Krajské ředitelství policie Stř. kraje, ÚO Praha venkov - VÝCHOD, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, Praha 6, IDDS: hjyaavk

Na vědomí:

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, ISSD: seccdqd
Dial Telecom a.s., Křižíkova 237/36a, Praha 8-Karlín, IDDS: p4vdqdt
Mero ČR a.s., Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou, IDDS: a4we6rx
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II, Praha 4-Nusle, IDDS: 8ecyjt9
SITEL s.r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, IDDS: 69779z9
T-Mobile Czech Republic a.s, Tomíčková 2144/1, Praha 4, IDDS: ygwch5i
Türk Telekom InternationalCZ s.r.o., Mistrovská 597/29, Praha 10, IDDS: hd8cr4p
TwigoNet Europe, SE, IDDS: pm9kvp7
InfoTel, spol.s r.o., Novolišeňská 2678/18, Brno-Líšeň, IDDS: t4wbzpv
Čepro a.s., Dělnická 12, Praha 7, IDDS: hk3cdqj
Pražská plynárenská distribuce a.s., U plynárny 500, Praha 4, IDDS: w9qfskt

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

adresa pro doručování: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,
- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 5.11.2019. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 5.11.2018

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo



Mgr. RADIM KRUŠ



Mgr. RADIM KRUŠ
