

Číslo smlouvy společnosti CETIN: CB 2019_0027
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S4 HANA : 8020000498
Registr smluv : ANO



KUJCP010WY2D

SON/ DVZ/ 088/19

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. CB 2019_0027**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Jihočeský kraj

Číslo smlouvy společnosti CETIN: CB 2019_0027
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S4 HANA : 8020000498
Registr smluv : ANO

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Ing. Zdeňkem Šulcem, MBA, manažerem, Výstavba fix

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Jihočeský kraj

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v CTN označená za etapu, vymezená v CTN a co do rozsahu určená položkami v CTN; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 2.7.2019 vydané pod čj. 680621/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Tábor,Vožická-Chýnov.,přel.SEK**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvu výslovně sjednáno jinak.
- 3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,
(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
- (iii) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky.

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí Městského úřadu Tábor – rozhodnutí o umístění stavby Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická: komunikace, lávka pro pěší a cyklisty, kabelové komory a kabelovod, vodovod, přeložky kanalizace a vodovodu, retenční nádrž, přeložky kabelů VN a NN, VO, SSZ a sdělovacích kabelů, protihlukový val a protihluková stěna č.j. 26711/2005/6/SÚ/AD ze dne 11.11.2005, které nabylo právní moci dne 20.12.2005 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění, resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení,

tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

- 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
 - (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
 - (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
 - (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona o vyvlastnění.
- 4.5 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlžení Stavebník s plněním povinností dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlžení Stavebníka.
- 4.6 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.
- 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU**
- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **664 188,00 Kč** (slovy: šest set šedesát čtyři tisíc jedno sto osmdesát osm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále

jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do tří (3) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.

- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu;
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými;
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty;
- (f) náklady na identifikaci parcel;
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky;
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění;
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky;
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky;
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu;
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 44 997,00 Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc devět set devadesát sedm korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;
- (b) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.6 Smlouvy.

- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Theodor Valenta
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. ■■■ ■■■ ■■■
e-mail: theodor.valenta@cetin.cz

ve věcech technických: Josef Filípek
funkce: specialista pro výstavbu sítě
■■■ ■■■ ■■■ ■■■
e-mail: josef.filipek@cetin.cz

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Stráská
funkce: hejtmanka Jihočeského kraje

ve věcech technických: Ing. Jitka Liláková
funkce: rozpočtář a stavební technik
tel.: 386720185
e-mail: lilakova@kraj-jihocesky.cz

- 8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu

v obchodním rejstříku.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.
- 9.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.5 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude o 10 % a více vyšší než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.6 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.5 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.7 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.8 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.
- 10.2 Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:
- (a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy;
 - (b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy.

- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze zaniklé části Smlouvy.
- 10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo její části.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na vyzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem

následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
- (c) e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají

nebezpečí změny okolností.

- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádný ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
- 12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
- Příloha č. 1 - CTN
 - Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí Městského úřadu Tábor o umístění stavby č.j. 26711/2005/6/SÚ/AD ze dne 11.11.2005
 - Příloha č. 3 - Stavební povolení Městského úřadu Tábor čj. S-META 53646/2006 OD/Ku 4 ze dne 20.11.2006
 - Příloha č. 4 - prodloužení platnosti stavebního povolení Městského úřadu Tábor čj. METAB 51999/2016/OD/1Kve ze dne 30.11.2016

Rozhodování o uzavření této smlouvy bylo svěřeno hejtmance Jihočeského kraje usnesením rady kraje č. 887/2015/RK-69 ze dne 27. 8. 2015.

Číslo smlouvy společnosti CETIN: CB 2019_0027
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S4 HANA : 8020000498
Registr smluv : ANO

CETIN

V Praze dne 11-07-2019



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Zdeněk Šulc MBA
manažer, Výstavba fix

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


240

Stavebník

V Českých Budějovicích dne 31.7.2019

Jihočeský kraj
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka



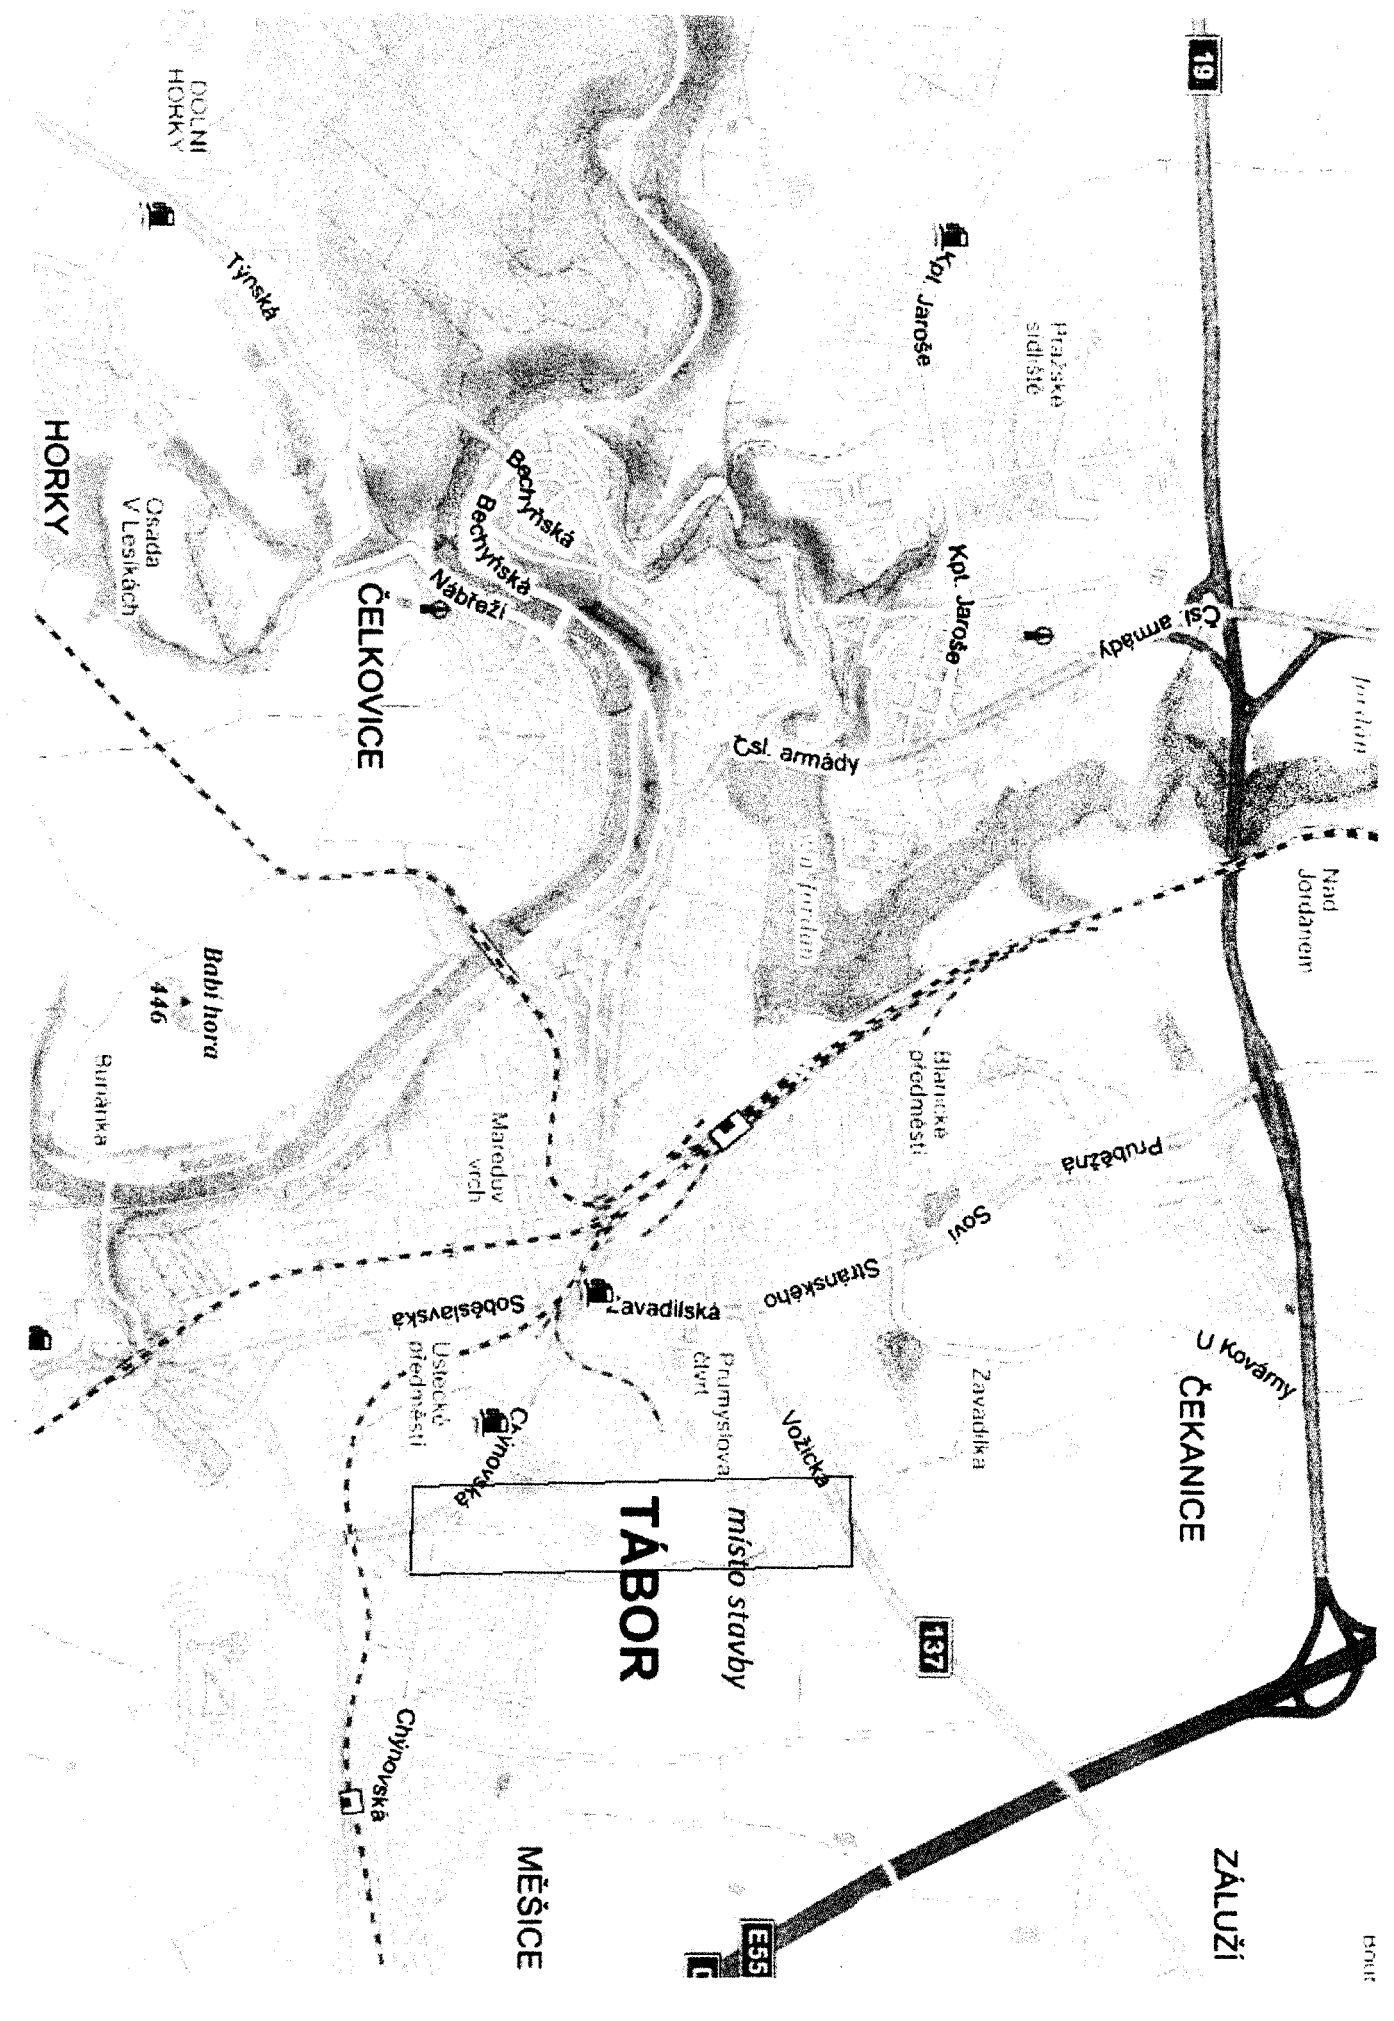

19

DOLNÍ
HORKY

Týnská

Kpt. Jaroše

Pražská
sídlisť

HORKY

Osada
V Leskách

Bechyňská
Bechyňská
Nábřeží

ČELKOVICE

Kpt. Jaroše

Čsl. armády

Čsl. armády

Jordan

Nad
Jordanem

Babi hora
446

Bunáňka

Marešův
vrch

Hlaničská
předměstí

Pruběžná

Sovi

Soběslavská

Zavadlička

Stránského

U Kováry

ČEKANICE

Ustecká
předměstí

Čimovská

Průmyslová
čtvrť

Vožická

Zavadlička

TÁBOR

místo stavby


137

MĚŠICE

ZÁLUŽÍ


137


HOUB

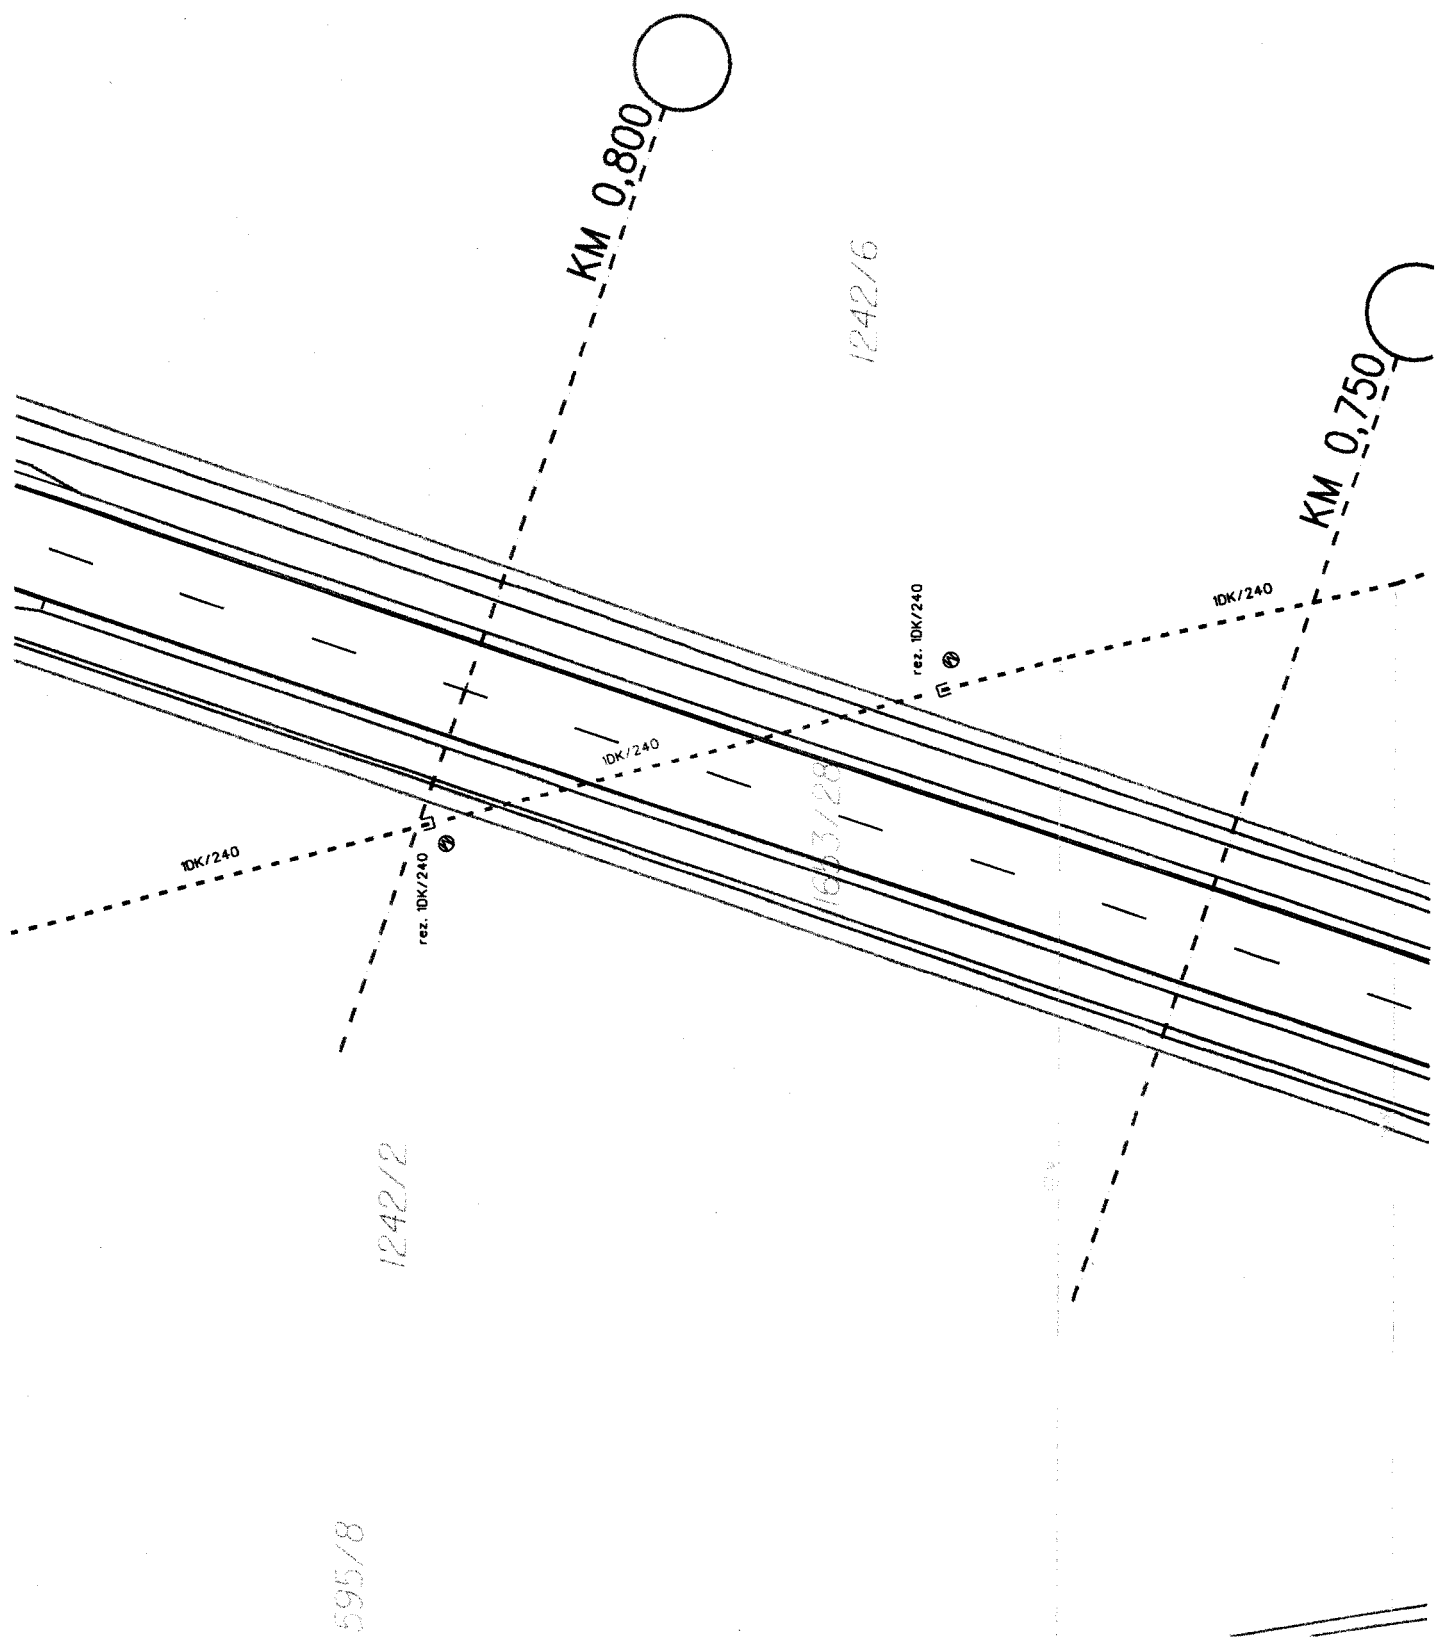


11

169/3

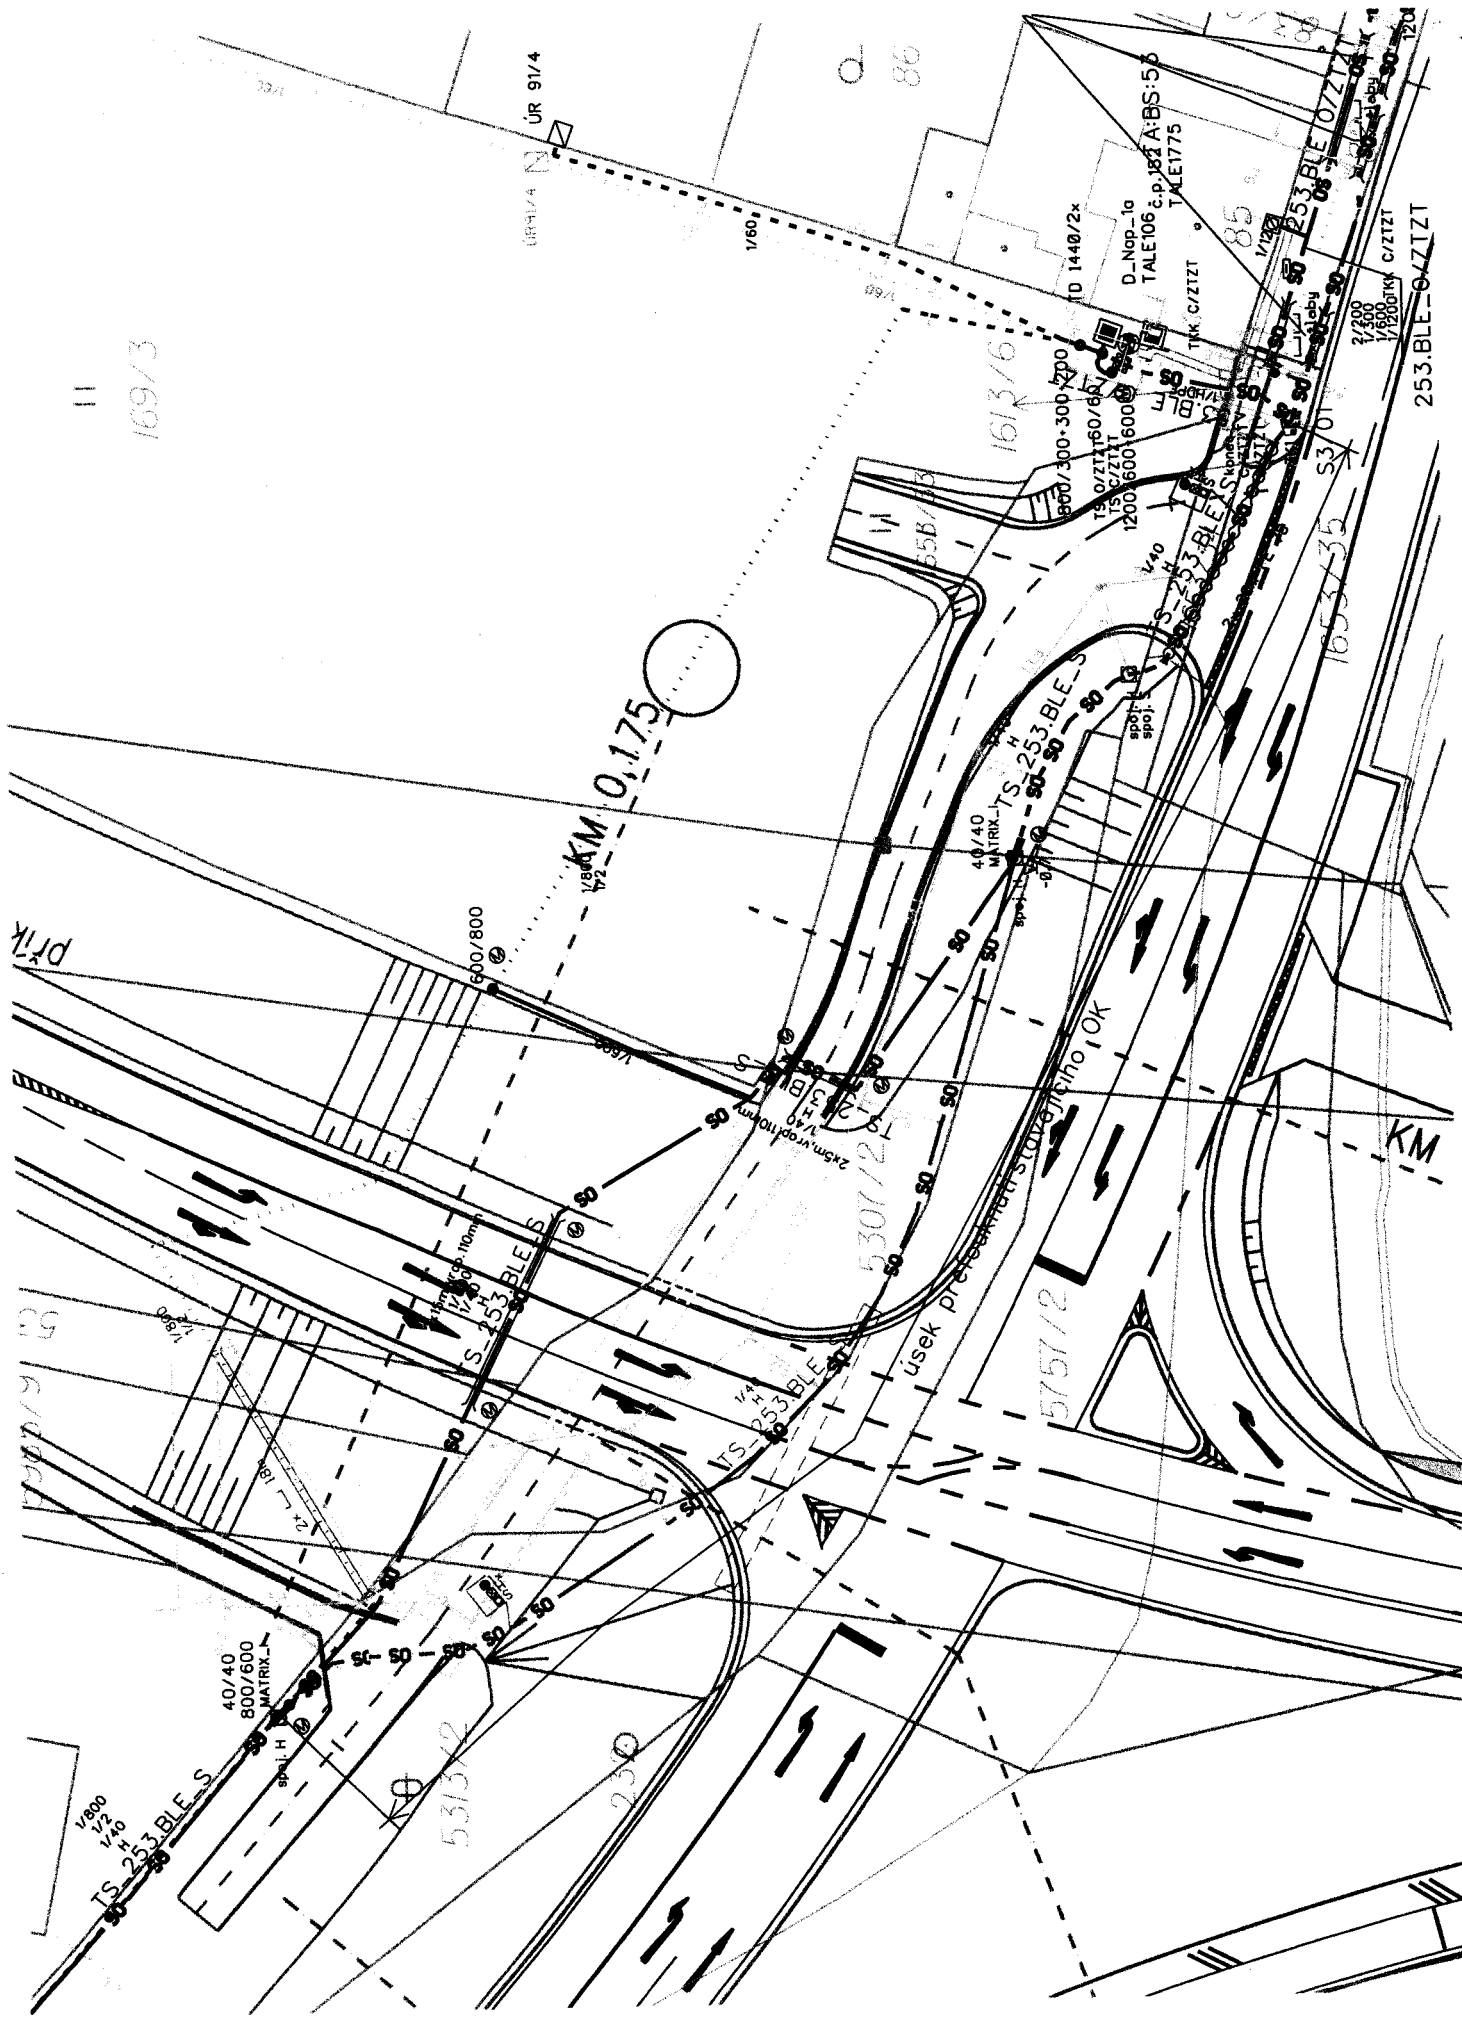

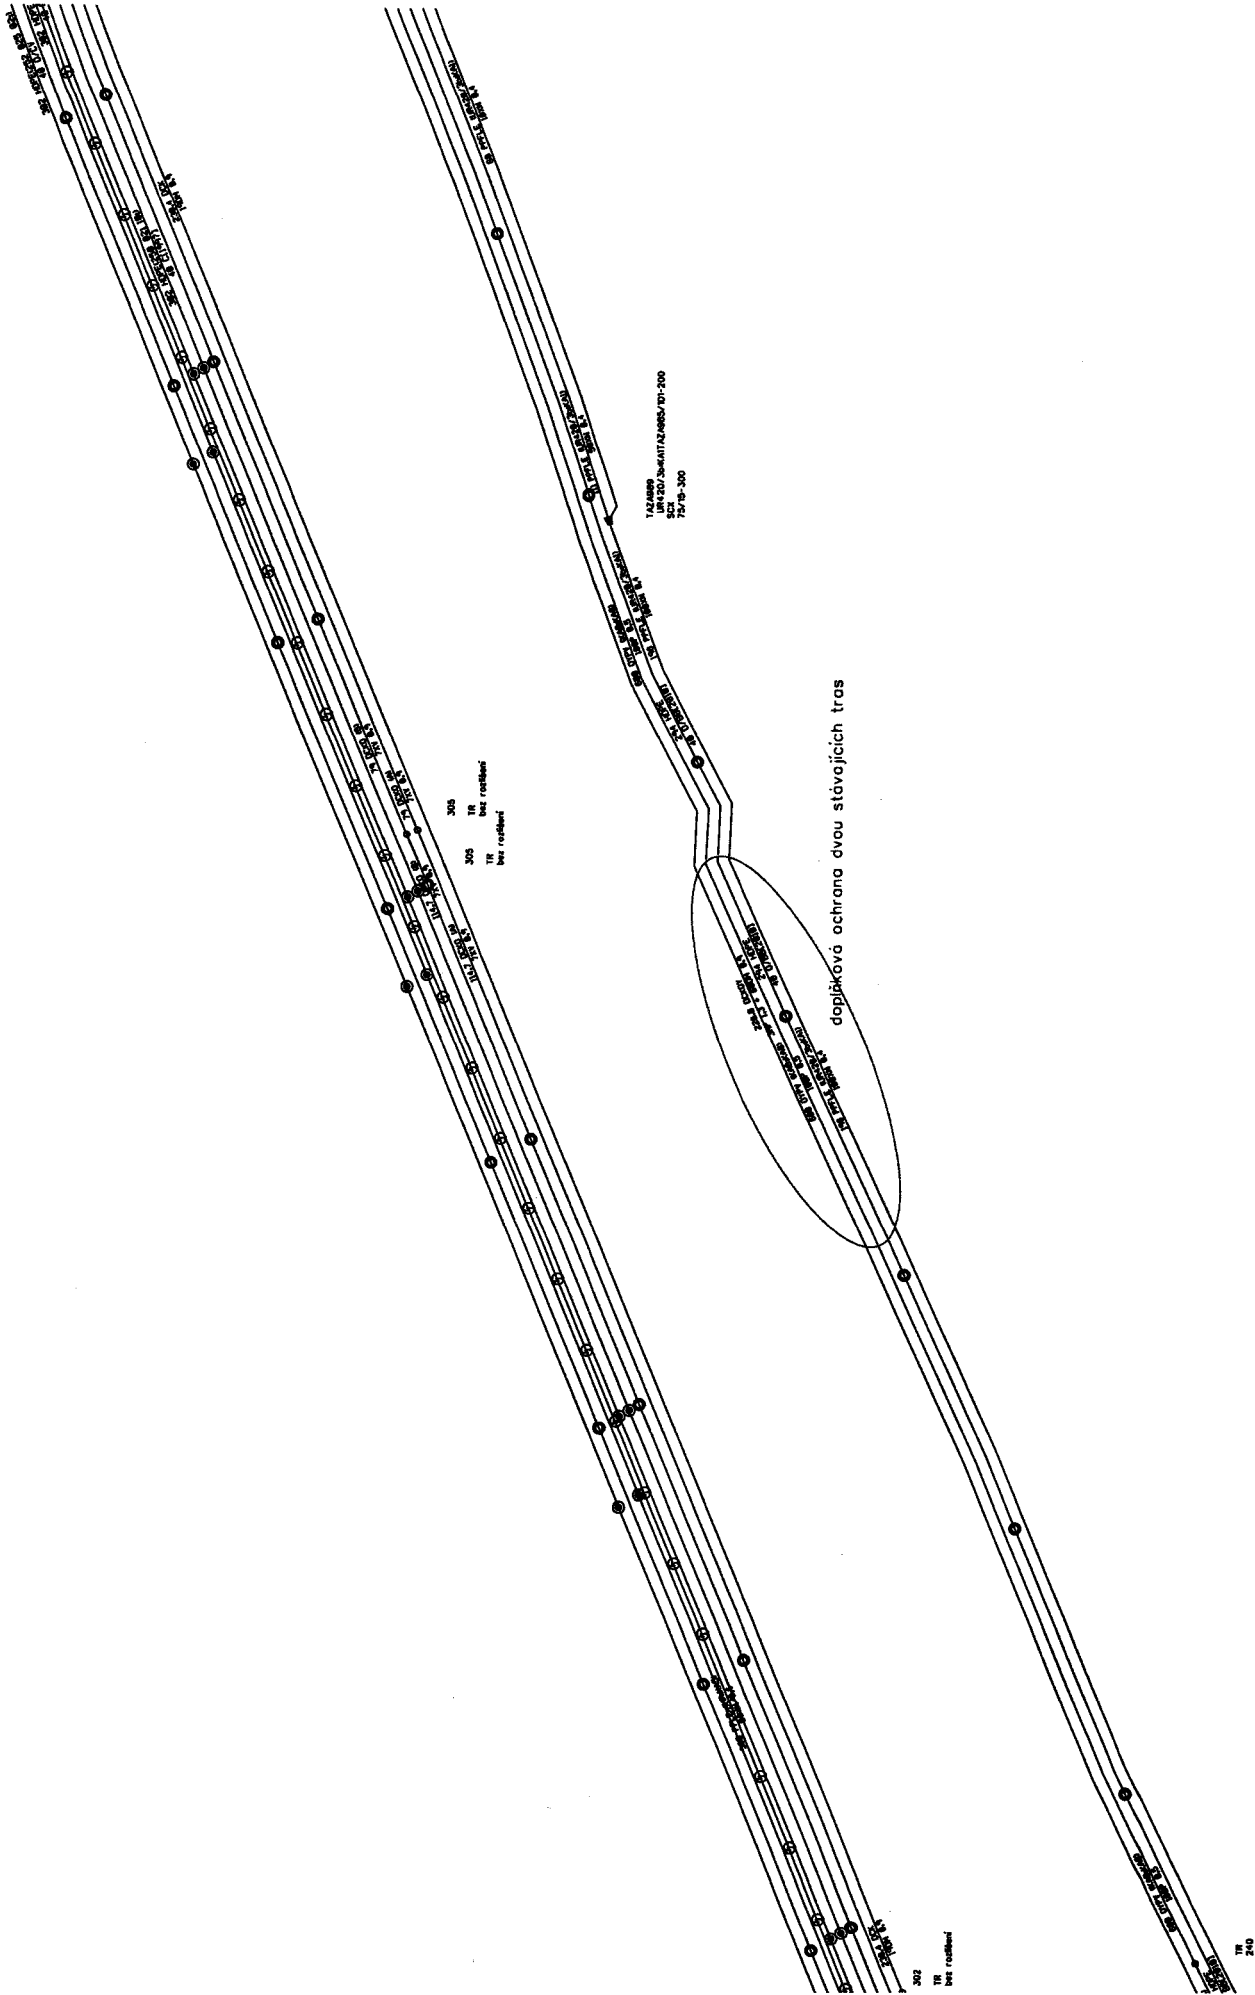

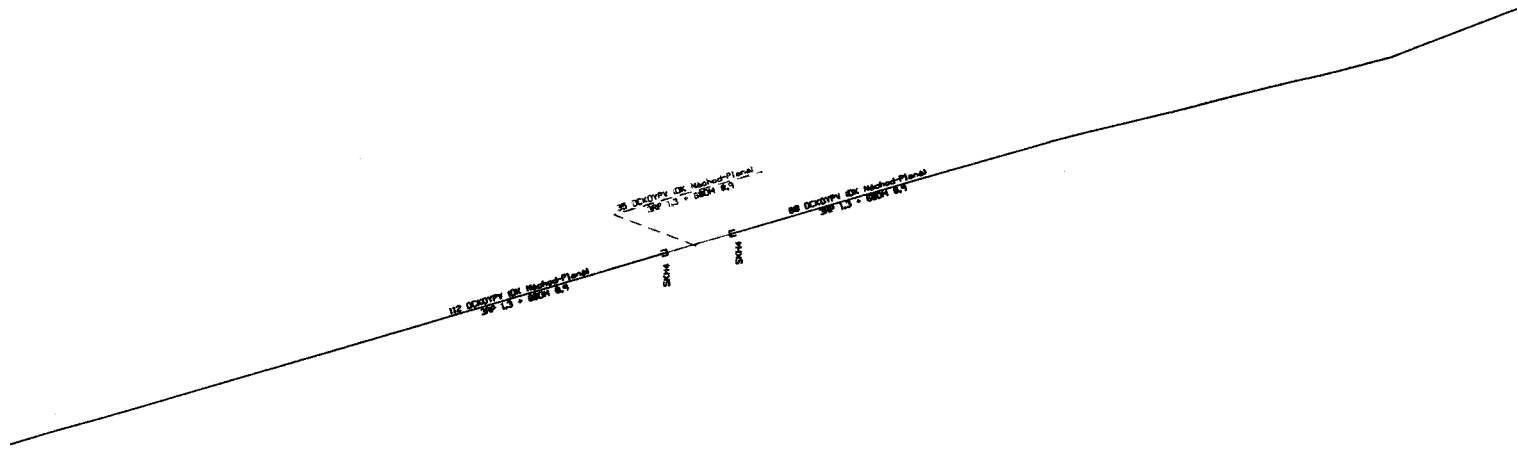

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby : VPIC Tábor, Vožická-Chýnovská, přel. SEK
Místo stavby : k.ú. Tábor, p.č. 5985/9, 5313/2, 5307/2, 5307/1 a k.ú. Měšice u
Tábora, p.č. 1653/32, 1653/38, 1653/1, 1653/4
Investor : CETIN a.s.
Olšanská2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Technické řešení stavby:

Plánovaná realizace stavby „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická“, investor JČK a město Tábor, vyžaduje přeložení a úpravu sítě elektronických komunikací (dále jen SEK).

Jde o změnu a doplňkovou ochranu metalické a optické trasy SEK.

První kolizní úsek se nachází na pozemku p.č. 1655/4, k.ú. Měšice u Tábora a jde o trasu SEK tvořenou metalickým kabelem TCEPKPFLE 100XN0,4 a HDPE40 trubkou O/BB. Prvky jsou uloženy v chráničce PVC o průměru 110 mm. V místě křížení trasy SEK s novou komunikací bude založena rezervní chránička PVC 110 mm.

Druhý kolizní úsek se nachází na pozemku p.č. 1653/1, k.ú. Měšice u Tábora a jde o trasu SEK tvořenou metalickými kabely TCKOYPV 100P0,5 a DCKQY 3RP1,3+60DM0,9. V místě křížení trasy SEK s novou komunikací budou prvky SEK uloženy do chráničky SYSPRO 110 mm se souběžným založením rezervní chráničky PVC 110 mm.

Třetí kolizní úsek se nachází na pozemku p.č. 1653/28, k.ú. Měšice u Tábora a jde o trasu SEK tvořenou metalickým kabel V místě křížení trasy SEK s novou komunikací bude kabel zrušen a zbylé části budou opatřeny koncovkami SKH4.

Čtvrtý kolizní úsek se nachází na pozemcích p.č. 5985/9, 5307/2, 5307/1, k.ú. Tábor a na pozemku p.č. 1653/32, k.ú. Měšice u Tábora a jde o trasu SEK tvořenou metalickým kabelem TCKQYPY 200XN0,8 a trasu SEK tvořenou metalickým kabelem TCEPKPFLE 10XN0,4 a HDPE40 trubkami H a S. V trubce S se nachází TS 253 BLE 3x10mm+4x7mm s kabelem OFS8xRB/48f. Obě trasy se v kolizních úsecích zruší a budou prostavěny vložkami uloženými v nové zčásti společné a ve zbytku samostatné trase. U trasy metalického kabelu bude pro vložku použit kabel TCEPKPFLE 150XN0,8 a spojky XAGA500 100/25-460. U trasy metalického kabelu a trubek HDPE včetně TS budou pro vložku použity stejné prvky jako rušené a spojky XAGA500 43/8-150, Plasson40, Matrix I 40/40 a GABO10 a 7mm. Optický kabel bude rozpojen demontáží spojky S3/01 provedené jako Coyote RUNT InLine, vyfouknut v stávající a rušené trase a zafouknut zpět v nové a stávající trase s opětným smontováním spojky S3/01.

Zemní práce budou prováděny v travnatém povrchu a komunikacích s asfaltovým povrchem. V nových trasách bude zřízeno kabelové lože z písku nebo prosáté zeminy a nové i stávající trasy budou zakryty výstražnou fólií. Konce chrániček, koncovky a spojky budou označeny Markery.

Při pokládce budou dodrženy ČSN 736005 a 341100.

Závěrečná měření, kalibrace a tlaková zkouška HDPE trubek, dodržení BOZP a ochrana životního prostředí bude prováděny a postupováno bude podle předpisu TIMP TD000007.

Montážní a zemní práce budou provedeny podle předpisu TIMP TD00004-6.

Polohopisná data skutečného provedení budou vytvořena podle směrnice TD000002.

S odpadem bude naloženo v souladu se zákonem 185/2001Sb.

Stavba s využitím ÚR nosné stavby, s projektem a zřízením služebnosti pro VBř.

Kapacity:

| KMMK | KMP | KMVK | KMVL | KMOK | KMTRU |
|-------|------|------|------|------|-------|
| 0,165 | 25,7 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 |

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-2019.05

Položková d: 2019.05

Název stavby: VPIC Tábor, Vožická-Chýnovská, přel. SEK_1 etapa

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

| | | | | | |
|-------------|-------|--------|-------|--------------|---|
| KMVYK: | 0.100 | KMP: | 2.000 | bytových HT | 0 |
| KMVYK: voz. | 0.000 | KMMK: | 0.100 | podnik. HTS: | 0 |
| km otvorů: | 0.000 | KMNT: | 0.000 | rekreač. HTS | 0 |
| | | KMTRU: | 0.100 | PP HR: | 0 |
| | | KMOK: | 0.000 | PP UR: | 0 |
| | | KMVL: | 0.000 | | |
| | | KMTRK: | 0.000 | | |

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km

Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km

Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km

Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| PŘÍPRAVA | 0,00 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | 36 772,00 Kč |
| MONTÁŽ | 81 135,87 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA | 0,00 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | 0,00 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | 0,00 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | 0,00 Kč |
| PROVOZNÍ PRÁCE | 0,00 Kč |
| MATERIÁL DOD. CETIN | 0,00 Kč |
| MATERIÁL VYŘAZENÝ | 0,00 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | 17 436,94 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | 0,00 Kč |
| POPLATKY | 0,00 Kč |

Celkové náklady: 135 344,81 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 135 344,81 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

Seznam položek

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|--------------------|------------------|---|----------|--------------|
| ZEMNÍ PRÁCE | | | | |
| 954970 S | | Pokládka PE nebo vrapované chráničky | 100.00 m | 1 815,00 Kč |
| 952345 S | | Rýha v trávě 35/70-100 | 100.00 m | 33 870,00 Kč |
| 955053 S | | Vytyčení trasy v zastavěném terénu | 100.00 m | 1 087,00 Kč |
| MONTÁŽ | | | | |
| 955000 S | | Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním | 20.00 ks | 605,00 Kč |
| 955281 S | | Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek | 2.00 ks | 2 298,28 Kč |

| | | | |
|----------|---|----------|--------------|
| 955945 S | Montáž spojky T (Y) (I) | 2.00 ks | 288,58 Kč |
| 952602 S | Montáž trubky úložné | 100.00 m | 1 173,00 Kč |
| 954990 S | Montáž úložných kabelů do 15 XN | 100.00 m | 2 062,00 Kč |
| 958592 S | Provádění PEW v maintenance window | 1.00 ks | 30 857,50 Kč |
| 958557 S | Realizace optické akce-ostatní činnosti | 2.00 ks | 32 546,04 Kč |
| 955942 S | Zafukování svazku trubiček | 100.00 m | 2 309,00 Kč |
| 955952 S | Zafukování/vyfukování mikrokabelu | 500.00 m | 6 360,00 Kč |
| 958558 S | Zkouška trhací | 1.00 ks | 1 525,60 Kč |
| 958555 S | Zpracování dok. skut. provedení do 50 m | 1.00 ks | 1 110,87 Kč |

Limitka materiálu

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|--|------------------|--|----------|--------------|
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | | | | |
| 303813 S | | Fólie výstražná 330mm PE oranžová | 100.00 m | 442,00 Kč |
| 300106 S | | Kabel plastový TCEPKPFL 10x4x0,4 | 100.00 m | 2 564,00 Kč |
| 318806 S | | Spojka I trubky rozšíř. 40SRV-M 40 vodot | 2.00 ks | 2 978,86 Kč |
| 320297 S | | Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500 | 2.00 ks | 1 599,08 Kč |
| 300633 S | | Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená | 100.00 m | 545,00 Kč |
| 300634 S | | Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená | 100.00 m | 545,00 Kč |
| 300635 S | | Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá | 100.00 m | 545,00 Kč |
| 300623 S | | Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená | 100.00 m | 347,00 Kč |
| 300624 S | | Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená | 100.00 m | 347,00 Kč |
| 300625 S | | Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá | 100.00 m | 347,00 Kč |
| 300626 S | | Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá | 100.00 m | 347,00 Kč |
| 300027 S | | Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy | 100.00 m | 2 743,00 Kč |
| 302423 S | | Trubka vrapovaná 110/94 s lankem | 100.00 m | 4 087,00 Kč |

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- 2019.05

Položková d: 2019.05

Název stavby: VPIC Tábor, Vožická-Chýnovská, přel. SEK
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: CETIN, Burda
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

| | | | | | |
|-------------|-------|--------|--------|--------------|---|
| KMVYK: | 0.170 | KMP: | 25.700 | bytových HT | 0 |
| KMVYK: voz. | 0.055 | KMMK: | 0.165 | podnik. HTS: | 0 |
| km otvorů: | 0.000 | KMNT: | 0.000 | rekreač. HTS | 0 |
| | | KMTRU: | 0.170 | PP HR: | 0 |
| | | KMOK: | 0.000 | PP UR: | 0 |
| | | KMVL: | 0.000 | | |
| | | KMTRK: | 0.000 | | |

Rozdělení dle zón:

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 1: Nad 100 tis. obyv. | | | | | |
| Historické centrum | 0.000 km | Městská zástavb | 0.000 km | Předměstí | 0.000 km |
| 2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. | | | | | |
| Historické centrum | 0.000 km | Městská zástavb | 0.000 km | Předměstí | 0.000 km |
| 3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. | | | | | |
| Historické centrum | 0.000 km | Městská zástavb | 0.000 km | Předměstí | 0.000 km |
| 4: Do 1 tis. obyv. | | | | | |
| Chráněná přírodní území | 0.000 km | Ostatní terén | 0.000 km | | |

Rekapitulace nákladů:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| PŘÍPRAVA | 36 293,38 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | 188 073,50 Kč |
| MONTÁŽ | 133 613,92 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA | 6 667,12 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | 9 463,73 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | 2 036,60 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | 4 283,03 Kč |
| PROVOZNÍ PRÁCE | 0,00 Kč |
| MATERIÁL DOD. CETIN | 0,00 Kč |
| MATERIÁL VYŘAZENÝ | 0,00 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | 128 411,54 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | 0,00 Kč |
| POPLATKY | 20 000,00 Kč |

Celkové náklady: 528 842,82 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 459 562,69 Kč
 NESTAVEBNÍ ČINNOST 69 280,13 Kč

Seznam položek

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|-----------------|------------------|---|-------------|--------------|
| PŘÍPRAVA | | | | |
| 958210 | | Návrh cenový a technický bez projednání | 1.00 ks | 5 677,78 Kč |
| 953634 | | Projekt tlkm liniové metalické sítě | 20275.24 JV | 20 275,24 Kč |
| 953635 | | Projekt tlkm liniové optické sítě | 10340.36 JV | 10 340,36 Kč |

ZEMNÍ PRÁCE

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------------------|
| 954970 S | Pokládka PE nebo vrapované chráničky | 225.00 m | 4 083,75 Kč |
| 952368 S | Pokládka žlabů TK2,T2N | 10.00 m | 907,30 Kč |
| 954973 S | Povrchy nad rámeč litý asfalt | 20.00 m2 | 13 478,60 Kč |
| 955552 S | Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm | 280.00 m | 4 390,40 Kč |
| 952345 S | Rýha v trávě 35/70-100 | 115.00 m | 38 950,50 Kč |
| 954958 S | Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm | 345.00 m | 33 385,65 Kč |
| 955571 S | Rýha ve vozovce l.asf.50/100rozš.o 10 cm | 55.00 m | 15 186,60 Kč |
| 955570 S | Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 | 55.00 m | 75 842,80 Kč |
| 955053 S | Vytyčení trasy v zastavěném terénu | 170.00 m | 1 847,90 Kč |
| MONTÁŽ | | | |
| 955038 S | Demontáž ochranného boxu pro spojku | 1.00 ks | 615,30 Kč |
| 958303 S | Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba | 122.00 m | 151,28 Kč |
| 958306 S | Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba | 170.00 m | 608,60 Kč |
| 958310 S | Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavb: | 48.00 ks | 17 697,12 Kč |
| 958314 S | Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba | 48.00 ks | 3 661,44 Kč |
| 952649 S | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka | 2.00 ks | 314,50 Kč |
| 952650 S | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka | 158.00 ks | 5 733,82 Kč |
| 952644 S | Měření střídavé během stavby - další čtyřka | 158.00 ks | 3 823,60 Kč |
| 952643 S | Měření střídavé během stavby - první čtyřka | 2.00 ks | 169,36 Kč |
| 955000 S | Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním | 320.00 ks | 9 680,00 Kč |
| 955003 S | Montáž ochranného boxu pro spojku | 1.00 ks | 699,24 Kč |
| 955269 S | Montáž podzemní tratě síťové optické | 612.56 JV | 612,56 Kč |
| deribonizace | | | |
| 955282 S | Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek | 2.00 ks | 3 386,92 Kč |
| 955281 S | Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek | 2.00 ks | 2 298,28 Kč |
| 955945 S | Montáž spojky T (Y) (I) | 2.00 ks | 288,58 Kč |
| 955946 S | Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk. | 14.00 ks | 364,70 Kč |
| 955284 S | Montáž spojky, redukce mechanické rozeb | 2.00 ks | 93,82 Kč |
| 952602 S | Montáž trubky úložné | 170.00 m | 1 994,10 Kč |
| 954990 S | Montáž úložných kabelů do 15 XN | 85.00 m | 1 752,70 Kč |
| 954992 S | Montáž úložných kabelů do 300 XN | 80.00 m | 2 903,20 Kč |
| 958592 S | Provádění PEW v maintenance window | 1.00 ks | 30 857,50 Kč |
| 958557 S | Realizace optické akce-ostatní činnosti | 1.00 ks | 16 273,02 Kč |
| 958331 S | Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síť | 10.00 ks | 3 814,00 Kč |
| 958333 S | Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metropol | 8.00 ks | 4 576,80 Kč |
| 955306 S | Úprava spojky | 1.00 ks | 1 560,41 Kč |
| 958469 S | Uvedení stavby do provozu | 3720.00 JV | 3 720,00 Kč |
| 955942 S | Zafukování svazku trubiček | 85.00 m | 1 962,65 Kč |
| 955952 S | Zafukování/vyfukování mikrokabelu | 239.00 m | 3 040,08 Kč |
| 958558 S | Zkouška trhací | 2.00 ks | 3 051,20 Kč |
| 958556 S | Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m | 1.00 ks | 2 666,09 Kč |
| 958346 S | Zrušení spojky, koncov., průchod.,reduk. | 7.00 ks | 127,05 Kč |
| 955012 S | Zrušení úložné trubky | 160.00 m | 1 264,00 Kč |
| 955042 S | Zrušení úložných kabelů do 300 XN | 120.00 m | 3 051,60 Kč |
| 955040 S | Zrušení úložných kabelů do15 XN | 60.00 m | 800,40 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA | | | |
| 956280 | Předměření trasy nad 100 m do 1km | 70.00 m | 1 236,20 Kč |
| 956279 | Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka | 1.00 ks | 5 430,92 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | | | |
| 956283 S | Doměření trasy nad 100 m do 1km | 70.00 m | 1 045,80 Kč |
| 956282 S | Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka | 1.00 ks | 5 430,92 Kč |
| 955198 S | Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) | 1.00 ks | 2 987,01 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | | | |
| 955313 | Uzavření sml. o SB o VBŘ | 1.00 ks | 2 036,60 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | | | |
| 955315 | Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ | 1.00 ks | 2 443,92 Kč |
| 958085 | Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN | 1.00 ks | 1 839,11 Kč |
| POPLATKY | | | |

| | | | |
|--------|--|-------------|--------------|
| 955367 | Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. | 10000.00 JV | 10 000,00 Kč |
| 955368 | Poplatky k podzemním tratím síť.optickým | 10000.00 JV | 10 000,00 Kč |

Limitka materiálu

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|--|------------------|--|-----------|--------------|
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | | | | |
| 303918 S | | Deska krycí plast. 300x1000 mm | 10.00 ks | 380,20 Kč |
| 303813 S | | Fólie výstražná 330mm PE oranžová | 170.00 m | 751,40 Kč |
| 300106 S | | Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4 | 85.00 m | 2 179,40 Kč |
| 300132 S | | Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,8 | 80.00 m | 78 588,00 Kč |
| 302550 S | | Mini Marker 1401 3M Ball | 12.00 ks | 2 443,92 Kč |
| 312425 S | | Modul konektor. 9700-10P | 64.00 ks | 1 475,84 Kč |
| 310387 S | | Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F | 16.00 ks | 630,08 Kč |
| 323050 S | | Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm | 10.00 ks | 54,40 Kč |
| 408090 S | | Páska speciální 16mmx20m pevnostní | 3.00 ks | 1 095,69 Kč |
| 305356 S | | Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2 | 20.00 ks | 1 086,20 Kč |
| 320141 S | | Průchodka opt.spojky Coyote1vstup11-15mm | 1.00 ks | 710,78 Kč |
| 320058 S | | Průchodka sp.Coyote(6vst.3-6) 1vst.11-15 | 1.00 ks | 710,78 Kč |
| 318806 S | | Spojka I trubky rozšíř.40SRV-M 40 vodot | 1.00 ks | 1 489,43 Kč |
| 312845 S | | Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE | 2.00 ks | 831,50 Kč |
| 320294 S | | Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 | 2.00 ks | 1 600,48 Kč |
| 318979 S | | Spojka trubičky 10mm neprůhledná GABO | 6.00 ks | 510,00 Kč |
| 318980 S | | Spojka trubičky 7mm neprůhledná GABO | 8.00 ks | 680,00 Kč |
| 303003 S | | Spojka trubky HDPE 40mm Plasson | 2.00 ks | 431,76 Kč |
| 319184 S | | Spona trubkySYSPRO | 150.00 ks | 3 055,50 Kč |
| 300633 S | | Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená | 85.00 m | 463,25 Kč |
| 300634 S | | Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená | 85.00 m | 463,25 Kč |
| 300635 S | | Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá | 85.00 m | 463,25 Kč |
| 300623 S | | Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená | 85.00 m | 294,95 Kč |
| 300624 S | | Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená | 85.00 m | 294,95 Kč |
| 300625 S | | Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá | 85.00 m | 294,95 Kč |
| 300626 S | | Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá | 85.00 m | 294,95 Kč |
| 319209 S | | Trubka dělená SYSPRO 160/110 | 25.00 m | 11 540,75 Kč |
| 300027 S | | Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy | 85.00 m | 2 331,55 Kč |
| 300036 S | | Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy | 85.00 m | 2 331,55 Kč |
| 302423 S | | Trubka vrapovaná 110/94 s lankem | 200.00 m | 8 174,00 Kč |
| 308513 S | | Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 | 1.00 ks | 179,08 Kč |
| 305232 S | | Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2 | 10.00 ks | 2 579,70 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | | | | |
| 304267 S | | Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá | 4.00 ks | 0,00 Kč |

**MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR**

Stavební úřad

Žižkovo náměstí 3 • 390 15 Tábor

Telefon: +420 381 486 111

Fax: +420 381 486 100

E-mail: posta@mu.tabor.cz

www.tabor.cz

S00FX006WL16

- dle rozdělovníku -

S00FP007KLSB

č. MFTA 7546/2005/58/01

| | | |
|--------|---------------------|-----------|
| 2 | STAVEBNÍ ÚŘAD TÁBOR | 3. oddok. |
| DOŠLO: | 21-12-2005 | pracovní |
| PRN: | | |
| Č.j.: | | |

ZNAČKA/ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

META

26711/2005/6/SÚ/AD

VYŘIZUJE

Adensamová Petra Ing.

TÁBOR

2005-11-11

Územní rozhodnutí (doručeno veřejnou vyhláškou)

Město Tábor - odbor investic, Žižkovo náměstí č.p. 3, 390 15 Tábor, podali dne 13.října 2004 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby **Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická**: komunikace, lávka pro pěší a cyklisty, kabelové komory a kabelovod, vodovod, přeložky kanalizace a vodovodu, retenční nádrž, přeložky kabelů VN a NN, VO, SSZ a sdělovacích kabelů, protihlukový val a protihluková stěna, Tábor, na pozemcích parc. č. 5982/1, 5982/2, 5982/5, 5982/6, 5982/7, 5982/8, 5982/9, 5982/10, 5982/11, 5982/12, 5982/13, 5982/14, 5982/15, 5982/16, 5982/17, 5209, 5224, 5231/1, 5231/9, 5248/1, 5248/11, 5248/20, 5248/21, 5249, 5250, 5258/1, 5289/5, 5756/1, 5801, kat. území Tábor, parc. č. 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, kat. území Čekanice u Tábora, parc. č. 169/1, 169/2, 1653/1, 1653/2, 1653/3, 1653/4, 1653/5, 1653/6, 1653/7, 1653/8, 1653/9, 1653/10, 1653/11, 1653/12, 1653/14, 1653/16, 1653/17, 1653/18, 1653/19, 1653/20, 1653/21, 1653/22, 1653/23, 1653/24, 1653/25, kat. území Měšice u Tábora.

Městský úřad Tábor, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil návrh podle § 37 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení **vydává** podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,

rozhodnutí o umístění stavby

Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická: komunikace, lávka pro pěší a cyklisty, kabelové komory a kabelovod, vodovod, přeložky kanalizace a vodovodu, retenční nádrž, přeložky kabelů VN a NN, VO, SSZ a sdělovacích kabelů, protihlukový val a protihluková stěna, Tábor na pozemcích parc. č. 5982/1, 5982/2, 5982/5, 5982/6, 5982/7, 5982/8, 5982/9, 5982/10, 5982/11, 5982/12, 5982/13, 5982/14, 5982/15, 5982/16, 5982/17, 5209, 5224, 5231/1, 5231/9, 5248/1, 5248/11, 5248/20, 5248/21, 5249, 5250, 5258/1, 5289/5, 5756/1, 5801, kat. území Tábor, parc. č. 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, kat. území Čekanice u Tábora, parc. č. 169/1, 169/2, 1653/1, 1653/2, 1653/3, 1653/4, 1653/5, 1653/6, 1653/7, 1653/8, 1653/9, 1653/10, 1653/11, 1653/12, 1653/14, 1653/16, 1653/17, 1653/18, 1653/19, 1653/20, 1653/21, 1653/22, 1653/23, 1653/24, 1653/25, kat. území Měšice u Tábora.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba komunikací má několik objektů. Hlavním objektem je komunikační propojení ulic Chýnovská a Vožická, které bude tvořit novou obslužnou místní komunikaci funkční třídy C2 v návrhové kategorii MOK 7,5/50 a délce 1260 m. Dále je nutná úprava křižovatky silnic II/123 a III/4093 pro napojení nové komunikace a zřízení nové křižovatky s komunikací II/137. Dalším objektem je příjezdová komunikace k výrobním areálům, která bude napojena na hlavní trasu komunikačního propojení a nahradí stávající obslužnou komunikaci, součástí této komunikace bude 34 parkovacích stání pro areály (22 + 12), chodník a nové vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí. V rámci stavby dojde i ke dvěma úpravám pěších cest. První je úprava dnešní příjezdové komunikace pro areály a stezky pro pěší a cyklisty, která bude nadále sloužit jako cesta pro pěší a cyklisty a bude přeřata novou komunikací. Druhou je propojovací úsek stezky pro pěší a cyklisty mezi komunikací Na Vojtěchu a polní cestou, včetně zřízení přechodu pro pěší přes hlavní komunikační propoj. Všechny objekty budou umístěny v souladu s koordinační situací č.1, která je součástí tohoto rozhodnutí a v souladu s geometrickými plány č. 2010,548-1029/2003 a č.3785-1029/2003 vypracované Ing.Pavlem Dvořáčkem.
2. Lávka pro pěší a cyklisty je vedena přes novou komunikaci a propojuje přerušenu stezku pro pěší a cyklisty z Měšic do Tábora. Bude mít ocelovou konstrukci s celkovým rozpětím 36,8 m a šířkou chodníku 3,25 m. Umístění bude v souladu s příloženou situací.
3. Kabelovod bude umístěn v km 0,55 v souladu s příloženou situací a bude navržen pro 5 kabelů 22 kV.
4. Součástí komunikací je i jejich odvodnění. V úseku 0,00 po km 0,619 budou dešťové vody svedeny novou propojovací kanalizační stokou DN 300 v délce 38 m do stávající kanalizace v křižovatce s Chýnovskou ulicí, střední část nové komunikace bude odvodněna přes retenční nádrž o objemu 80 m³ novým kanalizačním potrubím DN 400 o celkové délce 353,6 m s napojením na stávající kanalizační sběrač, který je napojen na městskou kanalizaci v ulici Zavadilská. Tento sběrač bude přeložen v úseku „A“ v délce 100 m a v úseku „B“ v délce 268 m. Poslední úsek komunikace bude odvodněn do stávajícího silničního příkopu v křižovatce silnice II/137 Tábor – Mladá Vožice. Umístění objektů bude v souladu se situací č.1 a situací č.2, které jsou součástí tohoto rozhodnutí.
5. V prostoru u areálů výrobních závodů bude provedena přeložka kanalizace DN 300 a kanalizační přípojky DN 200 v celkové délce 51,8 m . Umístění bude v souladu s příloženou situací č. 1.
6. V rámci stavby dojde k propojení vodovodního řádu v ulici Na Vojtěchu a vodovodního řádu v ulici Chýnovská. Propojení bude novým vodovodem z HDPE o vnějším průměru D 225 mm. Umístění bude v souladu s příloženou situací.
7. Stavba si vyžádá pět přeložek vodovodního řádu. Stávající vodovod v Chýnovské ulici bude přeložen v délce 43 metrů (do shybky) pod novou komunikací, kde bude uložen v chráničce. Dále bude přeložena část vodovodu před výrobními areály v délce 45,5 m. Další přeložka bude v km 0,68 v místě polní cesty, kde bude přeložen vodovod v délce 69,0 m kolmo na komunikaci a uložen v chráničce. Vodovodní přípojka pro zahrádkářskou kolonii bude v prostoru pod ochranným valem a komunikací v úseku 32 m přeložena a pod komunikací uložena v chráničce. V místě křížení vodovodní přípojky pro Teplárnu Tábor s komunikací bude přípojka přeložena do chráničky.
8. Podél komunikace Chýnovská je vedena kabelová trasa s kabely 22 kV a kabelem 0,4 kV. Toto vedení bude přeloženo nejprve do provisorní trasy a po dokončení terénních úprav do nové definitivní trasy podél komunikace Chýnovská. Dále bude nutno přeložit přípojku pro zahrádkářskou kolonii, která bude vedena podél zahrad rodinných domů v ulici Na Vojtěchu a v kabelovodu přes komunikaci k zahrádkářské kolonii.

9. Změny v křižovatce ulice Chýnovské si vyžádají překládku osvětlovacího stožáru s osmiramenným výložníkem a dvou stožárů 10m s novým kabelovým připojením.
10. V souvislosti s terénními úpravami dojde k přeložení stožáru a kabelů SSZ při komunikaci II/123.
11. U přechodu pro pěší a cyklisty přes novou komunikaci v km 0,66 bude umístěn varovný blikač. Elektropřípojka pro blikač bude vedena z komunikace Chýnovská podél zahrad rodinných domů v ulici Na Vojtěchu a dále v trase stezky pro pěší a cyklisty.
12. V místě křížení nové komunikace s ulicí Chýnovská jsou vedeny sdělovací kabely 1/800, 1/40 a trubky HDPE. Vzhledem k navrženým úpravám nelze přeložit kabely přímo do konečného umístění a není možné ani přerušit provoz na kabelech. Bude proto provedena provizorní přeložka a po provedení terénních úprav pak přeložka do definitivního umístění. K dalšímu křížení sdělovacího kabelu s novou komunikací dojde v km 0,8, kde bude kabel pouze opatřen chráničkou a dále budou osazeny pod komunikaci nové chráničky, které umožní překládku kabelu bez zásahu do komunikace. Jižně od Vožické ulice je uložen metalický sdělovací kabel, který bude v místě křížení s novou komunikací spuštěn níže a opatřen chráničkou, souběžně bude uložena rezervní chránička. Severně od Vožické ulice je uložen metalický kabel, který bude nutno, vzhledem k plánovanému rozšíření komunikace, přeložit do nové trasy ve větším odstupu od komunikace. Při překládce bude kabel v místě budoucí II. etapy komunikace opatřen chráničkou. Do chráničky bude současně uložen i dálkový optický kabel, který je dále severněji od komunikace a stavba se ho v této etapě jinak nedotýká.
13. V prostoru mezi obytnou zástavbou v ulici Na Vojtěchu a novou komunikací bude zřízen protihlukový zemní val délky 240 m a výšky 2,8 m, který bude ozeleněn. Mezi navrženými komunikacemi a zahradami zahrádkářské kolonie bude zřízena protihluková stěna o výšce 2,0 m a celkové délce 124 m. Umístění objektů bude v souladu s příloženou situací č.1.
14. Při ukládání inženýrských sítí je nutno při souběhu a křížování těchto sítí respektovat minimální vzdálenosti dle ČSN 736005.
15. Před vydáním stavebního povolení budou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí.
16. Před zahájením stavebního řízení bude projednán souhlas vodoprávního úřadu ve smyslu §17 vodního zákona.
17. Budou splněny podmínky souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF vydaného Krajským úřadem Jč kraje - odbor ŽP, zemědělství a lesnictví dne 11.11.2004, č.j. KUIJCK/29373/2004/OZZL/Vr: - Před započatím prací na pozicích budou v terénu vytýčeny hranice záboru. Investor stavby přijme opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli prací. - Skryvka kulturních vrstev zeminy z ploch trvale odňatých ze ZPF bude provedena dle příložené bilance skryvky. Objem skryté kulturní vrstvy půdy z celé odnímané plochy činí cca 6200 m³. Na vlastní výstavbu komunikace (ochranný protihlukový val, svahy a terénní sadové úpravy) bude zpětně využito cca 4100 m³. Zbylé množství zeminy v objemu cca 2100 m³ bude po dohodě se Školním statkem Měšice využito na úpravy a dorovnání jeho okolních pozemků. - Skrytá ornice bude deponována na některé z parcel vyjmutých ze ZPF tímto souhlasem. Odvoz zeminy a její rozprostření na určených pozemcích provede investor na vlastní náklady (§8 odst.1 písm.a zákona). - Odvoz skryté ornice a její rozprostření na pozemcích k tomu určených, včetně jejího využití pro následné úpravy staveniště, budou dokončeny nejpozději do doby kolaudace stavby. - Deponovaná zemina bude zajištěna před znehodnocením a ztrátami. - O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s ustanovením § 10 odstavce 2 vyhlášky MŽP č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. - Investor a dodavatelé prací učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. - Dojde-li vlivem realizace rekultivačních prací k poškození vodních poměrů a na okolních pozemcích, či negativnímu ovlivnění funkcí melioračního zařízení, zajistí investor stavby nápravu.

18. Budou splněny podmínky dotčených orgánů státní správy:

Policie CR ODI Tábor ze dne 25.02.2004, č.j. ORTA-12-30/DS-2004:

- požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro stavební řízení k vyjádření. Součástí této dokumentace bude návrh dopravního značení, dopravně-inženýrských opatření pro výstavbu a organizace staveništní dopravy

MěÚ Tábor – odbor ŽP ze dne 03.02.2004, č.j. ŽP 699/04 a ze dne 07.04.2005, č.j. META 16590/2005/2/OŽP/On:

- z hlediska veřejné zeleně se jeví jako vhodnější varianta „A“ s tím, že je žádoucí změnit použití tamaryšku, který v našich podmínkách trpí vymrzáním. Vhodnější by bylo nahradit jej např. kalinou vrásčitolistou, či jiným podobným druhem.
- Pokud budou káceny stávající dřeviny, je nutno postupovat dle §8 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
- Přeložky sítí (vodovodů a kanalizací) podléhají vydání stavební povolení k němuž je příslušný zdejší vodoprávní úřad. Žádost o povolení je nutno doložit podklady specifikovanými ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
- při realizaci tohoto záměru je třeba respektovat zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými právními předpisy, kterými jsou zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a na něj následně navazující právní předpisy, především vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

HZS Jč kraje – územní odbor Tábor ze dne 10.02.2004, č.j. HSCB-69/104/TA-Šř-2004:

- bude zachováno stávající dopravní zařízení pro umožnění výjezdu požárních vozidel dle vyhl. č.30/2001 Sb., (dopr.zn.S-13) včetně rozšíření na nové dopravní řešení.
- Během výstavby je nutné zajistit stálé telefonní spojení v nezbytném rozsahu pro činnost HZS, zejména tísňových volání.
- S HZS JčK je nutno projednat zajištění výjezdu požárních vozidel při uzavření stávající křižovatky a dále rozsah a způsob úprav plotu areálu HZS v Měšicích.

KHS Jč kraje – územní pracoviště Tábor ze dne 06.02.2004, č.j. 0292/2004/Koh a ze dne 13.01.2005 pod č.j. 0042/2005/Koh:

- při vlastní stavbě budou realizována v hlukové studii (DINPROJEKT, Praha 9, Ing. Karel Horníček ze dne 10.12.2004) uvedená opatření k zajištění požadavků daných nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění tj. protihluková stěna 2m vysoká v délce 123 m se zalomením podél příjezdové komunikace + navýšení původně navrženého protihlukového valu na 2,8 m v délce 240 m
- dostatečná účinnost navržených a při vlastní stavbě realizovaných protihlukových opatření bude ověřena měřeními a vyhovujícími výsledky měření hluku ve venkovním chráněném prostoru budou předloženy ke kolaudaci stavby
- navržená protihluková opatření budou zahrnuta do projektu stavby jako součást stavby a budou realizována nejpozději k termínu dokončení vlastní stavby
- u materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou použitých pro rekonstrukce a přeložky stavbou dotčených vodovodních řadů bude zajištěna a ke kolaudaci dokladována jejich zdravotní nezávadnost ve smyslu požadavků daných §5 resp. 102 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 37/2001 Sb., rovněž ke kolaudaci stavby budou doloženy vyhovující výsledky krácených rozborů vzorků pitné vody dle vyhlášky č. 376/2000 Sb. odebraných z těchto dotčených vodovodních řadů

MěÚ Tábor – odbor rozvoje ze dne 25.11.2004, č.j. OR 3116/2004/Bá:

- v případě, že při zemních pracích dojde k zachycení archeologického nálezu, je nutné po § 23 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, aby se stavebník ihned obrátil na archeologické pracoviště Husitského muzea v Táboře

(PhDr. Rudolf Krajíc, Csc, tel.: 381252242, 602425344), nález nahlásil a umožnil provedení záchranného archeologického průzkumu.

Drážní úřad – sekce stavební, oblast Plzeň ze dne 26.10.2005, č.j. 30-0994/05-DÚ/Kn:

- protože stavba zasáhne do ochranného pásma dráhy – vlečky, tj. do vzdálenosti 60 m kolmo od osy krajní traťové koleje (30 m kolmo od osy vlečkové koleje), Drážní úřad, oblast Plzeň jako drážní úřad podle §54 zákona č. 266/94 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, musí vydat souhlas na základě žádosti stavebníka. Souhlas se stavbou vydává Drážní úřad před zahájením stavebního řízení.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelé Město Tábor - odbor investic podali dne 13.10.2004 u zdejšího stavebního úřadu návrh na umístění stavby Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická: komunikace, lávka pro pěší a cyklisty, kabelové komory a kabelovod, vodovod, přeložky kanalizace a vodovodu, retenční nádrž, přeložky kabelů VN a NN, VO, SSZ a sdělovacích kabelů, protihlukový val a protihluková stěna, na pozemcích parc. č. 5982/1, 5982/2, 5982/5, 5982/6, 5982/7, 5982/8, 5982/9, 5982/10, 5982/11, 5982/12, 5982/13, 5982/14, 5982/15, 5982/16, 5982/17, 5209, 5224, 5231/1, 5231/9, 5248/1, 5248/11, 5248/20, 5248/21, 5249, 5250, 5258/1, 5289/5, 5756/1, 5801, kat. území Tábor, parc. č. 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, kat. území Čekanice u Tábora, parc. č. 169/1, 169/2, 1653/1, 1653/2, 1653/3, 1653/4, 1653/5, 1653/6, 1653/7, 1653/8, 1653/9, 1653/10, 1653/11, 1653/12, 1653/14, 1653/16, 1653/17, 1653/18, 1653/19, 1653/20, 1653/21, 1653/22, 1653/23, 1653/24, 1653/25, kat. území Měšice u Tábora.

Vzhledem k tomu, že se jedná o územní řízení týkající se rozsáhlého území, stavební úřad oznámil zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou svým opatřením ze dne 19.října 2004. Oznámení zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu a obce Tábor od 22.10.2004 do 15.11.2004. Současně stavební úřad k projednávání návrhu nařídil ústní jednání na den 22.listopadu 2004, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Protože řešení odvodnění a protihluková studie nebyly shledány při jednání dostačující, byli navrhovatelé dne 7.prosince 2004 vyzváni k doplnění návrhu a územní řízení bylo přerušeno. Rozhodnutí o přerušení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu a obce Tábor od 08.12.2004 do 23.12.2004. Návrh byl zcela doplněn dne 22.srpna 2005. Účastníci řízení byli seznámeni s doplněním podkladů pro vydání územní rozhodnutí. Oznámení o doplnění podkladů pro územní rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu a obce Tábor od 09.09.2004 do 24.09.2004. Připomínky k doplněným podkladům mohly být podány nejpozději při ústním jednání, které se konalo dne 10.10.2005 a o jeho výsledku byl sepsán protokol. Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- vyjádřením KHS JČ – územní pracoviště Tábor, vydaný dne 13.01.2005 pod číslem jednacím 0042/2005/Koh, a ze dne 06.02.2004 pod č.j. 0292/2004/Koh z hlediska ochrany veřejného zdraví
- vyjádřením HZS JČ – územní odbor Tábor, vydaným dne 10.02.2004 pod číslem jednacím HSCB-69/104/TA-Šř-2004, z hlediska protipožární ochrany.
- souhlasem vydaným KÚ Jč.kraje – odbor ŽP dne 11.11.2004 pod číslem jednacím KUJCK/29373/2004/OZZL/Vr, s odnětím budoucí zastavěné plochy pozemků parc. č. 5982/1, 5982/2, 5982/5, 5982/6, 5982/7, kat. území Tábor, parc. č. 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, kat. území Čekanice u Tábora, parc. č. 1653/1, 1653/2, 1653/3, 1653/4, 1653/5, 1653/7, 1653/8, 1653/9, 1653/10, 1653/14, kat. území Měšice u Tábora, ze zemědělského půdního fondu.
- povolením ČEPS a.s. vydaným dne 26.03.2004 pod číslem jednacím 64/04

- vyjádřením Drážního úřadu sekce stavební Plzeň vydaným dne 26.10.2005 pod číslem jednacím 30-0994/05-DÚ/K_n
- vyjádřením MěÚ Tábor – odbor ŽP vydaným dne 07.04.2005 pod číslem jednacím META 16590/2005/2/OŽP/On a ze dne 03.02.2004 pod č.j. ŽP 699/04
- vyjádřením MěÚ Tábor – odbor rozvoje vydaným dne 25.11.2004 pod číslem jednacím OR 3116/2004/Bá a ze dne 04.02.2004 pod č.j. OR 224/2004-Vr
- vyjádřením MěÚ Tábor – odbor dopravy vydaným dne 09.02.2004 pod číslem jednacím OD/180/04/sta.řízení/22
- vyjádřením MěÚ Tábor – odbor SMM vydaným dne 16.09.2005 a ze dne 06.10.2004
- vyjádřením Policie ČR – ODI Tábor vydaným dne 25.02.2004 pod číslem jednacím ORTA-12-30/DS-2004
- vyjádřením Zemědělské vodohospodářské správy Tábor vydaným dne 13.02.2004 pod číslem jednacím 195/04
- vyjádřením SÚS Tábor vydaným dne 20.02.2004 pod číslem jednacím 289/2004 a ze dne 03.10.2005, č.j. 1815/2005 a ze dne 11.05.2004
- vyjádřením Povodí Vltavy s.p. České Budějovice vydaným dne 25.02.2004 pod číslem jednacím 1813/04/142-P
- vyjádřením Teplárny Tábor a.s. vydaným dne 17.03.2004 pod číslem jednacím RT/VP/01/04 a dne 23.09.2005
- vyjádřením JČE a.s. Tábor vydaným dne 01.03.2004 pod číslem jednacím 20/2004/Bh a pod č.j. DP/48.4
- vyjádřením Technických služeb Tábor s.r.o. vydaným dne 28.01.2004
- vyjádřením VaK JČ a.s. divize Tábor vydaným dne 23.02.2004 pod číslem jednacím 261/Tú/11/Kt/2004 a ze dne 24.02.2004
- vyjádřením JČE a.s. telekomunikace České Budějovice vydaným dne 25.03.2003 pod číslem jednacím ITK/ADGT
- vyjádřením Českého Telecomu a.s. vydaným dne 16.02.2004 pod číslem jednacím 20045/04/TA/POS a ze dne 13.02.2004 pod č.j. 435/04/TA/VO
- vyjádřením Jihočeské plynárenské a.s. vydaným dne 16.04.2004 pod číslem jednacím 12245
- vyjádřením E.ON ČR a.s. vydaným dne 07.10.2005
- vyjádřením ÚZSvVM Tábor vydaným dne 10.03.2004
- vyjádřením JČ KÚ – odbor majetkový vydaným dne 02.11.2004 pod číslem jednacím KUJCK 29306/04 OMAJ
- vyjádřením TAGRAS s.r.o. Tábor vydaným dne 06.10.2005
- vyjádřením izomat Praha s.r.o. vydaným dne 18.10.2005.
- vyjádřením AL INVEST Břidličná a.s. vydaným dne 07.10.2005
- vyjádřením Pozemkového fondu ČR vydaným dne 07.10.2005 pod číslem jednacím 5893/05 a dne 10.03.2004
- vyjádřením samosprávy městské části Měšice
- vyjádřením Strojírny Tábor vydaným dne 15.03.2004
- vyjádřením ČSCH z.o. Tábor vydaným dne 01.03.2004
- vyjádřením ČZS z.o. Tábor vydaným dne 25.02.2004
- vyjádřením Památek Tábor s.r.o. vydaným dne 16.02.2004

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Ve stanovené lhůtě do 10.10.2005 nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.

Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schváleného územního plánu sídelního útvaru Tábor (schváleno MZ Tábor dne 1.6.1994). Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 137/1998 Sb.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.



Ing. Jitka Doležalová
vedoucí stavebního úřadu

Příloha :

- ověřený situační výkres v měř. 1:1000 – díl 1 a díl 2

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů (na úřední desce stavebního úřadu a obce Tábor)

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Doručí se:**Účastníci řízení: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)**

Město Tábor - odbor investic, Žižkovo náměstí č.p. 3, 390 15 Tábor

Město Tábor, odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 3, 390 15 Tábor

- vlastníci dotčených a sousedních nemovitostí, správci inženýrských sítí a ostatní účastníci řízení:
doručeno veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány státní správy (na vědomí)

KHS JČK územ.pracoviště Táb, Palackého č.p. 350, 390 01 Tábor

Policie ČR DI, Soběslavská č.p. 2763, 390 05 Tábor

Městský úřad - odbor dopravy, Žižkovo náměstí č.p. 3, 390 01 Tábor

Městský úřad - odbor ŽP, Husovo náměstí č.p. 2938, 390 01 Tábor


MěÚ Tábor - odbor rozvoje, Žižkovo náměstí č.p. 3, 390 01 Tábor

HZS Jihočeského kraje, Chýnovská č.p. 276, 390 04 Tábor

2 x MěÚ Tábor – odbor vnitřních věcí (se žádostí o vyvěšení po dobu 15ti dnů)

1 x spis zde

Toto rozhodnutí bylo provedeno
dnem 2005.

2 0. pros. 2005 podpis: 

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBOR
- 28 -

**MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR**

Stavební úřad

Žižkovo náměstí 2 • 390 15 Tábor

Telefon: +420 381 486 111

Fax: +420 381 486 100

E-mail: posta@mu.tabor.czwww.tabor.cz

ST.

S00FX009IJ3X

- dle rozdělovníku -

Číslo jednací META 26711/2005 SÚ/Ad 9
Vyřizuje Adensamová Petra Ing.

Tábor
2006-10-02

Věc: oprava chyby psaní

Městský úřad v Táboře, stavební úřad, vydal dne 11.11.2005 pod č.j. META 26711/2005/6/SÚ/Ad územní rozhodnutí o umístění stavby Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická: komunikace, lávka pro pěší a cyklisty, kabelové komory a kabelovod, vodovod, přeložky kanalizace a vodovodu, retenční nádrž, přeložky kabelů VN a NN, VO, SSZ a sdělovacích kabelů, protihlukový val a protihluková stěna, Tábor, navrhovatel Město Tábor - odbor investic, Žižkovo náměstí č.p. 3, 390 15 Tábor.

Při administrativním zpracování rozhodnutí došlo k chybnému označení čísel pozemků na straně 1 rozhodnutí.

Dle ustanovení § 47 odst. 6 správního řádu č. 71/1967 Sb. chyby v psaní, počtech a jiné zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení rozhodnutí, správní orgán kdykoli a bez návrhu opraví a vyzoomí o tom účastníky řízení.


Stavební úřad MěÚ Tábor, o p r a v u j e uvedenou chybu takto:

Město Tábor - odbor investic, Žižkovo náměstí č.p. 3, 390 15 Tábor, podali dne 13.října 2004 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická: komunikace, lávka pro pěší a cyklisty, kabelové komory a kabelovod, vodovod, přeložky kanalizace a vodovodu, retenční nádrž, přeložky kabelů VN a NN, VO, SSZ a sdělovacích kabelů, protihlukový val a protihluková stěna, Tábor, na pozemcích parc. č. 5982/1, 5982/2, 5982/5, 5982/6, 5982/7, 5982/8, 5982/9, 5982/10, 5982/11, 5982/12, 5982/13, 5982/14, 5982/15, 5982/16, 5982/17, 5985/3, 5985/4, 5209, 5224, 5231/1, 5231/9, 5248/1, 5248/11, 5248/20, 5248/21, 5249, 5250, 5258/1, 5289/5, 5293/6, 5307/1, 5307/2, 5313/2, 5756/1, 5801, kat. území Tábor, parc. č. 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 881/5, 881/6, kat. území Čekanice u Tábora, parc. č. 169/1, 169/2, 1653/1, 1653/2, 1653/3, 1653/4, 1653/5, 1653/6, 1653/7, 1653/8, 1653/9, 1653/10, 1653/11, 1653/12, 1653/14, 1653/16, 1653/17, 1653/18, 1653/19, 1653/20, 1653/21, 1653/22, 1653/23, 1653/24, 1653/25, 1653/27, 1653/28, 1653/29, 1653/32, 1653/33, 1653/34, 1653/35, 1653/36, 1653/37, 1653/38, 1653/30, 1653/31 kat. území Měšice u Tábora.

Tato oprava je nedílnou součástí stavebního povolení vydaného dne 11.11.2005 pod č.j. 26711/2005/6/SÚ/Ad.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBOR

- 30 -


Ing. Jitka Dolezalová
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se:

Účastníci řízení: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)

Město Tábor - odbor investic, Žižkovo náměstí č.p. 3, 390 15 Tábor

- vlastníci dotčených a sousedních nemovitostí, správci inženýrských sítí a ostatní účastníci řízení:
doručeno veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány státní správy (na vědomí)

KHS JČK územ.pracoviště Táb, Palackého č.p. 350, 390 01 Tábor

Policie ČR DI, Soběslavská č.p. 2763, 390 05 Tábor

Městský úřad - odbor dopravy, Žižkovo náměstí č.p. 3, 390 01 Tábor

Městský úřad - odbor ŽP, Husovo náměstí č.p. 2938, 390 01 Tábor

MĚÚ Tábor - odbor rozvoje, Žižkovo náměstí č.p. 3, 390 01 Tábor

HZS Jihočeského kraje, Chýnovská č.p. 276, 390 04 Tábor

MĚÚ Tábor - odbor vnitřních věcí (se žádostí o vyvěšení po dobu 15ti dnů)

1 x spis zde



MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR

Odbor dopravy

Žižkovo náměstí 2 • 390 15 Tábor

Telefon: +420 381 486 111

Fax: +420 381 486 100

E-mail: posta@mu.tabor.cz

www.tabor.cz

S00FX009ER08

Číslo jednací S-META 53646/2006 OD/Ku 4
Vyřizuje Kukač František

Tábor
20.11.2006

STAVEBNÍ POVOLENÍ

DORUČENO VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Dne 08.09.2006 obdržel Městský úřad Tábor, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad, žádost právnické osoby **Město Tábor, Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor** o vydání stavebního povolení na stavbu „**Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická**“, objekt č.

101 A- komunikační propojení Chýnovská – Vožická, km 0,144 00 – 0,415 00 včetně rekultivace ploch

101 B- komunikační propojení Chýnovská – Vožická, km 0,415 00 - 1,403 76

102 - Úprava křižovatky silnic II/123 a III/4093 (ul. Chýnovská)

103 - Příjezdová komunikace k výrobnímu areálu

104 - Úprava stávající komunikace k lávce

105 - Úprava silnice II/137 (ul. Vožická)

111 - Stezka pro pěší a cyklisty za protihlukovým valem

191 - Protihlukový val včetně protierozních opatření a ozelenění

701 - Protihluková stěna

201 - Lávka pro pěší

211 - Opěrná zeď u Logistického centra

002 - Bourání vozovek

kteřá je umístěna na pozemcích parc. číslo KN 881/1 (KN 569 PK 1186/1) 881/2, 881/3 vše k.ú.Čekanice u Tábora, obec Tábor, KN 1653/1, 1653/2, 1653/3 1653/4, 1653/5, 1653/6, 1653/7, 1653/ 8, 1653/12, 1653/16, 1653/17, 1653/19, 1653/23, 1653/24, 1653/25, 1653/26, 1653/27, 1653/28, 1653/29, 1653/30, 1653/31, 1653/32, 1653/33, 1653/34, 1653/35, 1653/36, 1653/37, 1653/38, vše k.ú. Měšice u Tábora, obec Tábor, KN 5985/1, 5985/2, 5985/3, 5985/4, 5985/5, 5985/6, 5985/7, 5985/9, 5985/10, 5985/11, 5985/12, 5985/13, 5985/14, 5985/15, 5985/16, 5985/17, 5985/18 vše k.ú. Tábor, obec Tábor.

Městský úřad Tábor, odbor dopravy – obec s rozšířenou působností (dle zákona č. 314/2002Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností) jako místně a věcně příslušný – speciální stavební úřad (dle § 10 a 11 zákona č.

500/2004 Sb., správní řád) ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. d) v návaznosti na § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na ustanovení § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) projednal podle § 61 a 62 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon žádost ve stavebním řízení a na základě § 66 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona rozhodl takto:

Právnícké osobě – stavebníkovi:

Městu Tábor, Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor

s e stavba

Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická, objekt č.

- 101 A- komunikační propojení Chýnovská – Vožická, km 0,144 00 – 0,415 00 včetně rekultivace ploch
- 101 B- komunikační propojení Chýnovská – Vožická, km 0,415 00 - 1,403 76
- 102 - Úprava křižovatky silnic II/123 a III/4093 (ul. Chýnovská)
- 103 - Příjezdová komunikace k výrobnímu areálu
- 104 - Úprava stávající komunikace k lávce
- 105 - Úprava silnice II/137 (ul. Vožická)
- 111 - Stezka pro pěší a cyklisty za protihlukovým valem
- 191 - Protihlukový val včetně protierozních opatření a ozelenění
- 701 - Protihluková stěna
- 201 - Lávka pro pěší
- 211 - Opěrná zeď u Logistického centra
- 002 - Bourání vozovek

p o v o l u j e

Stavba „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“, objekt č.

- 101 A- komunikační propojení Chýnovská – Vožická, km 0,144 00 – 0,415 00 včetně rekultivace ploch
- 101 B- komunikační propojení Chýnovská – Vožická, km 0,415 00 - 1,403 76
- 102 - Úprava křižovatky silnic II/123 a III/4093 (ul. Chýnovská)
- 103 - Příjezdová komunikace k výrobnímu areálu
- 104 - Úprava stávající komunikace k lávce
- 105 - Úprava silnice II/137 (ul. Vožická)
- 111 - Stezka pro pěší a cyklisty za protihlukovým valem
- 191 - Protihlukový val včetně protierozních opatření a ozelenění
- 701 - Protihluková stěna
- 202 - Lávka pro pěší
- 211 - Opěrná zeď u Logistického centra
- 002 - Bourání vozovek

která je umístěna na pozemcích parc. číslo KN 881/1 (KN 569 PK 1186/1) 881/2, 881/3 vše k.ú.Čekanice u Tábora, obec Tábor, KN 1653/1, 1653/2, 1653/3 1653/4, 1653/5, 1653/6, 1653/7, 1653/ 8, 1653/12, 1653/16, 1653/17, 1653/19, 1653/23, 1653/24, 1653/25, 1653/26, 1653/27, 1653/28, 1653/29, 1653/30, 1653/31, 1653/32, 1653/33, 1653/34, 1653/35, 1653/36, 1653/37, 1653/38, vše k.ú. Měšice u Tábora, obec Tábor, KN 5985/1, 5985/2, 5985/3, 5985/4, 5985/5,

5985/6, 5985/7, 5985/9, 5985/10, 5985/11, 5985/12, 5985/13, 5985/14, 5985/15, 5985/16, 5985/17, 5985/18 vše k.ú. Tábor, obec Tábor.

Stavba bude obsahovat výstavbu místní komunikace III. třídy, funkční skupiny C, jako obousměrná, dvou pruhová s šířkou jízdních pruhů 2 x 3m, vodíci proužky 2 x 0,25m, a nezpevněnou krajnicí 2 x 0.50m + 0,25m pro osazení sloupků. Navrhovaná hlavní trasa zajišťuje propojení dvou stávajících průjezdních úseků silnic II/123 na východě a na severu II/137 v celkové délce 1260m. Odvodnění místní komunikace je zajištěno podélným a příčným spádováním komunikačních ploch do oboustranně vedeného silničního příkopu.

Ochrana přiléhající zástavby RD v ul. Na Vojtěchu proti hluku je zajištěna protihlukovým zemním valem v délce cca 240m s výškou v koruně 2,8 m s protierozními úpravami a ozeleněním.

Propojení mezi Měšicemi a centrem města, podél Chýnovské ul., přes zářez nad hlavní trasou je překlenut lávkou pro pěší a cyklisty v délce 36,8m a šíři 3,6m mezi zábradlím výšky 1,30m. Objekt lávky je navržen v ocelové konstrukci o třech polích.

V úseku cca km 1.043 až 1,090 je vlevo ve směru staničení vložena gabionová opěrná zeď v délce 47m nad kterou je spolu s přilehlými úseky osazeno silniční ocelové svodidlo v délce 120m.

Nová příjezdová komunikace k výrobnímu areálu Strojírny Tábor s.r.o., Památek Tábor s.r.o. a dalších přilehlých nemovitostí se připojuje na nově budovanou komunikaci ve staničení km 0,437 novou stykovou křižovatkou. Součástí obslužné komunikace je pruh pro parkování před vstupy do jednotlivých areálů, počet parkovacích míst 34. Na straně při oplocení výrobních areálů je veden chodník v šíři 2,0m

Druh a účel stavby

Stavba je umístěna na výše uvedených pozemcích dle dokladů opírajících se o výpisy z katastru nemovitostí, snímky pozemkových map, vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy. Jedná se o výstavbu obslužné, místní komunikace III. třídy, funkční skupiny C, pod označením C3, kategorie MO 2k/-/ 7,5/50, která je navržena jako obousměrná, dvou pruhová s šířkou jízdních pruhů 2 x 3m, vodíci proužky 2 x 0,25m, a nezpevněnou krajnicí 2 x 0.50m + 0,25m pro osazení sloupků. Navrhovaná hlavní trasa zajišťuje propojení dvou stávajících průjezdních úseků silnic II/123 na východě a na severu II/137 v celkové délce 1260m. Komunikace bude zajišťovat připojení nově budované průmyslové zóny s logistickým centrem a umožňuje lepší přerozdělení přepravních vztahů na východním obvodu města. Odvodnění místní komunikace je zajištěno podélným a příčným sklonem 2,5% do oboustranně vedeného silničního příkopu.

Ochrana přiléhající zástavby RD v ul. Na Vojtěchu proti hluku je zajištěna protihlukovým zemním valem v délce cca 240m s výškou v koruně 2,8 m s protierozními úpravami a ozeleněním.

Propojení mezi Měšicemi a centrem města, podél Chýnovské ul., přes zářez nad hlavní trasou je překlenut lávkou pro pěší a cyklisty v délce 36,8m a šíři 3,6m mezi zábradlím výšky 1,30m. Objekt lávky je navržen v ocelové konstrukci o třech polích.

V úseku cca km 1.043 až 1,090 je vlevo ve směru staničení vložena gabionová opěrná zeď v délce 47m nad kterou je spolu s přilehlými úseky osazeno silniční ocelové svodidlo v délce 120m

Nová příjezdová komunikace k výrobnímu areálu Strojírny Tábor s.r.o., Památek Tábor s.r.o. a dalších přilehlých nemovitostí se připojuje na nově budovanou komunikaci ve staničení km 0,437 novou stykovou křižovatkou. Součástí obslužné komunikace je pruh pro parkování před vstupy do jednotlivých areálů, počet parkovacích míst 34. Na straně při oplocení výrobních areálů je veden chodník v šíři 2,0m a příčným sklonem min. 2% ke komunikaci. Odvodnění místní komunikace je zajištěno pomocí typových prefabrikovaných uličních vpustí.

Rozsah stavby je dán předloženou projektovou dokumentací vypracovanou Ateliérem PROMIKA s.r.o., Milady Horákové 103/66, 160 00 Praha 6, ČKAIT - 0100109 ověřené spec. stavebním úřadem ve stavebním řízení.

Podmínky pro provedení stavby, které jsou závazné pro stavebníka:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. číslo KN 881/1 (KN 569 PK 1186/1) 881/2, 881/3 vše k.ú. Čekanice u Tábora, obec Tábor, KN 1653/1, 1653/2, 1653/3 1653/4, 1653/5, 1653/6, 1653/7, 1653/ 8, 1653/12, 1653/16, 1653/17, 1653/19, 1653/23, 1653/24, 1653/25, 1653/26, 1653/27, 1653/28, 1653/29, 1653/30, 1653/31, 1653/32, 1653/33, 1653/34, 1653/35, 1653/36, 1653/37, 1653/38, vše k.ú. Měšice u Tábora, obec Tábor, KN 5985/1, 5985/2, 5985/3, 5985/4, 5985/5, 5985/6, 5985/7, 5985/9, 5985/10, 5985/11, 5985/12, 5985/13, 5985/14, 5985/15, 5985/16, 5985/17, 5985/18 vše k.ú. Tábor, obec Tábor, ke kterým má investor vlastnické a užívatelské právo a souhlasy vlastníků s výstavbou komunikace na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví stavebníka. Jedná se o pozemky (dle GP) p.č. 5985/7 ve vlastnictví státu, p.č. 5985/12 a 5985/17 ve vlastnictví Jihočeského kraje a p.č. 881/1 ve vlastnictví p. Veselého. Případné změny stavby oproti ověřené projekt. dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu a povolení příslušného speciálního stavebního úřadu.
2. Za dodržení předpisů o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci odpovídá při stavbě prováděné dodavatelsky provádějící stavební organizace. Zejména dodržovat vyhlášku č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
3. Uzavírku stávající silnice a místní komunikace lze provést jen na základě zvláštního povolení vydávané ve správním řízení odborem dopravy Městského úřadu v Táboře.
4. Se stavbou je možno započít až po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.
5. Provozem vozidel stavby nesmí být poškozovány a zejména znečišťovány veřejné komunikace.
6. Toto stavební povolení pozbude platnosti, nebude-li stavba zahájena do 2 let od právní moci tohoto stavebního povolení.
7. Stavba bude dokončena do 31.12.2009.
8. Skladování stavebního materiálu a používání sousedních pozemků je přípustné jen na základě povolení vlastníka.
9. Před zahájením prací budou vytyčena veškerá možná podzemní vedení, která se ve staveništi nachází.
10. Stavebník při výstavbě komunikace je vázán především dodržování zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 104/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dále příslušné ČSN a technologické postupy.
11. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.
12. Bude dodržen § 47 zákona č. 50/1976 Sb., týkající se vlastností výrobků pro stavbu. Stavebník předloží při kolaudaci doklady týkající se prováděných zkoušek zhutnění.
13. Před zahájením stavby, přístavby, terénních úprav a těžebních prací na povrchu musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry – § 75 zákona č. 50/1976 Sb. a zákon č. 200/1994 Sb.

14. Po dokončení stavby bude provedeno její zaměření – vyhotoven geometrický plán včetně uložení na disketu, který bude přiložen stavebníkem k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí. Geometrický plán bude vyhotoven podle předpisů katastru nemovitostí. Na správním území města Tábora musí být vyhotovena v souladu se zněním „Směrnice pro tvorbu a údržbu DTMM-JIH“. Text směrnice poskytne zpracovateli dokumentace odbor rozvoje, p. Michal Vrba, tel. 381486205, e- mail vrba@mu.tabor.cz.

15. Stavbu bude provádět jen právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu podnikání podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby (§ 44 zák. 50/1976 Sb., stavební zákon).

16. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště Tábor, Palackého 350, 390 01 Tábor, zn.: 602182/2006/HOK. TA ze dne 14.07.2006:

a) účinnost v projektu stavby navržených protihlukových opatření, dle zpracovaných hlukových studií, které budou realizovány nejpozději se stavbou hlavní jako součást projektu stavby, bude ověřena měřením v reálném (zkušebním) provozu a vyhovující výsledky měření budou předloženy ke kolaudaci stavby.

b) u materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou používaných pro přeložky vodovodních sítí bude zajištěna a kuvedení těchto dílčích staveb do provozu dokladována jejich zdravotní nezávadnost ve smyslu požadavků daných § 5 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb. Před jejich zprovoznění budou KHS předloženy vyhovující výsledky krácených rozborů vzorků pitné vody dle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, odebraných z těchto nových částí vodovodů.

17. Chodníky v místech přechodu, přes vjezdy, sjezdy k jednotlivým nemovitostem budou realizovány v souladu s požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. U vyznačených přechodů pro chodce budou varovné a signální pásy, v místě přechodu bude obrubník snížen na 20 mm nad niveletu komunikace.

18. K žádosti o kolaudační řízení předloží stavebník dokumentaci skutečného provedení stavby „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“, objekt č.

101 A- komunikační propojení Chýnovská – Vožická, km 0,144 00 – 0,415 00 včetně rekultivace ploch

101 B- komunikační propojení Chýnovská – Vožická, km 0,415 00 - 1,403 76

102 - Úprava křižovatky silnic II/123 a III/4093 (ul. Chýnovská)

103 - Příjezdová komunikace k výrobnímu areálu

104 - Úprava stávající komunikace k lávce

105 - Úprava silnice II/137 (ul. Vožická)

111 - Stezka pro pěší a cyklisty za protihlukovým valem

191- Protihlukový val včetně protierozních opatření a ozelenění

701 - Protihluková stěna

203 - Lávka pro pěší

211 - Opěrná zeď u Logistického centra

002 - Bourání vozovek

19. Budou dodrženy podmínky stanoviska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391 56 Tábor, Č.j.: HSCB-681/614/TA-Šř-2006 ze dne 25.08.2006:

- a) v rámci stavebních úprav křižovatky a předpokládané překládky kabelů je nutné pro výjezdy do všech projektovaných směrů osadit stožáry se semaforey, umožňující bezpečný a rychlý výjezd těžké požární techniky.
- b) doporučujeme zvážit možnost úpravy signalizačních zařízení pro výjezd vozidel PO tak, aby nebyla vyloučena možnost signalizaci ovládat selektivně v závislosti na směru výjezdu vozidel, což by umožňovalo zablokování silničního provozu pouze v předem definovaném směru, který bezpečný výjezd vozidel HZS umožní a ostatní účastníky silničního provozu neomezí.

20. Budou dále dodrženy podmínky ve vyjádřeních správců sítí:

A) vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Pražská 16, 370 04 České Budějovice

č. j.: 157477/06/CCB/VV0 ze dne 02.10.2006

Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména:

- a) Stavba vyvolá provádění ochrany a přeložek podzemních vedení komunikační sítě. V příloze Vám zasílám „Základní podmínky společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. pro realizaci přeložky PVKS...“ . pro bližší vysvětlení kontaktujte pracoviště ochrany sítě v J. Hradci, panu Málu, tel. 724 216 554.
- b) Při činnostech v blízkosti vedení VKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PVKS) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče.“
- c) Před započatím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§18, vyhl. 324/1990Sb.). Elektromagnetické vytyčení PVKS je též možno objednat u společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací.
- d) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVKS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- e) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě. **Kontakt: J. Mála, tel. 724 216 554 (dále POS).** V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§19, odst. 5, vyhl. 324/1990 Sb., čl. 56, ČSN 743050)

h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

i) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

j) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

k) Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.) Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

m) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby s VKS: provoz sítě České Budějovice-ochrana sítě – Pražská 2239/16,370 04 České Budějovice, 724 216 554.

n) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084 (pro Prahu volejte 241 400 500).

B) vyjádření Jihočeské energetiky, a.s., provozní správa Tábor, 390 02 Tábor ze dne 02.11.2005,

V zájmovém území se nachází nadzemní vedení VN a NN, podzemní kabely NN 0,4 kV, které budou před započítím prací vytýčeny – zajistí stavebník.

Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Výjimky trvalého charakteru z OP povoluje ECR na základě žádosti investora stavby. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné rozvodné zařízení, jste povinni dle zákona č. 324/90 sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON ze dne 02.11.2005.

Před započítím zemních prací nechá stavebník kabely vytýčit !

C) Budou dodrženy podmínky stanoviska ČEPS, a.s., Provozní správa Střed, TR Košín, 373 51 Dříteň Č.j.: 64/04 ze dne 09.01.2004:

1. Před zahájením prací musí zaměstnanec pověřený provádějíci organizací prokazatelně seznámit své zaměstnance s normou ČSN 343108.
2. Ochranné pásmo je stanoveno Zákonem č. 458/2000Sb. pro vedení 220 kV je tato vzdálenost 20m měřená kolmo od krajních vodičů po obou stranách vedení, v tomto prostoru se nepovoluje výsadba dřevin jejichž výška by přesáhla 3m. V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno zejména:

- vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN 343108
 - pojíždět pod elektrickým vedením tak vysokými vozidly, náklady nebo stroji, že by mohlo dojít k přiblížení k vodičům blíže, než stanoví ČSN 343108
 - používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení
 - pod vedením 220 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky po dobu delší než nezbytně nutnou, viz ČSN 33 2040 – ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy
3. Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich soustava. Výkopy nelze provádět blíže než 10 m od stožárové konstrukce. Případné škody budou likvidovány na náklad provádějící organizace.
 4. V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být práce v ochranném pásmu vedení přerušeny a pásmo opuštěno. Mimořádné jevy budou okamžitě nahlášený provozovateli elektrického vedení.
 5. Práce v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup energetických provozovatelů k zařízením.
 6. Zhotovitel prací odpovídá za jakékoliv škody na elektrickém zařízení zapříčiněné jejich činností.
 7. Zahájením prací v ochranném pásmu vedení musí být nejméně 15 dnů předem nahlášeno majiteli ČEPS, a.s., pracoviště PsPS jih, 373 51 Dříteň.
 8. Po skončení prací bude prostor ochranného pásma vedení uveden do původního stavu a fyzicky předán zástupci provozovatele.
 9. investor stavby předá provozovateli vedení přesné zakreslení trasy do geometrického plánu v dané lokalitě.
 10. Křižování nové silnice s vedením 220 KV musí splňovat požadavky normy ČSN 33 3300.

D) *Budou dodrženy podmínky stanoviska VAK Jižní Čechy, a.s.B. Němcové, 370 80 Č. Budějovice, Č.j.: 6088/11035187 ze dne 17.08.2006:*

1. Stavbu je nutné koordinovat s prodloužením vodovodu HDPE 225 do Chýnovské ulice (propojení VDJ Čekanice – VDJ Svatá Anna). Investorem této stavby je Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
2. V území rekultivace původní polní cesty (Chýnovská – Vožická) nesmí dojít ke snížení krytí nad vodovodem HDPE 225.
3. Upozorňujeme, že při dalším pokračování budování průmyslové zóny je nutné veškeré dešťové vody zaústěné do silničního příkopu v ulici Vožická převést do retenční nádrže pro průmyslovou zónu, resp. do povodí rybníka Sový.
4. Poklopy vodárenských šoupat, hydrantů a revizních kanalizačních šachet budou osazeny do nivelety komunikací a chodníků. Pokud budou poklopy uloženy na nezpevněných površích, budou poklopy vodárenských šoupat a hydrantů obetonovány 1,0 x 1,0 metru do hloubky 1,0 metru a poklopy revizních kanalizačních šachet 1,5 x 1,5 metru do hloubky 1,0 metru.
5. Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle ČSN 736005.

6. Před zahájením zemních prací je nezbytné provést vytýčení vodovodu a kanalizace na místě. Vytýčení provede VAK JČ a.s., středisko střediska Tábor, pověřený pracovník Vak JČ a.s. (381473136).
 7. Při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci odpovídá investor.
 8. podle §76 a násl. Zákona č. 50/76 Sb. (stavební zákon ve znění pozdějších předpisů) požadujeme účast na kolaudačním řízení stavby, při kterém investor (zhotovitel) předloží níže uvedené doklady: geodetické zaměření stavby a povrchových znaků vodovodu a kanalizace, doklad o vytýčení vodovodu a kanalizace a o jeho zpětném předání provozovateli, tj. VAK JČ a.s., středisko střediska Tábor
 9. na vodohospodářskou část stavby, která není součástí této projektové dokumentace bylo vydáno stanovisko č.j. 4814/11028344 ze dne 28.6.2006.
 10. Elektro část stavby si zajišťuje samostatně E.ON, a.s.
 11. Do stavebního povolení požadujeme uvést tuto formulaci: „Podmínky vyjádření provozovatele vodovodu a kanalizace VAK JČ a.s. č.j. 6088/11035187 musí být splněny a při kolaudaci budou kontrolovány.“ Toto vyjádření má platnost do 7.9.2007.
21. Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, S-META 37033/2006/OŽP/On ze dne 04.07.2006 :
- sadové úpravy požadujeme doplnit o cca 60 ks dřevin, které budou vysázeny v úseku od křižovatky budované komunikace s Vožickou ulicí až pod nadzemní vedení VN (**mimo rozhledový trojúhelník**) a od nadzemního vedení VN k protihlukovému valu. Břízy budou vysázeny v cca 10ti metrových vzdálenostech a v potřebném počtu.
 - dále je nutné při výstavbě s ohledem na blízkost některých dřevin, které mají být zachovány, dodržet ČSN 83 9061.
22. Budou dodrženy podmínky stanoviska Jihočeské plynárenské, A.S., Vrbenská 2, 371 47 Č. Budějovice, Č.j.: 28698 ze dne 02.10.2006:
- v zájmovém území se nachází nízkotlaký nebo středotlaký plynovod (NTP, STP) 110,32
 - vytýčení plynovodního zařízení zajišťuje na objednávku p. Fiala, tel. 606 660955
23. Součástí tohoto stavebního povolení **není** úprava vjezdů, sjezdů k jednotlivým nemovitostem. Vjezdy, sjezdy jsou součástí nemovitosti nebo pozemku, který se připojuje na komunikaci a jsou ve vlastnictví žadatele, stavebníka. Připojení nemovitosti povoluje obecný stavební úřad.
24. Součástí tohoto stavebního povolení **není** stanovení místní úpravy silničního provozu na nově budované komunikaci, podle § 77 odst. 1 zák. č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Stanovení místní úpravy silničního provozu se vede podle správního řádu, ale ne ve správním řízení.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Připomínky účastníků řízení jsou řešeny podmínkami tohoto rozhodnutí. Námitky nebyly vzneseny.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 08.09.2006 obdržel Městský úřad v Táboře, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad, žádost právnické osoby Město Tábor, Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor o vydání stavebního povolení na stavbu „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická ul.“, která je umístěna na pozemcích parc. číslo KN 881/1 (KN 569 PK 1186/1) 881/2, 881/3 vše k.ú. Čekanice u Tábora, obec Tábor, KN 1653/1, 1653/2, 1653/3 1653/4, 1653/5, 1653/6, 1653/7, 1653/ 8, 1653/12, 1653/16, 1653/17, 1653/19, 1653/23, 1653/24, 1653/25, 1653/26, 1653/27, 1653/28, 1653/29, 1653/30, 1653/31, 1653/32, 1653/33, 1653/34, 1653/35, 1653/36, 1653/37, 1653/38, vše k.ú. Měšice u Tábora, obec Tábor, KN 5985/1, 5985/2, 5985/3, 5985/4, 5985/5, 5985/6, 5985/7, 5985/9, 5985/10, 5985/11, 5985/12, 5985/13, 5985/14, 5985/15, 5985/16, 5985/17, 5985/18 vše k.ú. Tábor, obec Tábor. Jelikož se jedná o stavbu zvláště rozsáhlou, s velkým počtem účastníků řízení, bylo oznámení zahájení stavebního řízení doručeno formou veřejné vyhlášky (§ 61 odst. 4 stavebního zákona).

Žádost byla doložena stanovisky dotčených orgánů státní správy, správců sítí, vlastníků dotčených pozemků stavbou a projektovou dokumentací vypracovanou ateliérem PROMIKA s.r.o., Milady Horákové 103/66, 160 00 Praha 6, ČKAIT – 0001683.

K projednání předložené žádosti bylo svoláno ústní jednání na den 13.11.2006, o kterém byl sepsán protokol. Od místního šetření z důvodu dobře známých poměrů na staveništi a žádosti, poskytující dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby bylo upuštěno.

Protože návrh žádosti nebyl úplný a v průběhu stavebního řízení nebyl doložen všemi podklady a stanovisky potřebnými pro jeho řádné posouzení, byl navrhovatel dne 12.09.2006 vyzván k doplnění a řízení bylo přerušeno. Návrh byl zcela doplněn dne 07.11.2006 a tímto dnem bylo pokračováno ve stavebním řízení.

Městský úřad Tábor, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II.a III.třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) a c) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. a § 120 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, projednal podle § 62 zákona č. 50/1976 Sb., žádost ve stavebním řízení, hodnotil předložené doklady každý zvláště a všechny ve vzájemné souvislosti, stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 59 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Po přezkoumání žádosti rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Také se správní orgán zabýval tím, zda jsou účastníkem tohoto správního řízení další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává (§ 59 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů). Došel k závěru že ne, a to ani v případě podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Výstavbou komunikace a chodníků nemohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona (§ 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v souvislosti především s úvodními paragrafy vymezujícími působnost zákona (§ 1 – účel zákona, § 2 - ochrana přírody a krajiny).

Pro stavbu byl vydán stavebním úřadem souhlas dle § 120 zákona č. 50/1976 Sb. dne 02.10.2006, č.j.: META 26711/2005/SÚ/AD 10. Potvrdil, že projektová dokumentace pro stavební řízení je zpracována v souladu se závaznou i směrnou částí územního plánu sídelního útvaru Tábora a vydaným územním rozhodnutím. Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydal KÚ-Jčk OŽPZL č.j. KUJCK/29373/2004/OZZL/Vr dne 11.11.2004. Byl předložen písemný souhlas vlastníků dotčených pozemků s umístěním stavby na pozemky v jejich vlastnictví. Jedná se o pozemky dle GP p.č. 5985/7 ve vlastnictví státu, p.č. 5985/12 a 5985/17 ve vlastnictví Jihočeského kraje a p.č. 881/1 ve vlastnictví p. Veselého.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Žádost byla doložena stanovisky dotčených orgánů státní správy, správců sítí, vlastníků dotčených pozemků a projektovou dokumentací vypracovanou ateliérem PROMIKA s.r.o., Milady Horákové 103/66, 160 00 Praha 6 ČKAIT – 0000129.

Navrhované komunikační propojení ulic Chýnovská – Vožická doplňuje základní komunikační síť místních komunikací ve východní části zastavěného území města. Vytváří lepší předpoklady pro přerozdělení přepravních vztahů, především zdrojové a cílové dopravy a též vnitro městských vztahů. Vytvoří kvalitní komunikační předpoklady pro zajištění dopravní obslužnosti nových komerčních, výrobních a skladových aktivit v souladu s územním plánem města ve východní části města.

Toto stavební povolení bylo vydáno na základě provedeného správního řízení a se zřetelem k výše uvedeným zákonným ustanovením.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat písemné odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu Tábor, odboru dopravy.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.



František Kučač

odborný pracovník silničního správního úřadu

Všichni účastníci řízení jsou informováni touto veřejnou vyhláškou.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce města Tábora.

Po sejmutí žádá Městský úřad Tábor, odbor dopravy Město Tábor, odbor vnitřních věcí o doručení potvrzené vyhlášky.

Hlavní účastníci stavebního řízení:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2. 390 15 Tábor

Dotčené orgány státní správy (§ 61 odst. 5) z. č. 50/1976 Sb.):

Policie ČR, okresní ředitelství, okresní dopravní inspektorát, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 390 02 Tábor
Krajská hygienická stanice JČ, územní pracoviště Tábor, Palackého 350, 390 01 Tábor
Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938. 390 02 Tábor
Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, Žižkovo náměstí 2. 390 15 Tábor
Městský úřad Tábor, stavební úřad, Žižkovo náměstí 2. 390 15 Tábor

Město Tábor, odbor vnitřních věcí, Žižkovo náměstí 2. 390 15 Tábor – se žádostí o vyvěšení po dobu 15 ti dnů na úřední desce.


Na vědomí: ateliér PROMIKA s.r.o., Milady Horákové 103/66, 160 00 Praha 6
ČKAIT – 0000129.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 01. 2009 a je vykonatelné.


MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBOR
- 116 -

Toto rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku (§ 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

META 4546/2005 01/192

Městský úřad Tábor
Odbor dopravy

S00FP00S2AH3

Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

S00FX014NB7Y

Spis.značka S-META 31586/2016/IKve
Číslo jednací METAB 51999/2016/OD/IKve
Oprávněná úřední osoba Ing. Ivana Kverková / +420 381 486 283

Tábor
30.11.2016

Město Tábor, Odbor investic a strukturálních fondů, Žižkovo nám. 2/2, 390 15 Tábor 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dnem 24.8.2017 a je vykonatelné.

ROZHODNUTÍ

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

| | |
|--------------|-----------------------------|
| -2- | MĚSTO TÁBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD |
| DOŠLO: | 01.12.2016 |
| Č.j.: | |
| Čís. dopor.: | |

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBOR
- 118 -

Výroková část:

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) ve vazbě na § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 6.1.2014 podalo

Město Tábor, Odbor investic a strukturálních fondů, IČO 00253014, Žižkovo nám. 2/2, 390 15 Tábor 1

(dále jen "žadatel") jako účastník dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

o dva roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

platnost stavebního povolení na stavbu:

"Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor - východ -Vožická" (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 169/3, 1596/10, 1613/6, 1653/1, 1653/2, 1653/4, 1653/5, 1653/6, 1653/7, 1653/8, 1653/12, 1653/19, 1653/25, 1653/27, 1653/28, 1653/29, 1653/30, 1653/31, 1653/32, 1653/33, 1653/34, 1653/35, 1653/36, 1653/37, 1653/38 v katastrálním území Měšice u Tábora, parc. č. 5293/6, 5293/8, 5305, 5307/1, 5307/2, 5313/2, 5322/2, 5757/1, 5757/2, 5762/3, 5762/4, 5802/1, 5985/1, 5985/3, 5985/4, 5985/5, 5985/9, 5985/18 v katastrálním území Tábor.

Na výše uvedenou stavbu vydal Městský úřad Tábor, Odbor dopravy stavební povolení dne 20.11.2006 pod č.j. S-META 53646/2006/OD/Ku 4 a jeho platnost končila 13.1.2009. Dále speciální stavební úřad vydal rozhodnutí o prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení dne 13.11.2008 pod č.j. METAB 55686/2008/OD/Ku s platností do 13.1.2010, dne 23.12.2009 pod č.j. METAB 61109/2009/OD/Ku s platností do 13.1.2012, dne 25.1.2012 pod č.j. METAB 4250/2012/OD/Pok s platností do 13.1.2014 a dne 3.2.2015 pod č.j. METAB 5779/2015/OD/Len s platností do 30.3.2017. Dále Městský úřad Tábor, Odbor dopravy vydal dne 9.12.2015 pod č.j. METAB 58978/2015/OD/Ple rozhodnutí, že rozhodnutí o prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení vydané dne 3.2.2015 pod č.j. METAB 5779/2015/OD/Len s platností do 30.3.2017 se ruší a věc se vrací k novému projednání. Rozhodnutí ze dne 9.12.2015 pod č.j. METAB 58978/2015/OD/Ple nabylo právní moci dnem 25.12.2015.

Odůvodnění:

Žadatel dne 6.1.2014, před uplynutím lhůty platnosti stavebního povolení ve smyslu § 115 odst. 4 stavebního zákona, podal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. V této žádosti konstatoval, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebude možno v termínu platnosti stavebního povolení stavební práce zahájit. Dne 26.8.2016 žadatel doplnil svou žádost, ve které konstatoval, že k vyřešení tohoto problému proběhla již v loňském roce jednání s představiteli Jihočeského kraje o převedení investování na krajský úřad poté, co Město Tábor zajistí veškerou potřebnou dokumentaci a povolení. K zajištění splnění uvedených podmínek bylo ještě v roce 2015 zadáno Atelieru Promika vypracování zadávací dokumentace stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tato dokumentace byla předána v září téhož roku. Z uvedeného vyplývá, že je možné, v případě kladného vyřízení žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, pokračovat v přípravě výběrového řízení na dodavatele stavby a její následné realizaci. Krajský úřad, Odbor dopravy a silničního hospodářství počítá se zařazením této investiční akce do financování z fondů EU v měsíci dubnu roku 2017.

Správní orgán požádal Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství k ověření, resp. potvrzení výše uvedeného v doplnění žádosti. Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství sdělil, že stavba se v koncepčním materiálu Program výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2016 nachází na 5. prioritním místě v části Investiční opatření na silnicích II. třídy s vysokou prioritou. Stavba tedy patří do skupiny dopravních staveb financovaných Jihočeským krajem s nejvyšší prioritou. Pro úplnost uvedl, že stavby na 1. a 2. prioritním místě jsou právě ve výstavbě a budou dokončeny ještě v letošním roce.

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy poskytl v souladu s § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny osobám nebo jejich organizačním jednotkám možnost oznámit svou účast v uvedeném řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a v řízení mít poté postavení účastníka řízení. Oznámením o účastenství řízení ze dne 1.8.2016 se účastníkem řízení stal spolek JINUDY, z.s., Na Výsluní 283, Měšice, 391 56 Tábor 4

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy oznámil podle § 115 odst. 4 ve vazbě na § 112 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad oznámil podle § 144 odst. 2, 6 správního řádu zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Jelikož speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení prodloužení platnosti stavebního povolení, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě. Zároveň upozornil dotčené orgány a účastníky řízení v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek.

Ve stanovené lhůtě byly v řízení uplatněny námítky účastníků řízení: spolek JINUDY, z.s., Na Výsluní 283, Měšice, 391 56 Tábor 4 a advokátní kancelář Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o., Tyršova č.p. 521, 390 02 Tábor 2, která zastupuje Jiřího Štěpánka, Na Vojtěchu 383, Měšice, 391 56 Tábor 4; Milana Řihu, Na Vojtěchu 296, Měšice, 391 56 Tábor 4; Miroslava Faru, Na Vojtěchu 297, Měšice, 391 56 Tábor 4; Mgr. Janu Líbalovou, Jana, Na Vojtěchu 298, Měšice, 391 56 Tábor 4; Josefa Dvorského, Na Vojtěchu 306, Měšice, 391 56 Tábor 4; JUDr. Tomáše Faru, Janáčkova 3086, 390 02 Tábor 2; Jiřího Faru, Na Vojtěchu 455, Měšice, 391 56 Tábor 4; Františka Vaněčka, Na Vojtěchu 322, Měšice, 391 56 Tábor 4; Ing. Jiřího Doudu, Na Vojtěchu 318, Měšice, 391 56 Tábor 4; MUDr. Alici Kuchařovou, Na Vojtěchu 305, Měšice, 391 56 Tábor 4; Mgr. Marcelu Burešovou, Na Vojtěchu 327, Měšice, 391 56 Tábor 4; Hanu Zvonařovou, Na Vojtěchu 341, Měšice, 391 56 Tábor 4. Dotčené orgány ve stanovené lhůtě žádná závazná stanoviska nepodali.

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy sdělil účastníkům řízení, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci a vyjádřit se k nim s tím, že správní orgán po proběhu stanovené lhůty předpokládá ve věci bezodkladně rozhodnout. Ve stanovené lhůtě se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V řízení speciální stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Speciální stavební úřad se zabýval okruhem účastníků řízení dle § 109 stavebního zákona a stanovil je tak, jak je uvedeno: stavebník; vlastník stavby, na níž má být provedena změna; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, jehož práva budou prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, jehož vlastnické právo bude prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, které bude prováděním stavby přímo dotčeno; vlastníci a správci dotčené infrastruktury (ostatní nemohou být rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech). Speciální stavební úřad shledal, že účastníků je více než 30, proto je řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení vedeno veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona:

Město Tábor, Odbor investic a strukturálních fondů, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1
Zdeněk Plachý, Chýnovská č.p. 9, Měšice, 391 56 Tábor 4
Jitka Vachtová, Chýnovská č.p. 483, Měšice, 391 56 Tábor 4
Ing. Pavel Plachý, Spojovací č.p. 416, 391 55 Chýnov
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše č.p. 2418, Klokoty, 390 03 Tábor 3
Roman Šperl, Na Vojtěchu č.p. 166, Měšice, 391 56 Tábor 4
Alena Šperlová, Na Vojtěchu č.p. 166, Měšice, 391 56 Tábor 4
Zdeněk Mazaný, Chýnovská č.p. 182, Měšice, 391 56 Tábor 4
Mgr. Radka Šimonová, Dlouhá č.p. 336/17, 390 01 Tábor 1
Jiří Štěpánek, Na Vojtěchu 383, Měšice, 391 56 Tábor 4
Milan Říha, Na Vojtěchu 296, Měšice, 391 56 Tábor 4
Miroslav Fara, Na Vojtěchu 297, Měšice, 391 56 Tábor 4
Mgr. Jana Líbalová, Jana, Na Vojtěchu 298, Měšice, 391 56 Tábor 4
Josef Dvorský, Na Vojtěchu 306, Měšice, 391 56 Tábor 4
JUDr. Tomáš Fara, Janáčkova 3086, 390 02 Tábor 2
Jiří Fara, Na Vojtěchu 455, Měšice, 391 56 Tábor 4
František Vaněček, Na Vojtěchu 322, Měšice, 391 56 Tábor 4
Ing. Jiří Douda, Na Vojtěchu 318, Měšice, 391 56 Tábor 4
MUDr. Alice Kuchařová, Na Vojtěchu 305, Měšice, 391 56 Tábor 4
Mgr. Marcela Burešová, Na Vojtěchu 327, Měšice, 391 56 Tábor 4
Hana Zvonařová, Na Vojtěchu 341, Měšice, 391 56 Tábor 4
Jitka Říhová, Na Vojtěchu č.p. 296, Měšice, 391 56 Tábor 4
Ing. Jiří Líbal, Na Vojtěchu č.p. 298, Měšice, 391 56 Tábor 4
Ing. Petr Dvořák, Josefy Kolářové č.p. 1007/6, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11
Ludmila Heinová, Na Vojtěchu č.p. 300, Měšice, 391 56 Tábor 4
Ludmila Dvořáková, U Špýcharu č.p. 561, Měšice, 391 56 Tábor 4
Milena Dvořáková, Na Vojtěchu č.p. 299, Měšice, 391 56 Tábor 4
Marie Doudová, Na Vojtěchu č.p. 318, Měšice, 391 56 Tábor 4
Ing. Pavel Kuchař, Na Vojtěchu č.p. 305, Měšice, 391 56 Tábor 4
Jan Šich, Tyršova č.p. 50, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1
Průmyslová zóna Tábor, a.s., Vožická č.p. 2604, 390 02 Tábor 2
Greiner Real Estate s.r.o., Husova č.p. 1056, 374 01 Trhové Sviny
Oldřich Peřina, Žižkovo nám. č.p. 16/16, 390 01 Tábor 1
Miloslav Štěrba, Dlouhá Lhota č.p. 39, 391 55 Chýnov
Konstrukční, a.s., Vožická č.p. 621, Měšice, 390 02 Tábor 2
Cellofoam Realitní CZ s.r.o., Vožická č.p. 622, Měšice, 390 02 Tábor 2
Karel Dvořák - LOCE s.r.o., Vožická č.p. 2103, 390 02 Tábor 2
Zdeněk Brož, Chýnovská č.p. 121, Měšice, 391 56 Tábor 4
RNDr. Karel Vandrovec, Dlouhá č.p. 618/14, 110 00 Praha 1-Staré Město
Zdeňka Březinová, Budovatelů č.p. 2624, 390 02 Tábor 2
Jiří Bureš, Pražského povstání č.p. 2312, 390 03 Tábor 3
Dagmar Burešová, Pražského povstání č.p. 2312, 390 03 Tábor 3

Marie Křiklánová, Šelmberská č.p. 2282, 390 02 Tábor 2
Miroslav Kotrba, Sokolovská č.p. 2361, 390 03 Tábor 3
Václav Smrž, Angela Kančeva č.p. 2285, 390 02 Tábor 2
Vlastislava Smržová, Angela Kančeva č.p. 2285, 390 02 Tábor 2
Jaroslav Baloun, Budovatelů č.p. 2624, 390 02 Tábor 2
Blanka Balounová, Budovatelů č.p. 2624, 390 02 Tábor 2
Dáša Dlouhá, Vídeňská č.p. 2773/2, 390 05 Tábor 5
Ladislav Hála, Budějovická č.p. 2268, 390 02 Tábor 2
Jiřina Hálová, Budějovická č.p. 2268, 390 02 Tábor 2
Josef Kačer, Čsl. armády č.p. 2208, 390 03 Tábor 3
Jaroslava Kačerová, Čsl. armády č.p. 2208, 390 03 Tábor 3
Michal Permedla, Sedláčkova č.p. 2283, 390 02 Tábor 2
Blanka Permedlová, Sedláčkova č.p. 2283, 390 02 Tábor 2
Ivana Tlachová, Havanská č.p. 2825/6, 390 05 Tábor 5
Karel Březina, U Obecních domů č.p. 1617/4, 390 02 Tábor 2
Hana Křivánková, Poupětova č.p. 1332/9, 170 00 Praha 7-Holešovice
Mílada Sovová, Lidická č.p. 2355, 390 03 Tábor 3
RSDr. Karel Mráček, Farského č.p. 2196, 390 02 Tábor 2
Jana Mráčková Navrkalová, Farského č.p. 2196, 390 02 Tábor 2
Blažena Janurová, Pionýrů č.p. 242, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Ing. Marie Marhounová, Hanojská č.p. 2835/11, 390 05 Tábor 5
Pavlína Procházková, nám. Přátelství č.p. 2803/4, 390 05 Tábor 5
Dana Lišková, Buzulucká č.p. 2343, 390 03 Tábor 3
Václav Horák, Štíbrova č.p. 1221/2, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Tábor, Tomkova č.p. 2159/6, 390 01 Tábor 1
Ing. Ludmila Horká, Velvarská č.p. 1648/15, Dejvice, 160 00 Praha 6
Ing. Karel Hrazdil, Pštrossova č.p. 207/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
Ing. Pavel Zezulka, Oblouková č.p. 766/16, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Ing. Martin Ripper, Pardubická č.p. 132, 535 01 Přelouč
Bc. Dana Ripperová, Brigádníků č.p. 2558, 390 02 Tábor 2
Jana Švecová, Vídeňská č.p. 2774/3, 390 05 Tábor 5
Josef Kůta, Údolní č.p. 2185, 390 02 Tábor 2
Miroslav Kůta, Žernovice č.p. 24, 383 01 Prachatice
Ing. Karel Bednář, Čsl. armády č.p. 2688, 390 03 Tábor 3
Božena Bednářová, Čsl. armády č.p. 2688, 390 03 Tábor 3
František Krejčí, Brigádníků č.p. 2555, 390 02 Tábor 2
Věra Krejčová, Brigádníků č.p. 2555, 390 02 Tábor 2
Marie Šmídová, nám. F. Křížka č.p. 499/15, 390 01 Tábor 1
Mgr. Rudolf Zeman, Brigádníků č.p. 2558, 390 02 Tábor 2
Marie Zemanová, Brigádníků č.p. 2558, 390 02 Tábor 2
Jana Sobková, Kpt. Jaroše č.p. 2410, 390 03 Tábor 3
Václav Linda, Náchodská č.p. 2674, 390 03 Tábor 3
Magdalena Lindová, Náchodská č.p. 2674, 390 03 Tábor 3
Ing. Pavel Stolina, Angela Kančeva č.p. 2525, 390 02 Tábor 2
Miloslav Tůma, Školní náměstí č.p. 627/6, 391 02 Sezimovo Ústí 2
Věra Tůmová, Školní náměstí č.p. 627/6, 391 02 Sezimovo Ústí 2
František Douda, nám. Přátelství č.p. 2802/3, 390 05 Tábor 5
Dana Doudová, nám. Přátelství č.p. 2802/3, 390 05 Tábor 5
Jaroslav Kolomazník, Šlikova č.p. 1266/2, 390 02 Tábor 2
Zdeňka Svobodová, Pražského povstání č.p. 2310, 390 03 Tábor 3
Pavel Melichar, Budovatelů č.p. 2618, 390 02 Tábor 2
Hana Melicharová, Budovatelů č.p. 2618, 390 02 Tábor 2
Miloš Buchl, Kamarýtova č.p. 1597/12, 390 02 Tábor 2
Terézia Buchlová, Kamarýtova č.p. 1597/12, 390 02 Tábor 2
Hana Kotěrová, Soběslavská č.p. 2225, 390 02 Tábor 2
Gabriela Pražáková, Berlínská č.p. 2754/8, 390 05 Tábor 5
MUDr. Jana Motičková, Budějovická č.p. 3072, 390 02 Tábor 2
Václav Jakl, Kpt. Jaroše č.p. 2403, 390 03 Tábor 3

Galina Jaklová, Kpt. Jaroše č.p. 2403, 390 03 Tábor 3
Marie Machoňová, Angela Kančeva č.p. 2286, 390 02 Tábor 2
Český svaz chovatelů, Základní organizace Tábor I, Dražice č.p. 217, 391 31 Dražice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28
Jaroslav Veřtát, Průhon č.p. 356, Měšice, 391 56 Tábor 4
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská č.p. 2486/24, 390 02 Tábor 2
STROJÍRNA TÁBOR, spol. s r.o., Chýnovská č.p. 2420, 390 02 Tábor 2
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
SEKOMA, s.r.o., Chýnovská č.p. 2486/24, 390 02 Tábor 2
Ing. Karel Hrazánek, K Šachtě č.p. 353, Horky, 390 01 Tábor 1
Nábytek VASA spol. s r.o., Měšická č.p. 2697, 390 02 Tábor 2
Martin Veřtát, Na Vojtěchu č.p. 411, Měšice, 391 56 Tábor 4
Květoslava Reichelová, Na Vojtěchu č.p. 327, Měšice, 391 56 Tábor 4
Zdeňka Dolistová, Na Vojtěchu č.p. 341, Měšice, 391 56 Tábor 4
Marie Štěpánková, Na Vojtěchu č.p. 383, Měšice, 391 56 Tábor 4
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Pavel Plachý, Senovážná č.p. 643, Měšice, 391 56 Tábor 4
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T.G.Masaryka 788, nám. T. G. Masaryka č.p. 788/1, 390 02 Tábor 2
JINUDY, z.s., Na Výsluní č.p. 283, Měšice, 391 56 Tábor 4

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o., advokátní kancelář, podala jako zástupce některých účastníků řízení dne 11.10.2016 následující námitky:

Námitky pod body č. 4, 5, 6, 7

Stavební povolení bylo vydáno dne 20. 11. 2006, tedy téměř před 10 - ti lety. Jestliže v roce 2006 bylo vydáno Stavební povolení, jehož předmětem byla výstavba obslužné, místní komunikace III. třídy, je v roce 2016 zřejmé, že - ačkoli předmět Stavebního povolení zůstává nezměněn - faktickým záměrem navrhovatele již není vybudování „obslužné, místní komunikace stát. V této souvislosti je možné poukázat např. na článek, který byl publikován na iDnes dne 27. 2. 2015: *Ministr dopravy Dan Ťok zvažuje, že řidiči by na dálnici D3 okolo Tábora potřebovali dálniční známku až tehdy, když souběžně s ní vznikne nová přeložka silnice, kterou chce stavět kraj. O tuto výhodu tábořská radnice usiluje už od té doby, co se dálnice okolo města začala stavět. Navrhovali, aby úředníci vyjmuli úsek ze seznamu zpoplatněných silnic. Dosud však marně. Až nový ministr dopravy dává druhému největšímu jihočeskému městu naději a navrhuje jiné řešení než úplné odpuštění poplatků. „Vítám iniciativu při podpoře výstavby přeložky silnice, která je i podle mého názoru systémovým řešením dopravy na území Tábora. Proto také nechám z hlediska finančních i praktických dopadů prověřit možnost ponechat předmětný úsek dálnice D3 bez povinnosti poplatku do doby dostavby přeložky“ píše v dopise starostovi Tábora Ťok. Nová přeložka, o které ministr hovoří, má být propojením od hasičské stanice v Chýnovské ulici na silnici na Mladou Vožici a následně na silnici od Písku mířící na dálnici. Pokud ji kraj postaví, bude tak paralelním obchvatem města.*

Obdobné plyne i z emailové komunikace s 2. místostarostkou Tábora Ing. Michaelou Petrovou ze 4. 5. 2015. V rámci této komunikace 2. místostarostka hovoří o přípravě druhé části přeložky Vožická - I/19, která dopravně vyřeší severovýchodní část Tábora. Informace o plánované přeložce, jejíž součástí je povolená Stavba, jsou zveřejněny na webových stránkách města Tábora: <http://www.taborz.eu/dp/p1=11859&id ktg=2073>.

V Tábořském deníku bylo dále publikováno, že *silnice, která se má v budoucnu napojit na silnici I/19 a navést řidiče na dálnici, by měla především od osobní dopravy ulevit lokalitě od centra až po Průběžnou ulici v Čekanicích nebo Zavadilskou na Kourimově, jíž v průměru denně projede 15 tisíc aut. Je na ní již stavební povolení* (http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/proti-silnici-se-postavili-i-skolaci-20150520.html).

V současné době nelze na záměr pohlížet jako na výstavbu obslužné místní komunikace, k zajištění propojení dvou stávajících průjezdních úseků silnic II/123 na východě a na severu II/137, tedy k zajištění připojení nově budované průmyslové zóny s logistickým centrem, která byla povolena Stavebním povolením, ale o výstavbu částí přeložky k dálničnímu přivaděči. Představitelé navrhovatele v této

souvislosti publikují, že se připravuje výstavba nové komunikace pod názvem Přeložka Chýnovská-Vožická-I/19, přičemž tato stavba je rozdělena do dvou etap: I. Chýnovská - Vožická: trasa přeložky povede od stykové křižovatky od hasičské zbrojnice na hranici Měšic severním směrem přes průmyslový areál nad teplárnou k Vožické ulici; II. Vožická- I/19 (přivaděč od Písku): trasa bude dopravně navazovat na první část přeložky od Vožické ulice směrem na přivaděč I/19 od Písku, s následným propojením k dálnici D3 (viz článek starosty a místostarostky Města Tábor v příloze). Uvedenou skutečnost nelze při úvaze o tom, zda dojde k prodloužení platnosti stavebního povolení či nikoli pominout a nezohlednit, neboť samostatné posouzení jednotlivých etap výstavby zamýšlené přeložky dálničního přivaděče by bylo znamenalo aplikaci nepřipustné tzv. salámové metody.

Správní orgán se uvedenými námitkami zabýval a zaujal k nim toto stanovisko:

Tvrzení účastníků řízení, že povolovaná komunikace již nemá mít toliko obslužný charakter místního významu, ale v konečném důsledku má být součástí přeložky k dálničnímu převaděči je opřeno o články z médií a emailovou korespondenci s místostarostkou Michaelou Petrovou. Správní orgán komplexně zhodnotil tvrzení účastníků řízení i v souvislostech se spisovým materiálem. Při posuzování, kdy účastníci byli seznámeni se záměrem vedení komunikace spojující ul. Chýnovská a Vožická (úsek má stavební povolení) a dále ul. Vožická s místní částí Čekanice správní orgán vycházel z Územního plánu sídelního útvaru Tábor schváleného dne 19.12.1994. Tato územně plánovací dokumentace záměr budoucího zřízení dvou popsaných úseků komunikace neobsahuje (žádný z úseků). Dále správní orgán hodnotil obsah Změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Tábor schválené dne 17.3.1997 a konstatoval, že v této územně plánovací dokumentaci již je zanesen záměr v rozsahu obou úseků (ul. Chýnovská - Vožická a ul. Vožická - místní část Čekanice). Změna č. 5 ÚPnSÚ aglomerace Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí schválená 12.9.2005, která nabyla účinnosti 27.9.2005 rovněž obsahuje oba úseky komunikace, v trase úseku od ul. Vožická k místní části Čekanice došlo k mírné úpravě trasy spočívající v částečném narovnání průběhu (úsek, pro který doposud nebylo vydáno stavební povolení). Oba úseky komunikace jsou ukotveny i v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje z roku 2011 a následných aktualizacích. Správní orgán na základě uvedených listinných důkazů hodnotí věc tak, že občané (tedy i okruh účastníků řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí) měli možnost seznámit se se záměrem budoucí komunikace v rozsahu obou úseků (ul. Chýnovská - Vožická a ul. Vožická - místní část Čekanice) od doby projednávání návrhu změny územně plánovací dokumentace tzn. Změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Tábor schválené dne 17.3.1997 dle tehdejší právní úpravy (zák. č. 50/1976 Sb.). Oba úseky komunikace jsou rovněž společně ukotveny v následujících územně plánovacích dokumentacích, územních plánech, zásadách územního rozvoje projednávaných dle tehdy platné právní úpravy.

Při srovnání leteckých snímků území dostupných veřejně např. na portálu mapy.cz je území na snímcích z let 2003 a 2006 bez objektů průmyslové zóny Vožická, v mezidobí mezi snímkováním v roce 2006 a 2012 přibýly v průmyslové zóně objekty, stejně tak v mezidobí mezi rokem 2012 a současným stavem. Tzn., že od roku 2006 dochází k růstu průmyslové zóny Vožická, pro jejíž napojení na silniční síť je předmětná pozemní komunikace od počátku stavebním povolením z roku 2006 povolena.

K tvrzení účastníků o významu předmětné komunikace a jejímu zařazení do sítě komunikací správní orgán posoudil projektovou dokumentaci ve spisu a zjistil, že stavebně technické provedení komunikace se od projednání ve stavebním řízení nemění. Stavební povolení i projednávané prodloužení platnosti stavebního povolení kontinuálně zachovávají technická řešení úseku, na který bylo vydáno stavební povolení. K zařazování nových komunikací do sítě komunikací správní orgán uvádí, že dle § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Vlastníkem projednávané budoucí komunikace může být Město Tábor, pak by byla zařazena jako komunikace místní, nebo Jihočeský kraj a komunikace by byla zařazena jako silnice. Pokud bude stavebníkem kraj, parametry kategorie MO 2k/-/ 7,5/50 jsou totožné s parametry kategorie silnice II. a III. třídy, S 7,5/50; 60; 70. Pro posuzování stavebně technického provedení a významu komunikace je podstatné vymezení technického provedení stavby v projektové dokumentaci potvrzené ve stavebním řízení. Při zařazení komunikace jsou rozhodné i další charakteristiky komunikace, např. vlastnictví, jak je výše uvedeno. O kategorii silnice II. nebo III. třídy bude rozhodovat Krajský úřad dle § 40 odst. 3 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Pokud se bude jednat o místní komunikaci, bude rozhodovat Městský úřad Tábor dle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení a na základě § 3 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích vydá rozhodnutí o zařazení do sítě pozemních komunikací. Zařazení probíhá až po ukončení stavby

komunikací a nemá zpětně vliv na stavebně technické provedení komunikace, které je vymezeno během projednání ve stavebním řízení zakončeném vydaným stavebním povolením. Správní orgán v době vydání rozhodnutí nemůže spekulovat o budoucím zařazení komunikace do kategorie, příp. třídy. Po dokončení výstavby komunikace může dojít k převodu díla do majetku města Tábora, což může mít vliv i na zařazení komunikace, jak je výše uvedeno. Co je však po celou dobu od vydání stavebního povolení naprosto zřejmé, jsou skutečnosti, že trasa, stavebně technické provedení, účel pro připojení průmyslové zóny a dopravní význam komunikace se nemění.

Správní orgán se pro uvedené důvody neztotožňuje s tvrzením, že faktickým záměrem navrhovatele již není vybudování obslužné, místní komunikace, ale vybudování části přeložky dálničního převaděče, jehož součástí se má povolovaná komunikace stát, ani s tvrzením, že investor se pokouší tzv. salámovou metodou získat stavební povolení po jednotlivých úsecích na celek vyššího dopravního významu.

Námítky pod body č. 8, 9

Stavební povolení z roku 2006 založilo právo stavebníka provést stavbu obslužné místní komunikace, které stavebník až do současné doby nerealizoval z důvodu finanční náročnosti projektu. V rámci žádosti o prodloužení platnosti Stavebního povolení stavebník uvádí, že „k vyřešení tohoto problému proběhla již v loňském roce jednání s představiteli Jihočeského kraje o převedení investorství na krajský úřad poté, co Město Tábor zajistí veškerou potřebnou dokumentaci a povolení“. Skutečnost, že v loňském roce proběhla jednání s představiteli kraje, ještě nedokládá, že v případě prodloužení stavebního povolení skutečně dojde k realizaci předmětné stavby. Město Tábor ve své žádosti nijak nedokládá, že se Jihočeský kraj skutečně zavázal převzít investorství předmětné stavby a v nejbližších dvou letech bude mít dostatečné finanční prostředky k realizaci předmětné stavby. Fakt, že realizace předmětné stavby bude finančně náročným projektem, nemohl být žadateli v době podání žádosti o vydání stavebního povolení neznámý, a nelze na něj odkazovat do nekonečna.

Stavební povolení má, na rozdíl od jiných správních rozhodnutí, přímo ze zákona omezenou dobu platnosti. Účelem tohoto časového omezení je, aby se stavbou bylo započato v aktuálním reálném čase a byla také ve stanoveném čase i dokončena. Jedině tak lze eliminovat možné nežádoucí důsledky plynutí času, v důsledku čehož se mohly změnit původní okolnosti, z nichž úřad při povolování stavby vycházel. Opakované prodloužování platnosti Stavebního povolení z téhož důvodu je v rozporu s účelem zákonného omezení doby platnosti stavebního povolení.

Správní orgán se uvedenými námitkami zabýval a zaujal k nim toto stanovisko:

Ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona parametry pro případné prodloužení platnosti stavebního povolení nijak nespécifikuje a prodloužení váže pouze na odůvodněnou žádost stavebníka a na správní uvážení stavebního úřadu vyjádřeného v předmětném paragrafu dle „může... prodloužit“.

Nejedná se o pokračování či prodloužení stavebního řízení, které bylo ukončeno vydáním pravomocného stavebního povolení, přestože je jasné, že probíhá ve věcné souvislosti a časové návaznosti na pravomocné stavební povolení. Je proto nezbytné z takového stavebního povolení vycházet, a to i s ohledem na požadavek právní jistoty a tzv. presumpci správnosti správních aktů.

Řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení není pokračováním stavebního řízení, v němž bylo vydáno předmětné stavební povolení, ale jedná se o samostatné správní řízení, jehož předmětem je rozhodování o žádosti o prodloužení platnosti pravomocného stavebního povolení. Předmětem řízení o prodloužení stavebního povolení je přitom posouzení dodržení formálních podmínek pro rozhodnutí (existence pravomocného rozhodnutí, dodržení lhůty jeho platnosti) a dále posouzení důvodů žádosti ve vztahu ke skutečnostem, které aktuálně souvisí s realizací záměru schváleného stavebním povolením a které by mohly představovat zátěž pro veřejný zájem a právem chráněné zájmy jiných subjektů.

Žadatel dne 6.1.2014, před uplynutím lhůty platnosti stavebního povolení ve smyslu § 115 odst. 4 stavebního zákona, podal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení uvedenou stavbu. V této žádosti konstatoval, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebude možno v termínu platnosti stavebního povolení stavební práce zahájit. Dne 26.8.2016 žadatel doplnil svou žádost, ve které konstatoval, že k vyřešení tohoto problému proběhla již v loňském roce jednání s představiteli Jihočeského kraje o převedení investorství na krajský úřad poté, co Město Tábor zajistí veškerou potřebnou dokumentaci a povolení. K zajištění splnění uvedených podmínek bylo ještě v roce 2015 zadáno Atelieru Promika vypracování zadávací dokumentace stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tato dokumentace byla předána v září téhož roku. Z uvedeného vyplývá, že je možné, v případě kladného vyřízení žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, pokračovat v přípravě výběrového řízení na dodavatele stavby a její následné realizaci. Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství počítá se zařazením této investiční akce do financování z fondů EU v měsíci dubnu roku 2017.

Správní orgán požádal Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství o ověření, resp. potvrzení výše uvedeného v doplnění žádosti. Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství sdělil, že stavba se v koncepčním materiálu Program výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2016 nachází na 5. prioritním místě v části Investiční opatření na silnicích II. třídy s vysokou prioritou. Stavba tedy patří do skupiny dopravních staveb financovaných Jihočeským krajem s nejvyšší prioritou. Pro úplnost uvedl, že stavby na 1. a 2. prioritním místě jsou právě ve výstavbě a budou dokončeny ještě v letošním roce.

Správní orgán v rámci posuzování žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení zjistil, že žadatel po dosavadní dobu platnosti stavebního povolení činil v různých časových úsecích nezbytné kroky, které jednoznačně směřovaly a stále směřují k samotné realizaci stavby. Správní orgán vzal v úvahu i skutečnost, že se jedná o dopravní stavbu „na Táborské poměry“ velmi velkého rozsahu a významu, jejíž příprava včetně zajištění financování je pro žadatele velmi náročná, a to i časově. V průběhu platnosti stavebního povolení nedošlo na území města Tábora k realizaci obdobně rozsáhlé dopravní stavbě z prostředků rozpočtu města Tábor či Jihočeského kraje. Ze strany žadatele po majetkoprávním vypořádání pozemků pod stavbou došlo mimo jiné k vypracování zadávací dokumentace stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; k vyjednávání pro zajištění finančních prostředků na stavbu, resp. k převzetí investorství stavby; atd. Žadatel je v současné době připraven pokračovat v přípravě výběrového řízení na dodavatele stavby a její následné realizaci, stavba se v koncepčním materiálu Program výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2016 nachází na 5. prioritním místě v části Investiční opatření na silnicích II. třídy s vysokou prioritou, patří tedy do skupiny dopravních staveb financovaných Jihočeským krajem s nejvyšší prioritou (stavby na 1. a 2. prioritním místě jsou dokonce již ve výstavbě a budou dokončeny ještě v letošním roce). Z uvedeného je jasné patrné, že žadatel po celou dobu platnosti stavebního povolení vyvíjí snahu a činnosti vedoucí k samotné realizaci stavby.

Námítka pod bodem č. 10

Při rozhovoru o prodloužení platnosti stavebního povolení musí úřad brát v úvahu i práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, jakož i ochranu veřejných zájmů. Zájmem účastníků řízení je zachování kvality prostředí v lokalitě, v níž žijí, přičemž vybudováním části dálničního přivaděče v blízkosti jejich obydlí, bude kvalita prostředí v dané lokalitě výrazně dotčena. Nelze pominout, že nároky kladené na kvalitu prostředí v roce 2016 jsou oproti roku 2006 vyšší, a to v návaznosti na zvyšující se životní úroveň.

Správní orgán se uvedenými námitkami zabýval a zaujal k nim toto stanovisko:

Soulad záměru z hledisek uvedených v ustanovení § 90 stavebního zákona (odstupy od sousedních staveb, zachování kvality prostředí-pohody bydlení, nároky stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, jakož i vliv na životní prostředí) posuzoval stavební úřad v územním řízení. Zde je třeba doplnit i to, že v řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení se znovu hlediska ve smyslu ustanovení § 90 stavebního zákona neposuzují, protože o umístění stavby již bylo pravomocně rozhodnuto, ale posuzuje se pouze zachování práva žadatele provést stavbu na základě již vydaného a pravomocného stavebního povolení.

V řízení o žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení správní orgán nezkoumá, zda stavební povolení, jehož doba platnosti má být prodlužována, bylo vydáno v souladu se zákonem. Správní orgán zásadně zkoumá toliko to, zda navrhovatel (žadatel) je osobou oprávněnou k podání žádosti, tj. zda je stavebníkem, a zda žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení byla podána včas, tj. před uplynutím doby uvedené v § 115 odst. 4 stavebního zákona. Teprve při splnění těchto podmínek může usuzovat o důvodnosti či nedůvodnosti žádosti. Nejedná se o pokračování či prodloužení stavebního řízení, které bylo ukončeno vydáním pravomocného stavebního povolení, přestože je jasné, že probíhá ve věcné souvislosti a časové návaznosti na pravomocné stavební povolení. Je proto nezbytné z takového stavebního povolení vycházet, a to i s ohledem na požadavek právní jistoty a tzv. presumpci správnosti správních aktů. Řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení není pokračováním stavebního řízení, v němž bylo vydáno předmětné stavební povolení, ale jedná se o samostatné správní řízení, jehož předmětem je rozhodování o žádosti o prodloužení platnosti pravomocného stavebního povolení. Předmětem řízení o prodloužení stavebního povolení je přitom posouzení dodržení formálních podmínek pro rozhodnutí (existence pravomocného rozhodnutí, dodržení lhůty jeho platnosti) a dále posouzení důvodů žádosti ve vztahu ke skutečnostem, které aktuálně souvisí s realizací záměru schváleného stavebním povolením a které by mohly představovat zátěž pro veřejný zájem a právem chráněné zájmy jiných subjektů. Současně je s ohledem na smysl omezení doby platnosti stavebního povolení správní orgán povinen posoudit, zda uplynutím času nedošlo k natolik zásadní změně původních okolností (např. podmínek v území), z nichž správní orgán při povolení stavby vycházel, že by již stavební povolení, jehož doba platnosti má být prodloužena, vůbec nemohlo být vydáno. Taková změna poměrů, která by

vyhovění žádosti znemožňovala, by přitom musela být stavebnímu úřadu prima facie zřejmá, případně známa z úřední činnosti.

Správní orgán se zabýval i okolnostmi spočívajícími v případném negativním dopadu prodlužování doby realizace záměru na životní prostředí, tj. zabýval se i tím, zda pro životní prostředí může být další prodlužování doby provedení stavby, o jejímž umístění a provedení bylo pravomocně rozhodnuto za současných podmínek již výrazně zatěžující (např. s ohledem na změny technologií, změnu poměrů v území).

Z dat získaných z registru LPIS (geografický informační systém GIS, který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy) správní orgán došel k závěru, že uživatel a způsob hospodaření na předmětném území se po dobu od vydání stavebního povolení na pozemní komunikaci do současnosti nezměnil a nedošlo ke změně prostředí. Ke stejným závěrům dospěl správní orgán při srovnání leteckých snímků území dostupných veřejně např. na portálu mapy.cz. Na snímcích z let 2003 a 2006 je území bez objektů průmyslové zóny Vožická, v mezidobí mezi snímkováním v roce 2006 a 2012 přibyly v průmyslové zóně objekty, stejně tak v mezidobí mezi rokem 2012 a současným stavem. Kromě výstavby objektů v průmyslové zóně Vožická, pro jejichž napojení na silniční síť je předmětná pozemní komunikace od počátku povolena, nejsou v předmětném území změny, které by byly příčinou nárůstu ploch pro bydlení, rekreaci. Nevznikly ani jiné stavby, jež by generovaly větší zátěž území např. hlukem, dopravou apod. Při posouzení aktuální situace v území za účelem zjištění, zda lze stavbu i nadále realizovat nenastala žádná nová okolnost, která by odůvodňovala, že by stavební povolení nebylo možné prodloužit.

Námítka pod bodem č. 11

Nelze též pominout, že od roku 2006 došlo ke změně poměrů, z nichž se při vydání Stavebního povolení v roce 2006 vycházelo. Podklady o hustotě dopravního provozu, míře prašnosti a hluku z roku 2006 neodpovídají poměrům roku 2016. Rovněž nelze pominout, že od doby vydání Stavebního povolení došlo ke změnám právní úpravy hlukových limitů a posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). V současné době má být povolená stavba posouzena v rámci procesu EIA, a proto by již v současné době nebylo možno Stavební povolení vydat tak, jak bylo vydáno v roce 2006, neboť nové stavební povolení by nutně muselo reflektovat změny právní úpravy ohledně povolení předmětné stavby.

Správní orgán se uvedenými námitkami zabýval a zaujal k nim toto stanovisko:

Trasa předmětné pozemní komunikace je vedena přes zemědělsky obhospodařované území. Správní orgán ověřoval, zda v území, přes které je vedena trasa pozemní komunikace došlo v době od vydání stavebního povolení do vydání tohoto rozhodnutí ke změnám ve využívání území, z nichž by bylo možné dovozovat změny v kvalitě prostředí. Způsob hospodaření ověřoval správní orgán pomocí rejstříku LPIS a veřejně dostupných satelitních snímků území. LPIS je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy. LPIS vznikl na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství na přelomu let 2003 a 2004. Ke spuštění došlo 21. března 2004. Trasa je vedena přes díl půdního bloku 2008/1 (původní označení 3005/1), uživatelem je od doby vydání stavebního povolení do současnosti Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788. Výměra dílu půdního bloku je 30,84 ha, kultura standardní orná půda, režim hospodaření konvenční po celou dobu od vydání stavebního povolení do současnosti. Dále je trasa vedena přes díl půdního bloku 3007 (730-1120), uživatelem je od doby vydání stavebního povolení do současnosti Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788. Výměra dílu půdního bloku je 2,49 ha, kultura trvalý travní porost, klasifikace stálá pastvina, režim hospodaření konvenční po celou dobu od vydání stavebního povolení do současnosti. Dále je trasa vedena přes díl půdního bloku 3006 (730-1120), uživatelem je od doby vydání stavebního povolení do současnosti Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788. Výměra dílu půdního bloku je 9,15 ha, kultura trvalý travní porost, klasifikace stálá pastvina, režim hospodaření konvenční po celou dobu od vydání stavebního povolení do současnosti. Z dat získaných z registru LPIS správní orgán došel k závěru, že uživatel a způsob hospodaření na předmětném území se po dobu od vydání stavebního povolení na pozemní komunikaci do současnosti nezměnil a nedošlo ke změně prostředí. Ke stejným závěrům dospěl správní orgán při srovnání leteckých snímků území dostupných veřejně např. na portálu mapy.cz. Na snímcích z let 2003 a 2006 je území bez objektů průmyslové zóny Vožická, v mezidobí mezi snímkováním v roce 2006 a 2012 přibyly v průmyslové zóně objekty, stejně tak v mezidobí mezi rokem 2012 a současným stavem. Kromě výstavby objektů v průmyslové zóně Vožická, pro jejichž napojení na silniční síť je předmětná pozemní komunikace od počátku povolena, nejsou v předmětném území změny, které by byly příčinou nárůstu ploch pro bydlení, rekreaci. Nevznikly ani jiné stavby, jež by generovaly větší zátěž území např. hlukem, dopravou apod.

Námítka pod bodem č. 12

Účastníci řízení dále vyslovují pochybnost, resp. namítají, že žádost o prodloužení platnosti Stavebního povolení nebyla správnímu orgánu doručena žadatelem včas, tedy ještě v době platnosti Stavebního povolení a jsou přesvědčeni, že platnost Stavebního povolení expirovala.

Správní orgán se uvedenými námitkami zabýval a zaujal k nim toto stanovisko:

Správní orgán zhodnotil pochybnost vyřčenou účastníky na základě spisu vedeného ve věci. Účastníci neuvedli své úvahy či jiné skutečnosti na podporu svého tvrzení. Proto správní orgán vycházel pouze z obsahu spisu, který je ve věci veden a hodnotil podklady v souvislosti s tvrzením účastníků. Možnost prodloužení platnosti stavebního povolení a lhůty pro podávání žádosti upravuje § 115 odst. 4) zák. č. 183/2006 Sb. ve znění účinném v době provedení úkonu takto: „Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Doby platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.“ Stavební úřad z podkladů spisu zjistil, že platnost stavebního povolení byla prodloužena rozhodnutím č. j. S-META 4170/2012/OD/Pok 2 ze dne 25.1.2012 do 13.1.2014. Dále je z podkladů spisu zřejmé, že stavebník podal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení dne 6.1.2014. Jak je výše uvedeno, podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení a stavební úřad nezjistil skutečnosti, které by byly příčinou expirace platnosti stavebního povolení.

JINUDY, z.s. podal jako účastník řízení dne 3.10.2016 následující námítky:

Projekt byl vypracován na místní komunikaci pouze do průmyslové zóny a tomu odpovídaly i všechny podklady, které byly pro jeho vypracování použity. Týká se to zejména hlukové studie, ve které není vůbec předpokládán noční provoz ani nyní uvažovaná intenzita dopravy. Z nyní oficiálně městem prezentovaných informací však vyplývá, že město hodlá vybudovat komunikaci, spojující západní větev silnice první třídy I/19 od Písku s jejím východním pokračováním směrem na Pelhřimov. Má to být východní obchvat Tábora, paralelní s původním obchvatem, v jehož stopě je nyní vedena dálnice D3.

Toto však není veškeré dopravní zatížení, které má být na tuto komunikaci svedeno. Kromě silnice I/19 tudý má vést i tranzitní doprava ve směrech Soběslav, Bechyně (po vybudování přeložky Tesco- Slapy), Mladá Vožice a Benešov. Znamenalo by to i zrušení bezplatného úseku dálnice D3 Čekanice- Měšice, neboť by zde existovala paralelní komunikace.

Město Tábor žádá o prodloužení stavebního povolení na stavbu, která se nebude realizovat (místní komunikace pro napojení průmyslové zóny). Místo ní se má v té samé stopě postavit silnice první třídy I/19 s intenzitou dopravy, jak je uvedeno výše. Rovněž převedení investorství na Jihočeský kraj a snaha o financování z fondů EU tomu odpovídá.

Jsme přesvědčeni, že město Tábor chce zneužít deset let staré stavební povolení na místní komunikaci a použít ho pro výstavbu obchvatu města.

Na takto nově koncipovanou komunikaci je podle našeho názoru třeba nové stavební povolení a projekt, který by pracoval s aktuálními podklady a zohledňoval i veškeré dokumenty, které byly za dobu posledních deseti let vydány v oblasti životního prostředí

Správní orgán se uvedenými námitkami zabýval a zaujal k nim toto stanovisko:

Tvrzení účastníka řízení, že povolovaná komunikace již nemá mít toliko obslužný charakter místního významu, ale v konečném důsledku má být součástí přeložky silnice I/19 je opřeno o informace z médií. Správní orgán komplexně zhodnotil tvrzení účastníka řízení i v souvislostech se spisovým materiálem.

Správní orgán se neztotožňuje s tvrzením, že faktickým záměrem navrhovatele již není vybudování obslužné, místní komunikace, ale vybudování přeložky silnice I/19. Důvody, které správní orgán k tomuto hodnocení vedou, jsou podrobně uvedeny v odůvodnění námitek pod body č. 4, 5, 6, 7 podaných advokátní kanceláří Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o. Námítky JINUDY, z.s. jsou obdobného znění jako námítky pod body č. 4, 5, 6, 7 advokátní kanceláře Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o.

Shrnutí:

Správní orgán zkoumal to, zda navrhovatel (žadatel) je osobou oprávněnou k podání žádosti, a zda žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení byla podána včas, tj. před uplynutím doby uvedené v § 115 odst. 4 stavebního zákona. Po zjištění, že tyto základní podmínky byly splněny, správní orgán posuzoval důvodnost či nedůvodnost žádosti.

Správní orgán v rámci posuzování žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení zjistil, že žadatel po dosavadní dobu platnosti stavebního povolení činil v různých časových úsecích nezbytné kroky, které jednoznačně směřovaly a stále směřují k samotné realizaci stavby. Správní orgán vzal v úvahu i

skutečnost, že se jedná o dopravní stavbu „na Táborské poměry“ velmi velkého rozsahu a významu, jejíž příprava včetně zajištění financování je pro žadatele velmi náročná, a to i časově. V průběhu platnosti stavebního povolení nedošlo na území města Tábora k realizaci obdobně rozsáhlé dopravní stavbě z prostředků rozpočtu města Tábor či Jihočeského kraje. Ze strany žadatele po majetkoprávním vypořádání pozemků pod stavbou došlo mimo jiné k vypracování zadávací dokumentace stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Záměr se nachází v současné době na 5. prioritním místě v části Investiční opatření na silnicích II. třídy s vysokou prioritou, patří tedy do skupiny dopravních staveb financovaných Jihočeským krajem s nejvyšší prioritou (stavby na 1. a 2. prioritním místě jsou dokonce již ve výstavbě a budou dokončeny ještě v letošním roce). Z uvedeného je jasné patrné, že žadatel po celou dobu platnosti stavebního povolení vyvíjí úsilí a investuje finanční prostředky (výkupy pozemků, další stupeň projektové dokumentace) do činností vedoucích k samotné realizaci stavby.

Současně s ohledem na smysl omezení doby platnosti stavebního povolení správní orgán posoudil, že uplynutím času nedošlo k natolik zásadní změně původních okolností (např. podmínek v území), z nichž správní orgán při povolení stavby vycházel, že by již stavební povolení, jehož doba platnosti má být prodloužena, vůbec nemohlo být vydáno. Taková změna poměrů, která by vyhovění žádosti znemožňovala, není správnímu orgánu prima facie zřejmá, ani není známa z úřední činnosti.

Správní orgán se zabýval i okolnostmi spočívajícími v případném negativním dopadu prodloužení doby realizace záměru na životní prostředí, tj. zabýval se i tím, zda pro životní prostředí může být další prodloužení doby provedení stavby, o jejímž umístění a provedení bylo pravomocně rozhodnuto za současných podmínek již výrazně zatěžující (např. s ohledem na změny technologií, změnu poměrů v území). Správní orgán vyhodnotil, že podmínky v předmětném území se po dobu od vydání stavebního povolení na pozemní komunikaci do současnosti nezměnily a nedošlo ke změně prostředí. Kromě výstavby objektů v průmyslové zóně Vožická, pro jejichž napojení na silniční síť je předmětná pozemní komunikace od počátku povolena, nejsou v předmětném území změny, které by byly příčinou nárůstu ploch pro bydlení, rekreaci. Nevznikly ani jiné stavby, jež by generovaly větší zátěž území např. hlukem, dopravou apod.

Správní orgán hodnotil návrh žadatele komplexně v souvislosti s aktuálním stavem silniční sítě v území. Důvody pro realizaci řešení napojení průmyslové zóny v projednané trase a stavebně technickém provedení trvají. Dopravní obsluha průmyslové zóny Vožická je dodnes nevhodně vedena náhradní trasou vedenou vnitroměstskými komunikacemi zastavěným územím města. Z pohledu možných vlivů na místní část Měšice, je již dnes část intenzity dopravy ze silnice I/19 převedena z vnitroměstských pozemních komunikací na nezaplatněný úsek dálnice D3 mezi km 76 – 79. Tímto převedením klesla intenzita provozu i na úseku silnice I/3 podél této místní části. Vliv na bezpečnost silničního provozu v místní části Měšice a Záluží bude mít realizace napojení průmyslové zóny Vožická i ve vztahu k užívání účelové komunikace č. 17u přes školní statek VOŠ Tábor. Intenzita provozu není významná, nicméně užívání stavebně technicky nevhodné komunikace především obyvateli uvedených místních částí je rizikem pro osoby (studenty) pohybující se v areálu školního statku. Správní orgán spatřuje v této záležitosti význam především v oblasti bezpečnosti.

Při posouzení aktuální situace v území za účelem zjištění, zda lze stavbu i nadále realizovat nenastala žádná nová okolnost, která by odůvodňovala, že by stavební povolení nebylo možné prodloužit.

Na základě všech výše uvedených podkladů, důkazů, úvah a posouzení dospěl správní orgán za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených v tomto řízení k rozhodnutí, že platnost stavebního povolení prodlouží, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poštu, potom se za den doručení považuje

desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.



Mgr. Jan Pávek
vedoucí odboru dopravy

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Doručí se:

Stavebník: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)

Město Tábor, Odbor investic a strukturálních fondů, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1

Ostatní účastníci: (veřejnou vyhláškou)

Zdeněk Plachý, Chýnovská č.p. 9, Měšice, 391 56 Tábor 4

Jitka Vachtová, Chýnovská č.p. 483, Měšice, 391 56 Tábor 4

Ing. Pavel Plachý, Spojovací č.p. 416, 391 55 Chýnov

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše č.p. 2418, Klokoty, 390 03 Tábor 3

Roman Šperl, Na Vojtěchu č.p. 166, Měšice, 391 56 Tábor 4

Alena Šperlová, Na Vojtěchu č.p. 166, Měšice, 391 56 Tábor 4

Zdeněk Mazaný, Chýnovská č.p. 182, Měšice, 391 56 Tábor 4

Mgr. Radka Šimonová, Dlouhá č.p. 336/17, 390 01 Tábor 1

Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o., advokátní kancelář, Tyršova č.p. 521, 390 02 Tábor 2

zastoupení pro: Jiří Štěpánek, Na Vojtěchu 383, Měšice, 391 56 Tábor 4

zastoupení pro: Milan Říha, Na Vojtěchu 296, Měšice, 391 56 Tábor 4

zastoupení pro: Miroslav Fara, Na Vojtěchu 297, Měšice, 391 56 Tábor 4

zastoupení pro: Mgr. Jana Líbalová, Jana, Na Vojtěchu 298, Měšice, 391 56 Tábor 4

zastoupení pro: Josef Dvorský, Na Vojtěchu 306, Měšice, 391 56 Tábor 4

zastoupení pro: JUDr. Tomáš Fara, Janáčkova 3086, 390 02 Tábor 2

zastoupení pro: Jiří Fara, Na Vojtěchu 455, Měšice, 391 56 Tábor 4

zastoupení pro: František Vaněček, Na Vojtěchu 322, Měšice, 391 56 Tábor 4

zastoupení pro: Ing. Jiří Douda, Na Vojtěchu 318, Měšice, 391 56 Tábor 4

zastoupení pro: MUDr. Alice Kuchařová, Na Vojtěchu 305, Měšice, 391 56 Tábor 4

zastoupení pro: Mgr. Marcela Burešová, Na Vojtěchu 327, Měšice, 391 56 Tábor 4

zastoupení pro: Hana Zvonařová, Na Vojtěchu 341, Měšice, 391 56 Tábor 4

Jitka Říhová, Na Vojtěchu č.p. 296, Měšice, 391 56 Tábor 4
Ing. Jiří Libal, Na Vojtěchu č.p. 298, Měšice, 391 56 Tábor 4
Ing. Petr Dvořák, Josefy Kolářové č.p. 1007/6, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11
Ludmila Heinová, Na Vojtěchu č.p. 300, Měšice, 391 56 Tábor 4
Ludmila Dvořáková, U Špýcharu č.p. 561, Měšice, 391 56 Tábor 4
Milena Dvořáková, Na Vojtěchu č.p. 299, Měšice, 391 56 Tábor 4
Marie Doudová, Na Vojtěchu č.p. 318, Měšice, 391 56 Tábor 4
Ing. Pavel Kuchař, Na Vojtěchu č.p. 305, Měšice, 391 56 Tábor 4
Jan Šich, Tyršova č.p. 50, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1
Průmyslová zóna Tábor, a.s., Vožická č.p. 2604, 390 02 Tábor 2
Greiner Real Estate s.r.o., Husova č.p. 1056, 374 01 Trhové Sviny
Oldřich Peřina, Žižkovo nám. č.p. 16/16, 390 01 Tábor 1
Miloslav Štěrba, Dlouhá Lhota č.p. 39, 391 55 Chýnov
Konstrukční, a.s., Vožická č.p. 621, Měšice, 390 02 Tábor 2
Cellofoam Realitní CZ s.r.o., Vožická č.p. 622, Měšice, 390 02 Tábor 2
Karel Dvořák - LOCE s.r.o., Vožická č.p. 2103, 390 02 Tábor 2
Zdeněk Brož, Chýnovská č.p. 121, Měšice, 391 56 Tábor 4
RNDr. Karel Vandrovec, Dlouhá č.p. 618/14, 110 00 Praha 1-Staré Město
Zdeňka Březinová, Budovatelů č.p. 2624, 390 02 Tábor 2
Jiří Bureš, Pražského povstání č.p. 2312, 390 03 Tábor 3
Dagmar Burešová, Pražského povstání č.p. 2312, 390 03 Tábor 3
Marie Kříklánová, Šelmberská č.p. 2282, 390 02 Tábor 2
Miroslav Kotrba, Sokolovská č.p. 2361, 390 03 Tábor 3
Václav Smrž, Angela Kančeva č.p. 2285, 390 02 Tábor 2
Vlastislava Smržová, Angela Kančeva č.p. 2285, 390 02 Tábor 2
Jaroslav Baloun, Budovatelů č.p. 2624, 390 02 Tábor 2
Blanka Balounová, Budovatelů č.p. 2624, 390 02 Tábor 2
Dáša Dlouhá, Vídeňská č.p. 2773/2, 390 05 Tábor 5
Ladislav Hála, Budějovická č.p. 2268, 390 02 Tábor 2
Jiřina Hálová, Budějovická č.p. 2268, 390 02 Tábor 2
Josef Kačer, Čsl. armády č.p. 2208, 390 03 Tábor 3
Jaroslava Kačerová, Čsl. armády č.p. 2208, 390 03 Tábor 3
Michal Permedla, Sedláčkova č.p. 2283, 390 02 Tábor 2
Blanka Permedlová, Sedláčkova č.p. 2283, 390 02 Tábor 2
Ivana Tlachová, Havanská č.p. 2825/6, 390 05 Tábor 5
Karel Březina, U Obecních domů č.p. 1617/4, 390 02 Tábor 2
Hana Křivánková, Poupětova č.p. 1332/9, 170 00 Praha 7-Holešovice
Milada Sovová, Lidická č.p. 2355, 390 03 Tábor 3
RSDr. Karel Mráček, Farského č.p. 2196, 390 02 Tábor 2
Jana Mráčková Navrkalová, Farského č.p. 2196, 390 02 Tábor 2
Blažena Janurová, Pionýrů č.p. 242, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Ing. Marie Marhounová, Hanojská č.p. 2835/11, 390 05 Tábor 5
Pavlína Procházková, nám. Přátelství č.p. 2803/4, 390 05 Tábor 5
Dana Lišková, Buzulucká č.p. 2343, 390 03 Tábor 3
Václav Horák, Štíbrova č.p. 1221/2, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Tábor, Tomkova č.p. 2159/6, 390 01 Tábor 1
Ing. Ludmila Horká, Velvarská č.p. 1648/15, Dejvice, 160 00 Praha 6
Ing. Karel Hrazdil, Pštrossova č.p. 207/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
Ing. Pavel Zezulka, Oblouková č.p. 766/16, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 10
Ing. Martin Ripper, Pardubická č.p. 132, 535 01 Přelouč
Bc. Dana Ripperová, Brigádníků č.p. 2558, 390 02 Tábor 2
Jana Švecová, Vídeňská č.p. 2774/3, 390 05 Tábor 5
Josef Kůta, Údolní č.p. 2185, 390 02 Tábor 2
Miroslav Kůta, Žernovice č.p. 24, 383 01 Prachatice
Ing. Karel Bednář, Čsl. armády č.p. 2688, 390 03 Tábor 3
Božena Bednářová, Čsl. armády č.p. 2688, 390 03 Tábor 3
František Krejčí, Brigádníků č.p. 2555, 390 02 Tábor 2
Věra Krejčová, Brigádníků č.p. 2555, 390 02 Tábor 2

Marie Šmídová, nám. F. Křížika č.p. 499/15, 390 01 Tábor 1
Mgr. Rudolf Zeman, Brigádníků č.p. 2558, 390 02 Tábor 2
Marie Zemanová, Brigádníků č.p. 2558, 390 02 Tábor 2
Jana Sobková, Kpt. Jaroše č.p. 2410, 390 03 Tábor 3
Václav Linda, Náchodská č.p. 2674, 390 03 Tábor 3
Magdalena Lindová, Náchodská č.p. 2674, 390 03 Tábor 3
Ing. Pavel Stolína, Angela Kančeva č.p. 2525, 390 02 Tábor 2
Miloslav Tůma, Školní náměstí č.p. 627/6, 391 02 Sezimovo Ústí 2
Věra Tůmová, Školní náměstí č.p. 627/6, 391 02 Sezimovo Ústí 2
František Douda, nám. Přátelství č.p. 2802/3, 390 05 Tábor 5
Dana Doudová, nám. Přátelství č.p. 2802/3, 390 05 Tábor 5
Jaroslav Kolomazník, Šlikova č.p. 1266/2, 390 02 Tábor 2
Zdeňka Svobodová, Pražského povstání č.p. 2310, 390 03 Tábor 3
Pavel Melichar, Budovatelů č.p. 2618, 390 02 Tábor 2
Hana Melicharová, Budovatelů č.p. 2618, 390 02 Tábor 2
Miloš Buchl, Kamarytova č.p. 1597/12, 390 02 Tábor 2
Terézia Buchlová, Kamarytova č.p. 1597/12, 390 02 Tábor 2
Hana Kotěrová, Soběslavská č.p. 2225, 390 02 Tábor 2
Gabriela Pražáková, Berlínská č.p. 2754/8, 390 05 Tábor 5
MUDr. Jana Motičková, Budějovická č.p. 3072, 390 02 Tábor 2
Václav Jakl, Kpt. Jaroše č.p. 2403, 390 03 Tábor 3
Galina Jaklová, Kpt. Jaroše č.p. 2403, 390 03 Tábor 3
Marie Machoňová, Angela Kančeva č.p. 2286, 390 02 Tábor 2
Český svaz chovatelů, Základní organizace Tábor I, Dražice č.p. 217, 391 31 Dražice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28
Jaroslav Veřtát, Průhon č.p. 356, Měšice, 391 56 Tábor 4
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská č.p. 2486/24, 390 02 Tábor 2
STROJÍRNA TÁBOR, spol. s r.o., Chýnovská č.p. 2420, 390 02 Tábor 2
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
SEKOMA, s.r.o., Chýnovská č.p. 2486/24, 390 02 Tábor 2
Ing. Karel Hrazánek, K Šachtě č.p. 353, Horky, 390 01 Tábor 1
Nábytek VASA spol. s r.o., Měšická č.p. 2697, 390 02 Tábor 2
Martin Veřtát, Na Vojtěchu č.p. 411, Měšice, 391 56 Tábor 4
Květoslava Reichelová, Na Vojtěchu č.p. 327, Měšice, 391 56 Tábor 4
Zdeňka Dolistová, Na Vojtěchu č.p. 341, Měšice, 391 56 Tábor 4
Marie Štěpánková, Na Vojtěchu č.p. 383, Měšice, 391 56 Tábor 4
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Pavel Plachý, Senovážná č.p. 643, Měšice, 391 56 Tábor 4
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T.G.Masaryka 788, nám. T. G. Masaryka č.p. 788/1, 390 02 Tábor 2
JINUDY, z.s., Na Výsluní č.p. 283, Měšice, 391 56 Tábor 4

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Stavební úřad, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1 se žádostí o vyvěšení.
