

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MS/2019/00118 SAP S/4 Hana: 8020000576

Číslo smlouvy Stavebníka: 2019/036/OI/DSM Registr smluv: ANO

0.36.88

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MS/2019/00118**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Olomouckým krajem


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na základě pověření Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu



(dále jen „CETIN“)

a

Olomouckým krajem

se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy a jejích dodatků: Ing. Miroslav Kubín, vedoucí odboru investic na základě pověření hejtmana ze dne 10. 10. 2017

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460



(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítí, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 7.2.2019 vydané pod čj. 533599/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI_C_Štěpánov_křížovatka Březecká**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společností CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Přebkládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Přebkládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Přebkládky nebude Přebkládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Přebkládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Přebkládky a/nebo jednotlivými úkony Přebkládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Přebkládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Přebkládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) podat žádost o vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Přebkládky a učinit nezbytné kroky směřující k vydání rozhodnutí o umístění stavby Přebkládky;
- (iii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Přebkládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Přebkládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Přebkládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Přebkládky; dokumentace skutečného provedení Přebkládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit a předat Stavebníkovi dokumentaci skutečného provedení stavby (Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně technické zprávy a souřadnic ověřené dle zákona (1 x v grafické podobě, 1 x v digitální podobě v uzavřeném formátu a 1 x v digitální podobě v otevřeném formátu);
- (iii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Přebkládkou dotčeným nemovitostem;
- (iv) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Přebkládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Přebkládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Přebkládky:

- (i) po splnění Předpokladů pro realizaci Přebkládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Přebkládky), vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Přebkládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“).

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Přebkládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Přebkládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Přebkládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických

komunikací k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebnosti do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodloužení Stavebník s plněním povinností dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodloužení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky a předání dokumentů dle odst. 4 Závazky smluvních stran, bod 4.1 b) ii a iii. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty a předání příslušných dokumentů je splněné dnem doručení na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **190.801,- Kč**, (slovy: *jednostodevadesáttisícosmsetjedna korun českých*). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do jednoho (1) měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnostech a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **51.168,- Kč**, (slovy: *padesátjedenatisícjednošedesátosm korun českých*) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: specialista pro výstavbu sítí - překládky SEK
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454

- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kubín
funkce: vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
e-mail: m.kubin@olkraj.cz, tel.: 585 508 532

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno

pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnost CETIN doručena řádná Kvalifikovaná učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedených v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;

- (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
- (c) e-mailovou zprávou zaslano na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je

předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikt ní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

- 12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 12.14 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Doložka

Smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje v souladu s usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/3/16/2016 ze dne 5. 12. 2016 podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

CETIN: - 8 -08- 2019

Stavebník: 29-08- 2019

V Brně

V Olomouci dne

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Miroslav Kot
supervizor pro výstavbu sítě

Olomoucký kraj
Ing. Miroslav Kubín
Vedoucí odboru investic

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Technické řešení I.

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie AN – Přístupová síť
Podkategorie VPI - metal. kab. přístupová síť
Číslo SAP
Číslo interní
Schvalování akce 2-kolové schvalování
Název

66039/19/0027, VPIC_Štěpánov_křízovatka Březecká

Budoucí uživatel NO-OS Olomoucko

Zpracovatel Ing. Petr Pilař

Předkladatel Vedoucí: Pavel Sedlár
Manažer: Pavel Sedlár

Schvaluje Ing. Valter Skowronek
Radek Měchura
Vlastimil Lepieš
Ludmila Uhrová

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použité technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva
1.1 Základní údaje
Identifikační údaje

Název:	66039/19/0027, VPIC, Štěpánov_křížovatka Březecká
Kategorie:	AN - Přístupová síť
Podkategorie:	VPI - metal. kab. přístupová síť
Typ investice:	Ochrana a přeložka stáv. metalických kabelů
Důvod I:	
Číslo interní:	
Prvek SPP:	
ABC:	
HOST:	
ATÚ:	

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0,000 km	kmp mk
100200_Délka metalických kabelů	0,000 km	kmk mk
100700_Délka nadzemní tratě	0,000 km	km vyk
100100_Délka párů v metalických kabelech	0,000 km	km kv
100300_Délka výkopů vě. podvrtnů a přechodů	0,000 km	kmo kv
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár	
100900_Počet bytových domů	0 BD	
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj	
100500_Počet rodinných domů	0 RD	
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj	

Požadavky:

Název polygonu:

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Rekapitulace nákladů:

Příprava:	0 tis. Kč
Materiál - přímá dodávka TCZ:	0 tis. Kč
Materiál zhotovitele-vykazovaný:	0tis. Kč
Materiál zhotovitele-nevykazovaný:	0 tis. Kč
Montáž:	0 tis. Kč
Zemní práce:	0tis. Kč
GOZ:	0 tis. Kč
Poplatky:	0 tis. Kč
Ostatní:	0 tis. Kč
Provozní práce:	0 tis. Kč
VBŘ příprava + realizace:	0 tis. Kč
NPV:	
OPEX:	0 tis. Kč
Celkové investiční náklady včetně přípravy:	0 tis. Kč
Celkové realizační náklady:	0 tis. Kč

Termíny:

Platnost ÚR od: ÚR bude řešit CETIN

Platnost ÚR do:

Plánované zahájení přípravy:

Plánované ukončení přípravy:

Plánované zahájení realizace: 2. polovina 2020

Plánované ukončení realizace:

Nabídka k přejiímce (Plán):

1.2 Účel stavby:

SD stavby " 66039/19/0027, VPIC_Štěpánov_křížovatka Březecká"

V rámci stavby "III/44613, III/4468 Štěpánov, křížovatka Březecká", dojde k dotčením podzemních vedení sítí elektronických komunikací CETIN. Tento CTN řeší ochranu a přeložku těchto sítí.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu poskytnutá investorem.

2.2 Navrhované řešení:

Stávající stav

Trasa stávajícího kabelu PPFLE 75XN0,4 (přívod do SR STPN8, STPN9) kříží komunikaci vedoucí do Březců. Vzhledem k realizaci okružní křižovatky dojde k rozšíření této komunikace a stávající trasa kabelu by byla pod novými obrubníky.

Technické řešení

Trasa přeložky byla převzata z projektu investora.

Bude vykopána nová trasa dle podkladů v projektu. Přechod komunikace bude vzhledem k rekonstrukci vozovky řešen překopem. Pod vozovkou bude kabel veden v souběhu se stávajícím kabelem, proto je při výkopu nutno postupovat opatrně.

Při křížení komunikace bude kabel uložen v chrániče PE110m a jako rezervní bude připojena PE110mm.

Pozor je nutno dodržet krytí dle ČSN 736005.

Do nové trasy bude uložen. nový metalický kabel PPFLE 100XN0,4.

V pravé části vozovky (směrem od Březců) bude odkopána stávající trasa v délce cca 4m a v rámci PEW bude kabel přerušen a přesunut do nové trasy, kde bude propojen na nový kabel v metalických spojkách XAGA500 75/15-400.

Trasa přeložek je vedena v kat. území Štěpánov u Olomouce, vlastníci parcel jsou v příloze.

V případě **doplnění ochrany** případně zvýšení krytí metalických kabelů nebo úprav stávajících kabelů **nebudou uzavírány nové SoSB**. neboť na předmětném pozemku bylo uloženo telekomunikační vedení a zařízení ještě před účinností zákona č. 151/2000 Sb. (před 1.7.2000) tzn. vzniklo (a stále trvá) k uvedenému pozemku (resp. k jeho části) věcné břemeno přímo ze zákona č. 110/1964 Sb. (které se nezapisovalo do evidence nemovitostí, dnes katastru nemovitostí).

Zákonem č. 151/2000 Sb. a následně zákonem č. 127/2005 Sb. (současně účinný zákon o elektronických komunikacích) zůstala věcná břemena vzniklá na základě zákona č. 110/1964 Sb. zachována.

Tzn. věcná břemena ze zákona č. 110/1964 Sb. se nezapisovala do evidence nemovitostí a od 20.8.2003 není ani povinné dodatečně zapisovat tato břemena do katastru nemovitostí, tato povinnost byla zákonem č. 225/2003 k 20.8.2003 zrušena (odst. 15 byl z § 107 vypuštěn)! proto není jejich existence z katastru nemovitostí zřejmá.

Pokud tedy ČESKÝ TELECOM a.s. a nyní jeho nástupce Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále CETIN) zřídil a provozoval (a dodnes provozuje) zařízení telekomunikační sítě na předmětném pozemku před účinností zákona 151/2000 Sb., vzniklo k pozemku věcné břemeno přímo ze zákona 110/1964 Sb. (a do evidence nemovitostí /dnes katastru nemovitostí/ se nezapisovala a zapisovat nemusí / pak oprávnění z tohoto věcného břemene ve prospěch společnosti CETIN zůstávají nedotčena. Vlastník pozemku je povinný provozování vedení veřejné telekomunikační sítě na svém pozemku respektovat

Místa metalických spojek a konce chrániček budou označeny Minimarkery.

2.3 Popis tras

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Rezervy budou označeny Minimarkerem 3M, typ 1255.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I
TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II
TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III
TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely
TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení
POS 65-2001

Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Akci nutno koordinovat se stavbou „III/44613, III/4468 Štěpánov, křižovatka Březecká“

2.7 Ostatní:

Kontakty:



Stavební titul: ÚR bude zajišťovat CETIN

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené: nejsou

Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------

Navazující akce - vložené:







Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------


4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha



5. Přílohy


Název přílohy	Stupeň
Situace polohopisná	SD
Schéma přeložky	SD
Kalkulace nákladů - PPD	SD
Seznam vlastníků dotčených pozemků	SD
Podklady dokumentace CETIN	SD

LEGENDA:

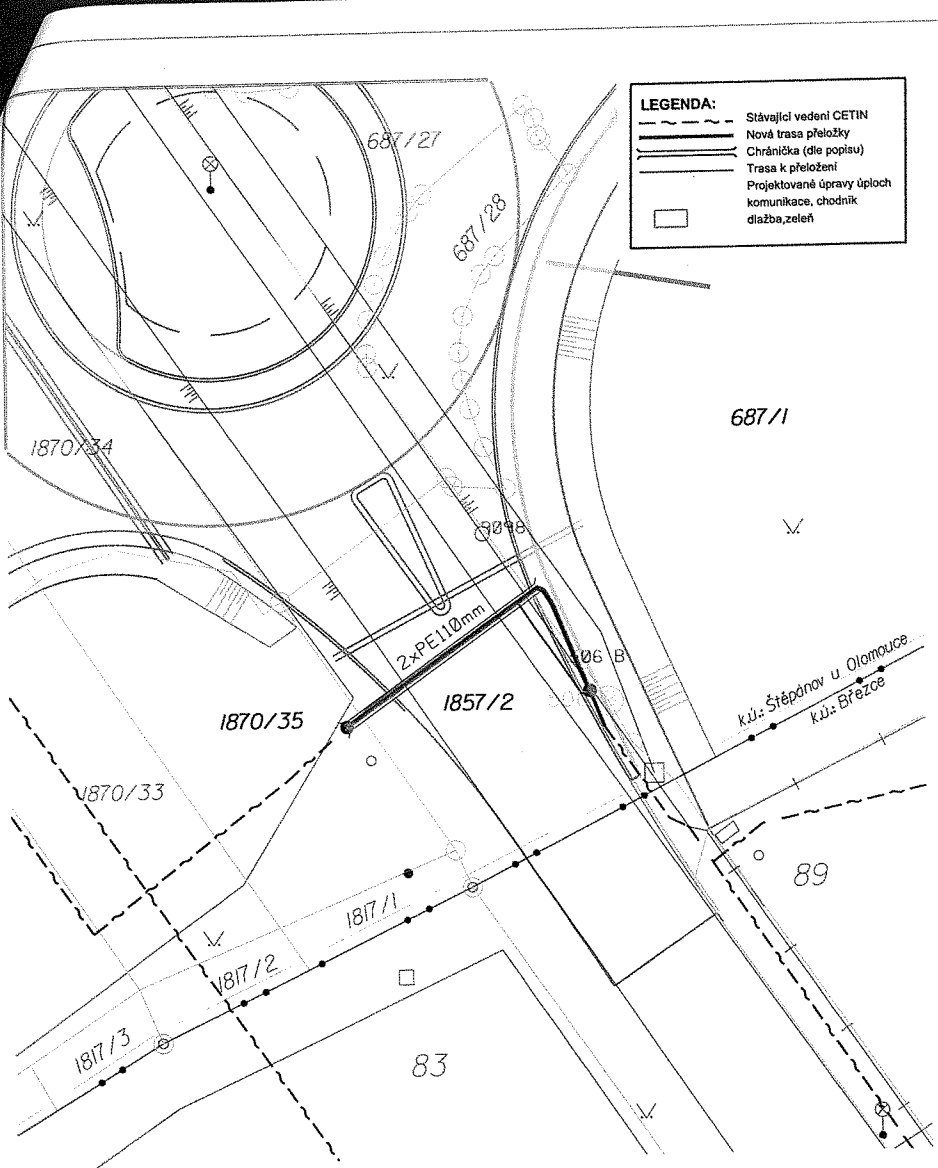-  Stávající vedení CETIN
-  Nová trasa přeložky
-  Chránička (dle popisu)
-  Trasa k přeložení
-  Projektované úpravy úpoch komunikace, chodník
-  dlažba, zeleň



Kreslil :		Generální projektant: VEGACOM a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4	  <small>ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOST</small>
Zkontroloval :		Investor: Česká telekomunikační infrastruktura Ošňanská 288/8, Praha 3	
Jiří Chlapík		Odsouhlasil :	
Zodp. pracovník: Ing. Petr Pilař		Ing. Petr Pilař	
Místo :	Štěpánov k.ú.: Štěpánov u Olomouce		
Název akce :	VPIC_Štěpánov_křížovatka Břežcecká		Datum : 04/2019
Příloha :	Situace katastrální		Stupeň : DUR / DUS
			Měřítko : 1 : 500
			č. výkresu: 01

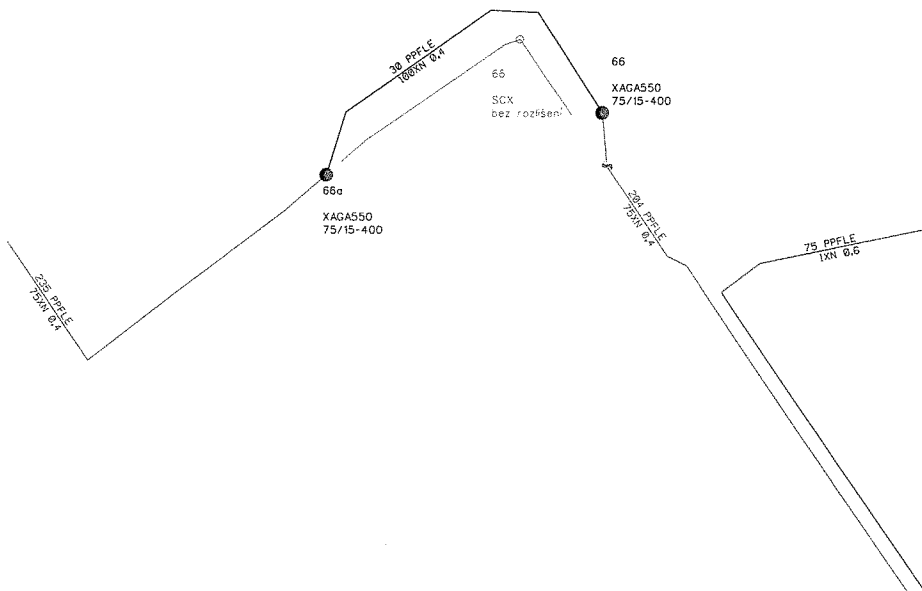

Kreslí :		Generální projektant: VEGACOM a.s.	VEGACOM
Lucie Šuherová		Novodvorská 1010/14, Praha 4	
Zkontroloval :		Investor: Česká telekomunikační infrastruktura Olšanská 268/8, Praha 3	▶CETIN <small>ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA</small>
Jiří Chlapík		Odsouhlasil :	
Zodp. pracovník:		Ing. Petr Pilař	
Místo :		Štěpánov k.ú.: Štěpánov u Olomouce	
Název akce :	VPIC_Štěpánov_křizovatka Březecká		Datum : 04/2019
Příloha :	Schema		Stupeň : DUR / DUS
			Měřítko : 1 : 500
			č. výkresu: 01

VPIC_Štěpánov_křizovatka Březecká

Parcelní číslo:	1870/35	
Obec:	Štěpánov [505161]	
Katastrální území:	Štěpánov u Olomouce [763438]	
Číslo LV:		1452
Výměra [m ²]:		196
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitosti	
Mapový list:	DKM	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě	
Způsob využití:	jiná plocha	
Druh pozemku:	ostatní plocha	
Vlastnické právo		Podíl
Česká republika,		
Právo hospodařit s majetkem státu		Podíl
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dílážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1		
Způsob ochrany nemovitosti		
Název		
ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně		

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Parcelní číslo:	1857/2	
Obec:	Štěpánov [505161]	
Katastrální území:	Štěpánov u Olomouce [763438]	
Číslo LV:		10001
Výměra [m ²]:		203
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitosti	
Mapový list:	DKM	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK	
Způsob využití:	silnice	
Druh pozemku:	ostatní plocha	
Vlastnické právo		Podíl
Obec Štěpánov, Horní 444/7, 78313 Štěpánov		
Způsob ochrany nemovitosti		
Název		
ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně		

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.




Parcelní číslo:	687/1	
Obec:	Štěpánov [505161]	
Katastrální území:	Štěpánov u Olomouce [763438]	
Číslo LV:		1281
Výměra [m ²]:		1324
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitosti	
Mapový list:	DKM	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě	
Druh pozemku:	orná půda	
Vlastnické právo		Podíl
B M H spol. s r.o., Ondřejova 592/11a, Chválkovice, 77900 Olomouc		
Způsob ochrany nemovitosti		
Název		
zemědělský půdní fond		
ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně		

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra	
	31100	96

Omezení vlastnického práva

Typ
Zákaz zcizení nebo zatížení
Zástavní právo smluvní



Poč.č	Vlastník
1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dílžďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1
2	Obec Štěpánov, Horní 444/7, 78313 Štěpánov
3	B M H spol. s r.o., Ondřejova 592/11a, Chválkovice, 77900 Olomouc

orná půda+F3:P6

str.č.	obec:	kú:	délka	Druh pozemku:	Způsob využití	m2	Kč	Status	OP / m
1870/35	Štěpánov	Štěpánov u Olomouce		ostatní plocha	jiná plocha				
1857/2	Štěpánov	Štěpánov u Olomouce		ostatní plocha	silnice				
687/1	Štěpánov	Štěpánov u Olomouce		orná půda					

Příloha č. 1 Specifikace nákladů_VPIC_Štěpánov_křizovatka Březecká

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.05

Položková 2019.05

Název stavby: VPIC Štěpánov_křizovatka Březecká

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Ing. Petr Pilař

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	45 057,70 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	34 308,15 Kč
MONTÁŽ	56 066,61 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	9 657,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	6 109,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	26 449,09 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	12 151,73 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	1 000,00 Kč
Celkové náklady:	190 801,01 Kč
STAVEBNÍ ČINNOST	112 184,42 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	78 616,59 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	14 954,40 Kč
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění st:	1.00 ks	24 425,52 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	25.00 m	453,75 Kč
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 080,38 Kč
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	24.00 m	1 276,80 Kč
955552 S		Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	4.00 m	62,72 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	17.00 m	8 987,22 Kč
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	14.00 m	2 116,94 Kč
954952 S		Rýha ve vozovce lity asfalt 50/130	10.00 m	16 200,20 Kč
955052 S		Vytyčení trasy ve volném terénu	27.00 m	130,14 Kč
MONTÁŽ				

955031 S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	4.00 m	125,92 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřk	1.00 ks	157,25 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřk	74.00 ks	2 685,46 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	74.00 ks	1 790,80 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	84,68 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	157,25 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	150.00 ks	4 537,50 Kč
955282 S	Montáž spojky smržitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 386,92 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	34.00 m	1 233,86 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	30 857,50 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	6200.00 JV	6 200,00 Kč
Rozpočtová rezerva min. 5000 Kč nebo 3% z nákladů stavby			
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 738,60 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 110,87 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 987,01 Kč
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	1240.00 JV	1 240,00 Kč
vytýčení trasy dle geo. bodů			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	6 109,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednáání Smlouvy o zřízení věcného břemene	3.00 ks	13 600,00 Kč
náhrada VBŘ -odhadovaná			
Výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 331,76 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z	3.00 ks	5 517,33 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	1000.00 JV	1 000,00 Kč
poplatek za ÚR			

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		17.00 ks	646,34 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		27.00 m	103,68 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		17.00 m	75,14 Kč
300110 S	Kabel plastový TCEPKPFL 100x4x0,4		30.00 m	5 398,80 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5		3.00 ks	692,46 Kč
312417 S	Modul konektor. 4000-25P		12.00 ks	578,88 Kč
407578 S	Souprava čisticí 4413L		1.00 ks	638,68 Kč
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE		2.00 ks	1 451,60 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm		5.00 ks	2 566,15 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá		4.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda		4.00 ks	0,00 Kč
