



S004P01E3JLD

SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník*

na **dodávku stavby** na akci:

„Hodonín – oprava živičných krytů MK 2019“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

IČ: 002 84 891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupené: ve smluvních věcech Liborem Střechou - starostou města Hodonína
v technických věcech Ing. Milanem Hudcem (ved. odboru investic MěÚ)
[redacted] (referent odboru investic MěÚ)

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 480 35 599

DIČ : CZ48035599

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 212269343/0300

Zastoupen: ve smluvních věcech:
[redacted] ředitel oblasti Hodonín a
[redacted] výrobně-technický ředitel
oba na základě plné moci
v technických věcech:
[redacted] – hlavní stavbyvedoucí

/dále jen zhotovitel/

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Stavba: HODONÍN – OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2019

Místo: ul. Okružní, ul. Lesní, ul. I. Olbrachta, ul. Za hřbitovem

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 3.2 Předmětem zakázky „Hodonín – oprava živičných krytů MK 2019“ je rekonstrukce živičného krytu MK Okružní, MK Lesní, MK I. Olbrachta, MK Za hřbitovem a ošetření spár v asfaltovém povrchu místních komunikací v rozsahu dle výkazu výměr a grafické přílohy (Příloha č.1). Rozsah bude dále upřesněn v rámci pochůzky na místě samém po předání staveniště a lokalizace opravy spár na MK města bude provedena obhlídkou před vlastní realizací.
- 3.3 **Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v zadávací dokumentaci obsaženy, ale jsou nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých by zhotovitel podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl.**
- 3.4 Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat v důsledku oprávněných požadavků a **rozhodnutí dotčených orgánů** v rámci prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.5 **Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:**
- 3.5.1 **neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),**
- 3.5.2 **provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),**
- 3.5.3 **před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem,**
- 3.5.4 Změny stavby mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím cen položkového rozpočtu (*Příloha č. 1*), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj. může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány tj. **RTS 2019**. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.
- 3.5.5 Součástí předmětu díla je rovněž zajištění povolení a realizace úpravy dopravního značení, potřebné pro zhotovení díla.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách a termínech:

předání staveniště: do 30 dnů od podpisu smlouvy

zahájení prací:	do 7 dnů od předání staveniště
ukončení prací:	do 30 dní od zahájení prací
předání díla:	do 7 dnů od ukončení prací

- 4.2 Plnění termínů realizace díla je podmíněno rovněž vhodnými **klimatickými podmínkami**. Změna termínu realizace díla může být provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn na pokyn TDS a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele (viz.čl.1.SOD) záznamem do stavebního deníku a zápisem na KD.

5 CENA ZA DÍLO

- 5.1 Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle Přílohy č.1. a je cenou nejvýše přípustnou ve výši:

4 892 562,- Kč (bez DPH)

1 027 438,- Kč DPH 21 %

5 920 000,- Kč (včetně DPH)

- 5.2 Cena **díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.3 **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.
- 5.4 Cena díla podle odst.5.1. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy**.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

- 6.1 Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený objednatelem.
- 6.2 Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

7 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno

v souladu s **jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb.** ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákoných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

- 7.2 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích které provádí stavební deník v souladu s Vyhl.č.499/2006.
- 7.3 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby stavbyvedoucího** musí být bezodkladně písemně **oznámena objednateli**. Výkon funkce stavbyvedoucího **nelze zajistit poddodavatelsky**.
- 7.4 **TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 7.5 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících **poddodavatelů**:

Název	IČ	Rozsah prací
NETÝKÁ SE		

- 7.6 Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli do 5 dnů od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než 20 % celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).

8 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 8.2 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 8.3 Převzetím díla přechází na objednatele **vlastnické právo** k dílu.

9 REKLAMACE

9.1 Postup při reklamaci:

9.2 Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje

do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
- datum prohlídky
- datum zjištění vady
- rozsah vady či poškození díla
- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
- předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které **nemají podstatný** vliv na funkci dokončeného díla, **zahájí do 15 dnů** od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady **odstraní do 30 dnů** od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která **má „podstatný vliv“** na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady **odstraní do 15 dnů** od obdržení písemného oznámení reklamace.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

9.3 I když, **reklamace nebude oprávněná**, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

9.4 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

10 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1 Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.

10.2 Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, **minimálně však 24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

- 10.3 Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv **právní vady díla**, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

11 SMLUVNÍ POKUTA

- 11.1 V případě **prodlení** s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a **vyčištění staveniště** zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k **odstranění vady** uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k **odstranění vady** uplatněné objednatelem **v záruční době**, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k **odstranění případných vad** či nedodělků uplatněných objednatelem **v průběhu provádění díla** dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje **15 dnem** prodlení ve výši **10.000,- Kč** za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli jiného svého závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,-Kč** za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností zhotovitele má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
- 11.8 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 11.9 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
- 11.10 Smluvní pokuty je objednatel **oprávněn započíst** proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

- 11.11 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 11.12 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

12 JINÁ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí **na svůj náklad**.
- 12.2 Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny pouze **písemnými dodatky**, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 12.3 Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a **nabývá účinnosti** dnem zveřejněním v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve **4 výtiscích** s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 12.4 Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.
- 12.5 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 V případě **neschválení přesunu finančních prostředků** zastupitelstvem města na realizaci akce s názvem „Hodonín – oprava živičných krytů MK 2019“ si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, příp. je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
- 12.7 Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

13 PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, a tedy město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- Příloha č. 1** **Položkový rozpočet** stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací VZ
Příloha č. 2 **Časový harmonogram** postupu stavebních prací
Příloha č. 3 **Změnový list** (vzor)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 15.8.2019, usnesení č. 1216

V Hodoníně dne: *2. 9. 2019*

Objednatel:

Libor Střecha – starosta

V Hodoníně dne 15.7.2019

Zhotovitel:

- ředitel oblasti Hodonín,
- výrobně-technický ředitel,
oba na základě plné moci

Položkový rozpočet

„Hodonín – opravy živičných krytů MK 2019“
Rekapitulace stavebních objektů

Název objektu

Cena za objekt bez DPH v Kč

Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Okružní	3 298 936 Kč
Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK I. Olbrachta	686 423 Kč
Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Za hřbitovem	359 418 Kč
Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Lesní	102 386 Kč
Ošetření spár - 2000 bm	391 800 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	53 598 Kč

Cena celkem bez DPH:	4 892 562 Kč
DPH 21%:	1 027 438 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%:	5 920 000 Kč

Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Okružní

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 Zemní práce					
1 113154364	Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase				
5 Komunikace					
2 573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2				
3 577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
4 577123121V	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 30 mm				
5 58920	Vyplnění spár živičnou zálivkou				
9 Ostatní konstrukce a práce					
6 919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu				
7 919721201T	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu				
8 919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm				
9 919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm				
10 938909331	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
11 997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km				
12 997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti				
13 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce				
14 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
15 MTŽ	Výšková úprava UV a poklopů				
16 VRN	Přechodné dopravní značení				

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	3 298 936 Kč
	21,00	692 777 Kč	Celková cena s DPH:	3 991 713 Kč



Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Za hřbitovem

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
5	Komunikace				
1	573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2				
2	577144121 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
3	58920 Vyplnění spár živičnou zálivkou				
9	Ostatní konstrukce a práce				
4	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
5	VRN Přechodné dopravní značení				


	Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	359 418 Kč
STAVBA CELKEM	21,00	75 478 Kč	Celková cena s DPH:	434 896 Kč



Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Lesní

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 Zemní práce					
1 113154364	Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase				
5 Komunikace					
2 573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2				
3 577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
4 577123121V	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 30 mm				
5 58920	Vyplnění spár živičnou zálivkou				
9 Ostatní konstrukce a práce					
6 919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu				
7 919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm				
8 919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm				
9 938909331	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
10 997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km				
11 997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti				
12 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce				
13 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
7 VRN	Přechodné dopravní značení				
STAVBA CELKEM					
		Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	102 386 Kč
		21,00	21 501 Kč	Celková cena s DPH:	123 888 Kč

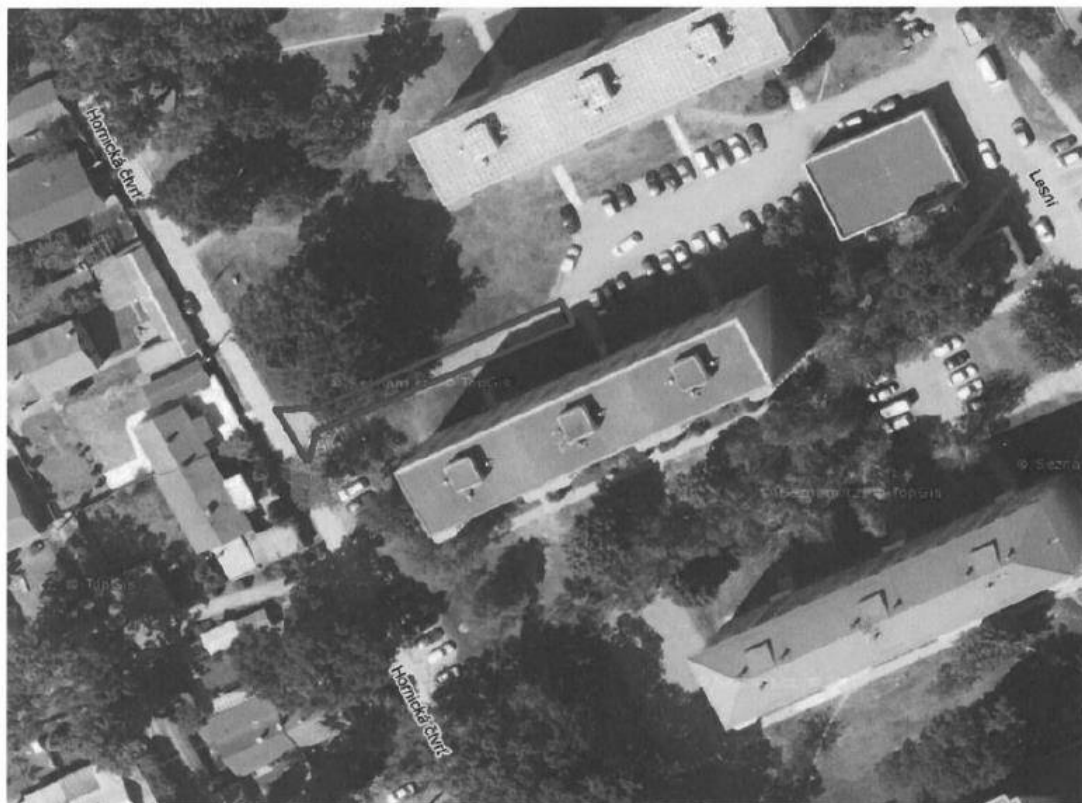

Ošetření spár - 2000 bm

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
5	Komunikace (aspe)				
1	58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM				
9	Ostatní konstrukce a práce (aspe)				
2	919112223 Řezání spár pro vytvoření komůrky § 15 mm hl 30 mm pro těsnici zalivku v živičném krytu				
STAVBA CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	391 800 Kč
		21,00	82 278 Kč	Celková cena s DPH:	474 078 Kč

Vedlejší a ostatní náklady

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
Vedlejší náklady					
1	Zařízení staveniště				
2	Koordinanční činnost				
3	Zajištění BOZP na staveništi				
Ostatní náklady					
4	Průzkumné práce				
5	Zajištění zkoušek				
6	Zeměměřičské práce při výstavbě - nivelace				
STAVBA CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	53 598 Kč
		21,00	11 256 Kč	Celková cena s DPH:	64 854 Kč

Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Hodonín – opravy živičných krytů MK 2019“

Stavební objekt	2019			
	září			
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden
Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Okružní				
Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK I. Olbrachta				
Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Za hřbitovem				
Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Lesní				
Ošetření spár - 2000 bm				

Změnový list

Vzor

Název akce:
HODONÍN – OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2019

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. XX**
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. Oddíl stavby: *(Stavební objekt, Provozní soubor)*
2. Zpracovatel změnového listu: *(zhotovitel stavby)*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
 - 3.1 stavební deník: *(SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)*
 - 3.2 kontrolní den: *(KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)*
 - 3.3 jiné související dokumenty: *(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)*
4. Zdůvodnění a příčina změny:
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MĚNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.)

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) *V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
Příloha č. 2	položkový rozpočet
Příloha č. 3	fotodokumentace
Příloha č.	xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu		celková částka
Rozpis částky na roky:	2016		
	2017		
	2018		

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:
