

OR/19/24875

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. HK 2019_0045**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Pardubický kraj

Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK2019_0045
Číslo smlouvy Stavebníka: OR/19/24875

SAP S/4 Hana: 8020000636
Registr smluv: ANO

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená [REDAKCE] supervizorem, Výstavba pevné přístupové

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí, 125, 532 11 Pardubice

IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822

zastoupen: Ing. Miroslavem Vohlídalem, vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 220430336/0300

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Choceň spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutačními okruhy nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 15. 3. 2019 vydané pod čj. 560700/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI Choceň(UO), mod. mostu 317-005A**“.
- 1.4 Název stavby, v důsledku které je vyvolána přeložka: „**Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň**“, uvedená stavebníkem.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) jako vlastník Překládkou dotčených nemovitostí uzavřít se společností CETIN smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti;
- (iii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;

(c) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládka).

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **336 856,00 Kč** (slovy: tři sta třicet šest tisíc osm set padesát šest korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do čtyř (4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktura bude společností CETIN vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno

jinak.

- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Radka Kroutilová
funkce: investiční technik
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

ve věcech smluvních: Ing. Radka Kroutilová
funkce: investiční technik
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předáváním Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
 - (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a

pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a

tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

CETIN

V Pelhřimově dne 26 -08- 2019

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Supervizor, Výstavba přístupové sítě

Stavebník

V Pardubicích dne 11. 09. 2019


Pardubický kraj

Ing. Miroslav Vohlídal

vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic

TEMO-TELEKOMUNIKACE,a.s. U Záb.zámku 233/15, **Praha10**

projekce a výstavba telekomunikačních zařízení

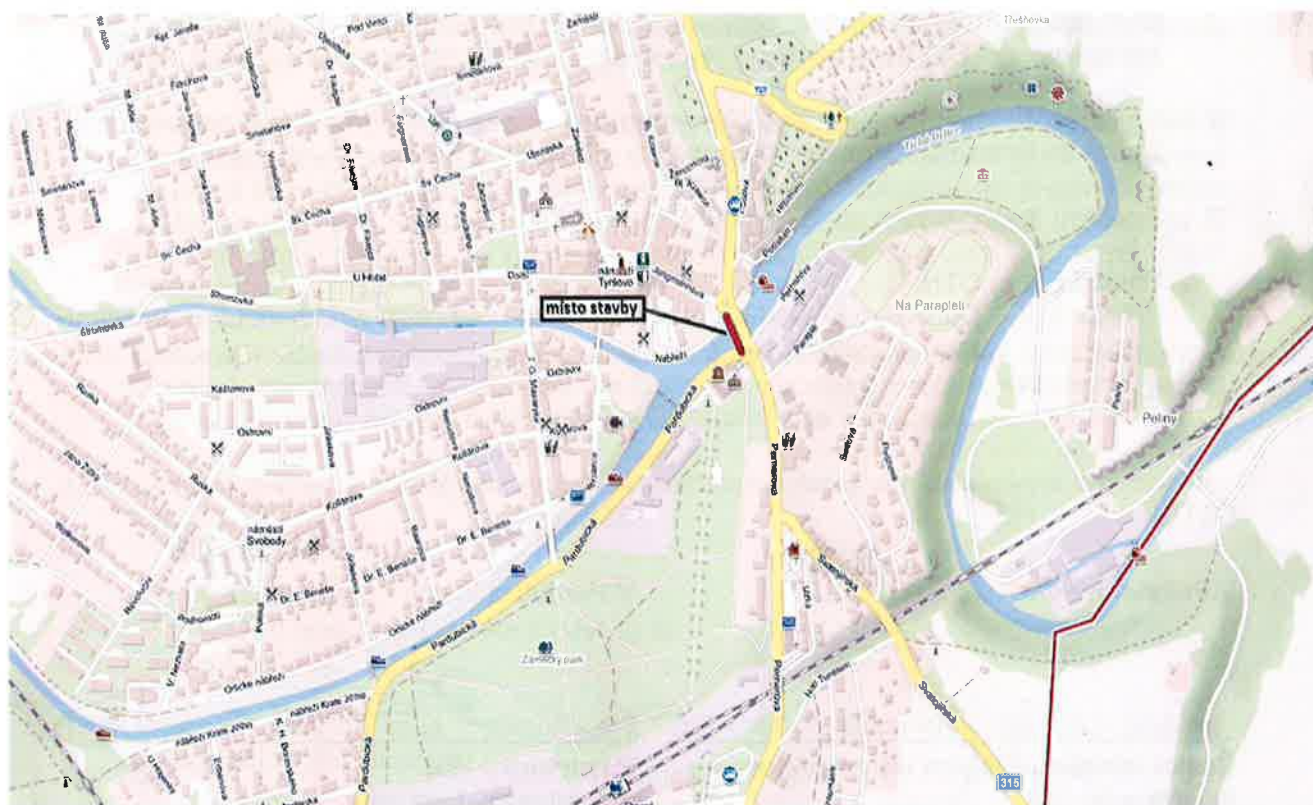

Hlavní projektant:		
Zpracoval:		TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
Technická kontrola:		U Záb. Zámku 233/15, Praha 10
Zodp. projektant:		Pracoviště: Záměl 169, 517 43 Potštejn
Kraj: Královéhradecký		
Investor		
Akce:	CTN Choceň(UO),mod.mostu 317-005A,VPIC	
Objekt:	přeložení vedení SEK (metalika + optika)	
Obsah:	Technická zpráva k CTN	
	Stupěň:	CTN
	Zak. č.:	
	Arch. č.:	
	Datum:	06/2019
	Formát:	
	Měřítko:	Č. výkresu:

11840/19/0008

Obsah:

1. Požadavek - stavebně technické řešení – technologie, montáž
2. Věcná břemena
3. rozpočet
4. kontakty
5. závěr

Výkresová část:

1. Přehledová mapa
2. polohopisný plán
3. schematický plán OK557RBF


1. Požadavek

Předmětem cenového technického návrhu (CTN) je požadavek společnosti CETIN a.s. na přeložení vedení sítě elektronických komunikací (SEK) vyvolaný žádostí Dopravně inženýrské kanceláře s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové za účelem stanovení cenového a technického návrhu.




pohled proti proudu řeky Tiché Orlice na rekonstruovaný most 317-005A

Vedení SEK budou přeložena do založených chrániček v mostním svršku. K přeložení vedení SEK se použijí nové vložky dotčených profilů. Po přepojení budou ocelové trubky včetně uvolněného vedení SEK zrušeny a ekologicky zlikvidovány.

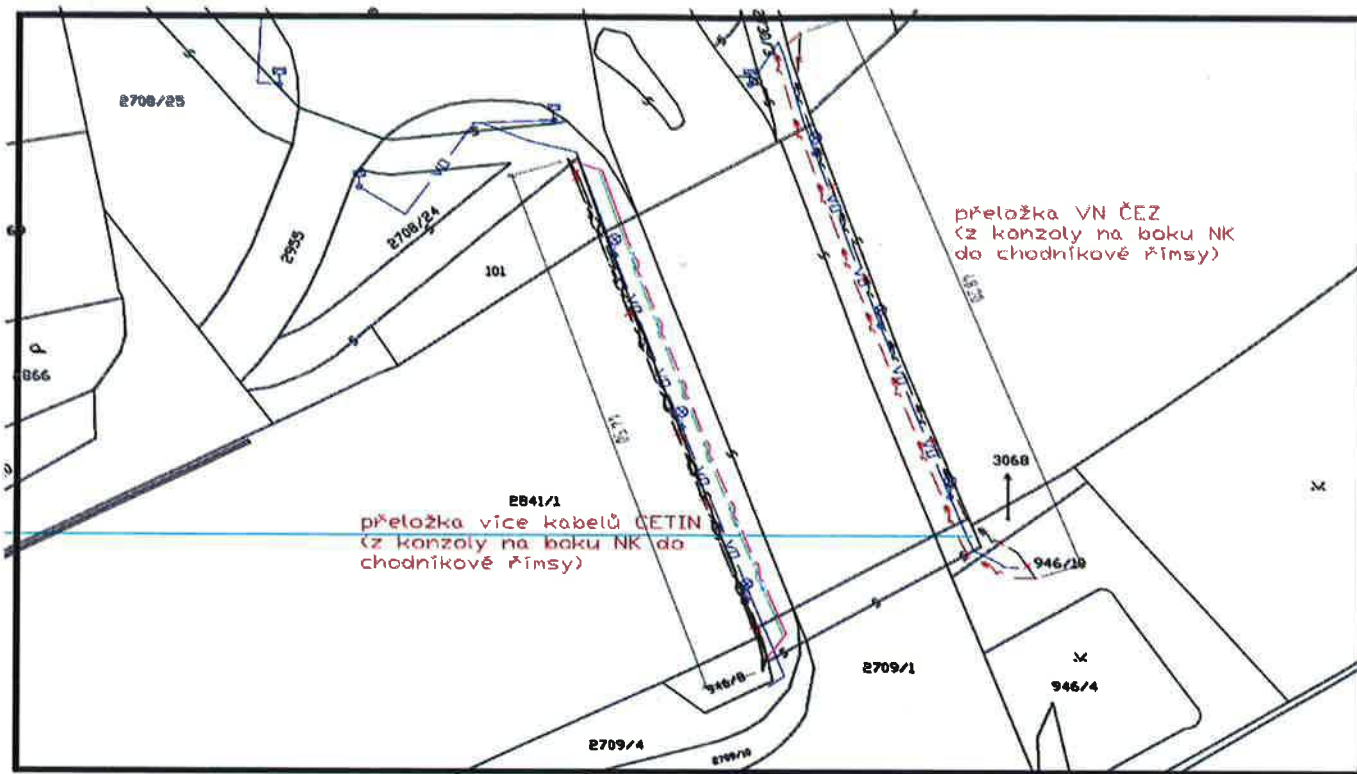

Polohopis v katastru dle projektanta Dopravně inženýrské kanceláře s.r.o.

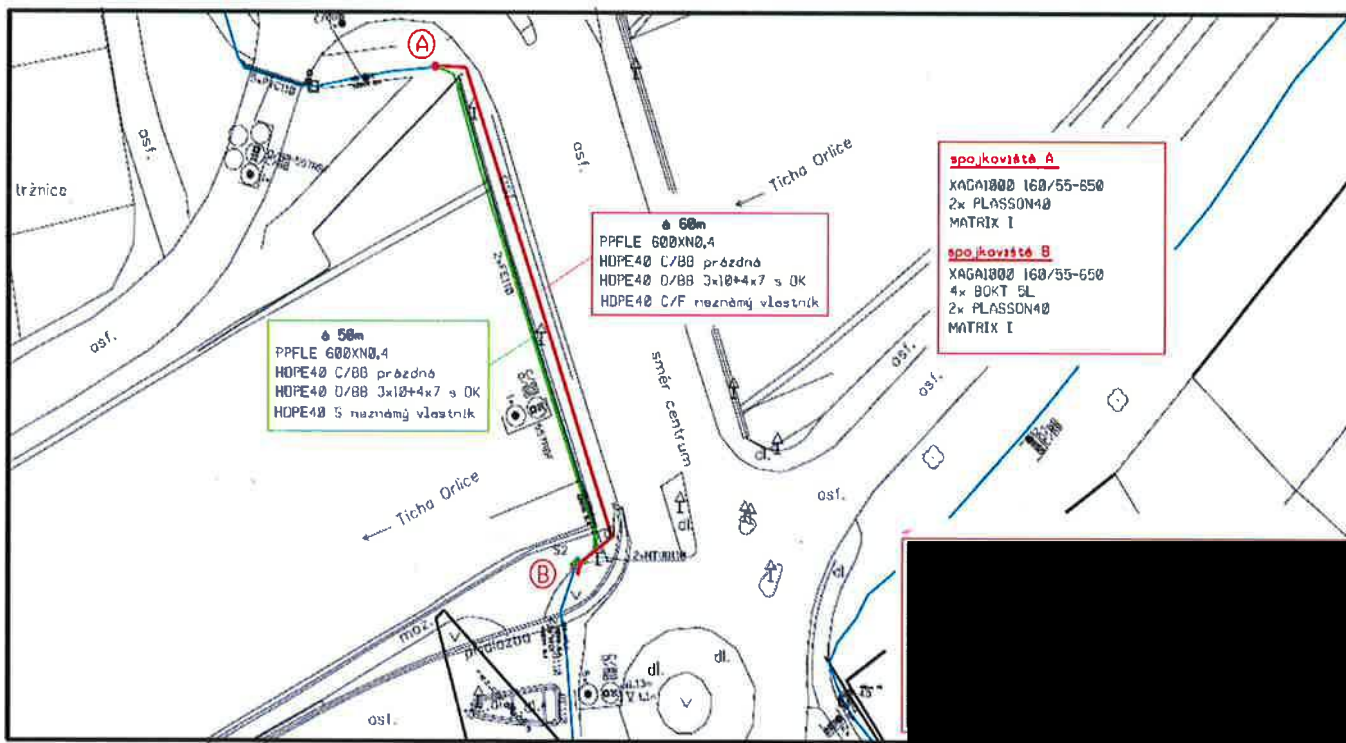


Polohopis dle CTN v podkladech společnosti CETIN


Metalický kabel TCEPKPFLE 600XN0,4

Do mostní a náběhové trasy bude zatažena kabelová vložka nového kabelu TCEPKPFLE 600XN0,4 v délce 60m s přespojováním v **bodě A** v rovné spojce XAGA1000 160/55-650.

V **bodě B** se naspojují stávající odchozí kabely. Všechny jsou typu TCEPKPFLE - 50XN0,4, 400XN0,4, 25XN0,4, 100XN0,4 a 50XN0,4 v dělicí spojce XAGA1000 160/55-650 4x BOKT 5L. Kabel 600XN0,4 je rozveden do 9ks síťových rozvaděčů. Síťové rozvaděče SR22 CHOC156, SR23 CHOC157 a SR26 CHOC160 jsou v uvedeném kabelu dálkově napájeny. (stav k 14.6.2019)

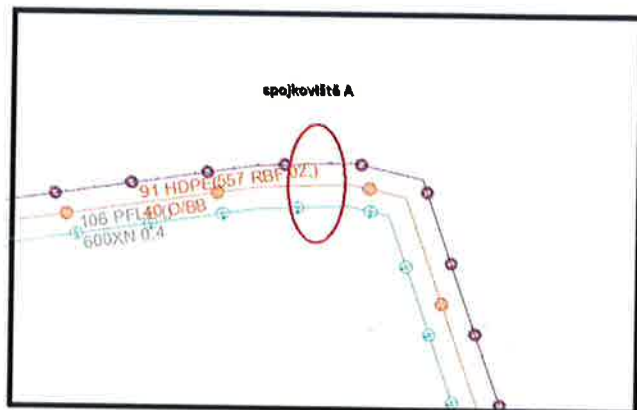

Schematický plán spojkoviště A

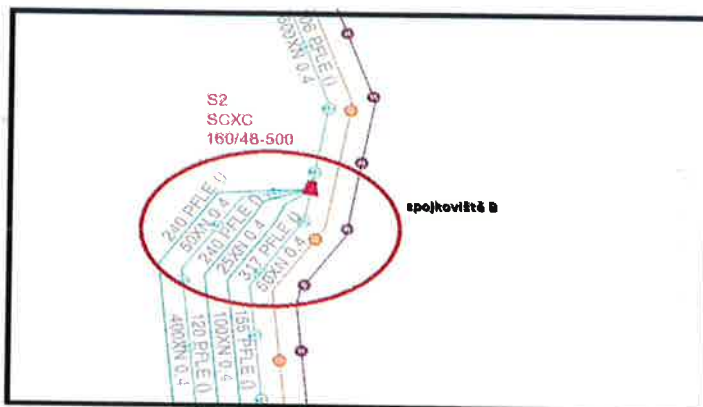

Schematický plán spojkoviště B

Trubka HDPE40 C/BB prázdná

Do mostní a náběhové trasy bude v délce 60m zatažena vložka nové trubky HDPE40 C/BB s přespojováním na stávající trubku HDPE v bodech **A a B** ve spojkách PLASSON40

Trubka HDPE40 šedá neznámého vlastníka s neznámým obsahem (v dokumentaci DLSS společnosti CETIN není vedena)

Do mostní a náběhové trasy bude v délce 60m zatažena vložka nové trubky HDPE40 C/F s přespojováním na stávající trubku HDPE v bodech **A a B** ve spojkách PLASSON40

Trubka HDPE40 O/BB s TS 3x10+4x7 s OK 557RBF

Do mostní a náběhové trasy bude v délce 60m zatažena vložka nové trubky HDPE40 O/BB s přespojováním na stávající trubku HDPE v bodech **A a B** ve spojkách MATRIX „I“. Do trubky HDPE40 bude ve vložce délce 60m zafouknut nový trubičkový systém 3x10+4x7mm. Propojení trubiček ve spojkách GABO neprůhledných velikost 7mm a 10mm.

Optický kabel OK 557RBF


Stávající stav

Optický kabel je typu OFS 24f 4x6RB D. Kabel je ukončen na **RSU Choceň** v ODF LST1U-072/7 + LSS1U-072/5. Vlákna číslo 1-6 jsou ukončena pomocí multimodulu FOB-AWF-6xE2/Diamond na panelu. Zbýlá vlákna 7-36 jsou stočena do rezervy.

Vlákna číslo 1 a 2 vedou do síťového rozvaděče **SR22 CHOC156 Vysokomýtská CHOC:BS:7**. Kabel je zafouknut do červené trubičky 7/5,5. V RSU Choceň je na kříži smotán do rezervy v délce 65m. (stav k 14.6.2019 – do dalších SR s připraveným dálkovým napájením optická vlákna nevedou).

Řešení přeložky

V ODF bude provaření vláken kabelu č.1 – 6 s multimodulem FOB-AWF-6xE2/Diamond zrušeno. Kabel se vyfoukne v délce 485m (420m + 65m rezerva) do bodu B. Po propojení trubek HDPE40 ve spojkách MATRIX „I“ včetně propojení trubičkového systému 3x10+4x7 se kabel zafoukne zpět s využitím červené trubičky 7/5,5 do ODF. Vlákna kabelu č. 1-6 budou v ODF provařena s vlákny původního multimodulu FOB-AWF-6xE2/Diamond. Na kříž bude smotána ponížená rezerva o 10m nově v délce 55m.

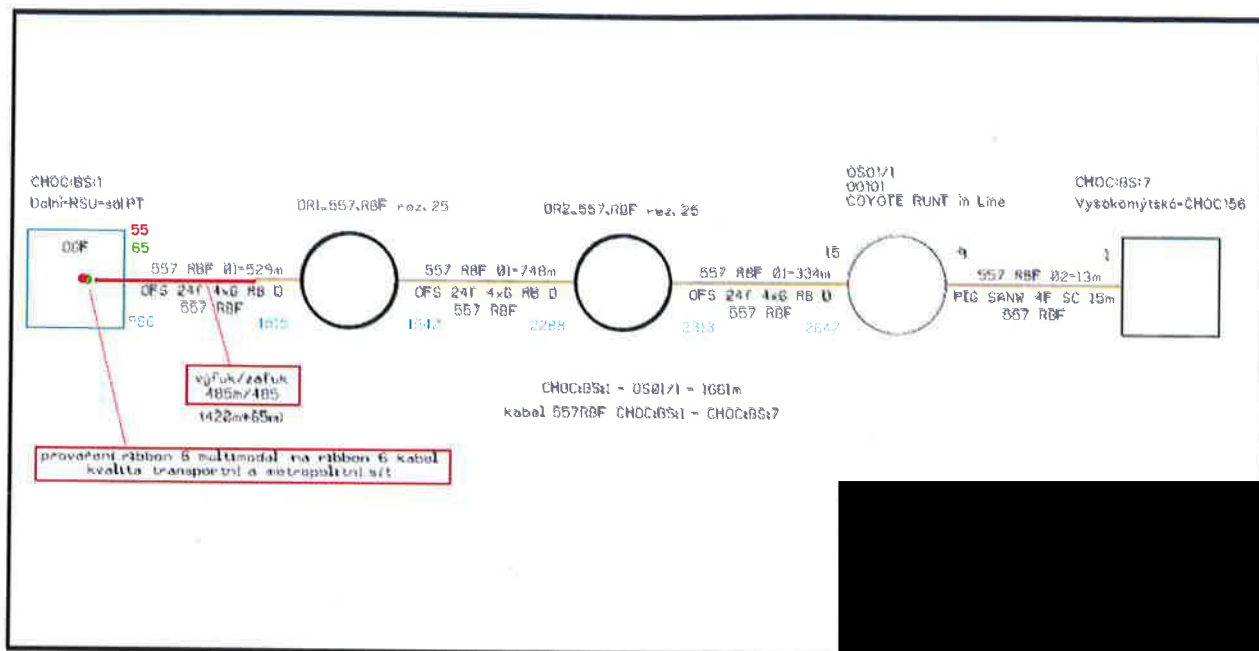

Schematický plán OK 557RBF

Místa spojek a konců chrániček budou označeny markery BALL.

Měření na kabelech

Metalický kabel – stejnosměrné a střídavé měření z HR RSU do všech SR
CHOC161, CHOC159, CHOC155, CHOC156, CHOC157, 1XN do KR čp.1732 CHOC2404,
CHOC159, CHOC2424, CHOC141, CHOC160

Optický kabel – vlákna 1 - 2

Přímou metodou - na vlnové délce 1310nm, 1550nm a 1625nm

Měření oboustranné - na vlnové délce 1310nm, 1550nm a 1625nm

Nová trasa bude geodeticky před záhozem zaměřena s vypracováním geometrického plánu.

Montážní práce vyžadují podat žádost o povolení k přerušení provozu.

2. Věcné břemeno

- vlastníci dotčených pozemků v katastrálním území Choceň:

p.č.101, p.č.2708/24, p.č.2709/4 je Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň

p.č.2709/10, p.č.2837/16 a mostu 317-005A je Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, právo hospodařit s uvedeným majetkem má Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

S oběma vlastníky budou sepsány Smlouvy o budoucí smlouvě na umístění zařízení inženýrské sítě v celkové částce za úhradu zřízení VBR 18 tis.Kč

3. Rozpočet – viz příloha

4. kontakty

CETIN a.s. projektový koordinátor [REDAKCE]

Projekt na rekonstrukci mostu 317-005A

Dopravně inženýrská kancelář s.r.o.

Bozděchova 1668

500 02 Hradec Králové

Projektant [REDAKCE]

Investor:

V zadání CTN nebyl uveden

5. závěr


Řešení CTN vychází z požadavku společnosti CETIN a.s. a poskytnutých podkladů konzultovaných s projektantem Dopravně inženýrské kanceláře. CTN je vypracováno k aktuální dokumentaci v programu GWS společnosti CETIN získané k datu 14.6.2019.

Nová trasa vedení SEK je uvedena v dokumentaci „Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP)“ a „Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)“ vypracované Dopravně inženýrskou kancelář.

Pro jednoduchost řešení použitím vložek do stávající sítě v poměru 1:1 nejsou v CTN vypracovány schematické plány. Jejich vypracování se předpokládá v následném kroku po CTN, tj. v kroku vypracování projektové dokumentace.

červen 2019

TEMO-TELEKOMUNIKACE
[REDAKCE]



Název stavby: CTN VPI Choceň(UO),mod. mostu 317-005A

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vladko Fiala

KPO: PA

HOST: UO

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK: 0.016

KMVYK: voz. 0.000

km otvorů: 0.000

KMP: 72.000

KMMK: 0.060

KMNT: 0.000

KMTRU: 0.180

KMOK: 0.000

KMVL: 0.000

KMTRK: 0.000

bytových HTS: 0

podnik. HTS: 0

rekreač. HTS: 0

PP HR: 0

PP UR: 0

Rozdělení dle zón:**1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km

Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km

Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km

Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

REKAPITULACE:**PŘÍPRAVA**

36 676,63 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

30 069,93 Kč

MONTÁŽ

138 188,49 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

7 652,66 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

3 702,90 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

25 899,52 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE

0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN

0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ

0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

92 666,08 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

0,00 Kč

POPLATKY

2 000,00 Kč

CELKEM:

336 856,21 Kč

STAVEB. ČINNOST

268 577,16 Kč

NESTAVEB. ČINNOST

68 279,05 Kč

Zhotovil

Kontroloval

Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
		Popis		
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	10 491,55 Kč
955833		Projekt tlk liniové sítě speciální OK v trubičkách výfuk/záfuk v délce 485m (trasa 0.401-0.600km)	11305.08 JV	11 305,08 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě trasa do 0.100km v zóně I	14880.00 JV	14 880,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
951624 S		Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba	90.00 m	4 444,20 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	12.00 m	222,24 Kč
954974 S		Povrchy nad rámeč zámková dlažba	5.00 m2	4 073,20 Kč
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 184,06 Kč
954959 S		Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm	24.00 m	4 562,16 Kč
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	16.00 m	10 861,92 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	65.00 m	722,15 Kč
MONTÁŽ				
958303 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba	420.00 m	520,80 Kč
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	180.00 m	667,80 Kč
958310 S		Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	2.00 ks	730,22 Kč
958314 S		Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	2.00 ks	151,08 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	10.00 ks	1 604,60 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	590.00 ks	21 847,70 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	10.00 ks	246,90 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	10.00 ks	864,10 Kč
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslováním	600.00 ks	14 814,00 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	600.00 ks	18 516,00 Kč
955267 S		Montáž nadzemní tratě síťové dohled a pomoc s umístěním ocelových chrániček na dočasné podpěry	4166.40 JV	4 166,40 Kč
955268 S		Montáž podzemní tratě síťové metalické demontáž ocelových trub 110 a odvoz vytěženého zařízení SEK k ekologické likvidaci	6249.60 JV	6 249,60 Kč
955269 S		Montáž podzemní tratě síťové optické rozpočtová rezerva	13020.00 JV	13 020,00 Kč
955282 S		Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 456,04 Kč
955946 S		Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.	14.00 ks	371,56 Kč
955284 S		Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	6.00 ks	287,40 Kč
955948 S		Montáž těsnění svazku trubiček	4.00 ks	981,52 Kč
952602 S		Montáž trubky úložné	192.00 m	2 300,16 Kč
954993 S		Montáž úložných kabelů nad 300 XN	65.00 m	3 370,25 Kč
958557 S		Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	16 115,03 Kč
958333 S		Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metropolitní síti	1.00 ks	566,55 Kč
958469 S		Uvedení stavby do provozu	5208.00 JV	5 208,00 Kč
955942 S		Zafukování svazku trubiček	60.00 m	1 414,80 Kč
955952 S		Zafukování/vyfukování mikrokabelu	970.00 m	12 212,30 Kč
958556 S		Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks	5 332,18 Kč
955012 S		Zrušení úložné trubky	150.00 m	1 204,50 Kč
955043 S		Zrušení úložných kabelů nad 300 XN	55.00 m	1 969,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198 S		Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 715,46 Kč
956284 S		Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 937,20 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	3 702,90 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene úhrada za zřízení VBŘ	18000.00 JV	18 000,00 Kč
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 443,48 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	3 456,04 Kč

Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
POPLATKY				
955367		Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. poplatek za zvláštní užívání Městu Choceň	2000.00 JV	2 000,00 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	20.00 ks	732,80 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	20.00 m	85,20 Kč
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	80.00 m	176,00 Kč
300114	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 600x4x0,4	60.00 m	58 686,60 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	10.00 ks	1 962,60 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	240.00 ks	5 332,80 Kč
310387	S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	1.00 ks	37,95 Kč
407578	S	Souprava čistící 4413L	2.00 ks	1 230,90 Kč
320313	S	Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50	4.00 ks	2 617,64 Kč
313317	S	Spojka kabelová XAGA1000 160/55-650/FLE	2.00 ks	10 247,14 Kč
318979	S	Spojka trubičky 10mm neprůhledná GABO	6.00 ks	491,46 Kč
318980	S	Spojka trubičky 7mm neprůhledná GABO	8.00 ks	655,28 Kč
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	832,12 Kč
311878	S	Spojka trubky HDPE 40mm RD rovná	2.00 ks	2 119,54 Kč
311727	S	Těsnění trubiček 3x10+5x7mm do trub.HDPE	4.00 ks	308,80 Kč
300633	S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená	60.00 m	315,00 Kč
300634	S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená	60.00 m	315,00 Kč
300635	S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá	60.00 m	315,00 Kč
300623	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená	60.00 m	200,40 Kč
300624	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená	60.00 m	200,40 Kč
300625	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá	60.00 m	200,40 Kč
300626	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá	60.00 m	200,40 Kč
300027	S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	60.00 m	1 585,80 Kč
300040	S	Trubka HDPE 40/33 černá -fialový pruh	60.00 m	1 585,80 Kč
300036	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	60.00 m	1 585,80 Kč
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	12.00 m	472,68 Kč
308513	S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	172,57 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267	S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	4.00 ks	0,00 Kč
407297	S	Pěna montážní CF-I 750ml pistolová izol.	2.00 ks	0,00 Kč

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zastoupená [•]

(dále jen „**Nabyvatel**“)

a

[•]

se sídlem [•]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]

IČO: [•]

DIČ: [•]

zastoupena [•]

(dále jen „**Převodce**“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

(dále jen „**Dohoda**“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „**Rozhodnutí o umístění stavby**“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „**Stavba**“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby

stanoveny.

- 2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
- 3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
- 3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel:

Převodce:

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. []

Jméno:

Funkce:
