
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2019/553**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Kraj Vysočina

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Ing. Miroslavem Kotem, Supervizorem, Výstavby PPS Čechy/Morava jih dle
pověření

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje
pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

číslo účtu: 4050005000/6800

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako
„**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“)
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je
Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k. ú. Havlíčkův Brod spočívající ve změně trasy komunikačního vedení
SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní
realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a)
Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 12. 9. 2018 vydané pod č.j. 720739/18, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemu nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC H. Brod II_150 ul. Žižkova a Dolní**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
 - 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.
- (vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládku realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 Společnost CETIN se zavazuje
- (a) před realizací Překládky:
- (i) zajistit zpracování CTN;
 - (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvou s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
- (b) po realizaci Překládky:
- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
 - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
 - (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
- 4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:
- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
 - (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí Městského úřadu Havlíčkův Brod – rozhodnutí o umístění stavby „II/150 HAVLÍČKŮV BROD – MOST. EV.Č. 150-026, 2. stavba, Havlíčkův Brod, Dolní, Na Ostrově, Na Valech, Žižkova“ č.j. ST/1031/2012/Ve ze dne 8.11.2012, které nabyla právní moci dne 11.12.2012 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslově uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

- 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
 - (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;

- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebnosti, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhranění správních poplatků za vklad služebnosti do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dнем ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.
- ## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU
- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **125.253,- Kč** (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc dvě stě padesát tři korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společnosti CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za CTN Překládky ve výši **10.492,- Kč** (slovy: deset tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společnosti CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společnosti CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud rádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení společnosti CETIN s realizací Překládky ve lhůtách stanovených v souladu s odst. 4.3 Smlouvy povinnost společnosti CETIN zaplatit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,03 % z částky odpovídající doplatku nákladů za Překládku dle odst. 6.1 písm. b) Smlouvy za každý den prodlení.

7.3 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.4 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Pažoutová
funkce: Specialista pro výstavbu sítě
e-mail: ludmila.pazoutova@cetin.cz, tel.: 238 462 468

ve věcech technických: Ing. Milan Baránek
funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť
e-mail: milan.baranek@cetin.cz, tel.: 238 465 534

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních:
MUDr. Jiří Běhounek – hejtman
Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

ve věcech technických: Ing. Irena Šedová
funkce: úředník ODSH
e-mail: sedova.i@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 274

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu (realizační projektová dokumentace Překládky) bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodu stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné

osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společnosti CETIN novou smlouvou, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvu neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
 - (a) v listinné podobě;
 - (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;

(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoli fyzická nebo

právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoli deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoli platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoli nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Stavebník potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu, zejména, že Smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a dalšími obecně závaznými předpisy.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí Městského úřadu Havlíčkův Brod – rozhodnutí o umístění stavby č. j. ST/1031/2012/Ve ze dne 8. 11. 2012

CETIN:

V Praze dne 18 -09- 2019


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Miroslav Kot
Supervizor Výstavba PPS Čechy/Morava jih

telekomunikační infrastruktura a.s.
Lipanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084005
[219]

Stavebník:

v Jihlava dne 25. 09. 2019


Kraj Vysočina
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	270/2
Obec:	Havlíčkův Brod [568414]
Katastrální území:	Havlíčkův Brod [637823]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	41
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápis

Nejsou evidovány žádné jiné zápis.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 10.07.2019 07:00:02.

© 2004 - 2019 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), [Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8](#).
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištěm zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.5 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	270/9
Obec:	Havlíčkův Brod [568414]
Katastrální území:	Havlíčkův Brod [637823]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	25
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

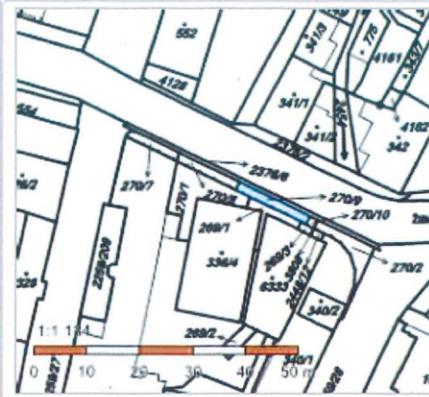

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápis

Nejsou evidovány žádné jiné zápis.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod](#).


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.07.2019 11:00:00.

© 2004 - 2019 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), [Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8](#).
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištěm zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.5 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	270/10
Obec:	Havlíčkův Brod [568414]
Katastrální území:	Havlíčkův Brod [637823]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	3
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

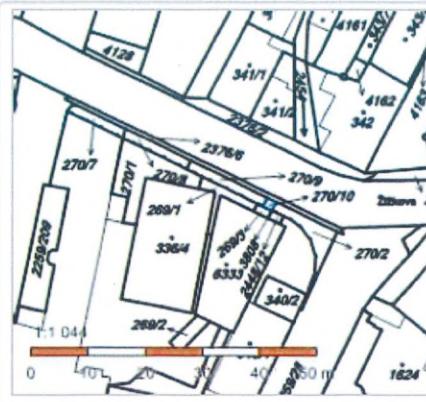

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápis

Nejsou evidovány žádné jiné zápis.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.07.2019 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1870/13
Obec:	Havlíčkův Brod [568414]
Katastrální území:	Havlíčkův Brod [637823]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	171
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

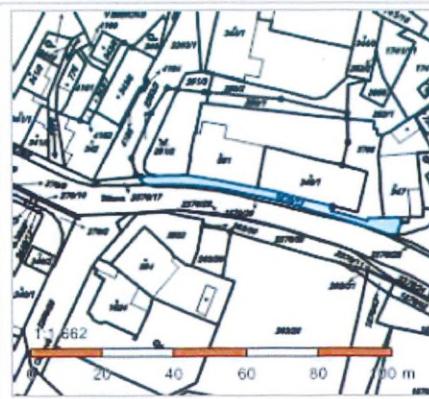

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápis

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 10.07.2019 07:00:02.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2259/28
Obec:	Havlíčkův Brod [568414]
Katastrální území:	Havlíčkův Brod [637823]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	454
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

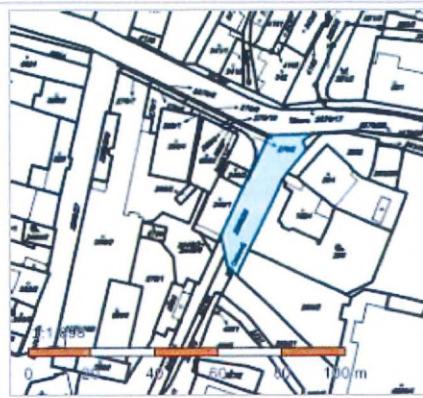

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápis

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 10.07.2019 07:00:02.

© 2004 - 2019 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištěm zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.5 build 0

Rozpárovací tabulka

Název rozváděče - nový HAVB74	Název rozváděče-původní 109	Poznámka 1 - rozváděče	
Adresa umístění rozváděče dle ROP		Type rozv.	Výstroj rozváděče
Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, SR 109 (ul. Žižkova)		SR	51x SID-CD 10p. rozp.; 1x SID-CD 40x1 uzem.
Type skříně rozváděče InCa 7/8 maxim. 600 př.	Umístění skříně rozváděče SLOUPEK LAMINÁTOVÝ EX	EPJ TOBJ	
Název /číslo - skříně 1	Poznámka - skříně S1		

Rozváděč					Měděná vazba / kabel					Propojovaný směr											
skříň	svítilce	řada	výchozí pozice	počet páru ve vazbě	Pozice od - do	typ zakončení	název vazby	typ kabelu	označení kabelu, číslo kabelu	páry kabelu	směr z / do	typ rozváděče	název rozv. nový	- název rozv. původní	typ skříně	typ zakončení	skříň	svítilce	řada	výchozí pozice	Pozice od - do
1	1	1	1	150	1-150	SID-CD rozp.10p	300XN0,4 FLE :151				z	SR	HAVB173	D_Nap_SR_74	SIS 900D	HD180 10x1 sv.blk	1	1	1	151	151-300
1	1	1	201	10	201-210	SID-CD rozp.10p	5XN0,4 FLE :201	50XN 0,4TCEK FLE		1-10	do	UR	HAVB5064	UR 109/10	MRK 20 - QT	SID-C 10x1	1	1	1	1	1-10
1	2	1	1	30	1-30	SID-CD rozp.10p	100XN_0,4_TCEK PFLE(1):1	50XN 0,4TCEK FLE		1-30	do	UR	HAVB373	109/1	MIS 1b - QT	SID-C 10x1	1	1	1	1	1-30
1	2	1	31	20	31-50	SID-CD rozp.10p	100XN_0,4_TCEK PFLE(1):31	50XN 0,4TCEK FLE		31-50	do	UR	HAVB374	109/2	MRK 20 - QT	SID-C 10x1	1	1	1	1	1-20
1	2	1	51	20	51-70	SID-CD rozp.10p	100XN_0,4_TCEK PFLE(1):51	50XN 0,4TCEK FLE		51-70	do	UR	HAVB375	109/3	MIS - 1bN	SID-C 10x1	1	1	1	1	1-20
1	2	1	71	10	71-80	SID-CD rozp.10p	100XN_0,4_TCEK PFLE(1):71	50XN 0,4TCEK FLE		71-80	do	UR	HAVB376	109/4	MIS 1b - QT	SID-C 10x1	1	1	1	1	1-10
1	2	1	81	20	81-100	SID-CD rozp.10p	100XN_0,4_TCEK PFLE(1):81	50XN 0,4TCEK FLE		81-100	do	UR	HAVB377	109/5	MIS 1b - QT	SID-C 10x1	1	1	1	1	1-20
1	2	1	141	20	141-160	SID-CD rozp.10p	50XN0,4 E :141	0,4TCEK FLE		1-20	do	UR	HAVB384	109/12	KS I.	ZA-40	1	1	1	1	1-20
1	2	1	161	10	161-170	SID-CD rozp.10p	50XN0,4 E :161	0,4TCEK FLE		21-30	do	UR	HAVB384	109/12	KS I.	kab.forma 1p.	1	1	2	1	1-10
1	2	1	171	10	171-180	SID-CD rozp.10p	50XN0,4 FLE :171	0,4TCEK FLE		31-40	do	UR	HAVB385	109/13	KS I.	ZAU-40	1	1	1	1	1-10

HAVB74 tabulka.xls

skříň	svislice	řada	výchozí pozice	pocet páru ve vazbě	Pozice od - do	typ zakončení	název vazby	typ kabelu	označení kabelu, číslo kabelu	páry kabelu	směr z / do	typ rozváděče	název rozv. nový	- název rozv. původní	typ skříně	typ zakončení	skříň	svislice	řada	výchozí pozice	Pozice od - do	
1	2	1	181	10	181-190	SID-CD rozp.10p	50XN0,4 FLE :181	50XN 0,4TCEK FLE		41-50	do	UR	HAVB405	109/11(11/2)	MRS 3	SID-C 10x1	1	1	1	1	1-10	
1	2	1	191	10	191-200	SID-CD rozp.10p	50XN0,4 FLE :191	50XN 0,4TCEK FLE		51-60	do	UR	HAVB5063	UR 109/9	MRK 20 - QT	SID-C 10x1	1	1	1	1	1-10	
1	2	1	201	5	201-205	SID-CD rozp.10p	334110860:	100XN 0,4TCEK FLE	-300	1-5	do	UR	HAVB378	109/6	KS I.	ZAU-10		1	1	1		1-1-5
1	2	1	206	25	206-230	SID-CD rozp.10p	334110861:	100XN 0,4TCEK FLE	-300	6-30	do	UR	HAVB379	109/7	KS I.	ZAU-100		1	1	1		1-1-25
1	2	1	231	20	231-250	SID-CD rozp.10p	334110862:	100XN 0,4TCEK FLE	-300	31-50	do	UR	HAVB380	109/8	KS I.	sv.ř.LSA 10x1		1	1	1		1-1-20

Doplňující poznámky
GPS: 49.60535667-15.58089833
adresa umístění dle ROP
Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, SR 74 (ul. Trčkova)
Havlíčkův Brod, 84, Na Ostrově
Havlíčkův Brod, 227, Dolní
Havlíčkův Brod, 142, Dolní
Havlíčkův Brod, 258, Dolní
Havlíčkův Brod, 146, Dolní
Havlíčkův Brod, 280, Žlžkova
Havlíčkův Brod, 28, Na Ostrově
Havlíčkův Brod, 28, Na Ostrově
Havlíčkův Brod, 28, Na Ostrově

adresa umístění dle ROP

Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, UR
11/2 (ul. Žižkova)

Havlíčkův Brod, 63, Žižkova

Havlíčkův Brod, 137, Na Valech

Havlíčkův Brod, 259, Na Valech

Havlíčkův Brod, 280, Žižkova

Rozpárovací tabulka

Název rozváděče - nový HAVB80	Název rozváděče-původní 113	Poznámka 1 - rozváděče
Adresa umístění rozváděče dle ROP	Typ rozv.	Výstroj rozváděče
Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, SR 113 (ul. Žižkova)	SR	16x LSA 10p. svisl.; 22x SID-CD 10p. rozp.
Typ skříně rozváděče	Umístění skříně rozváděče	EPJ
SIS - 300 - QT	SLOUPEK LAMINÁTOVÝ EX	TOBJ
Název /číslo - skříně 1	Poznámka - skříně S1	


Rozváděč				Měděná vazba / kabel				Propojovaný směr													
skřín	svislice	řada	výchozí pozice počet páru ve vazbě	Pozice od - do	typ zakončení	název vazby	typ kabelu	označení kabelu, číslo kabelu	páry kabelu	směr z / do	typ rozváděče	název rozv. nový	- název rozv. původní	typ skříně	typ zakončení	skřín	svislice	řada	výchozí pozice	Pozice od - do	
1	1	1	1	120	1-120	SID-CD rozp.10p	300XN0,4 FLE :1				z	SR	HAVB173	D_Nap_SR_74	SIS 900D	HD180 10x1 sv.blok	1	3	1	1	1-120
1	2	1	1	100	1-100	sv.ř.LSA 10x1	50XN0,4 PFLE :1	50XN 0,4TCEP KPFLE 10XN		1-100	do	SR	HAVB143	50	KS III.	SID-C 10x1	1	1	1	1	1-100
1	2	1	101	20	101-120	sv.ř.LSA 10x1	10XN0,4 PFLE :101	0,4TCEP KPFLE 10XN		1-20	do	REZ	HAVB5067	REZ 34	SKH 2 9/20 mm	REZ 1p.	1	1	1	1	1-20
1	2	1	121	14	121-134	sv.ř.LSA 10x1	10XN0,4 PFLE :121	0,4TCEP KPFLE 10XN		1-14	do	REZ	HAVB5068	REZ u čp.511	SKH 2 9/20 mm	REZ 1p.	1	1	1	1	1-14
1	2	1	135	6	135-140	sv.ř.LSA 10x1	10XN0,4 FLE :135	0,4TCEP KPFLE 5XN		15-20	do	KR	HAVB5061	KR 66	MRK 2	kab.forma 1p.	1	1	1	1	1-6
1	2	1	141	10	141-150	sv.ř.LSA 10x1	5XN0,4 FLE : 141	0,4TCEP KPFLE		1-10	do	UR	HAVB5062	UR 113/1	MIS 1b - QT	SID-C 10x1	1	1	1	1	1-10
1	2	1	151	6	151-156	sv.ř.LSA 10x1	3xN0,6FLES:1				do	KR	HAVB4792		FIST-WR- 047 univerzál ní nástenná skříň Raychem (Wall Rack)	SID-C př.modul	1	1	1	1	1-6
1	2	2	1	2	1-2	SID-CD rozp.10p	3XN_0,4_TCEKP FLE(6):1				do	REZ	HAVB4683	503Havlíčků v_Brod							
1	2	2	3	2	3-4	SID-CD rozp.10p	3XN_0,4_TCEKP FLE(2):1	3XN 0,4TCEK FLE		1-2	do	KR	HAVB3634	35Havlíčků v_Brod	MRK 10 - QT	SID-C 10x1	1	1	1	1	1-2

HAVB80 tabulka.xls

skříň	svislice	řada	výchozí pozice	použit páru ve vazbě	Pozice od - do	typ zakončení	název vazby	typ kabelu	označení kabelu, číslo kabelu	páry kabelu	smer z / do	typ rozváděče	název rozv. nový	- název rozv. původní	typ skříně	typ zakončení	skříň	svislice	řada	výchozí pozice	Pozice od - do
1	2	2	5	25-6	SID-CD rozp.10p	3XN_0,4_TCEKP FLE(1):1	3XN 0,4TCEK FLE			1-2	do	KR	HAVB3787	39Havlíčkův Brod	MRK 10 - QT	SID-C 10x1	1	1	1	1	1-2
1	2	2	7	27-8	SID-CD rozp.10p	3XN_0,4_TCEKP FLE(3):1	3XN 0,4TCEK FLE			1-2	do	KR	HAVB4431	83Havlíčkův Brod*	MRK 10 - QT	SID-C 10x1	1	1	1	1	1-2
1	2	2	9	29-10	SID-CD rozp.10p	3XN_0,4_TCEKP FLE(4):1	3XN 0,4TCEK FLE			3-4	do	KR	HAVB4431	83Havlíčkův Brod*	MRK 10 - QT	SID-CD rozp.10p	2	1	1	1	1-2
1	2	2	11	211-12	SID-CD rozp.10p	3XN_0,4_TCEKP FLE(5):1	3XN 0,4TCEK FLE			1-2	do	KR	HAVB4143	60Havlíčkův Brod*	MRK 10 - QT	SID-C 10x1	1	1	1	1	1-2

Doplňující poznámky GPS: 49.60552167-15.58149472
adresa umístění dle ROP
Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, SR 74 (ul. Trčkova)
Havlíčkův Brod, 904, Žižkova
Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, rezerva, před čp.34 (ul. Žižkova)
Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, rezerva, u čp.511 (ul. Žižkova)
Havlíčkův Brod, 66, Žižkova
Havlíčkův Brod, 65, Žižkova
Havlíčkův Brod, 34, Žižkova
Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, rez. (ul. Žižkova)
Havlíčkův Brod, 35, Žižkova


adresa umístění dle ROP
Havlíčkův Brod, 39, Žižkova
Havlíčkův Brod, 83, Žižkova
Havlíčkův Brod, 83, Žižkova
Havlíčkův Brod, 60, Žižkova

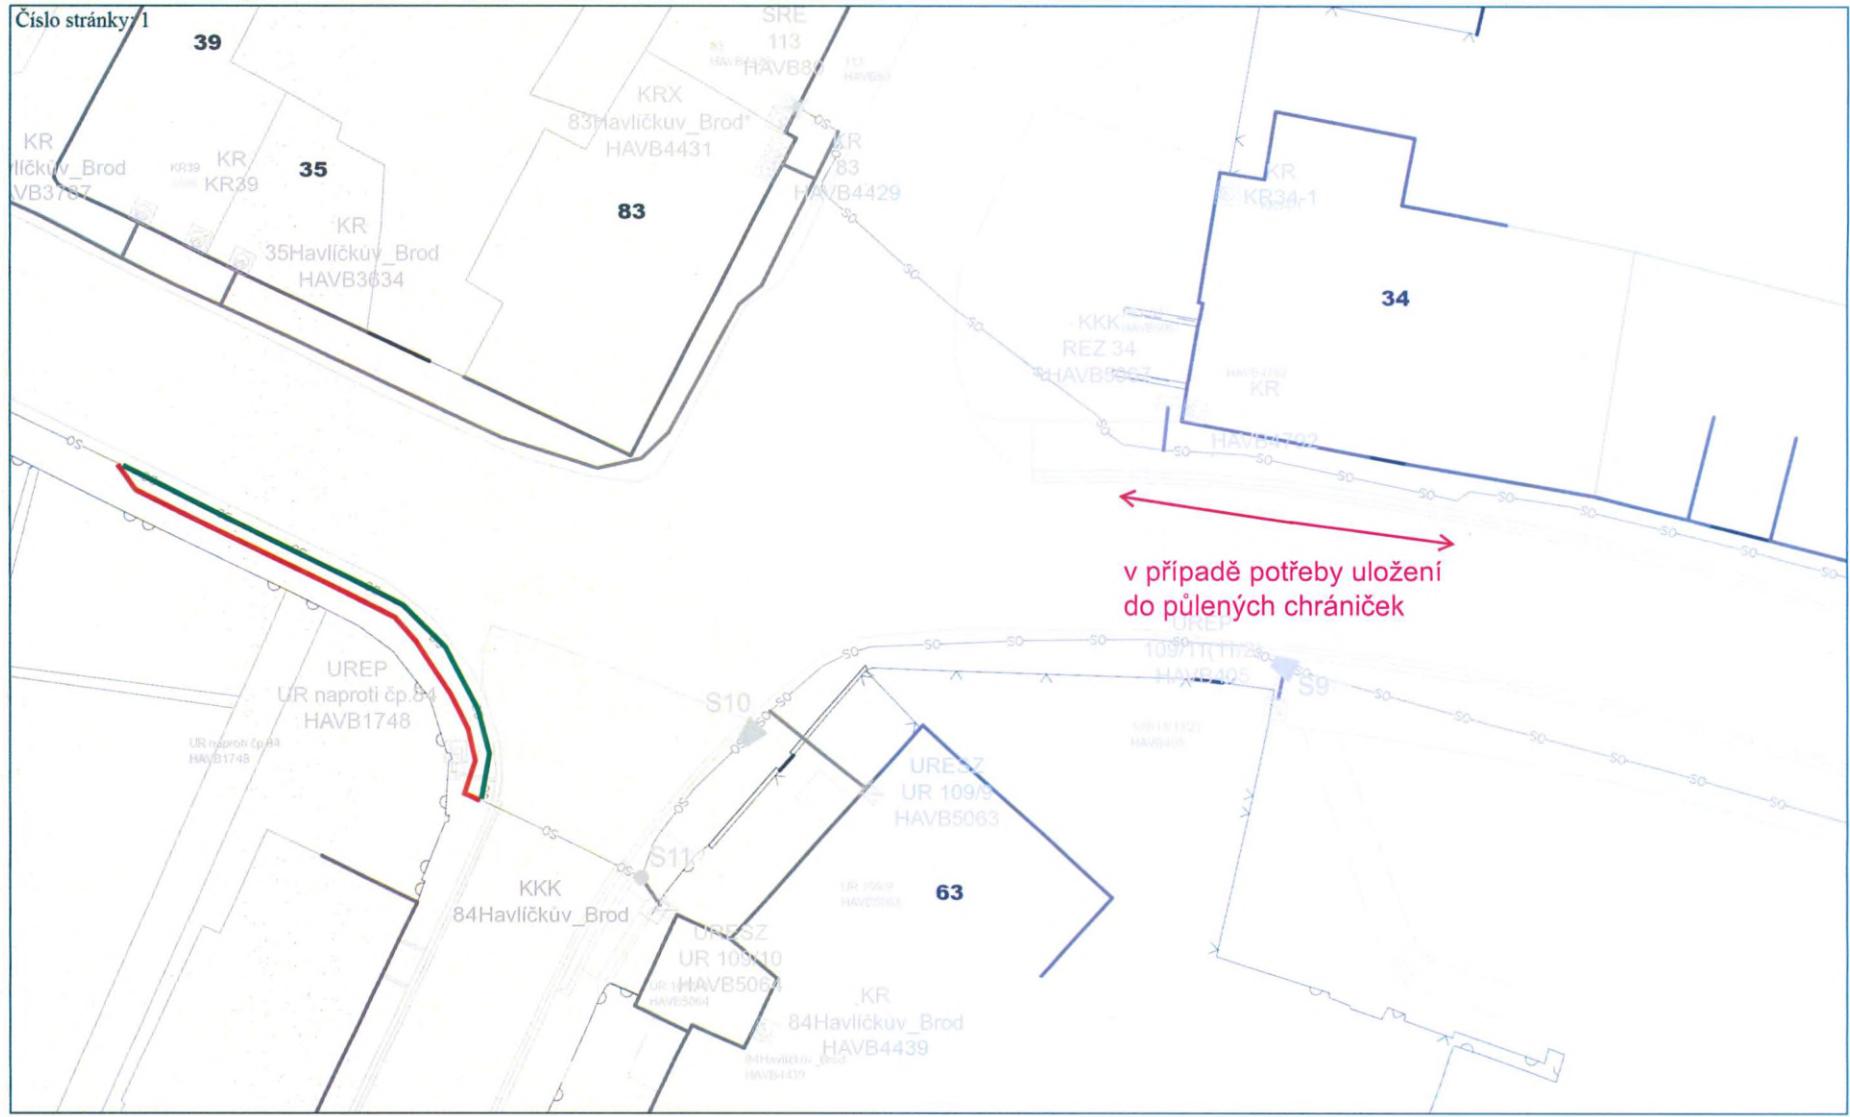

10.07.2019 10:38

Číslo stránky: 1

směr
HAVB74

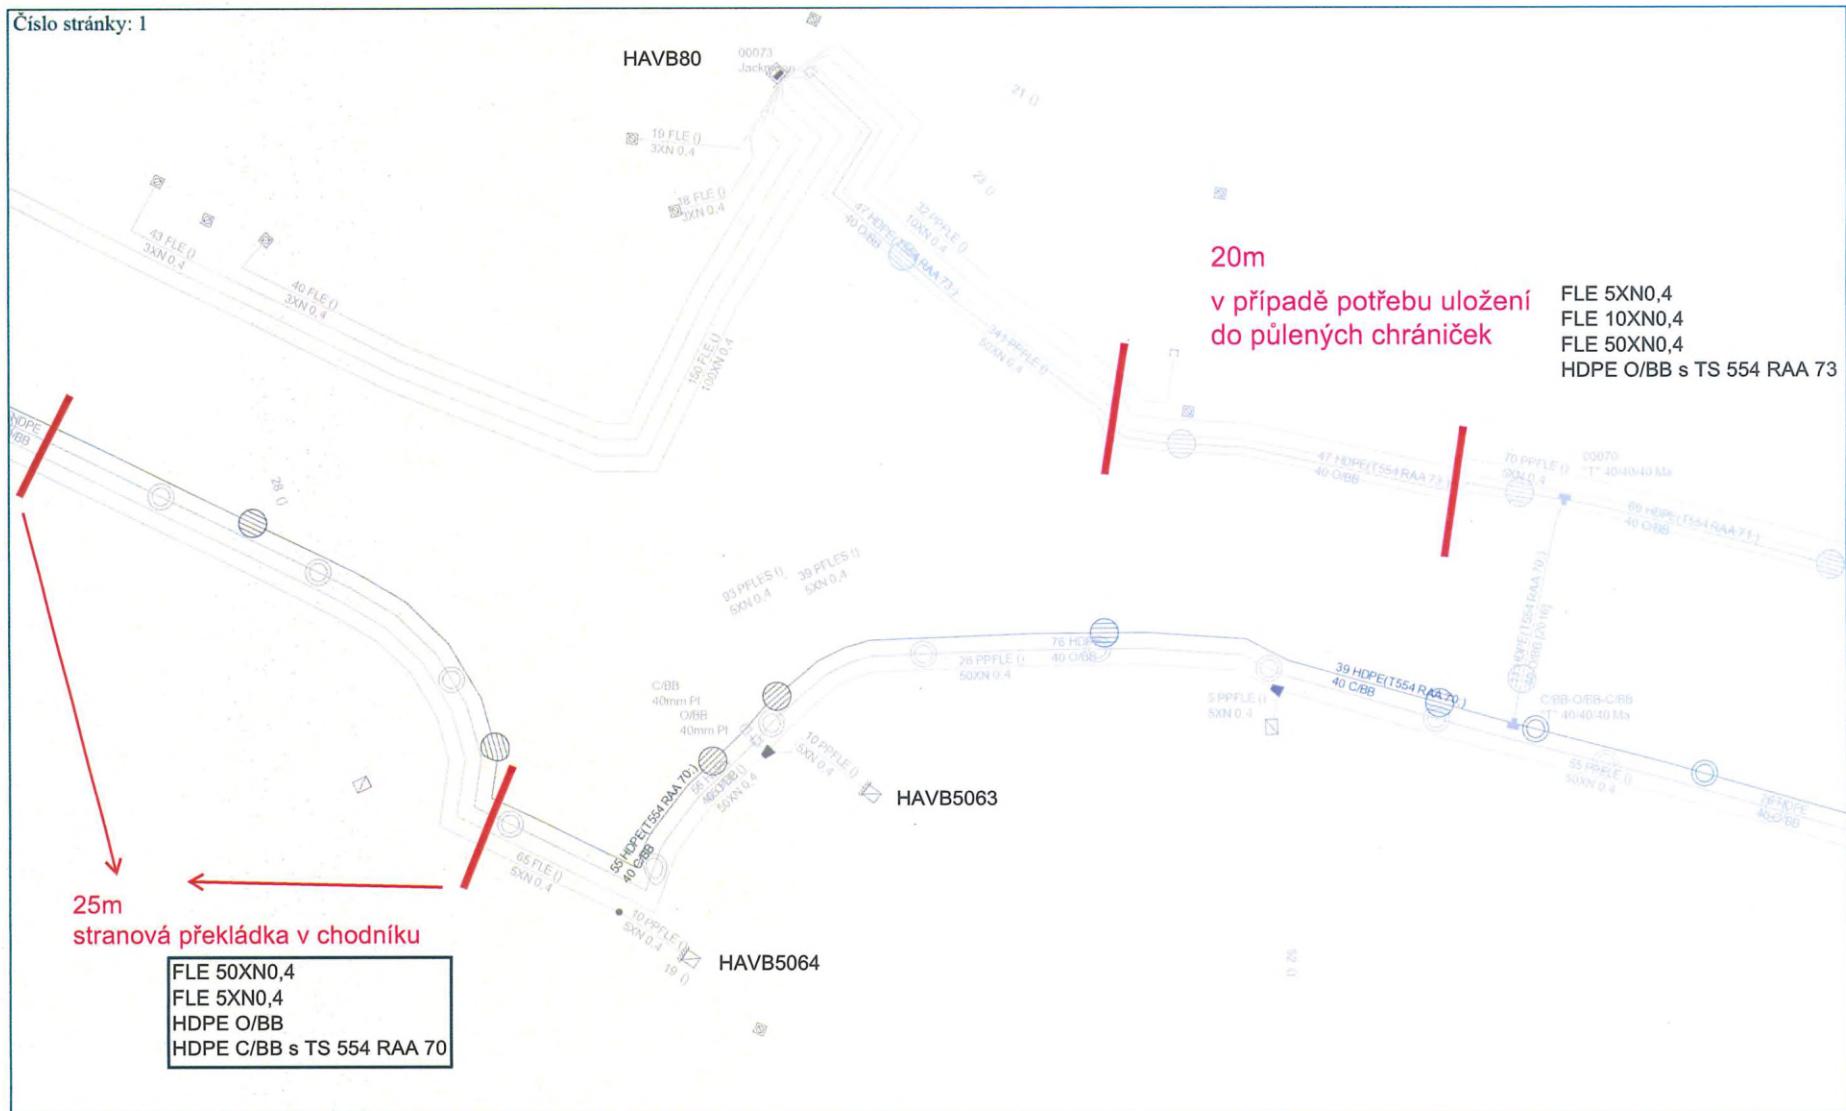

10.07.2019 10:41

Technická zpráva

Název: VPIC H.Brod II_150 ul.Žižkova a Dolní

Stručný popis:

Vynucená překladka SEK vyvolaná stavbou II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní.

Jedná se o kabely FLE 50XN0,4 a FLE 5XN0,4 odchod z HAVB74 a 2x HDPE O/BB a C/BB s TS 554 RAA 70

Pro přeložení trasy bude vyhloubena stávající trasa a nová rýha nové trasy, přeložení do nové trasy, pofuk TS do KK u prodejny O2

V druhé část křížovatku u čp. 34 počítáno v případě potřeby s uložením do půlených chrániček

Jedná se o kabely FLE 5XN0,4, FLE 10XN0,4, FLE 50XN0,4 odchody z HAVB80 a HDPE O/BB s TS 554 RAA 73

Nelze odhadnout rozsah prací do 50m – použita položka Práce zemní do 50m – ostatní činnosti

PD –Ne

Geo –Ano

SoU –Ano

GP-Ano

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601

Kontakt: Ing. Irena Šedová – 724 650 237

Projektant: Ing. Martin VAŠÁK, IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

GSM 777 1969 70 | T 533 446 080, martin.vasak@im-projekt.cz

ÚR – Ne – zajistí stavebník

Název stavby: VPIC H.Brod II_150 ul.Žižkova a Dolní

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: FM

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	10 491,55 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	66 208,81 Kč
MONTÁŽ	13 776,60 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 652,66 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	13 949,76 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	11 322,22 Kč

Celkové náklady: 125 253,05 Kč

Číslo SAP	Seznam položek	
	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA		
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE		
952369	Pokládka žlabů ostatních	25.00 m
958554	Práce zemní do 50 m-ostatní čí	1.00 ks
954951	Rýha v chodníku litý asfalt 35/!	50.00 m
952361	Rýha v chodníku mozaika 35/5	20.00 m
955054	Vytyčení trasy podél silnice,žel	45.00 m
MONTÁŽ		
955030	Demontáž úložných kabelů do	70.00 m
955029	Demontáž úložných kabelů do:	40.00 m
955268	Montáž podzemní tratě síťové	6200.00 JV
	Projektová rezerva	
955284	Montáž spojky, redukce mech:	2.00 ks
954990	Montáž úložných kabelů do 15	40.00 m
954991	Montáž úložných kabelů do 50	70.00 m
954980	Překládka trubky úložné	70.00 m
955942	Zafukování svazku trubiček	60.00 m
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m v	1.00 ks
956284	Zaměření trasy pro stavbu do :	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení v	10000.00 JV
	Náhrada za VBŘ	
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a příp	1.00 ks
958085	Zajištění vkladu věcného břem	1.00 ks

Číslo SAP	Limitka materiálu	Množství
	Název položky	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný		
303918	Deska krycí plast. 300x1000 m	25.00 ks
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranž.	45.00 m
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plast.	1.00 ks
319209	Trubka dělená SYSPRO 160/11	20.00 m
303643	Zámek trubky HDPE D 40mm	1.00 ks

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů - příprava

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2019.07
Položková databáze: 2019.07

Název stavby:

VPIC H.Brod II_150 ul.Žižkova a Dolní

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

FM

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

10 491,55 Kč

Celkové náklady:

10 491,55 Kč

Číslo SAP
PŘÍPRAVA
958084

S e z n a m p o l o ž e k

Název položky

Množství

Návrh cenový a technický

1.00 ks

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.12.2012

Rozhodnutí je vykonatelné dnem 11.12.2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD
stavební úřad
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

Městský úřad
stavební úřad
HAVLÍČKŮV BROD
19

Č.j.: ST/1031/2012/Ve
JID: 73895/2012/muhb

Havlíčkův Brod, dne 8.11.2012

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Havlíčkův Brod, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území (dále jen "rozhodnutí o změně stavby"), kterou dne 16.7.2012 podalo

Město Havlíčkův Brod, IČO 00267449, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1,
kterého zastupuje IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IČO 27689328,
Vodní 1, 602 00 Brno 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydařá podle § 81 a 92 stavebního zákona a § 11 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o změně stavby

II/150 HAVLÍČKŮV BROD - MOST EV.Č. 150-026, 2. STAVBA Havlíčkův Brod, Dolní, Na Ostrově, Na Valech, Žižkova

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 323, 328, 336/3, 357/2, 357/3, 1581, parc. č. 239, 251/2, 263/2, 263/21, 270/2, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 279/1, 279/3, 1870/13, 2259/25, 2259/26, 2259/27, 2259/28, 2259/29, 2259/47, 2259/48, 2259/49, 2259/158, 2259/208, 2259/209, 2262/1, 2262/2, 2262/3, 2262/6, 2262/7, 2263/1, 2263/2, 2264/1, 2270/1, 2376/1, 2376/2, 2376/3, 2376/6, 2447/1, 2447/3, 2448/4, 2448/8, 2448/10, 2454, 3554, 3604/8, 3731, 4005, 4128 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

Určení změn stavby a změn jejího vlivu na využití území:

- Vzhledem k tomu, že v centru města Havlíčkův Brod (ve spodní části ul. Dolní a začátku ul. Žižkova) dochází k dopravním problémům a šířkové uspořádání ulic neumožňuje potřebné rozšíření pro odbočovací pruhy byla v návaznosti na rekonstrukci mostu přes řeku Sázavu navržena celková reorganizace dopravy spočívající ve změně provozu v ulicích Dolní, Na Ostrově a Žižkova ze stávajícího obousměrného provozu na jednosměrný provoz s tím, že se tyto ulice upraví na tzv. velký kruhový objezd. Řešením budou sníženy nároky na šířku komunikace, zvětšeny poloměry oblouků při odbočování, rozšířeny prostory pro pěší. Dojde ke zvýšení bezpečnosti jak silničního tak pěšího provozu. Od parku Budoucnost bude rovněž vyřešena stezka pro pěší a cyklisty rekonstruovaným úsekem ul. Na Valech až k nábřeží.
- Jednosměrné ulice s šířkou jízdního pruhu 3,5 m (kryt asfalt), po obou stranách rozšíření o 1 m z žulových kostek. V případě rovněž jednosměrné ulice Na Valech o šířce 3,5 m (kryt z žulových kostek) souběžně vedena obousměrná stezka pro pěší a cyklisty (kryt asfalt) o šířce 3 m. V ul. Na Ostrově a části ul. Žižkova chodníky z mozaikové dlažby, v části ul. Žižkova směrem k centru a v celé rekonstruované ul. Dolní chodníky ze žulových desek.
- V souvislosti se zvýšením hladin akustického tlaku v ul. Na Ostrově budou překročeny normové limity - s vlastníky domů č.p. 27 a 126 dohodnuto vyjmout bytů z bytového fondu, u č.p. 26 navržena protihluková stěna podél uličních oplocení.

6. Při zpracování projektové dokumentace a při provedení stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. ze 13.3.2011 a 17.4.2012:
 - Nutná celková rekonstrukce vodovodních řad v ulicích Dolní, Na Valech a Na Ostrově. V ul. Na Ostrově v úseku podél řeky Sázavy vodovodní řad nutno rekonstruovat, v úseku kolmém na ul. Žižkova ponechán stávající stav.
 - Nutné uvažovat i s rekonstrukcí vodovodního řadu v ul. Žižkova. Součástí rekonstrukce řadu bude i výměna nevyhovujících vodovodních přípojek přilehlých domů.
 - Na kanalizačním řadu provedeny pouze úpravy revizních šachet (osazení nových poklopů), lokální opravy potrubí řadu a výstavba nové revizní šachty v ul. Na Valech.
 - Dvojí nevyhovující narušení kanalizačního potrubí neznámou sítí v ul. Na Ostrově bude uvedeno do původního stavu.
 - V ul. Žižkova (mezi ul. Dolní a Na Valech) bude zrušen úsek stávající kanalizační stoky v délce 49 m.
 - Projektovou dokumentaci rekonstrukce vodovodu a kanalizace předložit k odsouhlasení.
 - Zahájení prací v dostatečném předstihu konzultovat a oznámit.
7. Při zpracování projektové dokumentace a při provedení stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územního pracoviště Havlíčkův Brod zn. KHSV/06341/2012/HB/HOK/Vel ze 20.4.2012:
 - V projektové dokumentaci musí být protihluková stěna u rodinného domu č.p. 26 Na Ostrově navržena z hlediska fyzikálních vlastností stavebního materiálu (neprůzvučnost, pohltivost, plošná hmotnost, výška a délka) tak, aby splňovala požadavky předložené akustické studie (Akustika Brod s.r.o., 9/2011).
 - Budou provedena protihluková opatření, která jsou navržena v projektové dokumentaci. Doklad o provedení změny užívání dotčených rodinných domů na nebytové prostory bude předložen před uvedením stavby do zkušebního provozu.
 - V rámci zkušebního provozu stavby bude provedeno měření hluku z dopravy na silnici II/150 v chráněném venkovním prostoru stavby č.p. 1 Dolní, č.p. 84 Na Ostrově a č.p. 26 Na Ostrově v denní a noční době. V případě, že nebudou příslušné hygienické limity hluku dodrženy, bude nutno ze strany investora navrhnut a provést dodatečná účinná protihluková opatření, tedy zpracovat podrobnou hlukovou studii, ve které budou navrhнутa protihluková opatření zajišťující dodržení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních popřípadě vnitřních prostorech staveb dotčených objektů v řešeném úseku silnice II/150.
8. Při přípravě a provedení stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření MÚ Havlíčkův Brod, odboru dopravy č.j. DOP/1973/2012/JTE z 19.4.2012:
 - Minimálně 30 dnů před vlastním zahájením stavebních prací požádat o úplnou uzavírku komunikace podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a o stanovení přechodné úpravy provozu podle § 77 odst.1 písm.c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
 - O stanovení místní úpravy provozu podle § 77 odst.1 písm.c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích požádat minimálně 30 dnů před vlastním ukončením stavby.
9. Při přípravě provedení stavby budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice č.j. 2709/19906-ÚP/2012-1420 ze 26.4.2012:
 - V případě úplné uzavírky zabezpečit objízdné trasy v parametrech: únosnost objektů – min. 60 t, směrové poměry oblouků – 20 až 30 m, podjezdna výška - 4,5 m, šířka vozovky - 7 m.
 - Při uzavírce tuto skutečnost oznámit minimálně 3 týdny předem Regionálnímu úřadu vojenské dopravy (Hradec Králové) k provedení zvláštních opatření.
10. Při přípravě provedení stavby bude splněna podmínka uvedená ve vyjádření Regionálního úřadu vojenské dopravy, Olomouc č.j. 25-36/2012-1445 z 4/2012:
 - Před zahájením realizace stavby zaslat popis objízdných tras s přesným termínem konání stavby.

Miroslava Ježková, Jana Pártlová, Anna Vorlíčková, Zdeněk Polcar, Hana Stejskalová, Metropolitní s.r.o., OPTOKON Co., Ltd., spol. s r.o., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Nej TV a.s., Technické služby Havlíčkův Brod, Telefónica Czech Republic, a.s., ČD - Telematika, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o.

Stavební úřad oznámil v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou z 9.8.2012 zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 14.9.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost se k záměru změny stavby nevyjádřila.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Změna stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – **ÚZEMNÍM PLÁNEM SÍDELNÍHO ÚTVARU HAVLÍČKŮV BROD**, který byl schválen dne 26.6.1995 usnesením č.196 Městského zastupitelstva v Havlíčkově Brodě. Záměr stavby je navržen ve funkční ploše územního plánu „Plochy pro dopravu“, v blíže specifikovaných plochách „hlavní obslužné komunikace“ a „ostatní obslužné komunikace a dopravní plochy“.

Změna stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na využívání území.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Jelikož je v zájmovém území stavby schválen územní plán obce, doručuje se v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona územní rozhodnutí účastníkům řízením uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Těmito účastníky jsou vlastník pozemku a osoby, které mají jiné věcné právo k pozemku, na kterém má být stavba umístěna, osoby jejichž vlastnické nebo jiné práva k sousedním pozemkům a stavbám může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis a společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopsíš tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. V případě veřejné vyhlášky se odvolání podává ve 3 stejnopisech. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopsíš, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně stavby platí po dobu trvání změněné stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Bohumil Veselý
referent stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Helena Hanáková, Dolní č.p. 140, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Mgr. Jiří Šerých, Práčská 2596/91, Záběhlice, 106 00 Praha 10
MUDr. Olga Bezpalcová, Mirovická 1093/32, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Helena Králová, Veveří 2585/121, Žabovřesky, 616 00 Brno
Hana Jandová, Železná č.p. 158, 793 26 Vrbno pod Pradědem
David Teply, Přístavní 339/27, Holešovice, 170 00 Praha 7
Mgr. Robert Teply, Nad Královskou oborou 203/23, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Jiří Uhlíř, U Obůrky 928/6, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
Miroslav Uhlíř, Komenského náměstí 291/21, Stařečka, 674 01 Třebíč 1
Zdeněk Uhlíř, Pražská 1525/66, 669 02 Znojmo 2
Mgr. Nora Brátková, Palackého 278/12, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
Ivo Tubl, Náměstí Jiřího z Lobkovic 2301/13, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Bc. David Pešek, Smetanova nám. č.p. 1866, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Pavlína Pešková, Smetanova náměstí č.p. 1866, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Miroslava Ježková, Žižkova č.p. 39, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Jana Pártlová, Žižkova č.p. 39, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Anna Vorlíčková, Žižkova č.p. 39, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Zdeněk Polcar, Švermova č.p. 235, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Hana Stejskalová, Husova č.p. 1872, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Metropolitní s.r.o., IDDS: f2wmgeu
OPTOKON Co., Ltd., spol. s r.o., IDDS: s7grkte
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IDDS: z9egxzy
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Nej TV a.s., IDDS: yhjuida
Technické služby Havlíčkův Brod, IDDS: 8wfk9w2
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
ČD - Telematika, a.s., pobočka Brno, IDDS: dgzdpjp
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod,
IDDS: j5tiu6w

Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy, IDDS: 5uvbfub

Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, IDDS: 5uvbfub

dále obdrží

Městský úřad Havlíčkův Brod, podatelna – vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu nejméně
15 dnů, včetně způsobu umožňujícímu dálkový přístup
