



**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MS/2019/00068**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

městem Zábřeh

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Bj20623

zastoupená na základě pověření sítě Ing. Zdeňkem Šulcem, MBA, manažerem,

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**CETIN**“)

a

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČO: 00303640

DIČ: CZ00303640

zastoupené: RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D. - starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 188491461/0300

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 21.9.2018 vydané pod čj. **730795/18**, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Zábřeh, Sušilova 41, dům pro seniory**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **583.239,- Kč**, (slovy: *pět set osmdesát tři tisíc dvě stě třicet devět korun českých*). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do čtyř (4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázanosti na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 39.433,- Kč, (slovy: třicet devět tisíc čtyři sta třicet tři korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
funkce: starosta
e-mail: posta@muzabreh.cz, tel.: 583 468 111

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování
e-mail: [REDACTED]

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
 - (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a

pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a

tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Doložka

Smlouva byla schválena Radou města Zábřeh na schůzi č. 15, konané dne 13.08.2019 pod číslem usnesení 19/RM/15/ORÚP/879.

CETIN:

V 32.8.2019 dne - 5 - 09 - 2019

[Redacted signature]

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Zdeněk Šulc, MBA
manažer, Výstavba pevné přístupové sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
231

Stavebník:

V 28.8.2019 dne 17. 9. 2019

[Redacted signature]

město Zábřeh
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta



[Redacted signature]

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00

Technické řešení I.

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie AN – Přístupová síť
Podkategorie VPI - metalické kabelové přístupové sítě
Číslo SAP
Číslo interní
Schvalování akce 2-kolové schvalování
Název

VPIC Zábřeh, Sušilova 41, dům pro seniory

Budoucí uživatel



Zpracovatel



Předkladatel



Schvaluje

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC Zábřeh, Sušilova 41, dům pro seniory
Kategorie:	AN - Přístupová síť
Podkategorie:	VPI - Metal. kab přístupová síť
Typ investice:	
Důvod 1:	
Číslo interní:	
Prvek SPP:	
ABC:	
HOST:	
ATÚ:	

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:
100800 Délka HDPE trubek pro OK	0,129 km	kmp mk
100200 Délka metalických kabelů	0,323 km	kmk mk
100700 Délka nadzemní tratě	0 km	km vyk
100100 Délka párů v metalických kabelech	19,930 km	km kv
100300 Délka výkopů vč. podvrtů a přechodů	0,115 km	kmo kv
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.
100400 Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár	
100900 Počet bytových domů	0 BD	
101100 Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj	
100500 Počet rodinných domů	0 RD	
100600 Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj	

Požadavky:

Název polygonu: VPIC Zábřeh, Sušilova 41, dům pro seniory

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Termíny:

Platnost ÚR od:	ÚR na přeložku CETIN zajistí investor.
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	
Plánované ukončení přípravy:	
Plánované zahájení realizace:	Pravděpodobně v roce 2020.
Plánované ukončení realizace:	

Nabídka k příjemce (Plán):

1.2 Účel stavby:

Akce řeší přeložku telefonních kabelů na ulicích Morávková a Sušilova v Zábřehu. V dané lokalitě dojde k výstavbě nového domu pro seniory, nových komunikací a parkovišť na stávajících kabelech společnosti CETIN. Územní rozhodnutí na přeložku vyhotoví Město Zábřeh v rámci svého stavebního povolení na celou stavbu.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu.

2.2 Navrhované řešení:

- Stávající UR ZABR180 bude z důvodu bourání stáv. objektu zrušen. Bude nahrazen novým sloupkem SIS1, který bude instalován vedle budoucího prostoru pro popelnice, jižně od stáv. UR.
Po instalaci nového SIS1 bude kabel PPFLE 3XN0,4 vedoucí k ZABR1283 odkopán před novou SIS-1 a zaústěn do nového rozvaděče. Z rozvaděče dále budou vedeny nové kabely PPFLE 10XN0,4 a 3xPPFLE 3XN0,4 novým výkopem až před rušený UR, kde budou kabely 2xPPFLE 3XN0,4 napojeny pomocí rovných spojek na kabely k ZABR4058 a ZABR4135. Kabely PPFLE 40XN0,4 a PPFLE 3XN0,4 budou vedeny až do chodníku ulice Sušilova, kde kabely PPFLE 10XN0,4 bude napojen rovnou spojkou na shodný kabel do směru ZABR59 a kabel PPFLE 3XN0,4 bude ponechána v rezervě pomocí koncovky SKH. Ve shodném místě také bude zakončen koncovkou nevyužívaný (mrtvý) kabel UZ 2P 0,8.
- Dále dojde k překládce kabelu PPFLE 200XN0,6 a tří HDPE 40mm barev černá, oranžová a oranžová s bílým pruhem, vedoucí podél ulice Morávková. HDPE 40 O je obsazena OK 778 012 01 a HDPE 40 Ob je obsazena OK 549 012 01 oba typu Samsung 24f+CU. Kabel PPFLE bude přeložen v celém úseku pomocí vložky kabelu a dvou rovných spojek. Překládka HDPE 40 C bude provedena pomocí nové HDPE 40 C a dvou spojek Plasson.
Překládka OK bude provedena následovně:
 - Dojde k pokládce dvou HDPE 40 O a HDPE 40 Ob od ulice Sušilova, až do trávníku na ulici Morávková
 - Dojde k instalaci nových PKOR pro nové optické spojky na ulici Morávková a U Bořin.
 - Dojde k přerušení obou OK na křiž. ulic U Bořin a Sušilova. Stávající OK budou vyfouknuty do nových PKOR
 - HDPE budou na ulici Sušilova (v místě překládky a v místě přerušení OK) spojeny pomocí spojek Plasson.
 - Mezi PKOR budou do HDPE 40 O a HDPE 40 Ob zafouknuty OK typu OFS MIDIA 24F+CU
 - V nových PKOR budou instalovány nové spojky typu Coyote Runt in Line, ve kterých dojde k provaření všech vláken 1-24 průběžně.
 - HDPE s OK budou v PKOR zakončeny pomocí průchodek Jackmoon40.
- V úseku od plánované komunikace k novému PKOR bude vedení stranově přeloženo. Vedení tří HDPE 40mm barev černá, oranžová (s OK 778 012 01 typu Samsung 24f+CU) a oranžová s bílým pruhem (s OK 549 012 01 typu Samsung 24f+CU) a kabel PPFLE 200XN0,6 vedoucí do ZABR59 bude odkopáno a v délce 12m stranově přeloženo, tak aby optické spojky byly v trávníku.
- V místě plánovaného napojení nové komunikace a vjezdu na parkoviště na ulici Morávková bude vedení tří HDPE 40mm barev černá, oranžová (s OK 778 012 01 typu Samsung 24f+CU) a oranžová s bílým pruhem (s OK 549 012 01 typu Samsung 24f+CU) a kabel PPFLE 200XN0,6 vedoucí do ZABR59 odkopáno a v délce 12m a ochráněno pomocí SYSPRO. Souběžně bude uložena rezervní PE110 pro případné opravy na vedení. Délka SYSPRO je volena tak, aby vedení bylo ochráněno i pro realizaci stavby „VPIC Zábřeh, Na Skokance, komunikace“ v rámci které je plánováno napojení parkoviště na ulici Morávková. V případě, že bude dříve realizována stavba " VPIC Zábřeh, Na Skokance, komunikace" bude vedení ochráněno v rámci této stavby (toto je předpokládáno).
- **Měření optických vláken**
 - Oboustranné měření reflektrometrem (OTDR) s vyhodnocením útlumu případných spojek a vyhodnocením měrných úseků jednotlivých úseků. Provádí se při vhodné délce impulsu podle charakteru a délky trasy ve třech přenosových oknech (1310, 1550 a 1625 nm).
 - Oboustranné měření celkového útlumu všech vláken přímou metodou IEC 86 A-1 ve třech přenosových oknech (1310 nm, 1550 nm a 1625 nm).
- Před záhozem po odkrytí vedení a po uložení vedení do SYSPRO je zhotovitel povinen přizvat správce opt. sítě ke kontrole, se zápisem o povolení záhozu do SD.
- V rámci této akce budou prováděny montážní práce na vedení, které již zajišťuje telekomunikační provoz. Před započítím prací je nutno v dostatečném předstihu požádat o PEW pracovníky údržby kabelů.

2.3 Popis tras

viz polohopis
VVN: ne
El. trakce: ne
Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Spojky XAGA a optické spojky budou označeny Minimarkerem 3M, typ 1255.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I
TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II
TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III
TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely
TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení
POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření K1). Dokumentace skutečného provedení bude zpracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Realizace přeložky bude koordinována s realizací výstavby parkovišť a komunikací.

2.7 Ostatní:

Kontakty:

Projektový koordinátor TCZ: [REDACTED]

Zpracovatel CTN - [REDACTED]

Vypracoval - [REDACTED]

Investor:

Městský úřad Zábřeh, [REDACTED]

Projektant - [REDACTED]

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené: nejsou

Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------

Navazující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------

4. Vyjádření a záznamy - viz. příloha

5. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
K1 - Katastrální mapa.pdf	SD
P1 - Polohopisný plán.dgn	SD
S1,S2 - Kabelové schema.dgn	SD
Informace o parcele.pdf	SD
Kalkulace nákladů - PPD	SD

Situace stavby garáže	SD
Podklady dokumentace Telefónica	SD

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1083
Obec:	Zábřeh [541354]
Katastrální území:	Zábřeh na Moravě [789429]
Číslo LV:	3366
Výměra [m ²]:	266
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahrada



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
51212	266

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 21.01.2019 08:00:00.

© 2004 - 2019 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.3 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1084
Obec:	Zábřeh [541354]
Katastrální území:	Zábřeh na Moravě [789429]
Číslo LV:	3366
Výměra [m ²]:	1251
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

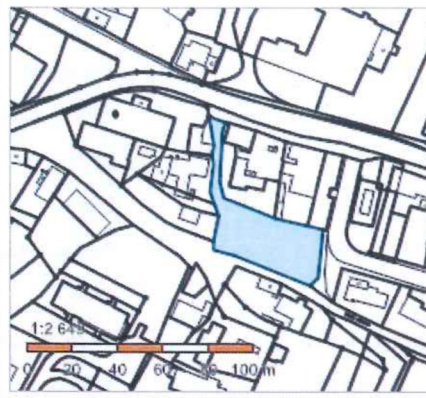

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 21.01.2019 08:00:00.

© 2004 - 2019 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.3 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1015
Obec:	Zábřeh [541354]
Katastrální území:	Zábřeh na Moravě [789429]
Číslo LV:	3366
Výměra [m²]:	5405
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

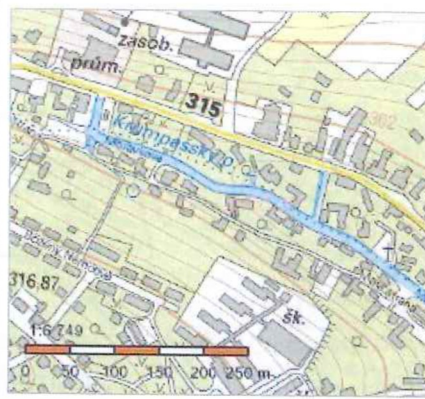

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno užívání

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 21.01.2019 08:00:00.

© 2004 - 2019 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.3 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1074
Obec:	Zábřeh [541354]
Katastrální území:	Zábřeh na Moravě [789429]
Číslo LV:	3366
Výměra [m ²]:	1262
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

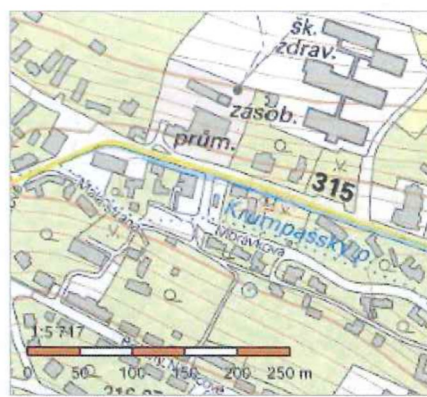

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 21.01.2019 08:00:00.

© 2004 - 2019 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.3 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1082
Obec:	Zábřeh [541354]
Katastrální území:	Zábřeh na Moravě [789429]
Číslo LV:	3366
Výměra [m ²]:	560
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

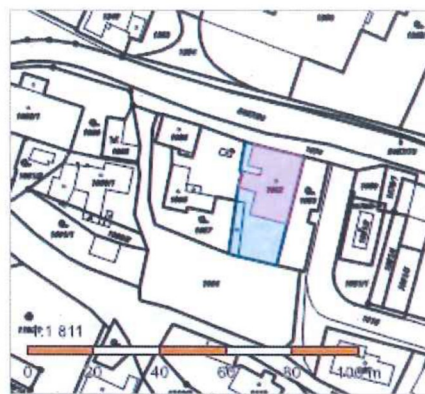

Součástí je stavba

Budova s číslem popisným:	Zábřeh [414701] ; č. p. 1375; stavba občanského vybavení
Stavba stojí na pozemku:	p. č. 1082
Stavební objekt:	č. p. 1375
Ulice:	Sušilova
Adresní místa:	Sušilova 1375/41

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 21.01.2019 08:00:00.

© 2004 - 2019 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.3 build 0




- LEGENDA**
- STAVAJÚCI ZARIŽENÍ
 - RÚSENÉ ZARIŽENÍ
 - NOVÉ ZARIŽENÍ
 - UPRAVŮVANÉ ZARIŽENÍ
 - PODMÍTLÍVÍ STAVBA
 - NAVÁZÚJÍCÍ STAVBA

Nové OSRŽE OK 778 012 011
Nové OSRŽE OK 549 012 011
Nové OSRŽE OK 549 012 011

Nové OSRŽE OK 778 012 011
Nové OSRŽE OK 549 012 011
Nové OSRŽE OK 549 012 011

Nové OSRŽE OK 778 012 011
Nové OSRŽE OK 549 012 011
Nové OSRŽE OK 549 012 011



11.

URT2/0-33
ZABR168

UR4/23-3
Sušilova č.50

URT2
ZABR

UR4/23-4
Sušilova č.33

Konec překládky vedení,
spojky na vedení.

vedení v 2xPE125

Ruční rozvaděč

Trasa možného napojení
uvedena v UR stavba.
Napojení není součástí této PD.

Nový rozvaděč SIS1-b.
Umístít do oplocení,
vedle prostoru popelnice.
Před realizací bude stáv.
objekt zbourán.

pro č.p.30

Vedení min. 0,5m od obruby.

Křížení obrub chodníku
Vedení v 2xPE125.

Počátek pokládky HDPE a PPFLE 200XN
Optické spojky v PKOR (1,0x0,8m)

Vedení HDPE a PPFLE 200XN
bude odkopáno a
stranově přesunuto do trávníku.
Trasa min. 0,5m od obruby.

Křížení obrub a sítí,
nové vedení v 2xPE125


Vedení ochráněno v rámci stavby
"VPIC Zábřeh, Na Skokance, komunikace".
V případě, že nebude v době realizace
již ochráněno, bude trasa odkopána
a ochráněna 2xSYSPRO+REZ. PE110.


Kabel 3XN vedoucí západním směrem,
bude dokopán přetažen do nového UR.

vedení v PE110

LEGENDA:

	PROJEKTOVANÁ TRASA
	SOĎLOVACÍ KABEL
	SILOVÉ KABELY NN
	SILOVÉ KABELY VN
	PLYNOVOD
	KANALIZACE
	VODOVOD
	TEPLOVOD

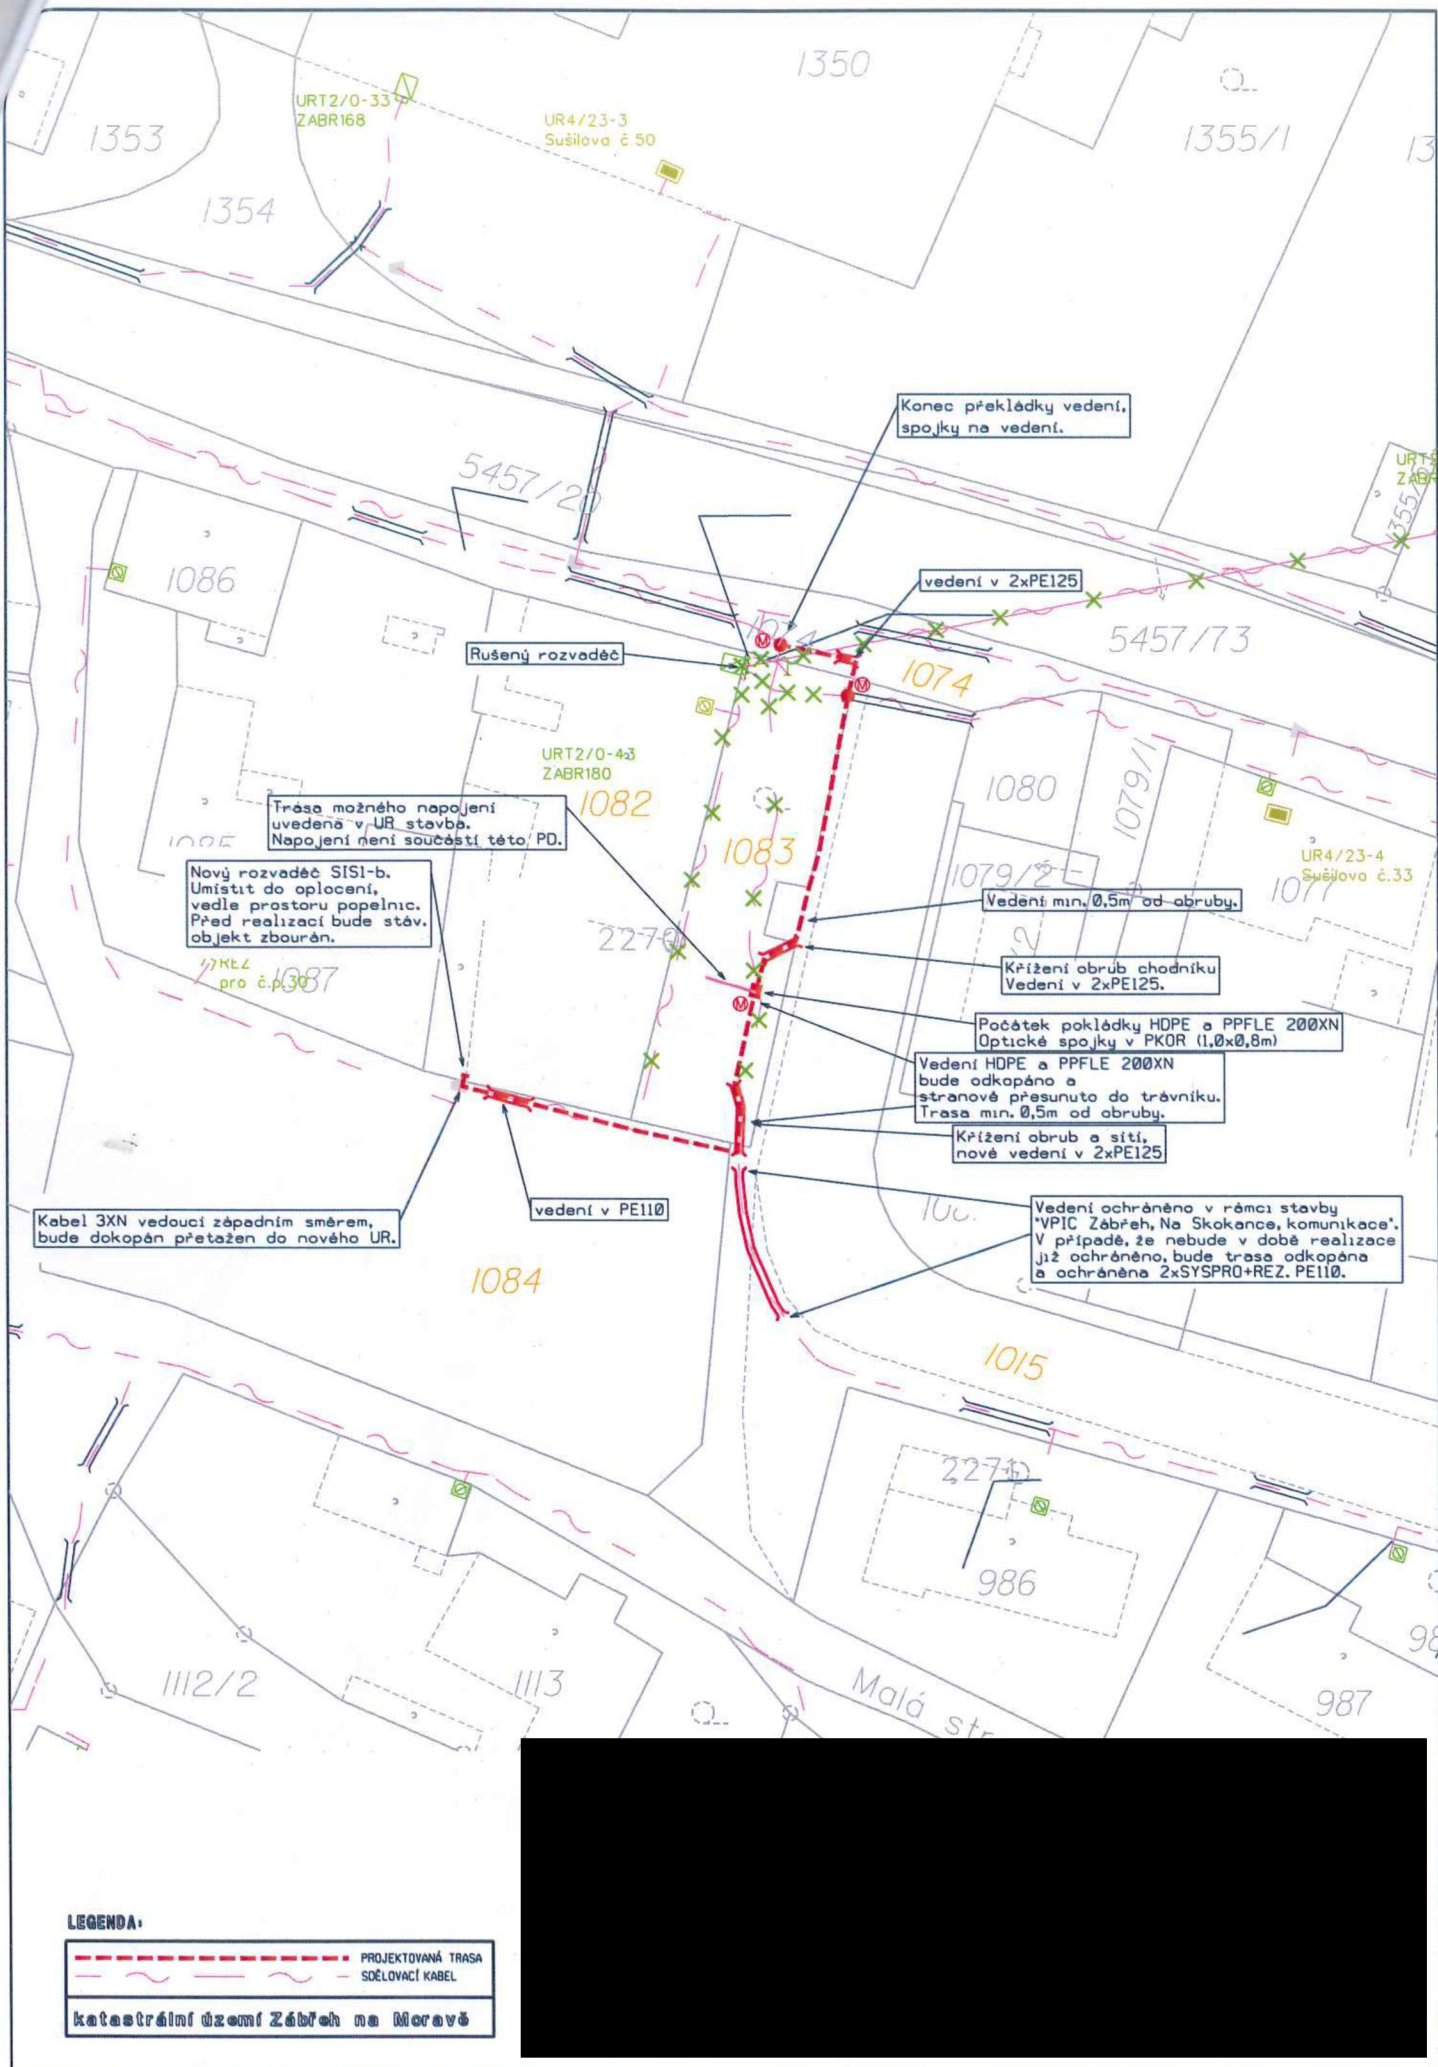

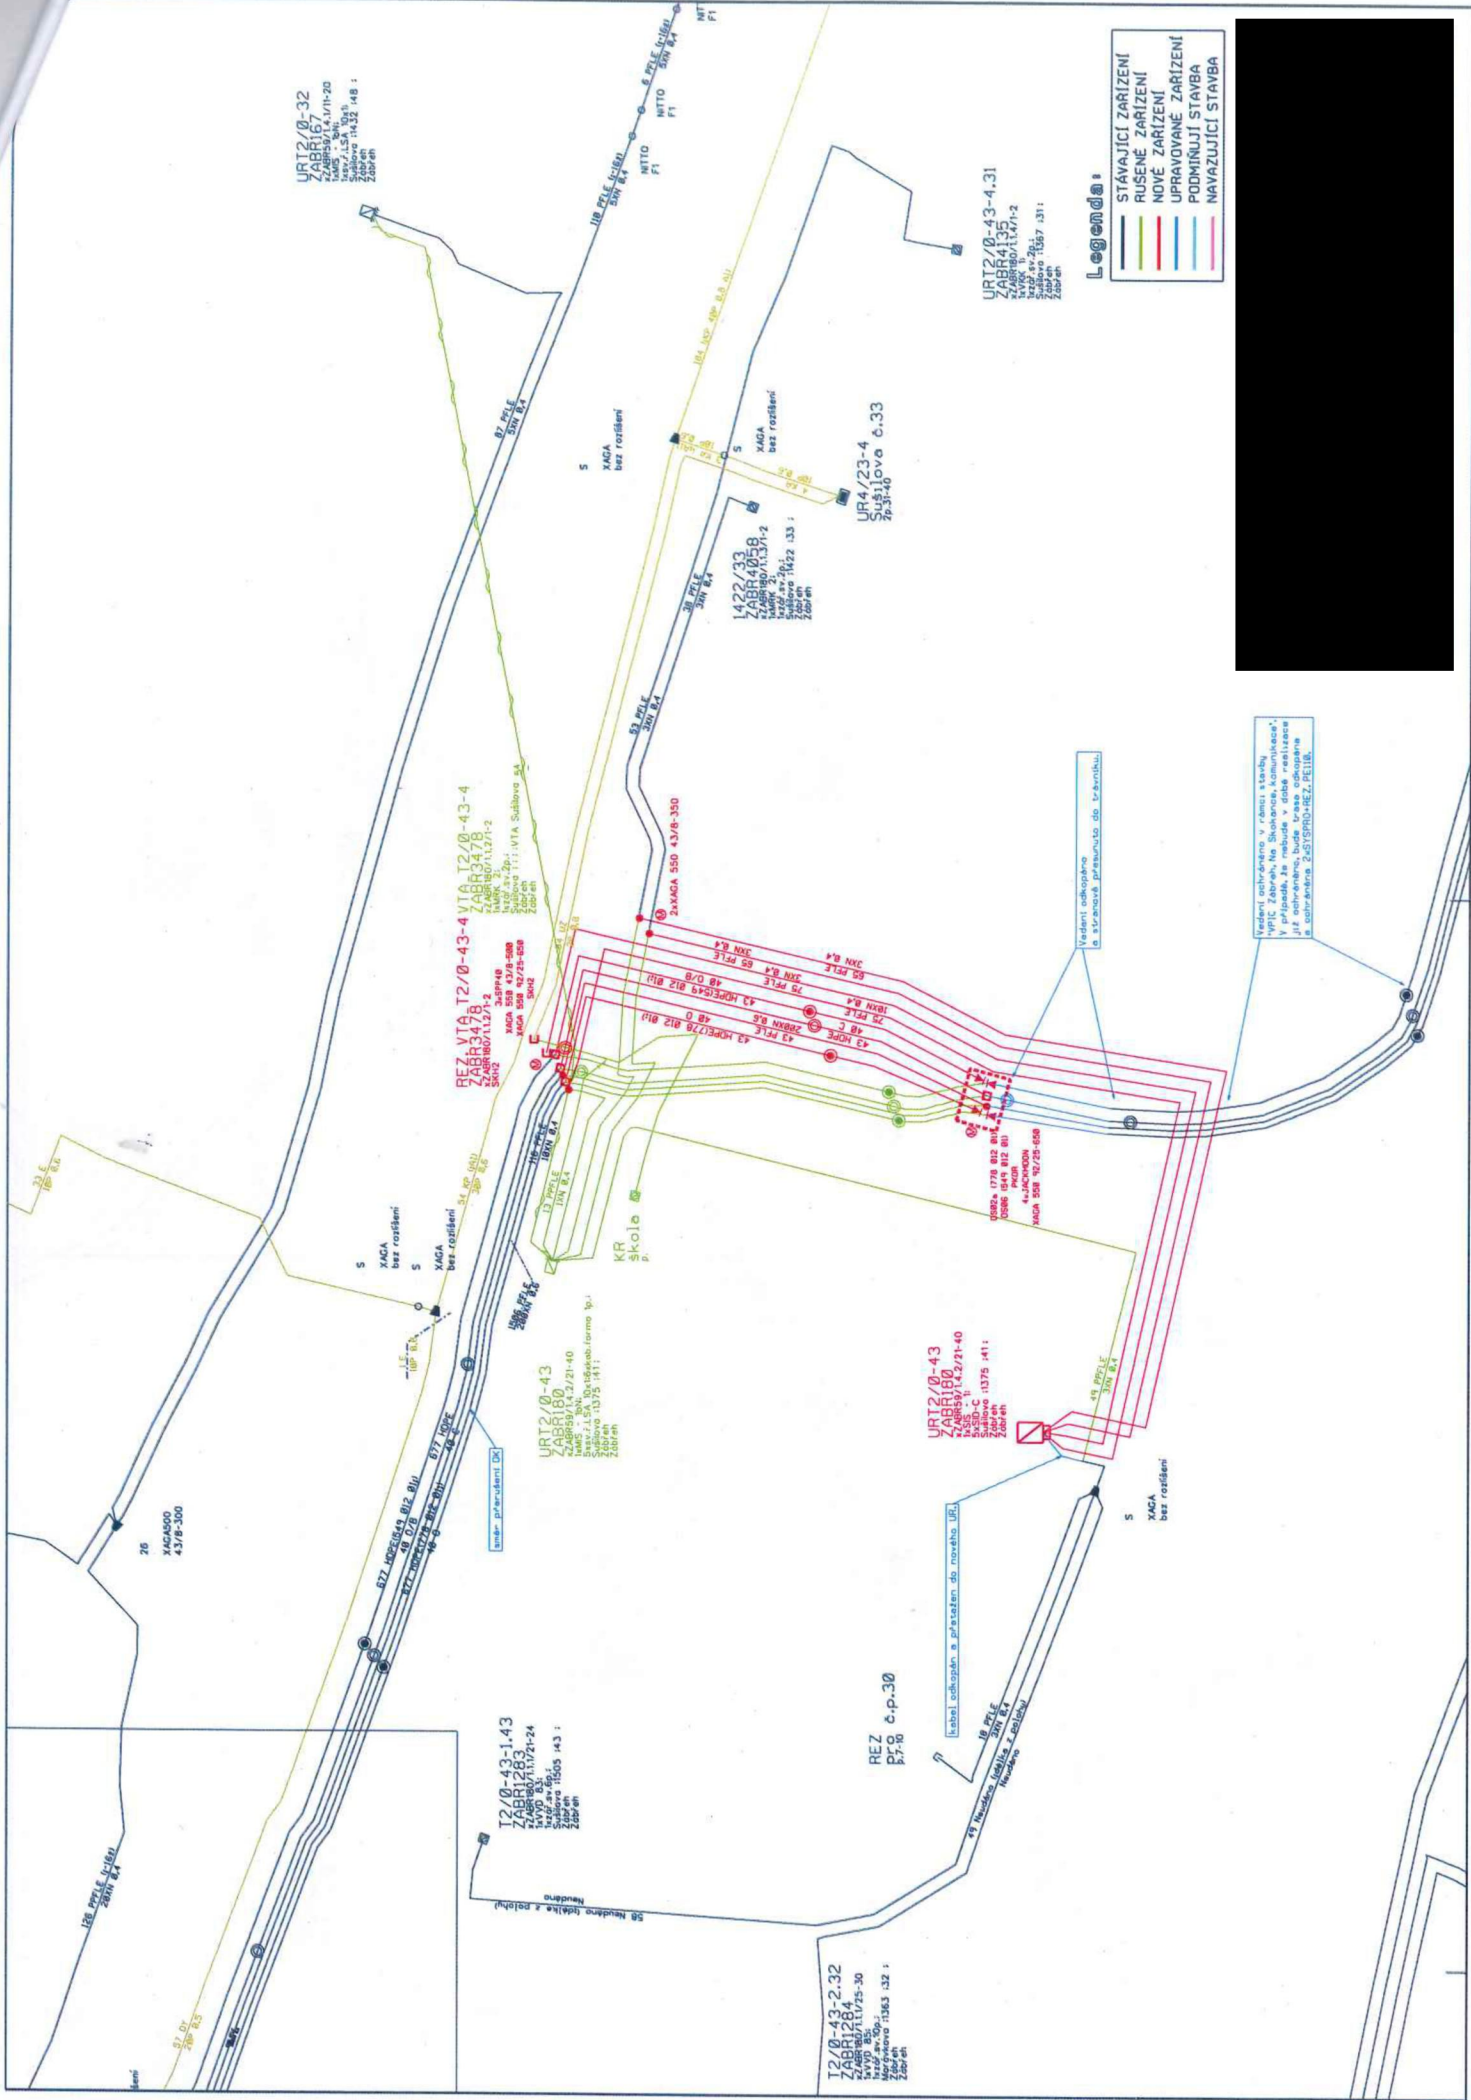

- Legenda:**
- STÁVAJÍCÍ ZARÍZENÍ
 - RUSENÉ ZARÍZENÍ
 - NOVÉ ZARÍZENÍ
 - UPRAVOVANÉ ZARÍZENÍ
 - PODMÍNUJÍ STAVBA
 - NAVAZUJÍCÍ STAVBA

Vedení odpočívá a strážná přímka do hranice.

Vedení odpočívá a strážná přímka do hranice.

Vedení odpočívá a strážná přímka do hranice.

Vedení odpočívá a strážná přímka do hranice.

Vedení odpočívá a strážná přímka do hranice.

Legenda:

—	STÁVAJÍCÍ ZARÍZENÍ
—	RUŠENÉ ZARÍZENÍ
—	NOVÉ ZARÍZENÍ
—	UPRAVOVANÉ ZARÍZENÍ
—	PODKMÍŇUJÍ STAVBA
—	NAVÁZUJÍCÍ STAVBA

URT2/0-34
ZABR169
KAM: 13.11.1941-60
Výš: 1.52, 102B
Výš: 1.52, 102B
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6

I2/0-34-4.6
ZABR1248
KAM: 13.11.1939-44
Výš: 1.52, 102B
Výš: 1.52, 102B
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6

I2/0-34-5.4
ZABR1249
KAM: 13.11.1945-50
Výš: 1.52, 102B
Výš: 1.52, 102B
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6

I2/0-34-6.2
ZABR1250
KAM: 13.11.1951-56
Výš: 1.52, 102B
Výš: 1.52, 102B
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6

I2/0-34-7.54
ZABR1251
KAM: 13.11.1957-62
Výš: 1.52, 102B
Výš: 1.52, 102B
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6

URT2/0-35
ZABR170
KAM: 13.11.1961-70
Výš: 1.52, 102B
Výš: 1.52, 102B
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6

UR4/23-1
ZABR171
KAM: 13.11.1971-72
Výš: 1.52, 102B
Výš: 1.52, 102B
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6



URT2/0-35-3.1
ZABR342
KAM: 13.11.1972-73
Výš: 1.52, 102B
Výš: 1.52, 102B
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6

URT2/0-35-2.60
ZABR343
KAM: 13.11.1973-74
Výš: 1.52, 102B
Výš: 1.52, 102B
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6

URT2/0-44
ZABR181
KAM: 13.11.1941-50
Výš: 1.52, 102B
Výš: 1.52, 102B
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6
Základ: 11172,34 u č.6


Kabel: 549 012 - DKO LANŠKROUN - ZÁBŘEH N.M. (ON:05.12.2014 08:22:39)

(LANS:BS:1 - ZABR:BS:1) Stránka: [K] Provozni



- Legenda:
- STÁVAJÍCÍ ZARÍZENÍ
 - RUŠENÉ ZARÍZENÍ
 - NOVÉ ZARÍZENÍ
 - UPRAVOVANÉ ZARÍZENÍ
 - PODKRÍJÍCÍ STAVBA
 - NAVÁZUJÍCÍ STAVBA


Kabel: 778 012 - DOK ZABREH NA MORAVE-HOSTEJN (ON:29.04.2014 12:27:33)
 (ZABR:BS:1 - HOSN:BS:1) Stránka: [K] Provozni

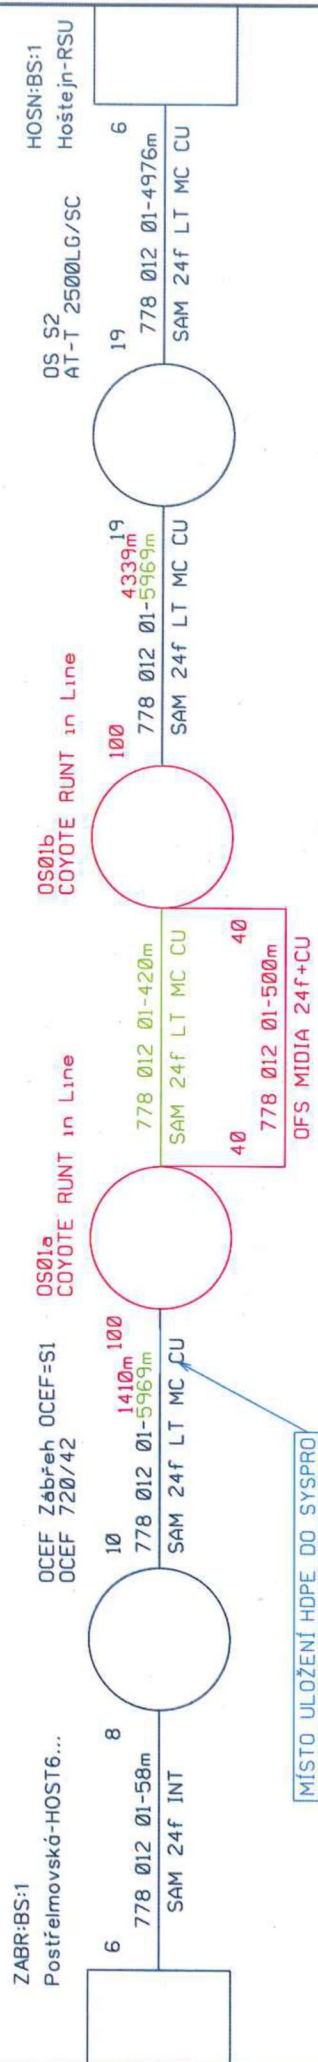

Legenda:

- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
- RUŠENÉ ZAŘÍZENÍ
- NOVÉ ZAŘÍZENÍ
- UPRAVOVANÉ ZAŘÍZENÍ
- PODMÍNUJÍ STAVBA
- NAVÁZUJÍCÍ STAVBA

Kabel: 549 012 - DKO LANŠKROUN - ZÁBŘEH N.M. (ON:05.12.2014 08:23:31)
 (LANS:BS:1 - ZABR:BS:1) Stránka: [K] Provozní




ZABR:BS:1

Zábřeh(Postřelmovská)-HOST648-PT-SUZAP KOS Postřelmovská-HOST6...
 OCEF 288/22

OS05
 COYOTE RUNT in Line


OS06
 COYOTE RUNT in Line

01/4/II
 AT-T 2500LG/SC



- Legenda:
- STÁVAJÍCÍ ZARÍZENÍ
 - RUŠENÉ ZARÍZENÍ
 - NOVÉ ZARÍZENÍ
 - UPRAVOVANÉ ZARÍZENÍ
 - PODMÍNUJÍ STAVBA
 - NAVÁZUJÍCÍ STAVBA

Kabel: 778 012 - DOK ZABREH NA MORAVE-HOSTEJN (ON:30.10.2018 08:28:29)
 (ZABR:BS:1 - HOSN:BS:1) Stránka: [K] Provozní

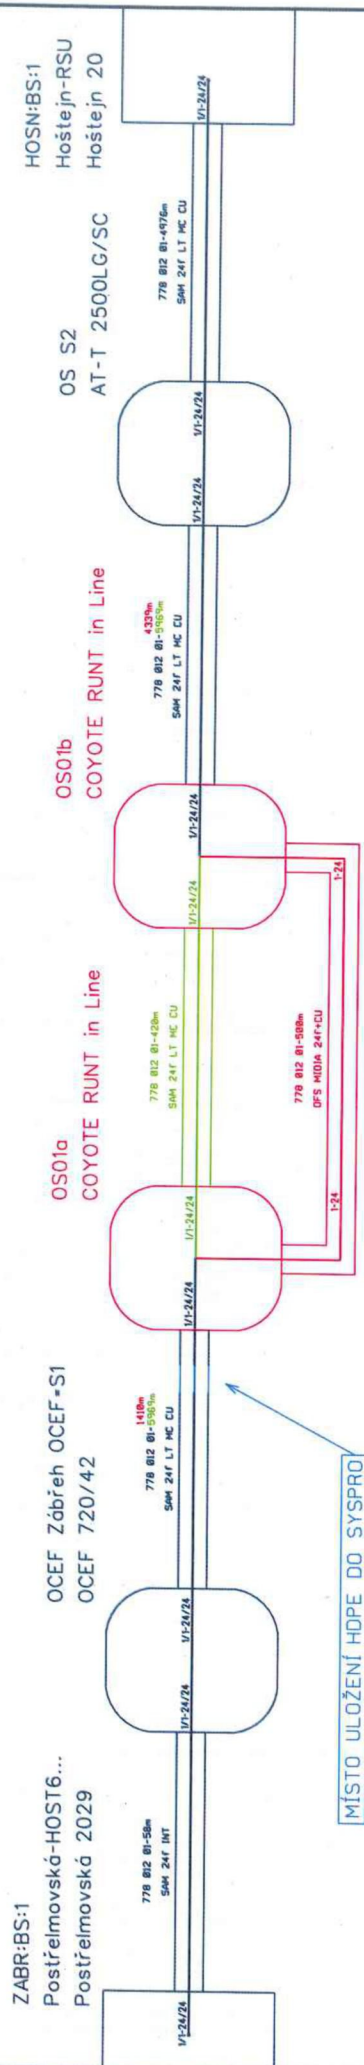

Legenda:

—	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
—	RUŠENÉ ZAŘÍZENÍ
—	NOVÉ ZAŘÍZENÍ
—	UPRAVOVANÉ ZAŘÍZENÍ
—	PODMIŇUJÍCÍ STAVBA
—	NAVÁZUJÍCÍ STAVBA

ODF LSC1U-144/21 - 1
 778.071.011

pozice kabel úsek směr

1 - 32 778 071 06 LUKE:BS:1
 33 - 33 778 071 66 ZABR:BS:26
 34 - 34 778 071 68 ZABR:BS:25
 35 - 36 778 071 64 RJEC:BS:1
 37 - 42 778 071 61 ZABR:BS:9
 43 - 48 778 071 62 ZABR:BS:5
 49 - 72 776 011 01 SUMP:BS:5
 73 - 84 776 081 01 SUMP:BS:5
 85 - 104 776 081 02 PLMV:BS:1
 105 - 110 776 081 62 ZABR:OB:J:701
 111 - 120 776 081 02 PLMV:BS:1
 121 - 144 778 012 01 HOSN:BS:1

1	13	25	37	49	61
1/1	7/7	13/13	19/19	25/25	31/31
2/2	8/8	14/14	20/20	26/26	32/32
3/3	9/9	15/15	21/21	27/27	33/33
4/4	10/10	16/16	22/22	28/28	34/34
5/5	11/11	17/17	23/23	29/29	35/35
6/6	12/12	18/18	24/24	30/30	36/36
12	24	36	48	60	72
73	85	97	109	121	133
1/1	7/7	13/13	19/19	25/25	31/31
2/2	8/8	14/14	20/20	26/26	32/32
3/3	9/9	15/15	21/21	27/27	33/33
4/4	10/10	16/16	22/22	28/28	34/34
5/5	11/11	17/17	23/23	29/29	35/35
6/6	12/12	18/18	24/24	30/30	36/36
84	96	108	120	132	144

ODF LSC2U-024/5 - 2
 549.012

pozice kabel úsek směr

1 - 24 549 012 01 LANS:BS:1

1	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6	7/7	8/8	9/9	10/10	11/11	12/12	13
13	13/13	14/14	15/15	16/16	17/17	18/18	19/19	20/20	21/21	22/22	23/23	24/24	24

ODF OMTR 2U-48 - 3

778.BAG

pozice kabel úsek směr

1 - 24 778 BAG 01 ZABR:BS:4

1	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6	7/7	8/8	9/9	10/10	11/11	12/12	13/13	14/14	15/15	16/16	17/17	18/18	19/19	20/20	21/21	22/22	23/23	24/24	24	
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48

ODF LSC2U-024/5 - 4

778.013

pozice kabel úsek směr

1 - 20 778 013 08 STIT:BS:1
 21 - 21 778 013 62 ROVS:BS:1
 22 - 22 778 013 66 HSTU:BS:2
 23 - 23 778 013 08 STIT:BS:1
 24 - 24 778 013 64 SVEB:BS:1

1	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6	7/7	8/8	9/9	10/10	11/11	12/12	13
13	13/13	14/14	15/15	16/16	17/17	18/18	19/19	20/20	21/21	22/22	23/23	24/24	24

ODF LSC1U-072/12 - 5

778.011.778.AAA

pozice kabel úsek směr

1 - 24 778 011 01 LITL:BS:1
 25 - 48 778 AAA 01 ZABR:BS:2
 49 - 60 778 BAA 01 ZABR:BS:4

1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67
1/1	7/7	13/13	19/19	25/25	31/31	37/37	43/43	49/49	55/55	61/61	67/67
2/2	8/8	14/14	20/20	26/26	32/32	38/38	44/44	50/50	56/56	62/62	68/68
3/3	9/9	15/15	21/21	27/27	33/33	39/39	45/45	51/51	57/57	63/63	69/69
4/4	10/10	16/16	22/22	28/28	34/34	40/40	46/46	52/52	58/58	64/64	70/70
5/5	11/11	17/17	23/23	29/29	35/35	41/41	47/47	53/53	59/59	65/65	71/71
6/6	12/12	18/18	24/24	30/30	36/36	42/42	48/48	54/54	60/60	66/66	72/72
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72

ODF OMTR 2U-48 - 6

778.AAB

pozice kabel úsek směr

1 - 24 778 AAB 01 ZABR:BS:2
 25 - 36 778 BAC 01 ZABR:BS:7
 37 - 48 778 BAC 01 ZABR:BS:7

1	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6	7/7	8/8	9/9	10/10	11/11	12/12	13/13	14/14	15/15	16/16	17/17	18/18	19/19	20/20	21/21	22/22	23/23	24/24	24
25	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6	7/7	8/8	9/9	10/10	11/11	12/12	13/13	14/14	15/15	16/16	17/17	18/18	19/19	20/20	21/21	22/22	23/23	24/24	48

ODF OMTR 2U-48 - 7

778.BAD

pozice kabel úsek směr

1 - 12 778 BAD 02 ZABR:BS:10
 13 - 18 778 BAD 02 ZABR:BS:10
 19 - 22 778 BAD 01 SOR 01
 23 - 24 778 BAD 62 ZABR:BS:14
 25 - 26 778 BAE 02 ZABR:BS:16
 27 - 28 778 BAE 62 ZABR:BS:21
 29 - 30 778 BAE 65 JESE:BS:2
 31 - 36 778 BAE 01 SOR 01
 37 - 40 778 BAF 02 ZABR:BS:17
 41 - 48 778 BAF 01 S 01

1	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6	7/7	8/8	9/9	10/10	11/11	12/12	13/13	14/14	15/15	16/16	17/17	18/18	19/19	20/20	21/21	22/22	23/23	24/24	24
25	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6	7/7	8/8	9/9	10/10	11/11	12/12	13/13	14/14	15/15	16/16	17/17	18/18	19/19	20/20	21/21	22/22	23/23	24/24	48

ODF LSTIU-144/9 - 1
 549 041
 pozice kabel úsek směr
 1 - 24 549 041 03 CETR:BS:1
 25 - 26 549 041 70 CETR:BS:34
 27 - 34 549 041 03 CETR:BS:1
 35 - 36 549 041 69 CETR:BS:31
 37 - 42 549 041 61 CETR:BS:5
 43 - 48 549 041 62 CETR:BS:22

ODF-72 E2000/APC - 2
 549 RAB,RAJ
 pozice kabel úsek směr
 1 - 6 549 RAB 03 LANS:BS:5
 7 - 12 549 RAB 62 LANS:BS:11
 13 - 18 549 RAB 63 LANS:BS:9
 19 - 28 549 RAB 65 LANS:BS:6
 29 - 30 549 RAB 66 LANS:BS:16
 31 - 32 549 RAB 67 LANS:BS:15
 33 - 36 549 RAB 02 SOR0101
 37 - 42 549 RAB 68 LANS:BS:16
 43 - 48 549 RAB 65 LANS:PROSTORA:5
 49 - 54 549 RAJ 01 LANS:BS:19

ODF144 E2000/APC - 3
 549 016,014,015,012
 pozice kabel úsek směr
 1 - 24 549 016 01 DAMN:BS:1
 25 - 48 549 014 05 TATE:BS:1
 49 - 71 549 015 03 DCRM:BS:1
 72 - 72 549 015 61 DCRM:BS:2
 97 - 120 549 012 01 ZABR:BS:1

LANS BS 1 LANS PROSTORA 21 Kamenského / Londron
 ET104030-700 1:1
 Vlastník: HKH&PZ-1902

Verze: 02/04/01
 Úpravy: PAM&PZ-002/4

1	13	25	37	49	61	73	85	97	109	121	133
1/1	13/13	25/25	37/37	/	/	/	/	/	/	/	/
2/2	14/14	26/26	38/38	/	/	/	/	/	/	/	/
3/3	15/15	27/27	39/39	/	/	/	/	/	/	/	/
4/4	16/16	28/28	40/40	/	/	/	/	/	/	/	/
5/5	17/17	29/29	41/41	/	/	/	/	/	/	/	/
6/6	18/18	30/30	42/42	/	/	/	/	/	/	/	/
7/7	19/19	31/31	43/43	/	/	/	/	/	/	/	/
8/8	20/20	32/32	44/44	/	/	/	/	/	/	/	/
9/9	21/21	33/33	45/45	/	/	/	/	/	/	/	/
10/10	22/22	34/34	46/46	/	/	/	/	/	/	/	/
11/11	23/23	35/35	47/47	/	/	/	/	/	/	/	/
12/12	24/24	36/36	48/48	/	/	/	/	/	/	/	/
12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144

1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67
1/1	7/7	13/13	19/19	25/25	31/31	37/37	43/43	49/49	55/55	61/61	67/67
2/2	8/8	14/14	20/20	26/26	32/32	38/38	44/44	50/50	56/56	62/62	68/68
3/3	9/9	15/15	21/21	27/27	33/33	39/39	45/45	51/51	57/57	63/63	69/69
4/4	10/10	16/16	22/22	28/28	34/34	40/40	46/46	52/52	58/58	64/64	70/70
5/5	11/11	17/17	23/23	29/29	35/35	41/41	47/47	53/53	59/59	65/65	71/71
6/6	12/12	18/18	24/24	30/30	36/36	42/42	48/48	54/54	60/60	66/66	72/72
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72

1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67
1/1	7/7	13/13	19/19	25/25	31/31	37/37	43/43	49/49	55/55	61/61	67/67
2/2	8/8	14/14	20/20	26/26	32/32	38/38	44/44	50/50	56/56	62/62	68/68
3/3	9/9	15/15	21/21	27/27	33/33	39/39	45/45	51/51	57/57	63/63	69/69
4/4	10/10	16/16	22/22	28/28	34/34	40/40	46/46	52/52	58/58	64/64	70/70
5/5	11/11	17/17	23/23	29/29	35/35	41/41	47/47	53/53	59/59	65/65	71/71
6/6	12/12	18/18	24/24	30/30	36/36	42/42	48/48	54/54	60/60	66/66	72/72
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
73	79	85	91	97	103	109	115	121	127	133	139
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144



6.

HOSH BS 1 HOSH OBJ 101 / Holtej
EFS6030-220 1
Vinstok: OS:66P2-OS:2

AB01-ISC-F1-Q1 variantje					PCB-M0103H001 Wn.01				
				1 1					
4	5	6	7	8	9	10	11		


GSI-2000v AT-T-1															
vz/factor Q3															
PAGE 1										FACILITY	FACILITY	COUNTRY	COUNTRY		
1										1	2	1	2		
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	P9	I-10	I-11	W1	E1			


ODF ORMP1U 12 - 1
systémový
pozice kabel úsek směr

[illegible]

ODF LSCIU-072/12 - 2
778.012,778.014
pozice kabel úsek směr
1 - 24 778 012 01 ZABR:BS:1
25 - 44 778 014 02 STIT:BS:1
45 - 48 778 014 61 JDL:OBJ:169

1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67
1/1	7/7	13/13	19/19	25/1	31/7	37/13	43/19	/	/	/	/
2/2	8/8	14/14	20/20	2/2	8/8	14/14	20/20	/	/	/	/
3/3	9/9	15/15	21/21	3/3	9/9	15/15	21/21	/	/	/	/
4/4	10/10	16/16	22/22	4/4	10/10	16/16	22/22	/	/	/	/
5/5	11/11	17/17	23/23	5/5	11/11	17/17	23/23	/	/	/	/
6/6	12/12	18/18	24/24	6/6	12/12	18/18	24/24	/	/	/	/
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72





6.

Příloha č. 1 Specifikace nákladů_VPIC Zábřeh, Sušilova 41,dům pro seniory

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.07

Položková 2019.07

Název stavby: VPIC Zábřeh, Sušilova 41,dům pro seniory

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	37 374,76 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	68 033,32 Kč
MONTÁŽ	300 487,31 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	11 895,19 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 057,99 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 428,01 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	158 962,41 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 583 238,99 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 539 378,23 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 43 860,76 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	5 737,40 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	20 275,24 Kč
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě		1.00 ks	11 362,12 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		78.00 m	1 429,74 Kč
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	48.00 m	2 580,48 Kč
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		22.00 m	11 752,62 Kč
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	22.00 m	17 863,56 Kč
952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70		15.00 m	9 822,15 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	56.00 m	19 166,00 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		33.00 m	3 227,07 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	115.00 m	1 262,70 Kč
954972 S	Znovuosazení obrubníků chodníkových		4.00 m	929,00 Kč

MONTÁŽ

955010 S	Demontáž úložné trubky	81.00 m	839,16 Kč
955031 S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	37.00 m	1 176,97 Kč
955029 S	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	5.00 m	91,65 Kč
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	42.00 m	2 053,80 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	129.00 m	466,98 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm)	48.00 ks	17 883,36 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm)	48.00 ks	3 700,32 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	6.00 ks	953,46 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	214.00 ks	7 849,52 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	212.00 ks	5 185,52 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	5.00 ks	427,85 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	317,82 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	416.00 ks	10 175,36 Kč
955288 S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks	97,80 Kč
955299 S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	1 053,69 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 413,16 Kč
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	4.00 ks	4 099,52 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 422,50 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	3.00 ks	3 483,63 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	5.00 ks	237,00 Kč
955948 S	Montáž těsnění svazku trubiček	8.00 ks	1 943,84 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	210.00 m	2 488,50 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	280.00 m	5 835,20 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	43.00 m	1 577,24 Kč
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 114,80 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	3.00 ks	93 544,53 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	16 443,88 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	19840.00 J	19 840,00 Kč

rozpočtová rezerva

958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metro	96.00 ks	36 998,40 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	22.00 ks	538,12 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	1 772,35 Kč
957739 S	Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti	1.00 ks	617,02 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 738,60 Kč

kolaudace

955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 090,36 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trut	1840.00 m	31 924,00 Kč
958558 S	Zkouška trhací	2.00 ks	3 083,24 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks	5 388,18 Kč
955103 S	Zrušení rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř	1.00 ks	770,06 Kč
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	70.00 m	1 458,80 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	24.00 ks	410,16 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	8.00 ks	1 173,44 Kč
955012 S	Zrušení úložné trubky	120.00 m	958,80 Kč
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	40.00 m	1 028,00 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do 15 XN	78.00 m	1 050,66 Kč
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	770,06 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955198 S	Plán geom.pro VBR do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	6 036,74 Kč
----------	---	---------	-------------

956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	15.00 m	370,50 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevr	1.00 ks	5 487,95 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 057,99 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBŘ odhadovaná Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.	1.00 ks	100,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 469,58 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KI	1.00 ks	1 858,43 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
306577 S	Bleskojistka třípólová 230V 10A/10kA		4.00 ks	191,04 Kč
311145 S	Číslo násuvné 1-0 79170-00328		4.00 ks	75,84 Kč
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		103.00 ks	3 916,06 Kč
319092 S	Díl ohybový Syspro 160/110		10.00 ks	2 444,00 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		103.00 m	455,26 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		200.00 m	458,00 Kč
300218 S	Kabel opt. MiDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu		1000.00 m	23 490,00 Kč
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4		75.00 m	1 864,50 Kč
300123 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6		43.00 m	30 772,95 Kč
300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		205.00 m	2 695,75 Kč
318863 S	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6		4.00 ks	2 098,52 Kč
316534 S	Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm		2.00 ks	127,84 Kč
312186 S	Konektor UR2-D - suchý		4.00 ks	15,68 Kč
312204 S	Konektor UR2 - plněný		4.00 ks	15,68 Kč
321714 S	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450		2.00 ks	17 596,20 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5		6.00 ks	1 384,92 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		84.00 ks	1 937,04 Kč
323050 S	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm		96.00 ks	522,24 Kč
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m		25.00 kg	1 079,50 Kč
306776 S	Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm		8.00 ks	5 686,24 Kč
324253 S	Průchodka těsnící D 40mm (5-9mm) Jackm		4.00 ks	415,80 Kč
303251 S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon		4.00 ks	387,68 Kč
312888 S	Rámeček LSA + rámeček násuvný		3.00 ks	381,33 Kč
312905 S	Rámeček LSA + rámeček odklopný		2.00 ks	236,68 Kč
306419 S	Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek		1.00 ks	6 867,40 Kč
407578 S	Souprava čistící 4413L		1.00 ks	638,68 Kč
306732 S	Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line		4.00 ks	20 614,16 Kč
320296 S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350		2.00 ks	1 493,74 Kč
320297 S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500		1.00 ks	799,55 Kč
320300 S	Spojka smršťovací XAGA 550 92/25-650		2.00 ks	2 512,04 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		5.00 ks	1 079,40 Kč
319184 S	Spona trubkySYSPRO		168.00 ks	3 422,16 Kč
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm		1.00 ks	45,49 Kč

309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	2.00 ks	242,30 Kč
309388 S	Svorkovnice zář. spoj.SID-C 79101-55300	3.00 ks	384,51 Kč
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	28.00 m	12 925,64 Kč
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá	43.00 m	1 179,49 Kč
300032 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	43.00 m	1 179,49 Kč
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	43.00 m	1 179,49 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	3.00 ks	1 539,69 Kč
302752 S	Trubka PE 125/7,1/6000mm	2.00 ks	2 069,20 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	20.00 m	817,40 Kč
308513 S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	179,09 Kč
303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	42,38 Kč
303204 S	Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35	4.00 ks	251,44 Kč
302288 S	Vodič propoj.-volný konec B3 10114-B3L35	1.00 ks	69,53 Kč
306188 S	Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113	1.00 ks	111,34 Kč
302289 S	Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000	2.00 ks	533,74 Kč
309814 S	Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn	1.00 ks	536,31 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304553 S	Pásek vázací 432x4,8 mm	100.00 ks	0,00 Kč
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	5.00 m	0,00 Kč

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zastoupená na základě pověření [REDAKCE] specialistou pro výstavbu sítě – překládky SEK

(dále jen „Nabyvatel“)

a

[•]

se sídlem [•]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]

IČO: [•]

DIČ: [•]

zastoupena [•]

(dále jen „Převodce“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

(dále jen „Dohoda“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „Stavba“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců

inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.

- 2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
- 3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
- 3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel:

Převodce:

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

[]

specialista pro výstavbu sítě - překládka SEK
