

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: [REDACTED]
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále také jen „Objednatel“

a

2. Zhotovitel:

AQUAS vodní díla s.r.o.

Sídlo: Brno, Podzimní 2a, 614 00
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 14344
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 606 97 539
DIČ: CZ60697539
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále také jen „Zhotovitel“,

společně také jen jako „Strany“

II. Předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je zajištění realizace stavby „Bařův kanál, Vnorovy – oprava regulačních stavidel“ (dále jen „Dílo“), která je financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ISPROFOND 5625110001.
- Zhotovitel podal nabídku dne 6. 11. 2019 na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Bařův kanál, Vnorovy – oprava regulačních stavidel“ za Přijatou smluvní částku ve výši devět set čtyřicet osm tisíc osm set Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Dílo cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	cena v Kč s DPH
948 800,-	199 248,-	1 148 048,-

kterážto Přijatá smluvní částka byla vypočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

3. Strany se dohodly na uzavření této Smlouvy. Součástí obsahu Smlouvy jsou:
- a) Návrh Smlouvy o dílo
 - b) Příloha č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
 - c) Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
 - d) Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky
 - e) Příloha č. 4 – Dopis nabídky
 - f) Příloha č. 5 – Výkaz výměr
 - g) Příloha č. 6 – Technická specifikace
 - h) Příloha č. 7 – Výkresy
 - i) Příloha č. 8 – Formuláře 3.1 a 3.2
4. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Bařův kanál, plavební komora Nedakonice - oprava opevnění horní rejdý“ a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky.
5. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit pro Objednatele Dílo v rozsahu dle této Smlouvy, vč. odstranění všech vad, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Přijatou smluvní částku v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

III. Další ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tuto Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.
2. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno obdrží Zhotovitel.

V Brně dne: 13. 11. 2019

V Brně dne: 13. 11. 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[Redacted signature]

.....
AQUAS vodní díla s.r.o.
[Redacted signature]



PŘÍLOHA Č. 1 – TABULKA UPRAVUJÍCÍ A DOPLŇUJÍCÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Díla: Bařův kanál, Vnorovy – oprava regulačních stavidel

Následující tabulka odkazuje na tyto **Smluvní podmínky**:

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Povodí Moravy, s. p. , Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	AQUAS vodní díla s.r.o. Brno, Podzimní 2a, 614 00
Datum pro zahájení prací	1.1.7	Nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
Doba pro dokončení	1.1.9	15. 4. 2020
Výkaz výměr	1.1.20	Pod - článek zvláštních podmínek se nepoužije a je nahrazen následujícím textem: „Výkaz výměr“ je pro účel této smlouvy Soupis prací, dodávek a služeb.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	15. 4. 2020
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky – Příloha č. 1 (c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky – Příloha č. 3 (d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky – Příloha č. 2 (e) Technická specifikace – Příloha č. 6 (f) Výkresy – Příloha č. 7 (g) Výkaz výměr - Příloha č. 5 (h) Dopis nabídky - Příloha č. 4

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		(i) Formuláře 3.1 a 3.2 – Příloha č. 8
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Sociální odpovědnost	1.7	Nepoužije se
Poskytnutí Staveniště	2.1	Podrobný popis způsobu a rozsahu poskytnutí Staveniště bude dle potřeby na pozemcích ve vlastnictví investora.
Pověřená osoba	3.1	 Projektový manažer zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd., a je výhradní kontaktní osobou pro Zhotovitele. Současně je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a spolupodepisovat změnové listy. Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.
Zástupce Objednatele	3.2	
Povinnosti Zhotovitele – informační panely	4.1.3	Zhotovitel má povinnost instalovat na viditelném místě a po celou dobu realizace Díla dočasný velkoplošný reklamní panel vždy postupně v místě realizace Díla – tj. na PK Vnorovy I.. Množství: 1 ks o rozměru 0,8 x 1,1 m dle grafického návrhu Objednatele. Provedení: bílý podklad, plnobarevný tisk CMYK, požadovaný materiál musí být odolný vodě a povětrnostním podmínkám s otvory pro připevnění na zeď či konstrukci, životnost 10 let. Termín osazení: do 21 dnů od Data zahájení prací.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Zhotovitel je povinen odstranit vady v souladu s článkem 9 Smluvních podmínek. Záruční doba je 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Zhotovitel není povinen získat Záruku za odstranění vad ve formě bankovní záruky.
Projektová dokumentace	5.1	Zpracování 2 paré Realizační dokumentace stavby (RDS) na základě Záměru projektu a skutečného

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Zhotovitele		zaměření.
Harmonogram	7.2	Zhotovitel předloží harmonogram do 14 dnů po Datu zahájení prací.
Postupné závazné milníky	7.5	<p>Závazný milník (pro tuto smlouvu nastaven jako milník finanční):</p> <p>do 5. 12. 2019 je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli plnění a zaslat fakturu ve výši odpovídající min. 50% Přijaté smluvní částky.</p> <p>Za nedodržení finančního milníku se nepovažuje poskytnutí plnění až do výše 200%, resp. alespoň 80% vypočtené hodnoty tohoto milníku.</p>
Předčasné užívání	7.6	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích, který je součástí této Přílohy č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky.
Cenová soustava	10.2	Pro ocenění variace dle písm. c) se použije aktuální cenová soustava ÚRS platná v okamžiku podpisu změnového listu všemi stranami.
Kontrolní kniha stavby	11.1	Stavební deník nad rámec zákonných povinností plní i funkce stanovené pro Kontrolní knihu stavby.
Měsíční vyúčtování	11.2	<p>Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:</p> <p>Zhotovitel je oprávněn k platbám hodnoty prováděného Díla v následujících termínech s výhradou jakýkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. Vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného, je zhotovitel oprávněn předložit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vyúčtování, vč. faktury - nejpozději do 5. 12. 2019, 2. a případné další vyúčtování - nejdříve po 1. 3. 2020, Objednatel si vyhrazuje možnost přijmout toto vyúčtování i dříve pokud to bude možné s ohledem na financování Díla.


Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R“
Průběžné platby	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 30 % Průběžné platby.
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % Průběžné platby.
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné platby.
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč za každý případ porušení.
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky); 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení.
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení.
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; jednorázově splatná pokuta ve výši 0,1 % z hodnoty plnění chybějícího ke splnění uvedeného milníku ke dni 5. 12. 2019.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data



Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		oznámeného Objednatel podle Pod-článku 9.1; 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení.
	12.5 g)	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram] ; 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	40 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10% z Přijaté smluvní částky.
	14.2	Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: - pojištění okolního majetku - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle.
	14.2	Pojištění odpovědnosti: Minimální limit 0,5 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem.

Datum: 13. 11. 2019

AQUAS vodní díla s.r.o.



- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(součást Přílohy č. 1)

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy č. 1, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):

Číslo smlouvy Objednatele číslo smlouvy Zhotovitele 114/2019 uzavřené dne.....

2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů):

Dojde ke změně celkové ceny díla – navýšení o Kč bez DPH, tj. výsledná cena díla bude činit Kč bez DPH.

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní hodnota) činí:

..... Kč bez DPH.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.

5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Brně dne

V Brně dne

Oprávněný zástupce Zhotovitele

Pověřená osoba Objednatele

V Brně dne

V Brně dne

Zástupce Objednatele

Autorský dozor

V Brně dne

V Brně dne

Technickoprovozní ředitel Objednatele

Investiční ředitel Objednatele

V Brně dne

Generální ředitel Objednatele

6. Změna Smlouvy

6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem.

6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.

6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

V Brně dne

V Brně dne

Generální ředitel Objednatele

.....Zhotovitele

Přílohy:

PŘÍLOHA Č. 4

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: Bařuv kanál, Vnorovy – oprava regulačních stavidel

PRO: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

DODAVATEL (obchodní firma nebo název)	AQUAS vodní díla s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Brno, Podzimní 2a, 614 00
Korespondenční adresa (je-li odlišná)	
Identifikační číslo	606 97 539
Daňové identifikační číslo	CZ 60697539
Tel. / Číslo datové schránky ID/ E – mail	
Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka	
Kontaktní osoba pro komunikaci v zadávacím řízení (jméno, telefon, email)	
Dodavatel je malý až střední podnik (dle směrnice EU - doporučení Komise 2003/361/ES)	ANO

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Celková nabídková cena bez DPH *	948 800,-Kč
DPH 21 %	199 248,-Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	1 148 048,-Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci ekonomické výhodnosti nabídky podle nejnižší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedenou hodnotu pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny:

Kritérium hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	948 800,00 Kč bez DPH

V případě změny v osobě Stavbyvedoucího se zavazujeme, že si vyžádáme předchozí písemný souhlas zadavatele s provedením této změny. Zavazujeme se, že nová osoba Stavbyvedoucího bude splňovat požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací, což bude z naší strany doloženo zadavateli, a to odpovídajícími dokumenty.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky
- (d) Příloha a oceněný soupis prací – Výkaz výměr
- (e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- (f) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky
- (g) Technická specifikace
- (h) Výkresy
- (i) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 3.1. přílohy č. 8 zadávací dokumentace).

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru

smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Jméno:

funkce:

Podpis:

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení:

Adresa: Podzimní 2a, 614 00 Brno

Datum: 13. 11. 2019

5


FORMULÁŘ 3.1.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel, společnost AQUAS vodní díla s.r.o., se sídlem v Brně, Podzimní 2a, 614 00, IČO: 60697539, zastoupená Pavlem Štroblem, v souvislosti se svojí účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „**Bařův kanál, Vnorovy – oprava regulačních stavidel**“, jejímž zadavatelem je Povodí Moravy, s.p., předkládá níže uvedený seznam poddodavatelů, kteří se v případě uzavření Smlouvy budou podílet na této zakázce:

č.	Identifikace poddodavatele	Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:		DODAVTEL ZAJISTÍ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY VLASTNÍMI KAPACITAMI BEZ VYUŽITÍ PODDODAVATELŮ.	
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./Email:			
	IČO:			
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:			
2.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./Email:			
	IČO:			
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:			

V Brně dne 13. 11. 2019




FORMULÁŘ 3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÝCH JE PLNĚNA KVALIFIKACE

Dodavatel, společnost AQUAS vodní díla s.r.o., se sídlem Brno, Podzimní 2a, 614 00, IČO: 60697539, zastoupená Pavlem Štroblem, v souvislosti se svojí účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „**Bařův kanál, Vnorovy – oprava regulačních stavidel**“, jejímž zadavatelem je Povodí Moravy, s.p., předkládá níže uvedený seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých je plněna kvalifikace, a kteří se v případě uzavření Smlouvy budou podílet na této zakázce:

č.	Identifikace poddodavatele	Část plnění VZ, kterou byla prokazována kvalifikace	% podíl na plnění VZ
1.	Název:	DODAVTEL PROKAZUJE SPLNĚNÍ KVALIFIKACE BEZ PROSTŘEDNICTVÍ PODDODAVATELŮ	
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./Email:		
	IČO:		
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:		
2.	Název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./Email:		
	IČO:		
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:		

V Brně dne 13. 11. 2019




Přílohy:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti poddodavatelů (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace
- doklady o splnění základní způsobilosti poddodavatele
- písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém poddodavatel prokazuje kvalifikaci za dodavatele

Název projektu:

„Baťův kanál, Vnorovy – oprava regulačních stavidel“
ISPROFOND 5625110001

LIST s CD

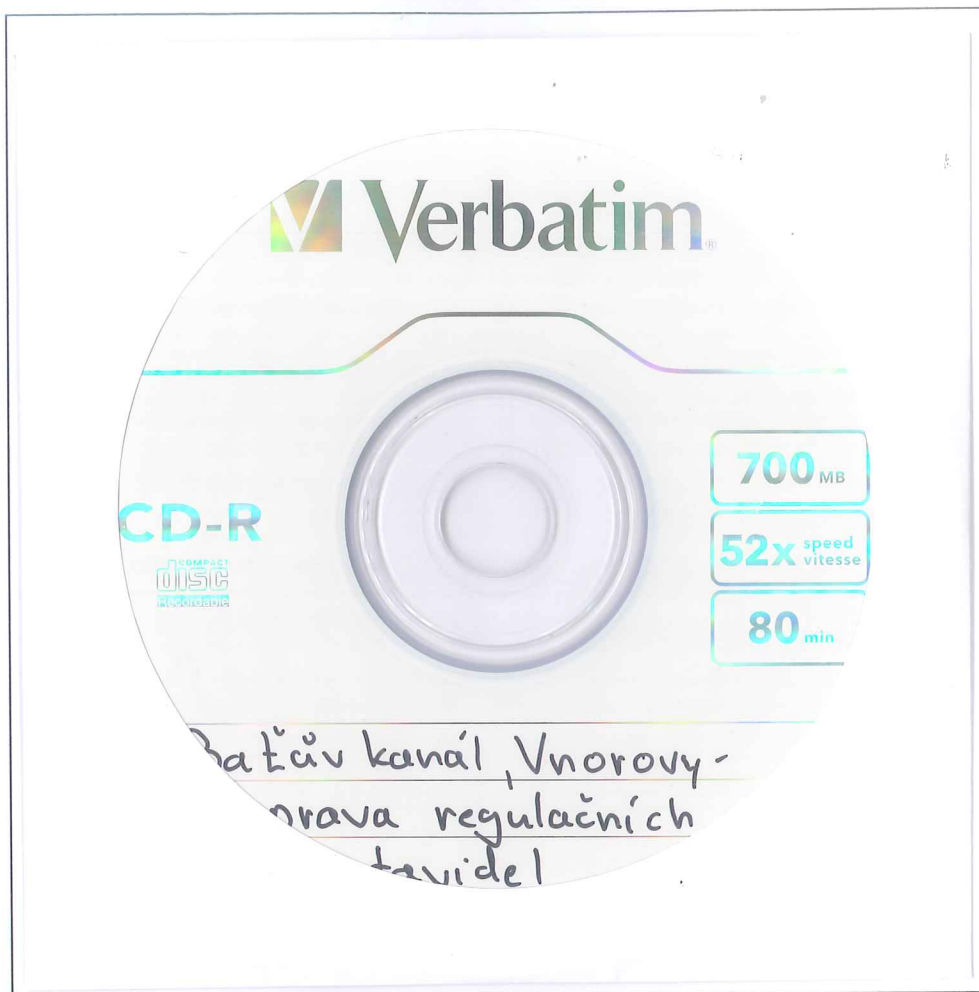

PŘÍLOHY:

- Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky
- Příloha č. 5 – Výkaz výměr
- Příloha č. 6 – Technická specifikace
- Příloha č. 7 – Výkresy

Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.



Zhotovitel:

AQUAS vodní díla s. r. o.



V Brně dne 13. 11. 2019

8
