

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MS/2019/00214
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: ⁸⁰³⁰⁰⁰⁰⁴⁹⁵~~8020000795~~
Registr smluv: ANO



S00AP00XALOR

PVMU 145903/2019 60

56.8 S10 ; LISTŮ 6

PŘÍLOHA 2

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MS/2019/00214**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Statutární město Prostějov

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na základě pověření Ing. Zdeňkem Šulcem, MBA, manažerem, Výstavba pevné
přístupové sítě

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „CETIN“)

a

Statutární město Prostějov

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01, Prostějov

IČO: 00288659

DIČ: CZ00288659

zapsaná v obchodním rejstříku - obec

zastoupená Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora dle pověření ze dne 14. 11. 2018

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 12.7.2019 vydané pod čj. 677189/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC_PV_Regenerace sídliště B.Šmerala“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky

nebude Překládka realizována.

- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektů,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však šest (6) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených

nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodloužení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodloužení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **874.307,- Kč**, (slovy: *osm set sedmdesát čtyři tisíc tři sta sedm korun českých*). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do pěti (5) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznuocí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **30.305,- Kč**, (*slovy: třicet tisíc tři sta pět korun českých*) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasilány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Sankce je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.3 Povinností zaplatit sankci, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit sankci může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.4 Povinnost zaplatit sankci, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.
- 7.5 Pro případ, že realizace překládky nebude dokončena ve smluvené lhůtě nebo v jiné lhůtě dohodnuté se Stavebníkem a dojde tak k prodlení s navazujícími stavebními pracemi pro akci uvedenou v článku 1, zaplatí CETIN stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky uvedené v článku 5 odst. 5.2. za každý den prodlení s dokončením Překládky dle této smlouvy. Povinnost nahradit škodu Stavebníkovi tímto ustanovením není dotčena.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail: [REDAKCE]

ve věcech technických [REDAKCE]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDAKCE]

- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
funkce: náměstek primátora SMPv
e-mail: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]
funkce: vedoucí oddělení realizace ORI MMPv
e-mail: [REDAKCE]

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předáváním Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
- (c) e-mailovou zprávou zaslánou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN


Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Doložka


Smlouva byla schválena Radou města Prostějov na schůzi č. 33 dne 22. 10. 2019 usnesením č. 9977.

CETIN:

- 7 - 11 - 2019



Stavebník:



VPIC_PV_Regenerace sídliště B.Šmerala

1 Technická zpráva

1.1 Vstupní podklady:

Poptávka SITEL, projekt generálního projektanta stavby, podklady GWS

1.2 Navrhované řešení:

Technické řešení:

Projektovaná rekonstrukce komunikace vyvolá na více místech přeložky sítí elektronických komunikací společnosti CETIN. Dotčena bude metalická síť (úložné kabely TCEKE) a optická síť (kabel i prázdné HDPE trubky).

Technická dokumentace CETINU není jednoznačná:

- v polohopisu jsou v popisu kynet uvedeny kabely, které však nejsou ve schématu,
- více metalických spojek má stejná čísla,
- ve spojkách dochází ke změně průměru žil z 0,4 na 0,6, ale z navazujících rozvaděčů odchází opět kabely 0,4.

Jednotlivá místa přeložek jsme označili pořadovým číslem. Tam, kde budou prováděny vložky, budou použity kabely TCEPKPFLE a před spojkami vodní bloky.

Úsek č. 1, nová komunikace před č.p. 3775

Výšková úprava a doplnění dělené chráničky SYSPRO 160/110 v místě nové komunikace:

- 10XN04 do UR PROS2517
- 2,5XN06 do UR PROS2515

Po odkrytí stávající trasy ve volném terénu v naznačené délce budou kabely uloženy hlouběji a bude na nich doplněna chránička SYSPRO 160/110. Přiložena bude prázdná rezervní chránička PE 110 mm.

Úsek č. 2, vjezd ke garáži před č.p. 3775

Pod vjezdem bude na kabelech 10XN04 a 2,5XN06 doplněna chránička SYSPRO 160/110. Přiložena bude prázdná rezervní chránička PE 110 mm.

Úsek č. 3, garáže u č.p. 3772

Úprava trasy a doplnění chrániček PE110 a HGR110 na kabelu 15XN04 z SR PROS214 do dělicí spojky SO1.

Na rohu garáží je nyní dělicí spojka SO1, která by zůstala pod obrubníkem rekonstruované komunikace. Je navržena vložka kabelem 15XN04 mezi stávající spojkou S1 a novou SO1, která však bude umístěna ve volném terénu vedle garáže.

Úsek č. 4, jižní strana nové komunikace s odbočkami do bytových domů

Stávající trasa od spojky MK104 poblíž domu č.p. 3764 až k domu č.p. 3772 bude přeložena mimo novou komunikaci. Trasa povede podél jižního kraje komunikace, která zde má v celé délce nájezdový obrubník. Tzn. že nově a do budoucna budované nemovitosti si zřídí sjezd, kde budou potřebovat. Je to tak navrženo, aby nedocházelo ke zbytečným úpravám komunikace. Kabely budou uloženy do dostatečné hloubky a do chráničky, jako příprava na případné vybudování sjezdů.

Na odbočkách do bytových domů budou provedeny vložky.

V hlavní trase je přívod 100XN04 do SO1. Ve spojení se dělí na přívod SR PROS213, 75XN06 a na přívod SR PROS214, 75XN06. Kromě těchto přívodů kříží novou komunikaci odchody z těchto SR. Jsou to kabely 10XN04 do UR PROS2523, 2521, 2506.

Z SR PROS213 odchází i kabel s neuvedenou dimenzí do jiné dělicí spojky SO1 na rohu domu č.p. 3764. Jsou z něho napojeny UR PROS2498, 2500, 2502 a 2504.

Ve vložkách na odchodech ze SR budou použity stejné dimenze kabelů. Přívodní kabely 75XN06 budou nahrazeny kabely 100XN04. Ve vložce pro napojení PROS2498, 2500, 2502 a 2504 bude použit kabel 50XN04.

Před domem č.p. 3771 bude stávající kabel UZ 2P08 do rezervy po bývalém VTA PROS4953 ukončen kabelovou koncovkou před novým parkovacím stáním.

Úsek č. 5, rekonstruovaný vjezd k č.p. 3768

Prodloužení stávající mechanické ochrany až za plochu pro kontejnery. V trase je uloženo:

- 2x kabel 300XN04
- HDPE 40, O, s OK 662 013 05, DOK PROSTĚJOV – DRAHANY, (PROS:BS:11 - DRAH:BS:1), úsek OCEF-SOR01a, kabel Sam. 24f LT MC +Cu
- HDPE 40, C, prázdná
- HDPE 40, M, MICOS
- HDPE 32, CV, MICOS
- HDPE 40, C, MICOS
- 2x prázdná chránička PVC bez uvedení průměru
- kabely uvedené jen v řezu kynety ale ne ve schématu: 15XN06, 200XN04, 400XN04, 200XN06 a DM

V místě křížení vjezdu jsou kabely a HDPE trubky uloženy v 1.1 ks PVC chrániček bez uvedení průměrů. Chráničky nyní ve směru do města končí pod hranou rozšiřované komunikace.

Je navrženo jejich prodloužení až za plochu pod kontejnery. Je předpoklad, že i ve schématu neuvedené kabely v terénu skutečně jsou. Všechny stávající obsazené chráničky budou prodlouženy chráničkami SYSPRO 160/110. Prázdné chráničky budou prodlouženy PE trubkami 110 mm.

Úsek č. 6, nový vjezd vedle č.p. 3764

Výšková úprava a doplnění mechanické ochrany pod novým vjezdem. V trase je uloženo:

- 2x kabel 300XN04
- HDPE 40, O, s OK 662 013 05, DOK PROSTĚJOV – DRAHANY, (PROS:BS:11 - DRAH:BS:1), úsek OCEF-SOR01a, kabel Sam. 24f LT MC +Cu
- HDPE 40, C, prázdná
- HDPE 40, M, MICOS
- HDPE 32, CV, MICOS
- 2x HDPE 40, C, MICOS
- obdobně jako v místě č. 5 kabely neuvedené ve schématu: 15XN06, 200XN04, 400XN04, 200XN06 a DM

Pro výškovou úpravu bude stávající trasa (nyní ve volném terénu) v naznačeném rozsahu asi 18 m odkryta a kyneta prohloubena. Kabely a HDPE trubky CETINU budou uloženy do dvou chrániček SYSPRO 200/160. Jako rezerva budou přiloženy dvě prázdné chráničky PE110 mm.

HDPE trubky MICOSU budou uloženy do třetí SYSPRO200/160.

Před rekonstrukcí komunikace dojde ke kácení některých stromů a dřevin. Musí být provedeny před realizací přeložek. Kácení není součástí přeložek.

Před záhozem bude TD a PTD (správce sítě CETIN) přizván ke kontrole kabelů a HDPE trubek. Povolení záhozu bude zapsáno ve stavebním deníku.

Řešení podle směrnice TM000072:

model 3 – stranová přeložka.

model 4 – dvě vložené spojky.

model 5 – jedna vložená spojka.

model 6 – bez dodatečně vkládaných spojek.

Trasa kabelu je v kat. území Prostějov.

Generální projektant má ve své dokumentaci pro přeložku samostatný stavební objekt:

SO 402 – Přeložka SEK CETIN

Před realizací stavby bude zpracována a schválena PD.

Bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VBŘ s vlastníky dotčených parcel.

Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, bude vyhotoven geometrický plán, uzavřena konečná smlouva o VBŘ a zavkládováno VBŘ do KN.

1.3 Popis tras

viz polohopis
VVN: ne
El. trakce: ne
Vodní toky: ne

1.4 Použitá technologie:

Kabely: TCEPKPFLE, HDPE 40 mm
Kabelové soubory a přechody přes komunikace budou označeny Minimarkery 3M , typ 1255.

1.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I
TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II
TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III
TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí – Optické kabely
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení
POS 65-2001

Na metalických kabelech, u kterých dojde k rozpojení, bude po ukončení stavby bude provedeno závěrečné měření dle předpisu TPP2001- 4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi a kontinuity stínění proti provoznímu páru. Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

1.6 Koordinace:

Navrhované trasy přeložek budou koordinovány s generálním dodavatelem stavby.

1.7 Ostatní:

Kontakty

stavebník:

Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČ: 00288659,
zastoupeno Martinem Bartákem, referent tech.přípravy, odbor rozvoje a investic magistrátu, [redacted]

žadatel/generální projektant:

Ing. Tomáš Ruth, projektová činnost ve výstavbě, Sedmdesátá 7055, Zlín,
[redacted]

e-mail, na který zaslat návrh překládky: [redacted] dle PM.

projektový koordinátor CETIN: Radek Měchura

zpracovatel CTN: MULTINET, s.r.o. – Ing. Aleš Jurečka, [redacted]



Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.


2. Podmiňující, související a navazující stavby nejsou.

3. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
Přehledová situace	CTN
Situace – parcely	CTN
Schéma	CTN
Vyjádření SEK č.j. 677189/19	CTN
Kalkulace nákladů, rámcový zhotovitel	CTN
Kalkulace nákladů, projekční příprava	CTN


Výpisy KN	CTN
Poznámky k PPD	CTN

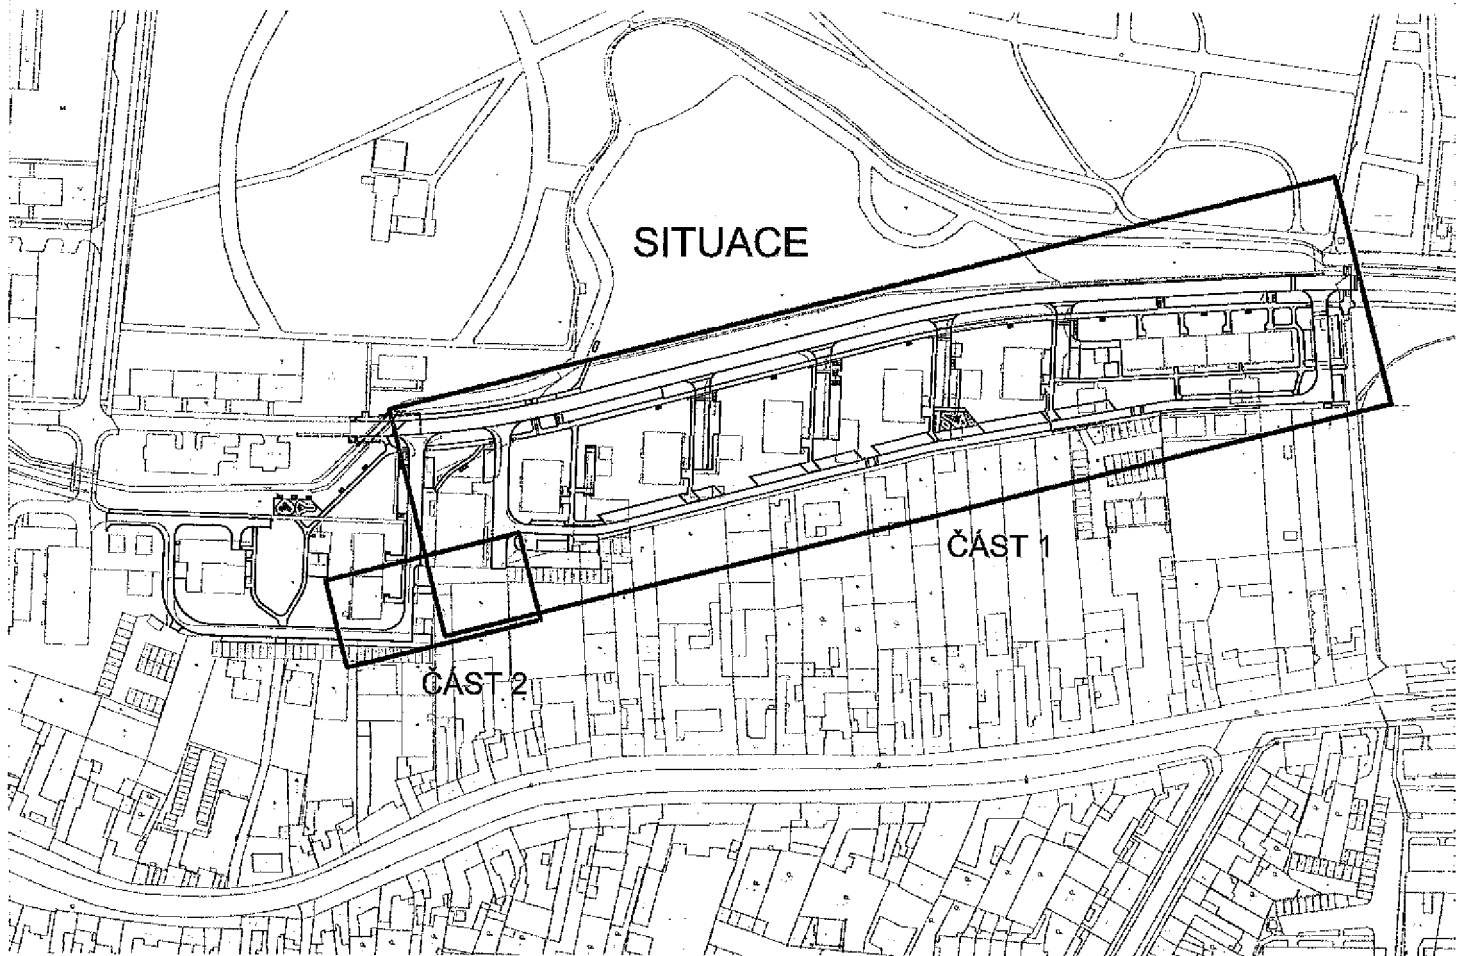

VYPRACOVAL	ING. JUREČKA	AUTORIZ.ING.	ING. KAREL	 Farského 43/4, OLOMOUC www.multinet.cz			
MÍSTO	PROSTĚJOV	KRAJ	OLOMOUCKÝ				
INVESTOR	Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01						
STAVBA	VPIC_PV_Regenerace sídliště B.Šmerala			ÚČEL	CTN	MĚŘITKO	-
VÝKRES	PŘEHLEDOVÁ SITUACE			ARCH.Č.	P 55-19	DATUM	09/19
				Č.VÝK.			0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>1701/2</u>
Obec:	<u>Prostějov [5892501]</u>
Katastrální území:	<u>Prostějov [733491]</u>
Číslo LV:	<u>10001</u>
Výměra [m ²]:	20121
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha

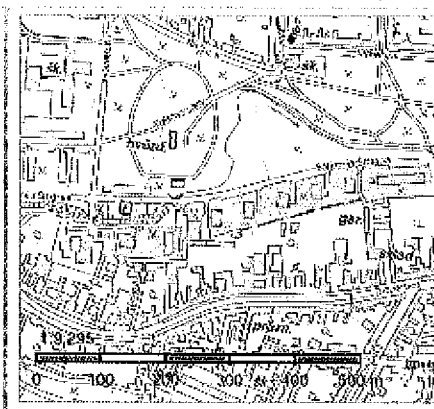

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno vedení
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 24.09.2019 07:00:02.

© 2004 - 2019 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
 Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.6 build 0

Příloha č. 1 Specifikace nákladů_VPIC_PV_Regenerace sídliště B.Šmerala

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.10

Položková 2019.10

Název stavby: VPIC_PV_Regenerace sídliště B.Šmerala

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: MULTINET, s.r.o.

KPO:

HOST: PROSTĚJOV

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	28 247,12 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	400 517,18 Kč
MONTÁŽ	190 571,87 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	39 413,65 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 057,99 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 428,01 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovan	209 070,85 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazov	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 874 306,67 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 839 573,55 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 34 733,12 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 737,40 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	22 509,72 Kč
zóna I, 0,4-0,6 km				
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	437.00 m	8 010,21 Kč
952368 S		Pokládka žlabů TK2,T2N	66.00 m	6 050,88 Kč
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	728.00 m	39 137,28 Kč
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	10.00 ks	366,80 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	452.00 m	241 462,92 Kč
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	3.00 m	2 435,94 Kč
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření ø10cm	408.00 m	62 342,40 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	23.00 m	7 871,75 Kč
954952 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	8.00 m	13 096,24 Kč
954954 S		Rýha ve vozovce litý beton 50/130	8.00 m	13 096,24 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	494.00 m	5 424,12 Kč

951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	10.00 ks	1 222,40 Kč
MONTÁŽ			
955010 S	Demontáž úložné trubky	110.00 m	1 139,60 Kč
955031 S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	66.00 m	2 099,46 Kč
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	22.00 m	482,90 Kč
955029 S	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	73.00 m	1 338,09 Kč
955032 S	Demontáž úložných kabelů nad 300 XN	22.00 m	996,16 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	10.00 ks	1 589,10 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	250.00 ks	9 170,00 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	250.00 ks	6 115,00 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	10.00 ks	855,70 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	10.00 ks	1 589,10 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	640.00 ks	15 654,40 Kč
955288 S	Montáž koncovky SKH	1.00 ks	48,90 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	6200.00 JV	6 200,00 Kč
koordinace se stavbou			
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	12.00 ks	20 535,00 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	10.00 ks	11 612,10 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	110.00 m	1 303,50 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	393.00 m	8 190,12 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	466.00 m	17 092,88 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	177.00 m	4 548,90 Kč
954993 S	Montáž úložných kabelů nad 300 XN	22.00 m	1 130,58 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	31 181,51 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	26040.00 J	26 040,00 Kč
rozpočtová rezerva			
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 778,28 Kč
kolaudace			
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	5.00 ks	5 451,80 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 122,54 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 694,09 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	1.00 ks	806,73 Kč
955067 S	Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř	4.00 ks	4 791,48 Kč
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	57.00 m	1 464,90 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do 15 XN	115.00 m	1 549,05 Kč
GEODETIČKÉ PRÁCE REALIZACE			
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	5.00 ks	13 033,90 Kč
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	11160.00 J	11 160,00 Kč
Vytyčení trasy podle geo bodů, 100m + 25bodů			
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	394.00 m	9 731,80 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pe	1.00 ks	5 487,95 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 057,99 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	100.00 JV	100,00 Kč
náhrady za VBŘ odhadovaná			
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 469,58 Kč

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z l 1.00 ks 1 858,43 Kč
Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
316464 S		Blok vodní a vzd. ACBS-W-18/12	6.00 ks	7 469,88 Kč
316478 S		Blok vodní a vzd. ACBS-W-30/22	5.00 ks	7 023,50 Kč
316485 S		Blok vodní a vzd. ACBS-W-40/30	2.00 ks	3 107,22 Kč
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	83.00 ks	3 155,66 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	32.00 m	122,88 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	500.00 m	2 210,00 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	800.00 m	1 832,00 Kč
300110 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	400.00 m	68 992,00 Kč
300106 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	320.00 m	7 971,20 Kč
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	155.00 m	13 647,75 Kč
316527 S		Koncovka smršť. SKH 1 4/10 mm	1.00 ks	49,18 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	26.00 ks	6 001,32 Kč
312417 S		Modul konektor. 4000-25P	40.00 ks	1 929,60 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	28.00 ks	645,68 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	3.00 ks	1 916,04 Kč
320313 S		Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50	1.00 ks	674,45 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	5.00 ks	735,85 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	3.00 ks	1 238,70 Kč
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1.00 ks	517,18 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1.00 ks	720,84 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	25.00 ks	869,00 Kč
320294 S		Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	6.00 ks	4 768,62 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	396.00 ks	8 066,52 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	42.00 m	19 388,46 Kč
319210 S		Trubka dělená SYSPRO 200/160	24.00 m	15 478,32 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	23.00 ks	17 987,38 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	304.00 m	12 424,48 Kč
303465 S		Víčko plastové trubky 110/100 mm	6.00 ks	127,14 Kč

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zastoupená Ludmilou Uhrovou, specialistou pro výstavbu sítě dle pověření na straně jedné

(dále jen „Nabyvatel“)

a

[•]

se sídlem [•]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]

IČO: [•]

DIČ: [•]

zastoupena [•]

(dále jen „Převodce“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

(dále jen „Dohoda“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „Stavba“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců

inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.

2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.

3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.

3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel:

Převodce:

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. []

Jméno: Ludmila Uhrová

Funkce: specialista pro výstavbu sítě
