


KUOLX00ZM51Z

Smlouva / objednávka číslo :

2016/04809/OVZI/DSM

Průvodní list příloh



Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2016/00113

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená Ing. Zdeňkem Šulcem, manažerem, Výstavba fix, dle pověření

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy a jejích dodatků: MGr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmána

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.

Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 2.2.2016 pod č. 525031/16 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením
„VPIC Hanušovice-Nová Seninka, silnice“.

Čl. 2 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3 Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK VPIC Hanušovice-Nová Seninka, silnice, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4 Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:

- zajistit vyhotovení Projektu,
- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

- po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky), nebo územní souhlas
- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve 4 měsíce po uzavření této smlouvy.

Po nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky), převést na společnost CETIN práva a povinnosti z tohoto územního rozhodnutí týkající se Překládky (uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby dle vzoru viz. příloha č. 4 této smlouvy) a předat toto územní rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 4 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce, a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 6 bodu 6.1 písm. a) a v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 4 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě po realizaci Překládky, k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN, jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Závazky (povinnosti) společnosti CETIN z této smlouvy týkající se realizace Překládky a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do dvou etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „První etapa“) a bude považována za ukončenou dnem ukončení První etapy, tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu

elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení První etapy. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem (dále jen „Druhá etapa“) a považována za dokončenou dnem ukončení realizace Překládky, tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **464.169,- Kč**. Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením projektové dokumentace Překládky (dále jen Projekt“) na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační).

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN písemně oznámí do 4 měsíců od uzavření této smlouvy Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu ve smyslu čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,

- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

- a) Fakturu č. 1 ve výši **43.716,- Kč** do 30 dnů ode dne jejího doručení Stavebníkovi,
- b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího doručení Stavebníkovi.

6.2 Faktura dle bodu 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení První etapy , faktura dle bodu 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení každé jednotlivé faktury Stavebníkovi.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních Ludmila Uhrová

funkce :specialista pro výstavbu sítě Morava

e-mail

ve věcech technických Petr Truhlář

funkce : specialista pro výstavbu sítě

e-mail

tel.

b) Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Zemánek.

funkce: 1. náměstek hejtmána

ve věcech technických: Ing. Dlabal Petr

funkce: vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, odboru investic a evropských programů Krajského úřadu Olomouckého kraje

e-mail:

tel.

Ing. Vrbková Milena

Funkce: oddělení přípravy a realizace investic, odboru investic a evropských programů Krajského úřadu Olomouckého kraje

e-mail:

tel.

Čl. 9 Odstoupení od smlouvy

9.1 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou některé platby dle této smlouvy a toto prodlení trvá déle než 60 dní, poruší Stavebník smlouvu podstatným způsobem a společnost CETIN je oprávněna od této smlouvy odstoupit nejpozději do 80. dne prodlení.

9.2 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu, je Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.3 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 nebo 9.2 tohoto článku je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10

Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy; ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu,

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž 2 obdrží Stavebník a jeden společnost CETIN..

11.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude také uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Stavebník.

Doložka

Smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí hejtmána Olomouckého kraje ze dne 24. 11 2016 podle usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/10/61/2005 ze dne 24. 3. 2005 a v souladu s § 59 odst. 4 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy :

1. Cenový a technický návrh Překládky
2. Specifikace nákladů
3. Specifikace první etapy Překládky
3. Vzor dohody o převodu práv z územního rozhodnutí

V Brně dne 15-01-2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
Ing. Zdeněk Šulc
manažer, výstavba fix

V Olomouci dne

Stavebník:
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

16-12-2016



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Technické řešení I.

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie AN – Přístupová síť
Podkategorie VPI - optická přístupová síť, metal. kab. přístupová síť
Číslo SAP
Číslo interní
Schvalování akce 2-kolové schvalování
Název

VIC Hanušovice-Nová Seninka, silnice

Budoucí uživatel NO-OS Olomoucko

Zpracovatel Petr Pilař

Předkladatel Vedoucí: Pavel Sedlář
Manažer: Pavel Sedlář

Schvaluje

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC Hanušovice-Nová Seninka,silnice
Kategorie:	AN - Přístupová síť
Podkategorie:	VPI - optická přístupová síť, metal. kab. přístupová síť
Typ investice:	Přeložka stáv. metalických kabelů, ochrana kabelů
Důvod 1:	
Číslo interní:	
Prvek SPP:	
ABC:	
HOST:	
ATÚ:	

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0.0 km	kmp mk
100200_Délka metalických kabelů	0.0 km	kmk mk
100700_Délka nadzemní tratě	0,0 km	km vyk
100100_Délka párů v metalických kabelech	0, km	km kv
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0,028 km	kmo kv
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár	
100900_Počet bytových domů	0 BD	
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj	
100500_Počet rodinných domů	0 RD	
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj	

Termíny:

Platnost ÚR od:	Překládky budou zahrnuty do společného územního rozhodnutí - SO401 Přeložky datových kabelů - zajistí stavebník
-----------------	--

Platnost ÚR do:

Plánované zahájení přípravy:

Plánované ukončení přípravy:

Plánované zahájení realizace:

Plánované ukončení realizace:

Nabídka k přejímce (Plán):

1.2 Účel stavby:

SD stavby " VPIC Hanušovice-Nová Seninka,silnice".

Akce ješí přeložky, ochranu a zvýšení krytí stávajících metalických sdělovacích kabelů a optického kabelu z důvodu stavby „Silnice II/446 Hanušovice - Nová Seninka“.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu poskytnutá investorem.

2.2 Navrhované řešení:

Akce řeší přeložky, ochranu a zvýšení krytí stávajících metalických sdělovacích kabelů a optického kabelu z důvodu stavby „Silnice II/446 Hanušovice - Nová Seninka“.

Přeložky a případné zvýšení krytí kabelů bude prováděno na více místech. Viz polohopisná situace

1. Zvýšení krytí metalického a optického kabelu

Z důvodu budování nového příkopu je nutno stávající trasu dvou HDPE trubek (jednu s OK 776.014) a metalického kabelu 35XN0,6 ručně odkopat a snížit ji pod projektovaný příkop. Z důvodu lepší ochrany budou HDPE trubky a metalický kabel uloženy do dělených chrániček SYSPRO160, s přesahem min. 1m za hranu příkopu.

2. Dočasná a definitivní přeložka metalických kabelů z důvodu opravy opěrné zdi.

Stáv. situace – opěrná zeď začíná od č.p. 343, metalický kabel 150XN0,6 a 5XN0,4 vedou podél spodní hrany zdi.

S nimi je v trase kabel 3XN0,4, který slouží jako přívod pro dům č.p.55.

Ve vozovce nad zdí vede stávající neprovozovaný kabel P35XN0,6.

Dočasná přeložka

Z důvodu rekonstrukce opěrné zdi bude nutno provést dočasnou přeložku kabelů mimo staveniště. Rekonstrukce zdi bude prováděna za úplné uzavírky silnice.

Jelikož stáv. kabel 150XN0,6 a 5XN0,4 není možné přenést mimo staveniště, navrhujeme provést přeložku novým kabelem 200XN0,6 a 5XN0,4, které budou v chráničce vedeny podél plotu stavby a zabezpečeny proti zničení a odcizení. Kabely budou naspojovány spojkami XAGA na stávající kabely mimo prostor staveniště.

Stáv. kabel pro RD č.p.55 bude odkopán a přesunut mimo oblast stavby, bude umístěn do chráničky.

Starší neprovozovaný kabel P30XN0,6 bude ukončen koncovkami.

Definitivní přeložka

Po skončení prací na opěrné zdi, budou kabely 200XN0,6 a 5XN0,4 přeloženy do nové trasy v chodníku nad opěrnou zdí. Jelikož délka trasy dočasné přeložky je delší než trasa definitivní přeložky, budou kabely umístěny do nové trasy, zkráceny na potřebnou délku a znovu naspojovány na stáv. kabely..

Starší kabel P30XN0,6 bude naspojován na nový kabel 50XN0,6, který bude uložen do společné trasy s kabelem 200XN0,6 a 5XN0,4.

Kabel 3XN0,4 pro RD č.p.55 bude po skončení prací umístěn zpět do původní trasy.

3. Zvýšení krytí metalického kabelu v délce 80m

Z důvodu úprav a prohloubení stáv. příkopu bude stáv. kabel TCEPPFLE 75XN0,6 odkopán a výkop bude prohlouben tak, aby dosaženo dostatečné krytí pod upraveným příkopem.

4. Přeložka kabelu z důvodu rekonstrukce propustku

V kolizi s rekonstruovaným propustkem se nachází dva metalické kabely PPFLE 3XN0,4 (přívod pro RD Květná 137) a neprovozovaný kabel QY10XN0,8.

Stávající kabel 3XN0,4 bude přerušen a bude na něj naspojován nový kabel stejného typu a dimenze, který bude umístěn do nové trasy mimo propustek, v místech přechodu přes příkop bude zatažen do nové chráničky HGR 110mm. Dále bude opět naspojován na stávající kabel 3XN0,4.

Neprovozovaný kabel QY10XN0,8 bude přerušen a naspojován nový kabel stejného typu a dimenze, bude umístěn do trasy s kabelem 3XN0,4, na konci přeložky bude opět naspojován na stáv. kabel.

5. Zvýšení krytí metalického kabelu v délce 23m

Z důvodu úprav a prohloubení stáv. příkopu a úpravy komunikace bude stáv. kabel TCEPPFLE 75XN0,6 odkopán a výkop bude prohlouben tak, aby dosaženo dostatečné krytí pod upraveným příkopem.

6. Stranová přeložka metalických kabelů

Z důvodu budování nového nástupiště, chodníku a příkopu bude nutno přeložit stávající metalické kabely 2x 25XN0,6 pod dosvahování za obrubou.

Stávající kabely budou odkopány a přemístěny do nové trasy, která bude umístěna za obrubou nového nástupiště.

7.Stranová přeložka metalických kabelů

Z důvodu rekonstrukce propustku a prohloubení příkopu bude nutno přeložit stávající metalické kabely 2x 25XN0,6 mimo propustek a příkop.

Stávající kabely budou odkopány a přemístěny do nové trasy, která bude umístěna za příkopem.

8.Doplnění mechanické ochrany - odbočka Chrastice

Pod projektovaným nástupištěm bude doplněna mechanická ochrana kabelovými žlaby.

Trasa přeložek je v kat.území Staré Město pod Králickým Sněžníkem, výpis vlastníků parcel je přiložen.

Po realizaci stavby, bude provedeno geodetické doměření skutečného stavu podle platných předpisů, budou vyhotoveny geometrické plány a budou uzavřeny konečné smlouvy o zřiz.VBŘ.

2.3 Popis tras

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Rozvaděče: Nebudou postaveny

Rezervy a spojky budou označeny Minimarkerem 3M, typ 1255.

Dále bude provedeno závěrečné měření dle předpisu TPP2001- 4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi a kontinuity stínění proti provoznímu páru.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III

TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely

TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křížovatky a souběhy vedení

POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření K1).


Dokumentace skutečného provedení bude zpracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:


Akci nutno koordinovat se stavbou : „Silnice II/446 Hanušovice - Nová Seníčka“

2.7 Ostatní:


Kontakty:








výstavba nového příkopu - zvětšení krytí kabelů a HDPE trubek
stávající kabel a HDPE trubky budou odkopány a uloženy zpět
do původní trasy, aby byla dodržena
hloubka uložení dle ČSN 736005
trasa bude nově uložena do dělených chrániček
s minimálním přesahem 1m za příkop

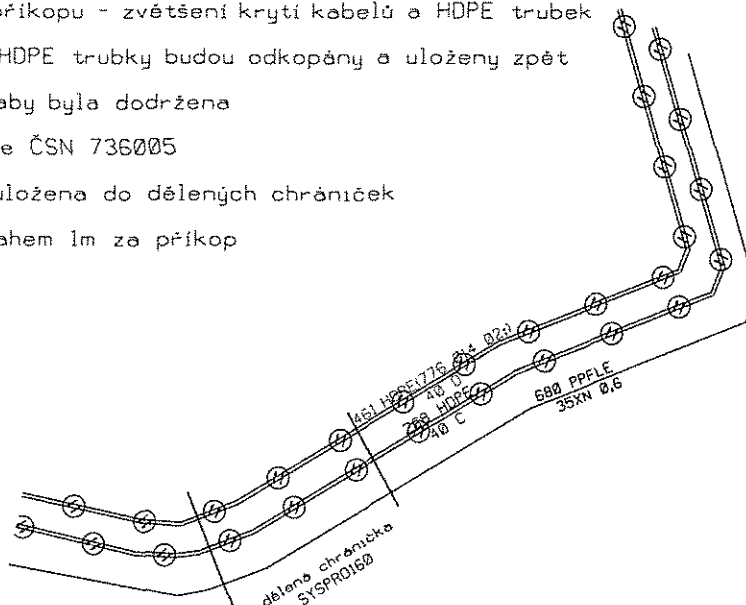

Vypracoval :		Generální projektant:	 VEGA COM	
Lucie Šufnerová		Novodvorská 1010/14, Praha 4		
Zkontroloval :		Investor:	 CETIN ČESKÁ TELEKOMUNICAČNÍ INFRASTRUKTURA	
Jiří Chlápík		Česká telekomunikační infrastruktura Olšanská 263/5, Praha 3		
Zodp. pracovník:		Odsouhlasil :		
Ing. Petr Pileř		Ing. Petr Pileř		
Místo :	k.ú.: Staré Město			
Název akce :	VPIC Hanušovice - Nová Seninka, silnice		Datum :	08/2016
Priloha :	Schéma - sit.1		Stupeň :	DUR / DUS
			Měřítko :	1 : 500
			č. výkresu :	I

Definitivní přeložka

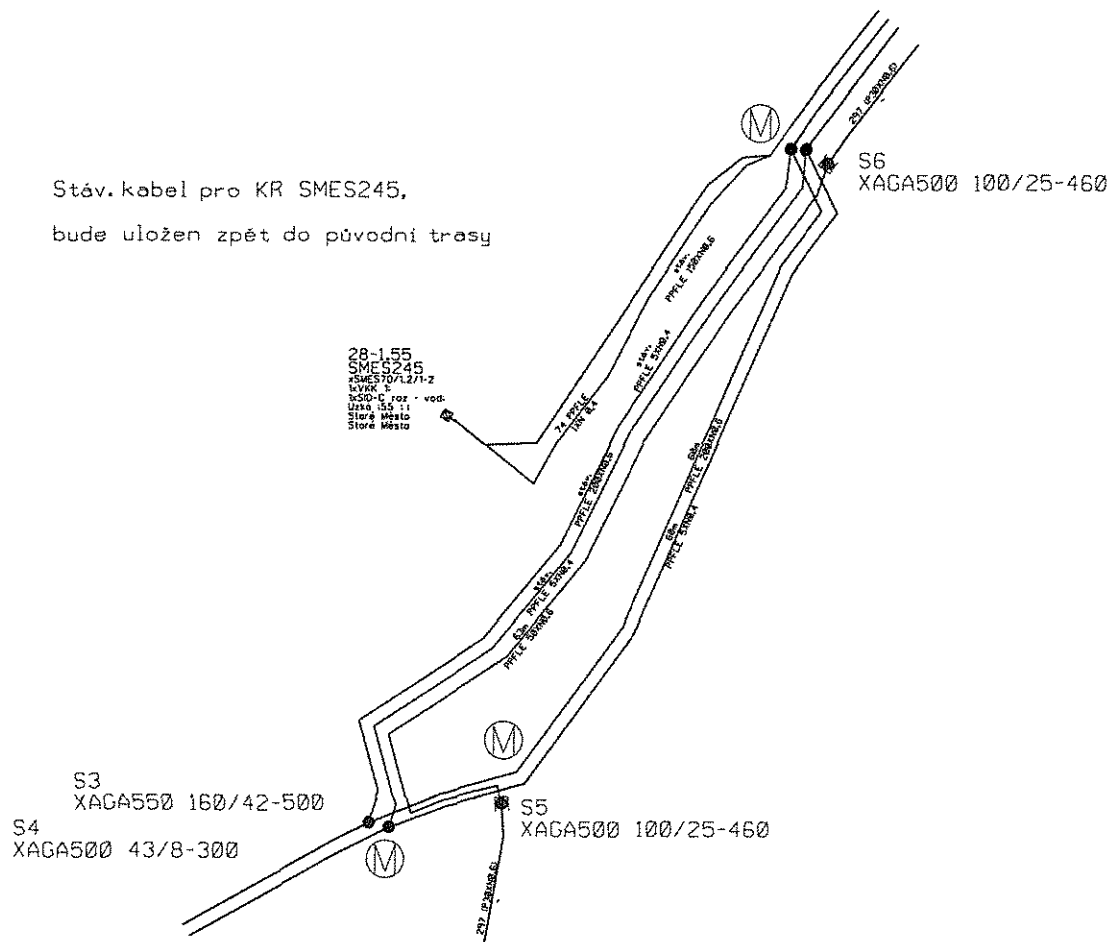

- kabely 200XN0,6 a 5XN0,4, které jsou HGR110 umístěny podél oplocení stavby budou přeneseny do nové trasy v chodníku
- budou zkráceny na potřebnou délku a poté znovu naspojovány na stávající kabely za přeložkou
- k nim do trasy bude zatažen nový kabel 50XN0,6, který bude propojen na stávající kabel P30XN0,6

Vypracoval :		Generální projektant:	  ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA	
Lucie Šufnerová		VEGACOM o.s.		
Zkontroloval :		Investor:		
Jiří Chloupík		Česká telekomunikační infrastruktura		
Zodp. pracovník:		Od souhlasil :		
Ing. Petr Pileř		Ing. Petr Pileř		
Místo :	k.ú.: Staré Město			
Název akce :	VPIC Hanušovice - Nová Seninka, silnice			Datum :
Průběh :	Schéma			Stupeň :
				Měřítko :
				č. výkresu:


Dočasná přeložka

Stáv. kabel pro KR SMES245, bude odkopán

a dočasně přeložen mimo místo stavby.

Po dobu dočasné přeložky bude uložen v půlené chráničce

a zabezpečen proti zničení a odcizení

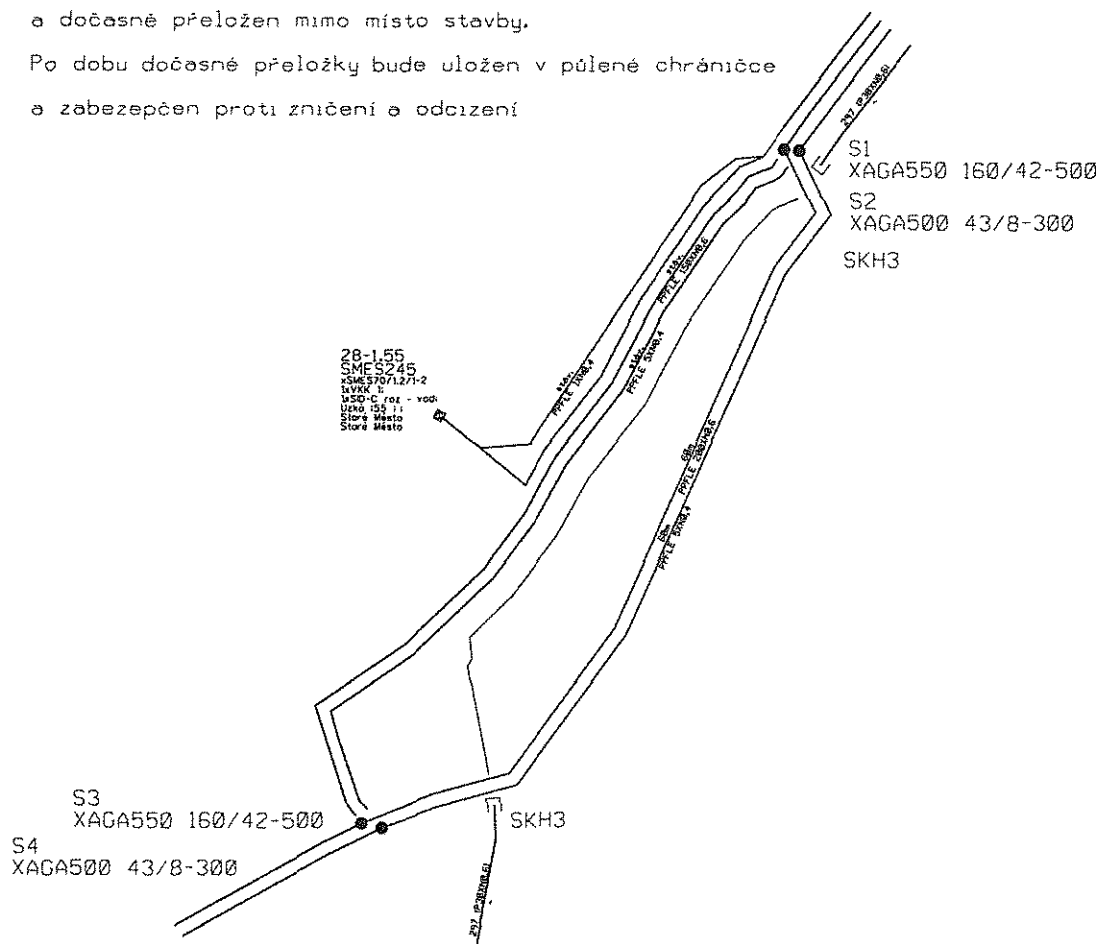

- stáv. kabely 150XN0,6 a 5XN0,4 se přeruší a nově naspojkují na kabely 200XN0,6 a 5XN0,4, které budou umístěny do HGR110 podél oplocení stavby a zabezpečeny proti zničení a odcizení


- kabel P30XN0,6 - bude přerušen a opatřen koncovkami, jeho přeložení bude řešeno až v definitivní přeložce

Vypracoval :		Generální projektant:	VEGACOM a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4		 VEGACOM  CETIN ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA	
Lucie Šufnerová		Investor:	Česká telekomunikační infrastruktura Oldenská 268/8, Praha 3			
Zkontroloval:		Odsouhlasil:				
Jiří Chlopík		Ing. Petr Pilar				
Zodp. pracovník:						
Ing. Petr Pilar						
Místo :	K.ú.: Staré Město					
Název akce :	VPIC Hanušovice - Nová Seninka, silnice				Datum :	08/2016
					Stupeň :	DUR / DUS
Příloha :	Schéma				Měřítko :	1 : 500
					č. výkresu:	2

úprava a prohloubení stáv. příkopu

- zvětšení krytí kabelů

stávající kabel bude odkopán a uložen zpět
do původní trasy, tak, aby byla dodržena
hloubka uložení dle ČSN 736005

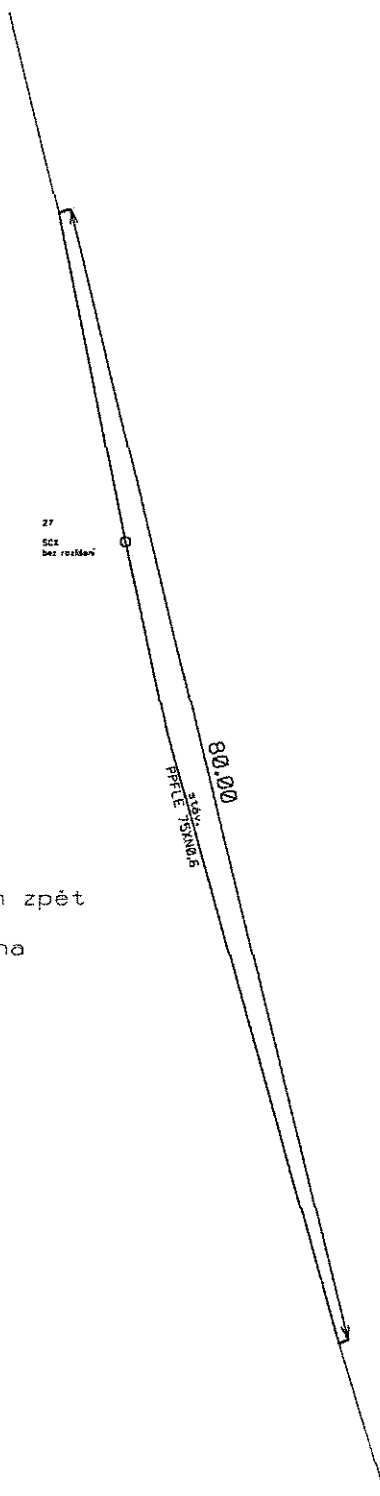

Vypracoval :		Generální projektant: VEGACOM o.s. Novodvorská 1210/14, Praha 4	
Lucie Šufnerová		Investor: Česká telekomunikační infrastruktura Olšanská 258/8, Praha 3	
Zkontroloval :		Odsouhlasil :	
Jiří Chlapík		Ing. Petr Pileš	
Zodp. pracovník:		Místo :	
Ing. Petr Pileš		k.ú.: Staré Město	
Název akce :		Datum :	
VPIC Hanušovice - Nové Senínka, silnice		08/2016	
Priloha :		Stupeň :	
Schéma - sit.3		Měřítko :	
		1 : 500	
		č. výkresu :	
		3	


VEGA COM
CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

rekonstrukce propustku

- bude provedena přeložka kabelů TCEPKPFLE 3XN0,4 a QY10XN0,8 do nové trasy mimo projektovaný propustek

Kabely budou přerušeny a naspojkovány na kabely stejné dimenze.

Pod příkopem budou kabely v chrániče HGR110mm.

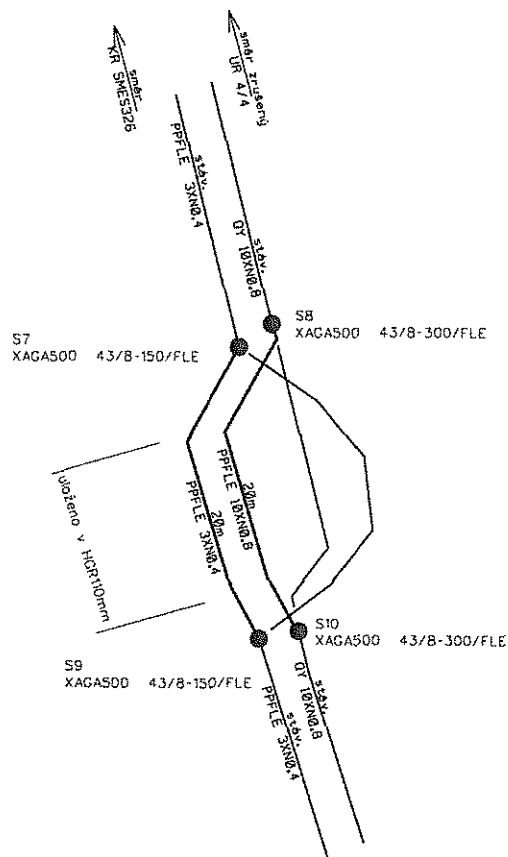

Vypracoval :		Generální projektant:	VEGA COM  CETIN ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA	
Lucie Šufnerová		Novodvorská 1010/14, Praha 4		
Zkontroloval :		Investor:		
Jiří Chlapík		Česká telekomunikační infrastruktura Olšanská 268/8, Praha 3		
Zodp. pracovník:		Odsouhlasil :		
Ing. Petr Piloř		Ing. Petr Piloř		
Místo :	k.ú.: Staré Město			
Název okce :	VPIC Hanušovice - Nová Seninka, silnice		Datum :	08/2016
Priloha :	Schéma - sit.4		Stupeň :	DUR / DUS
			Měřítko :	1 : 500
			č. výkresu:	4


úprava a prohloubení stáv. příkopu

- zvětšení krytí kabelů

stávající kabel bude odkopán a uložen zpět

do původní trasy, tak, aby byla dodržena


hloubka uložení dle ČSN 736005

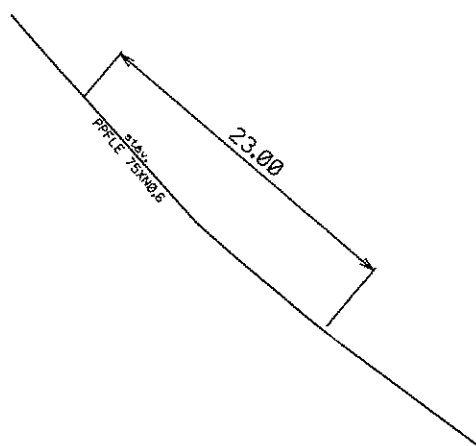

Vypracoval :		Generální projektant :	VEGA COM  CETIN ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA	
Lucie Šufnerová		VEGACOM s.r.o. Novodvorská 1010/14, Praha 4		
Zkontroloval :		Investor :		
Jiří Chlapík		Česká telekomunikační infrastruktura Olšanská 268/3, Praha 3		
Zodp. pracovník :		Odsouhlasil :		
Ing. Petr Pílař		Ing. Petr Pílař		
Místo :	k.ú.: Staré Město			
Název akce :	VPIC Hanušovice - Nová Seninka, silnice		Datum :	08/2016
Příloha :	Schéma- sít.5		Stupeň :	DUR / DUS
			Měřítko :	1 : 500
			č. výkresu :	5

LEGENDA:

- Stávající trasy CETIN
- Nová trasa přeložky
- Trasa k přeložení

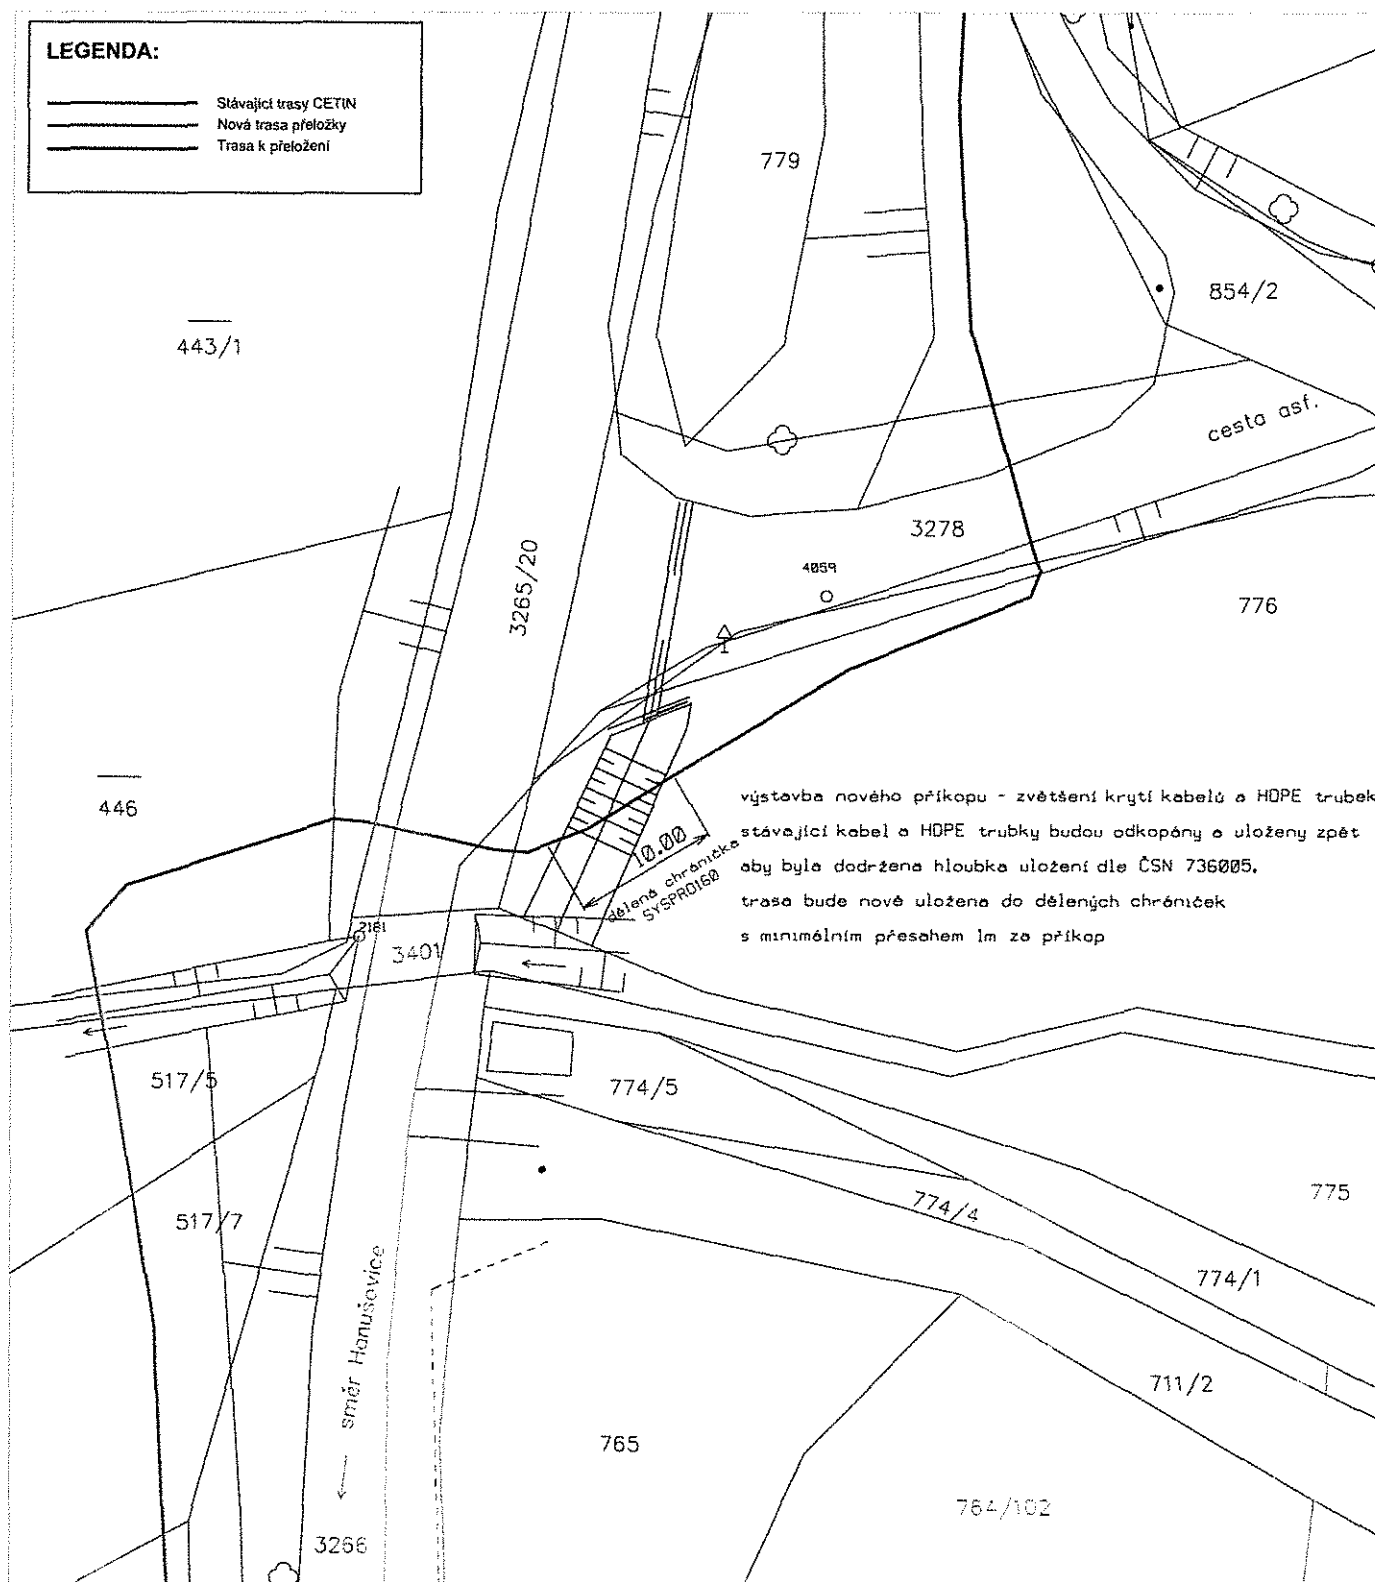


Vypracoval :		Generální projektant:	
Lucie Šufnerová		VEGACOM a.s.	
Zkontroloval :		Novodvorská 1010/14, Praha 4	
Jiří Chlapík		Investor:	
Zodp. pracovník:		Česká telekomunikační infrastruktura	
Ing. Petr Pilař		Olšanská 269/8, Praha 3	
Místo :		Odsouhlasil :	
		Ing. Petr Pilař	
Název akce :		k.ú.: Staré Město	
VPIC Hanušovice - Nová Seninka, silnice		Datum :	
Příloha :		08/2016	
Situace katastrální		Stupeň :	
		DUR / DUS	
		Měřítko :	
		1 : 500	
		č. výkresu:	
		1	


VEGA COM

► CETIN


ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

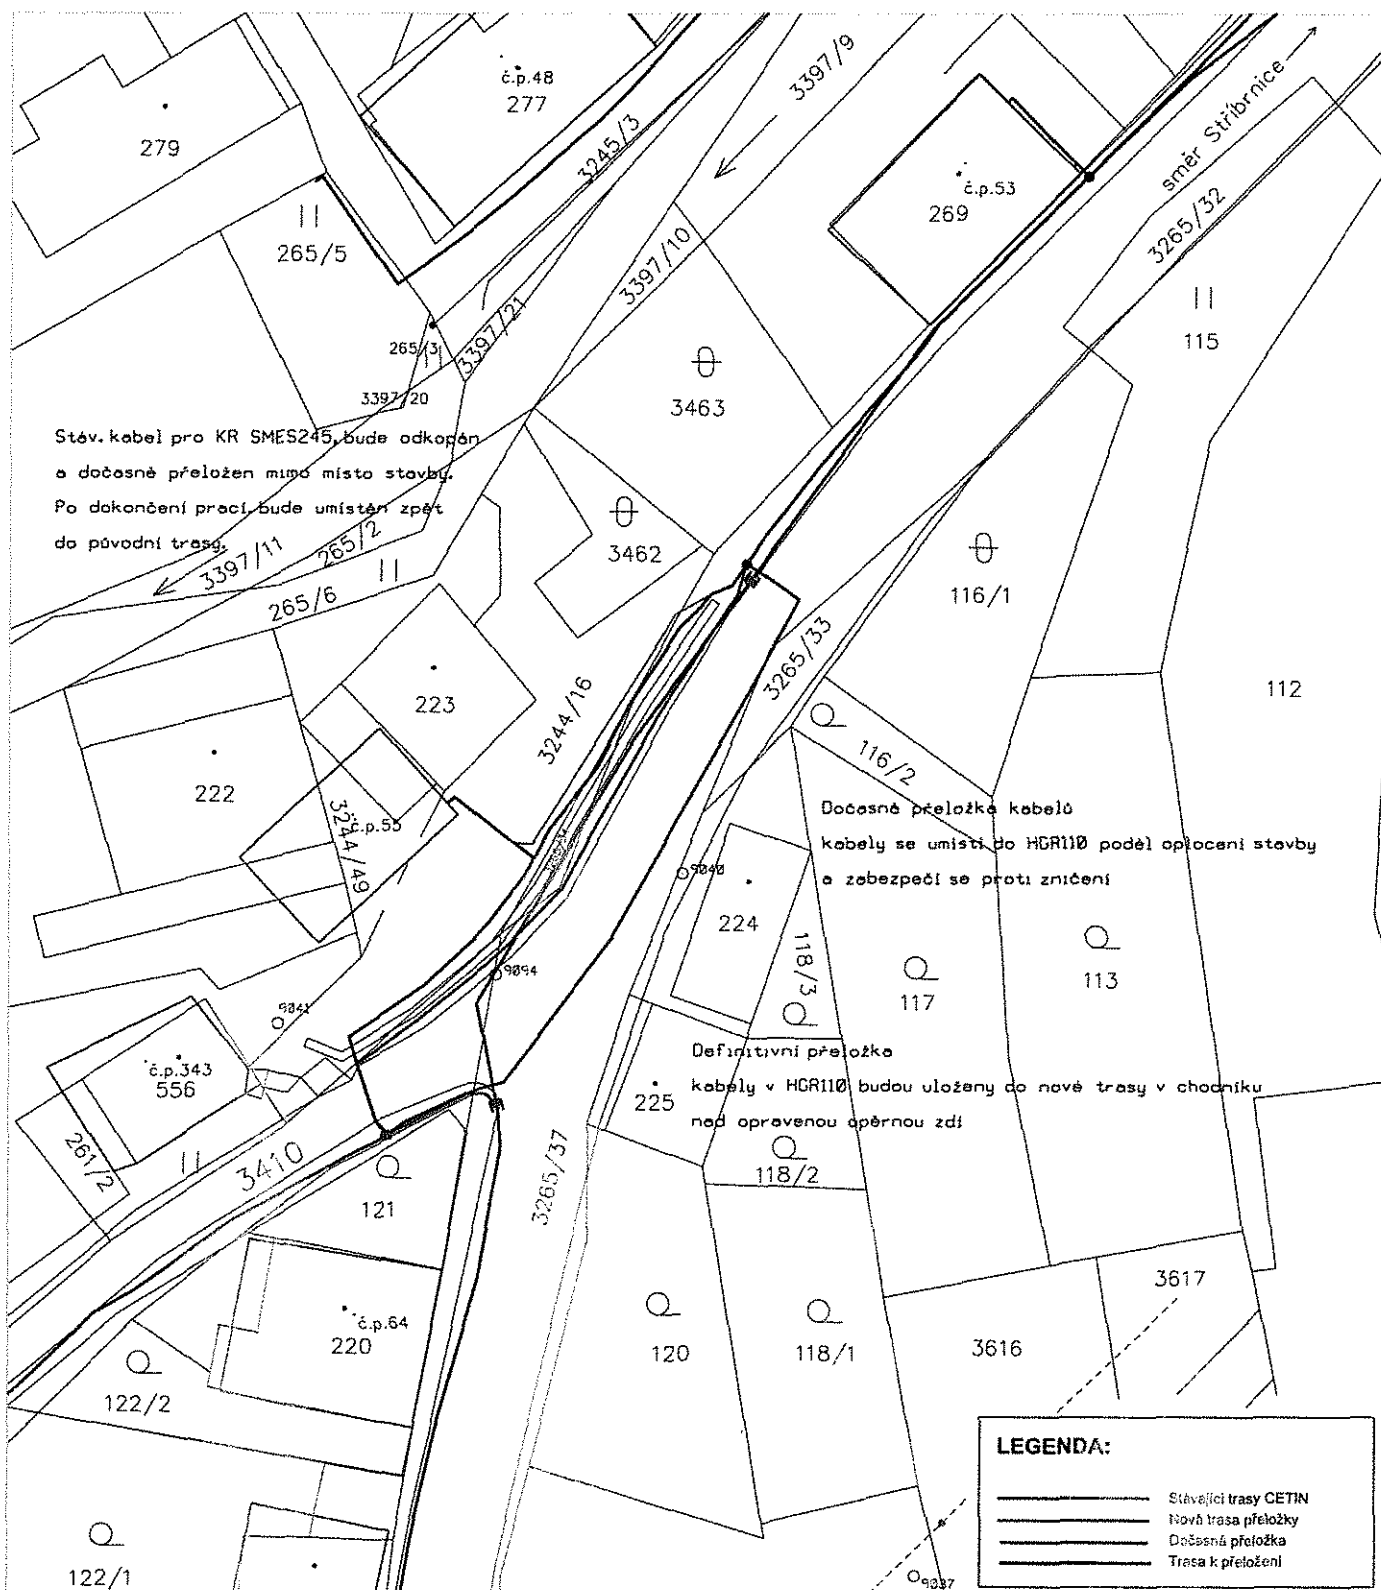


Vypracoval :		Generální projektant: VEGACOM a.s.		  ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA	
Lucie Šufnerová		Novodvorská 1010/14, Praha 4			
Zkontroloval :		Investor:			
Jiří Chlapík		Česká telekomunikační infrastruktura Olšanská 268/B, Praha 3			
Zedp. pracovník:		Odsouhlasil :			
Ing. Petr Pilař		Ing. Petr Pilař			
Místo :		k.ú.: Staré Město			
Název akce :				Datum :	
VPIC Hanušovice - Nová Seninka, silnice				08/2016	
Příloha :				Stupeň :	
Situace katastrální				DUR / DUS	
				Měřítko :	
				1 : 500	
				č. výkresu:	
				2	

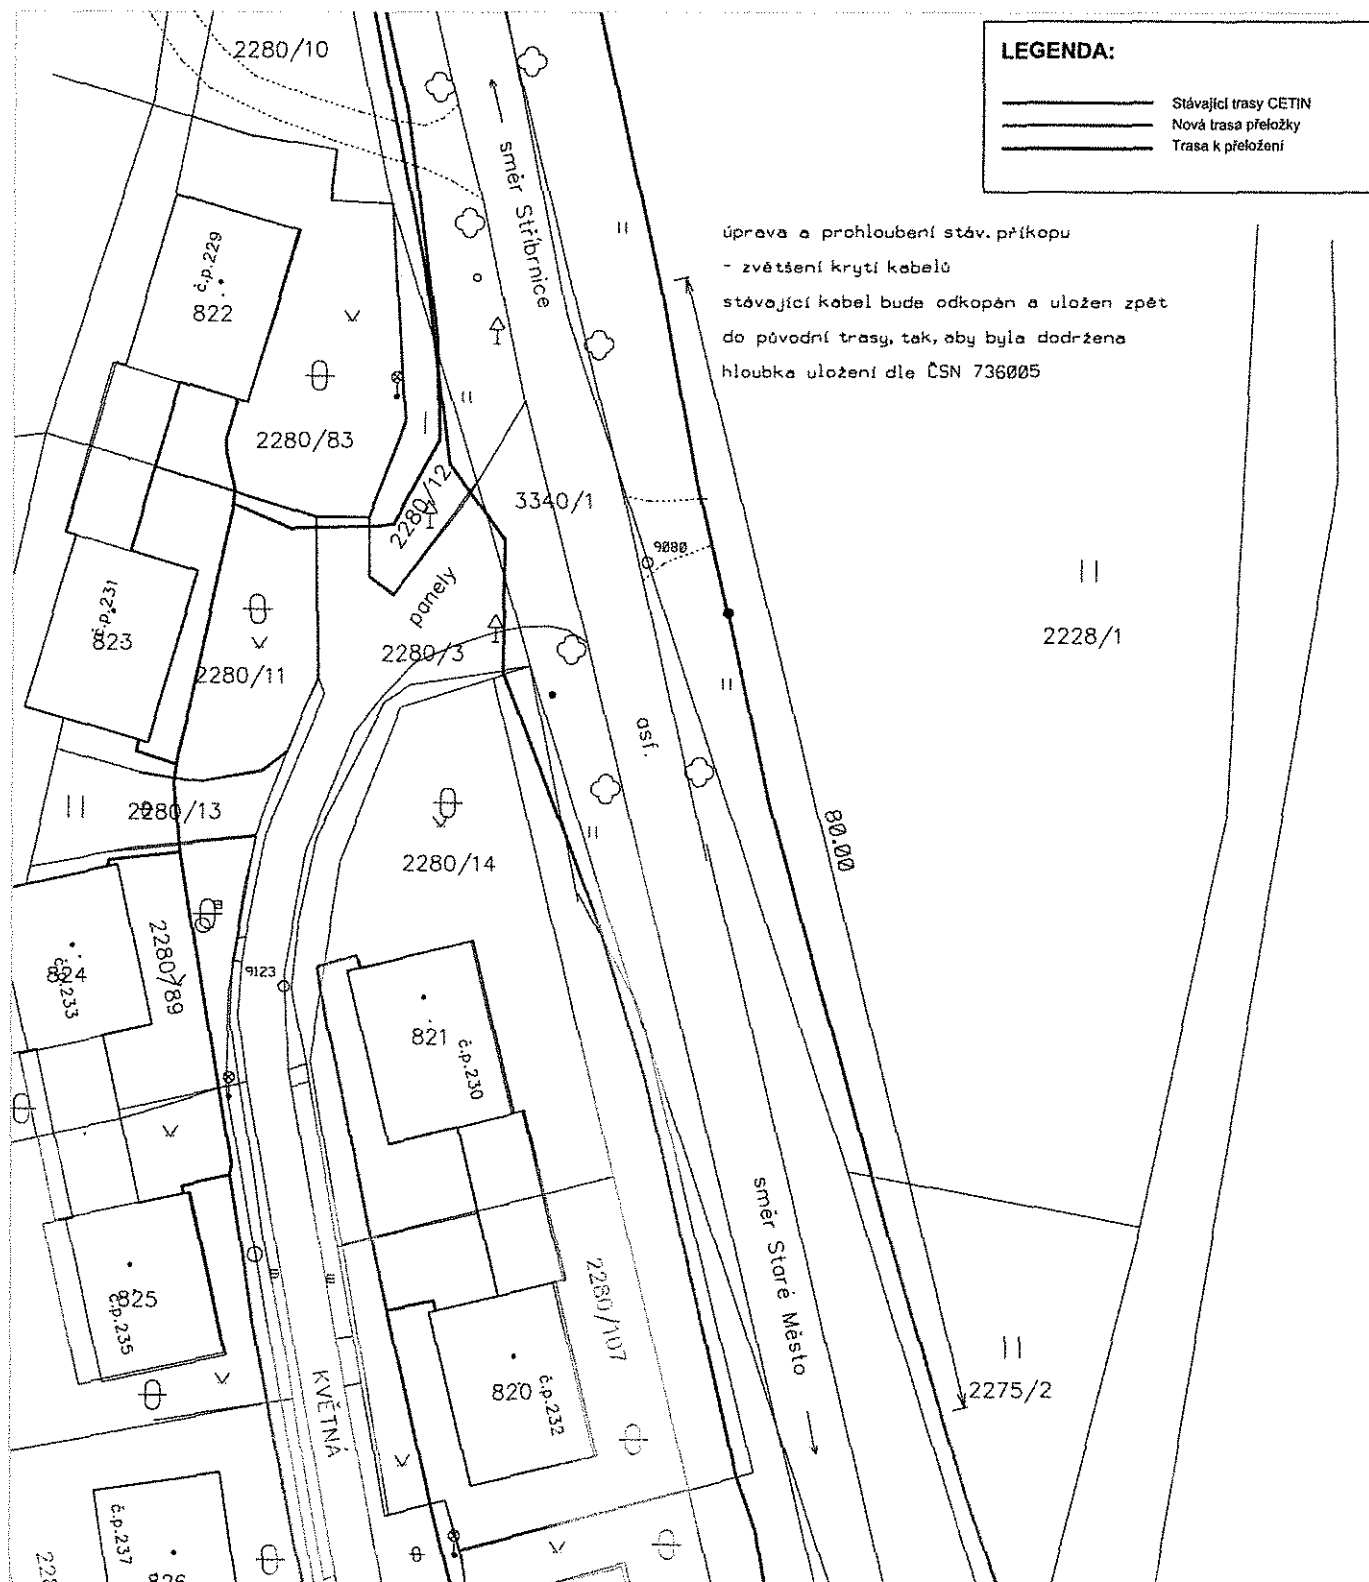


Vypracoval :		Generální projektant: VEGACOM a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4		  ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA			
Lucie Šufnerová							
Zkontroloval :		Investor: Česká telekomunikační infrastruktura Ošňanská 268/8, Praha 3					
Jiří Chlapík							
Zodp. pracovník:		Odsouhlasil :					
Ing. Petr Pilař		Ing. Petr Pilař					
Místo :		k.ú.: Staré Město					
Název akce : VPIC Hanušovice - Nová Seninka, silnice				Datum :		08/2016	
				Stupeň :		DUR / DUS	
Příloha : Situace katastrální				Měřítko :		1 : 500	
				č. výkresu:		3	

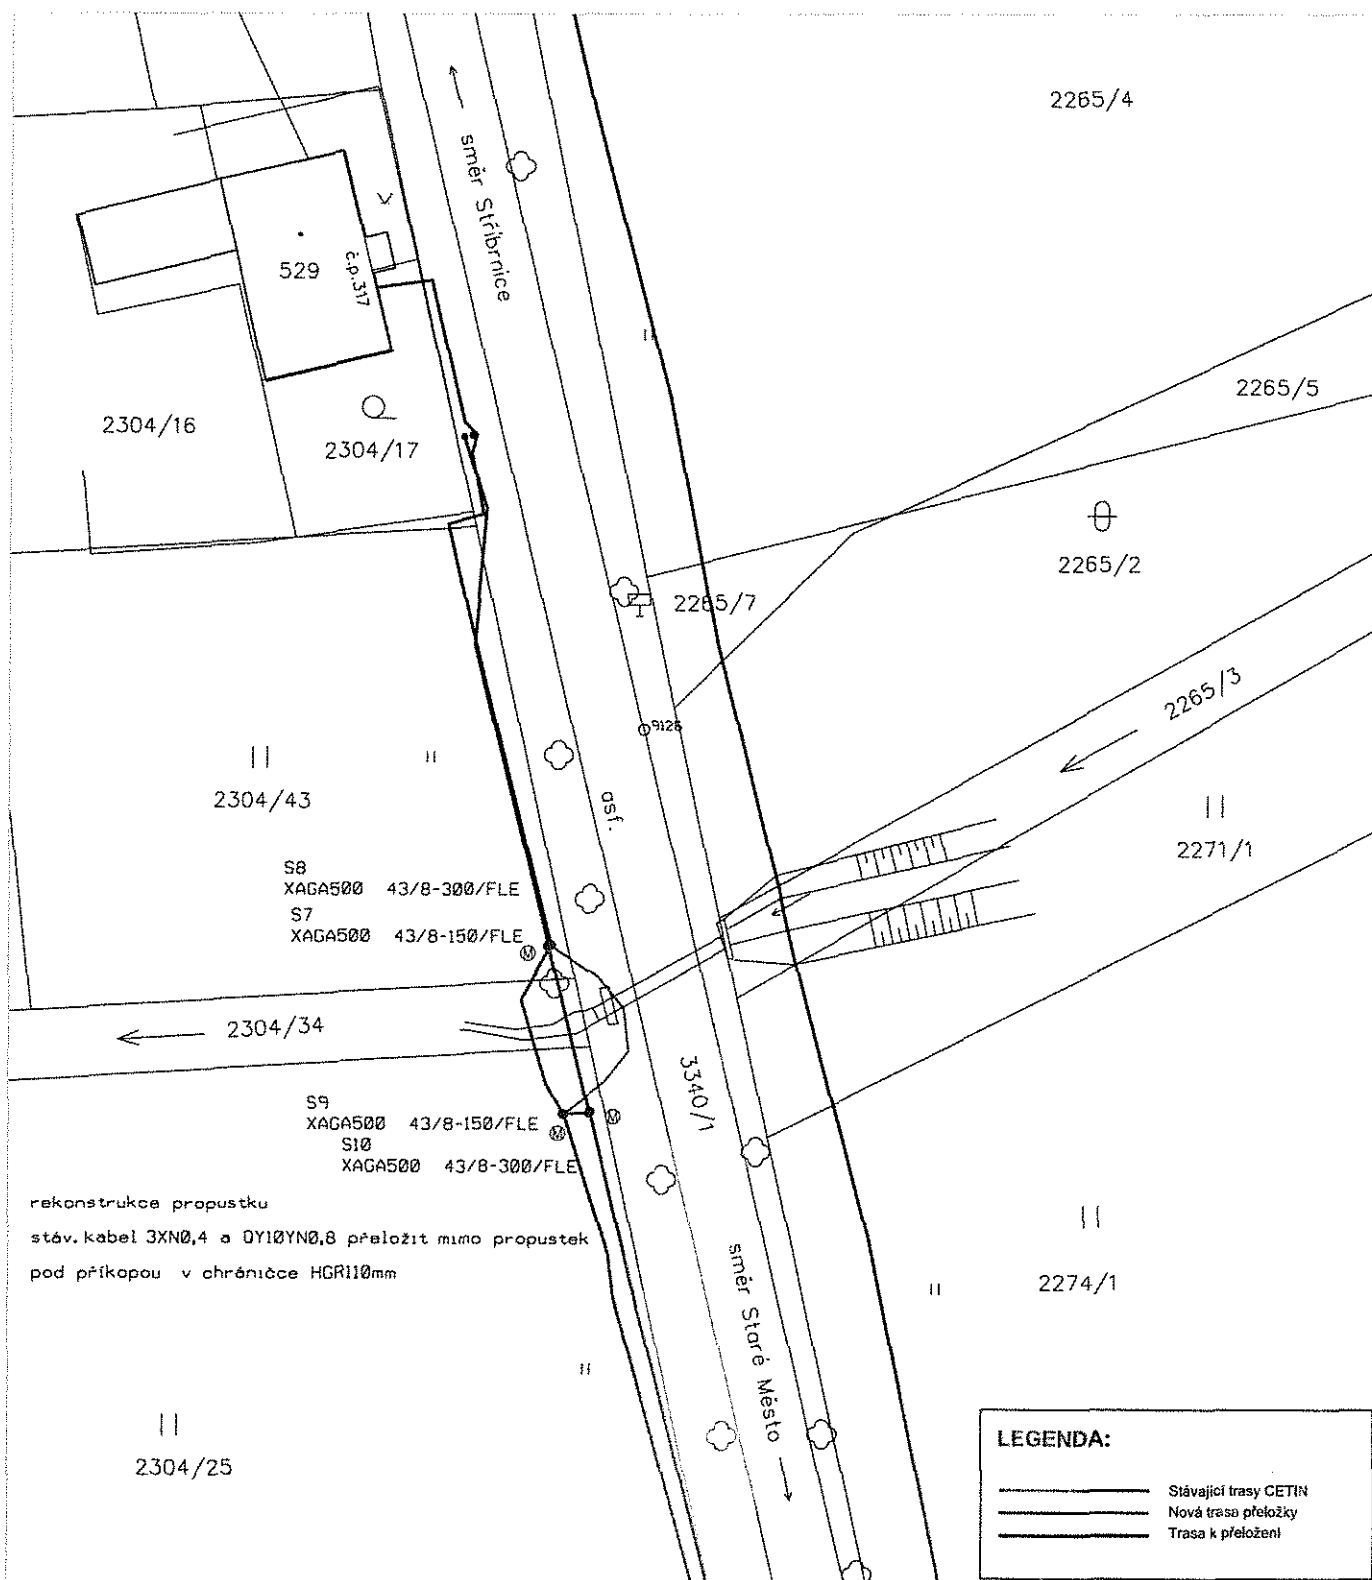


Vypracoval :		Generální projektant: VEGACOM a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4		  ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA	
Lucie Šufnerová					
Zkontroloval :		Investor: Česká telekomunikační infrastruktura Olšanská 268/8, Praha 3			
Jiří Chlapík					
Zodp. pracovník:		Odsouhlasil :			
Ing. Petr Pilař		Ing. Petr Pilař			
Místo :	k.ú.: Staré Město				
Název akce : VPIC Hanušovice - Nová Seninka, silnice				Datum :	08/2016
				Stupeň :	DUR / DUS
Příloha :				Měřítko :	1 : 500
Situace katastrální				č. výkresu:	4

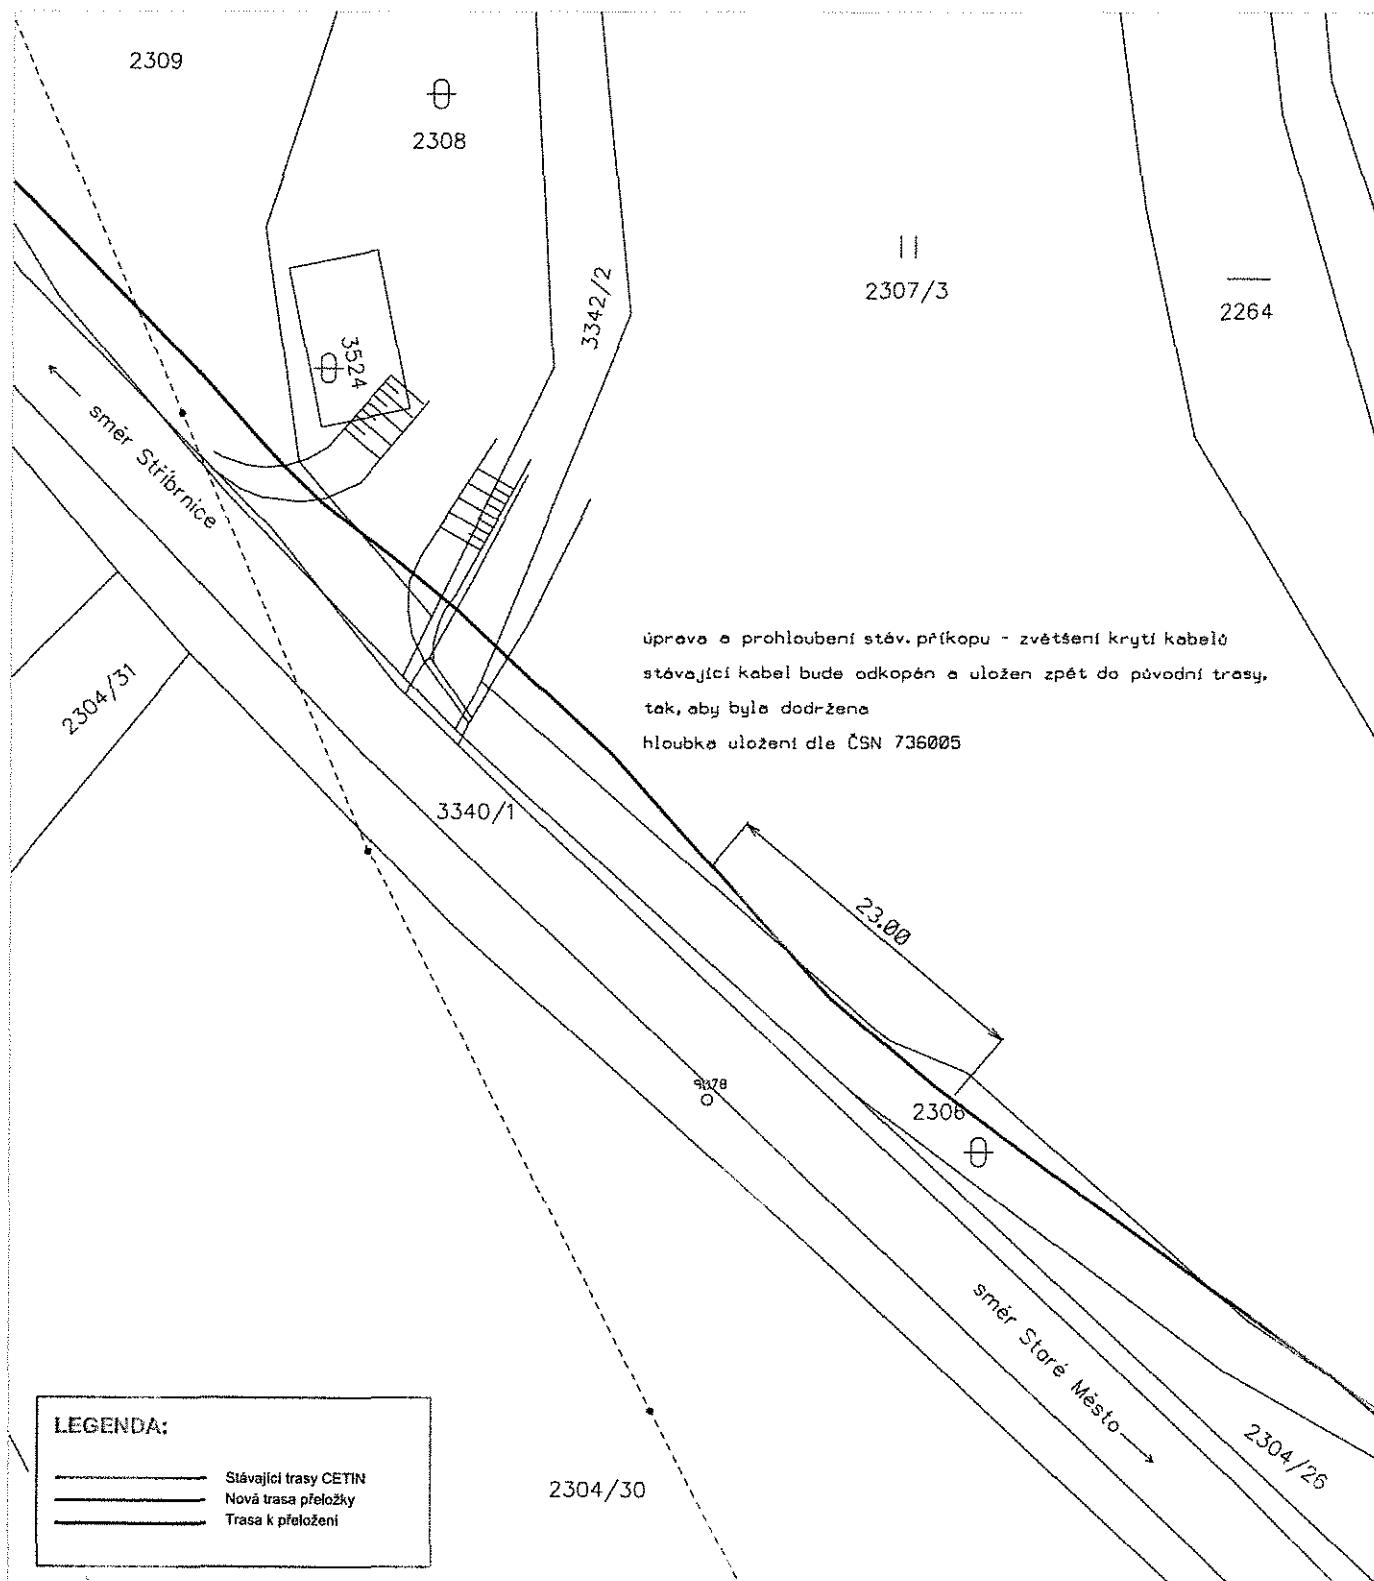

Vypracoval :		Generální projektant: VEGACOM a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4		VEGA COM CETIN ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA	
Lucie Šufnerová					
Zkontroloval :		Investor: Česká telekomunikační infrastruktura Olšanská 268/8, Praha 3			
Jiří Chlapík					
Zodp. pracovník:		Odsouhlasil :			
Ing. Petr Pilař		Ing. Petr Pilař			
Místo :		k.ú.: Staré Město			
Název akce : VPIC Hanušovice - Nová Seninka, silnice				Datum : 08/2016	
				Stupeň : DUR / DUS	
Příloha : Situace katastrální				Měřítko : 1 : 500	
				č. výkresu: 5	

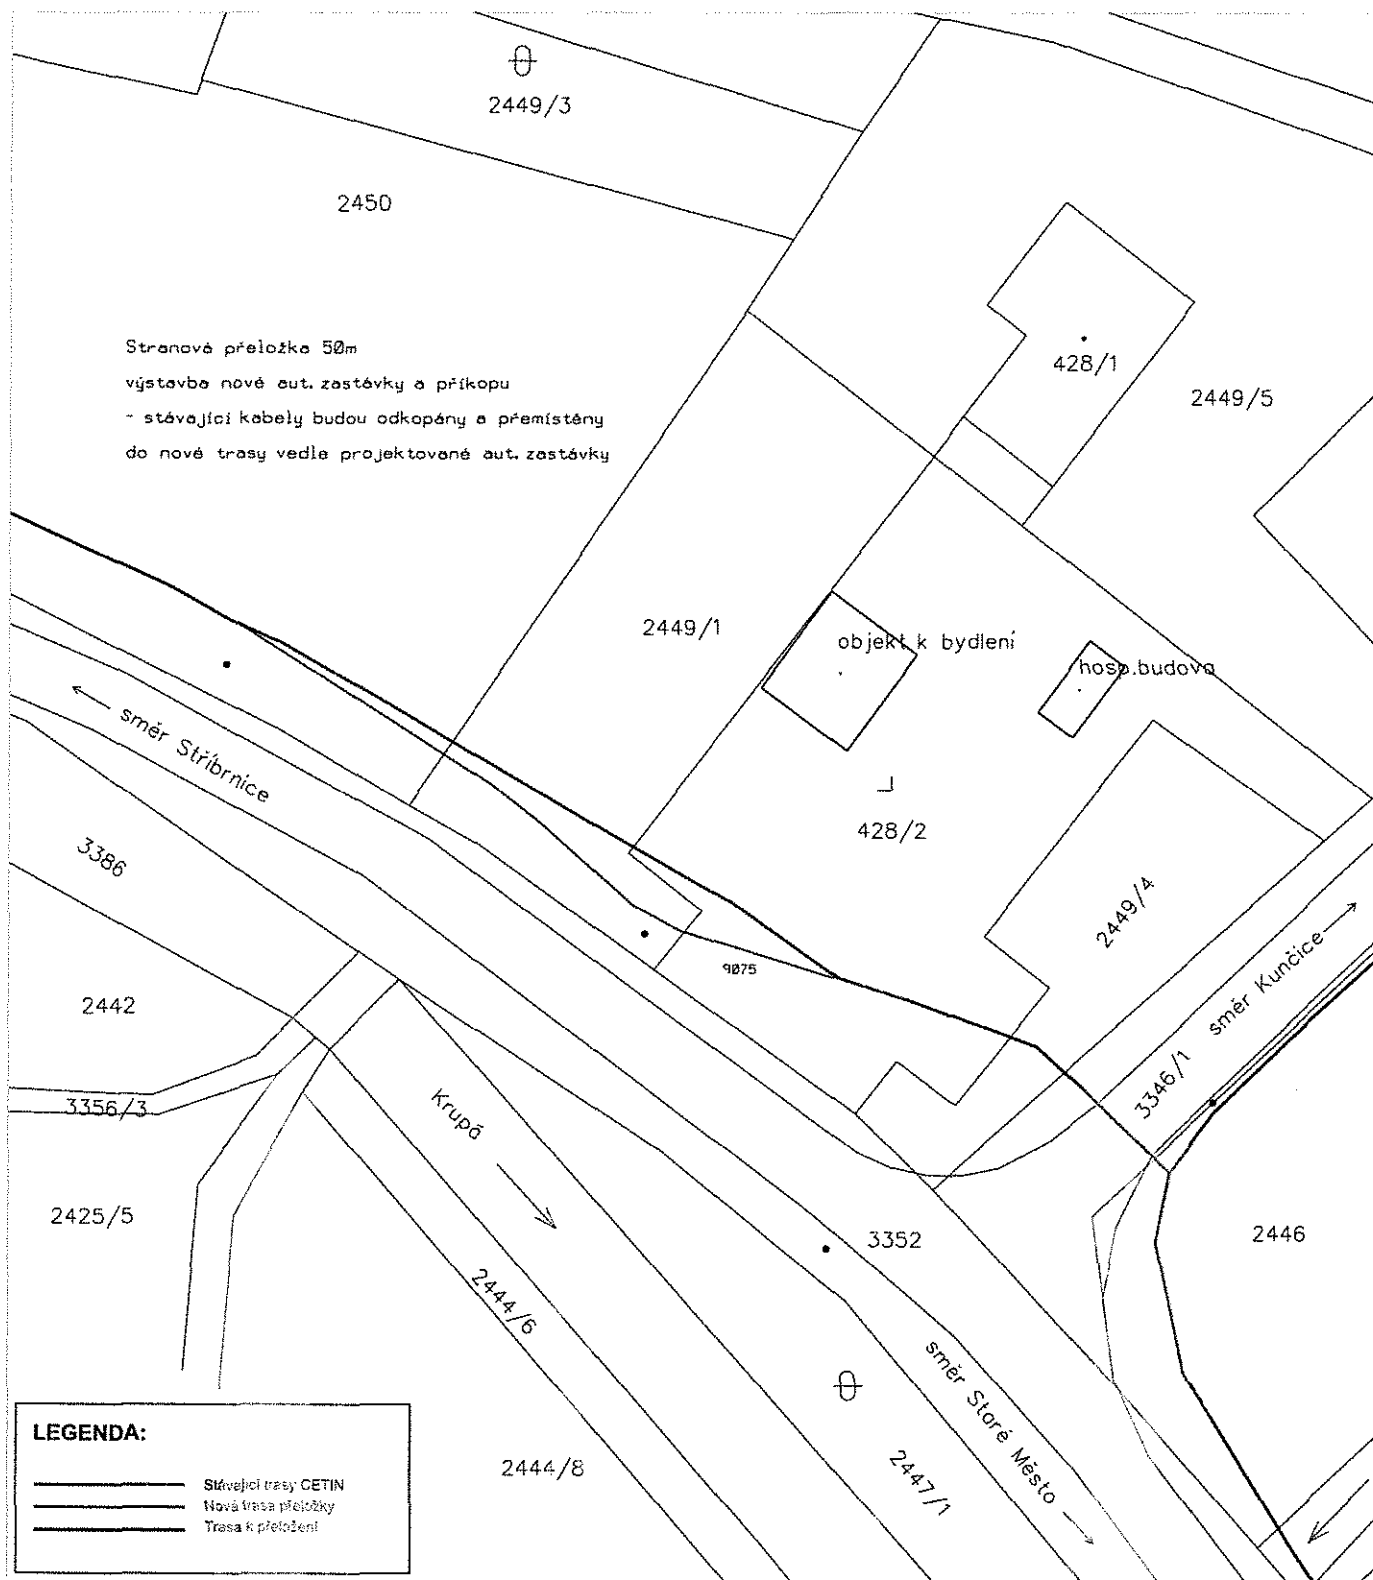


Vypracoval :		Generální projektant: VEGACOM a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4		  ČESKÁ TELKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA	
Lucie Šufnerová					
Zkontroloval :		Investor: Česká telekomunikační infrastruktura Olšanská 268/8, Praha 3			
Jiří Chlapík					
Zodp. pracovník:		Odsouhlasil :			
Ing. Petr Pilař		Ing. Petr Pilař			
Místo :		k.ú.: Staré Město			
Název akce : VPIC Hanušovice - Nová Senínka, silnice				Datum : 08/2016	
				Stupeň : DUR / DUS	
Příloha : Situace katastrální				Měřítko : 1 : 500	
				č. výkresu: 6	

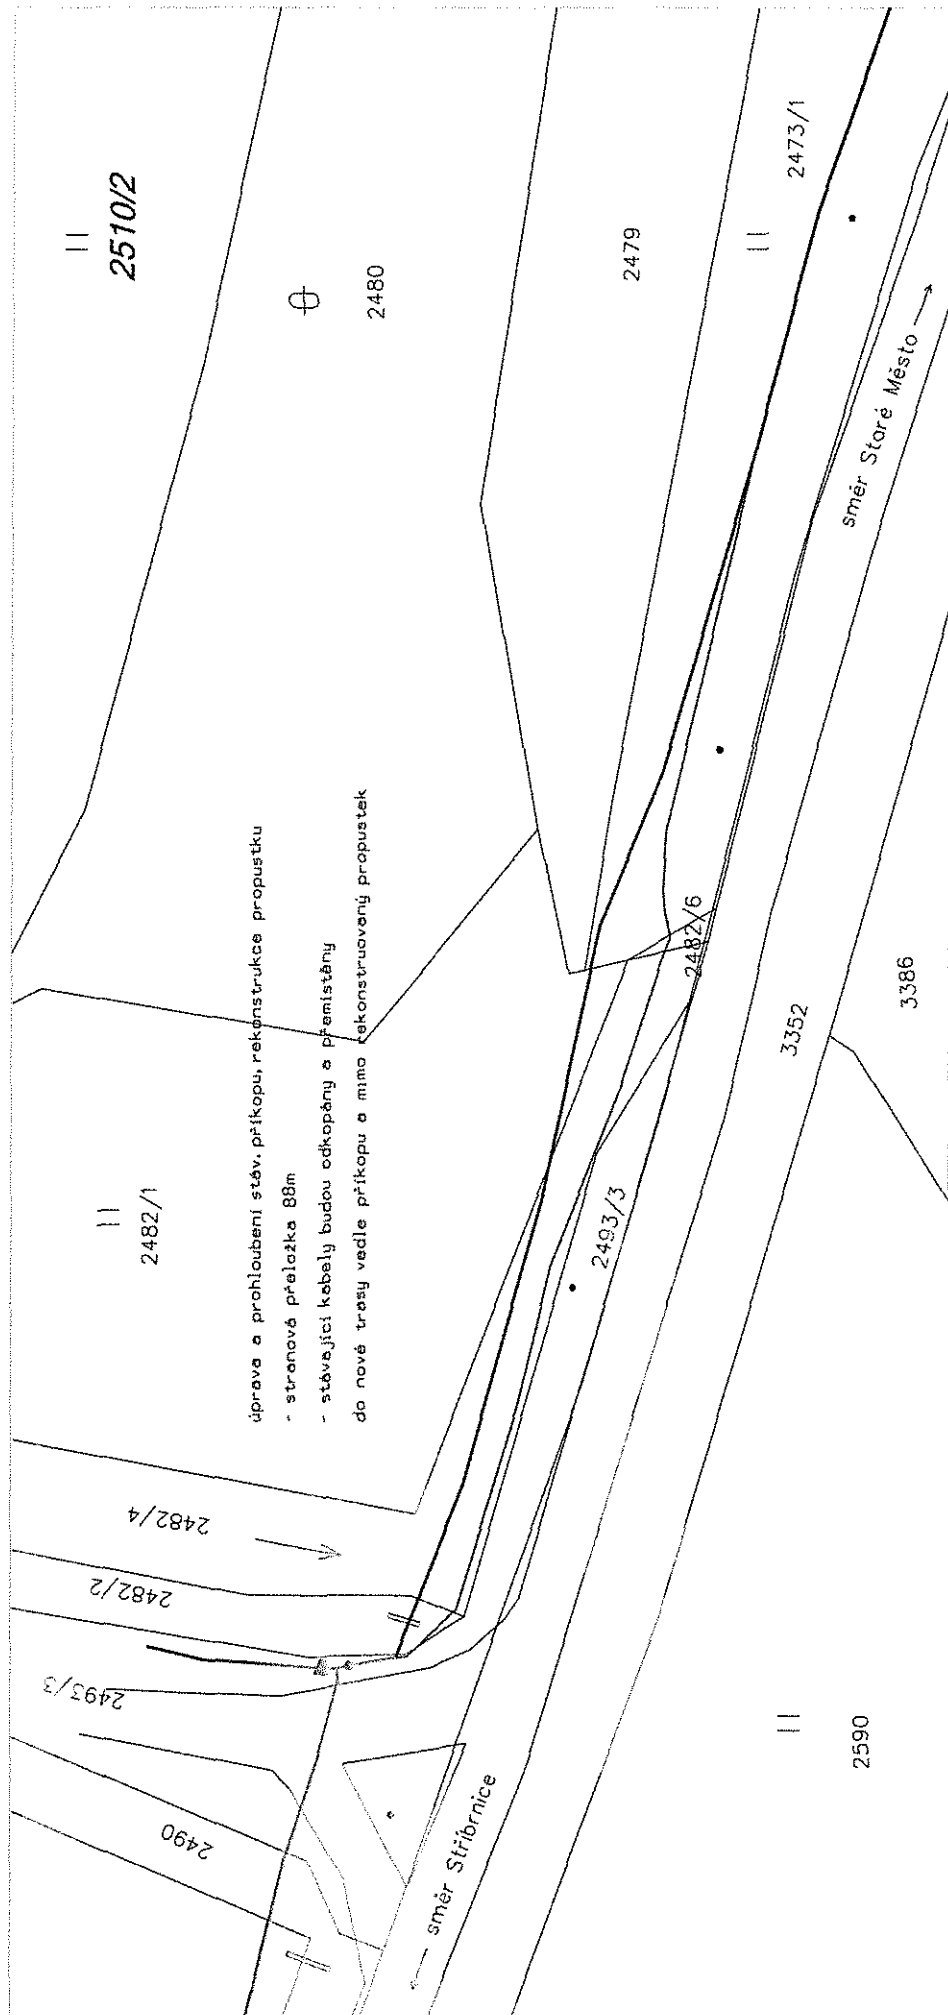


LEGENDA:

	Stávající trasy CETIN
	Nová trasa přeložky
	Trasa k přeložení

VEGA COM		CETIN ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA	
Vypracoval :	Generální projektant:	Datum :	08/2016
Lucie Šufnerová	VEGACOM a.s.	Stupeň :	DUR / DUS
Zkontroloval :	Novodvorská 1010/14, Praha 4	Měřítko :	1 : 500
Jiří Chlapík	Investor:	Č. výkresu:	7
Zodp. pracovník:	Česká telekomunikační infrastruktura		
Ing. Petr Pilař	Olšanská 268/8, Praha 3		
Místo :	Odsouhlasil :		
Název akce :	Ing. Petr Pilař		
	k.ú.: Staré Město		
Situace katastrální			
VPIC Hanušovice - Nová Seninka, silnice			

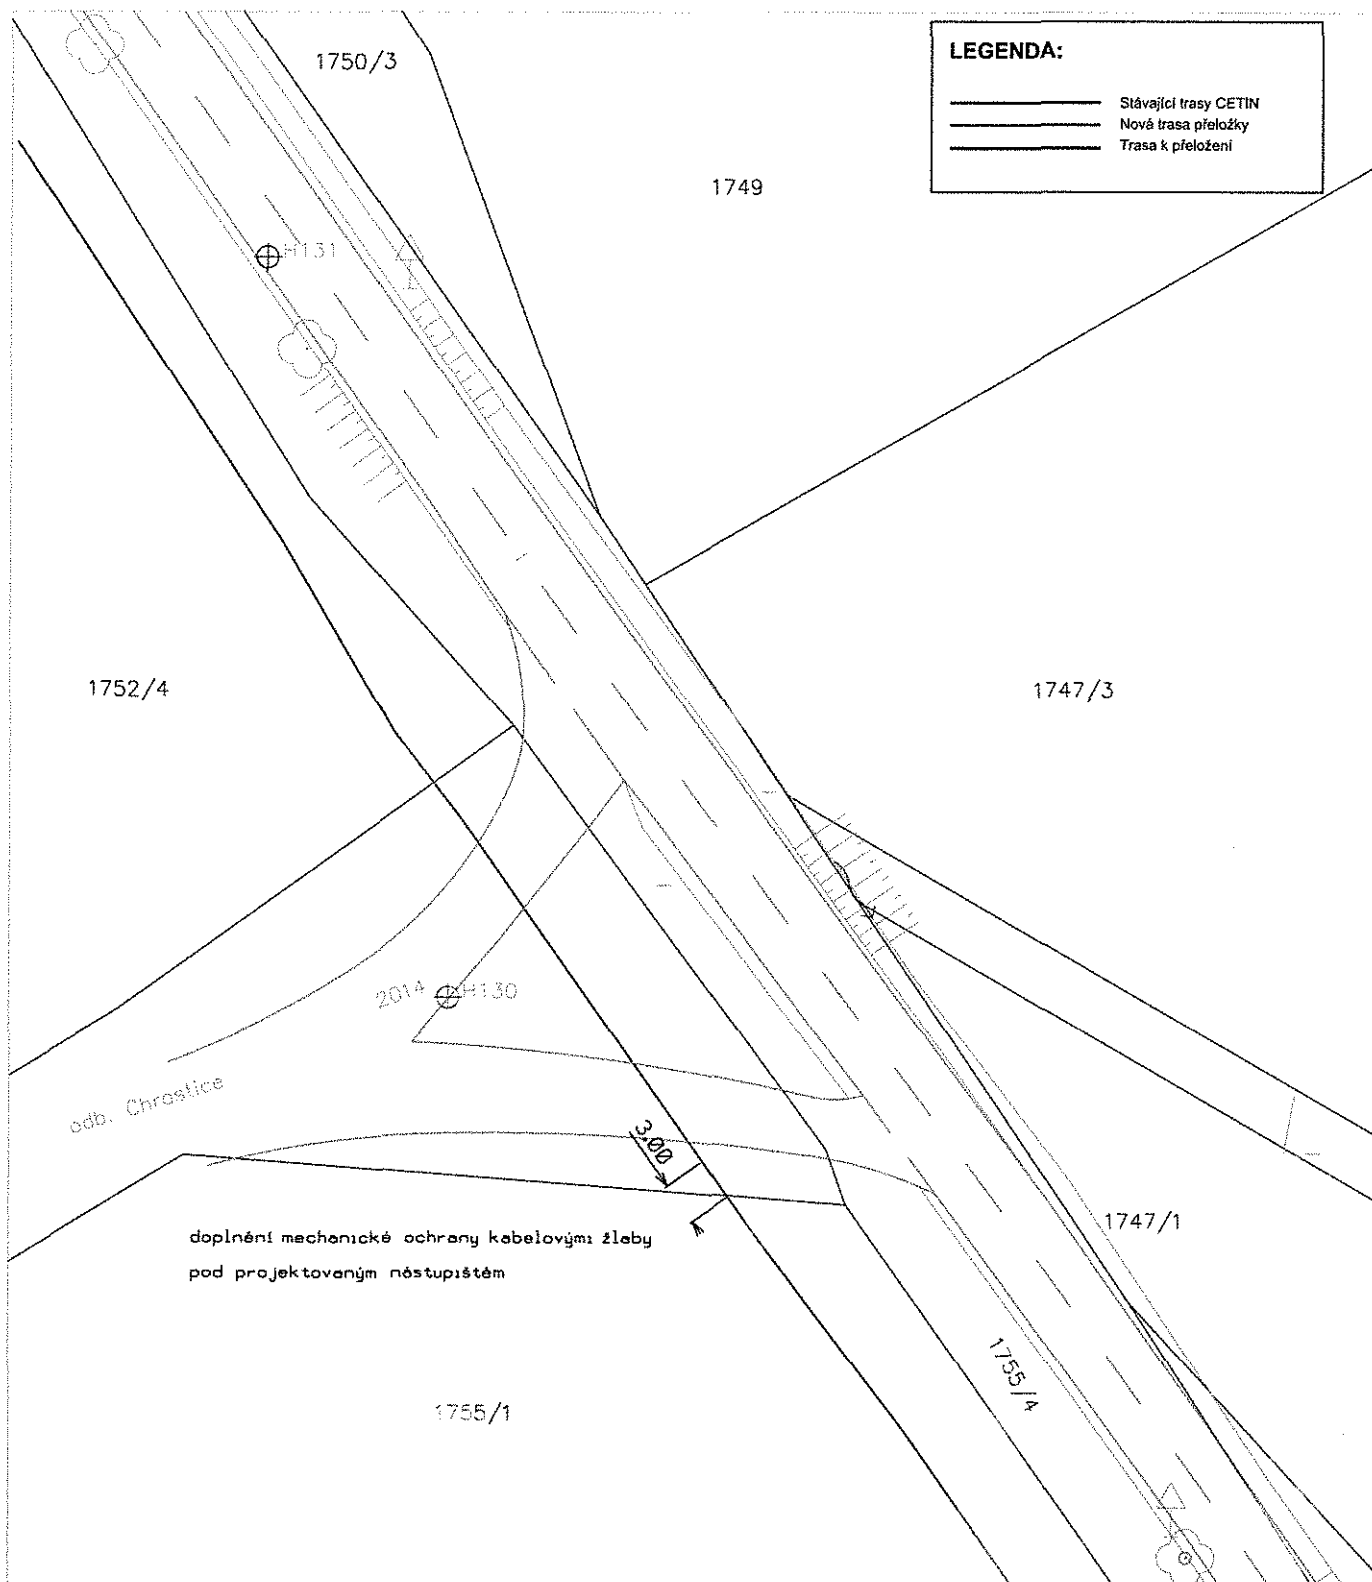


Vypracoval :		Generální projektant: VEGACOM a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4		  ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA	
Lucie Šufnerová					
Zkontroloval :		Investor: Česká telekomunikační infrastruktura Olšanská 268/8, Praha 3			
Jiří Chlapík					
Zodp. pracovník:		Odsouhlasil :			
Ing. Petr Pilař		Ing. Petr Pilař			
Místo :		k.ú.: Staré Město			
Název akce :				Datum :	
VPIC Hanušovice - Nová Seninka, silnice				08/2016	
Příloha :				Stupeň :	
				DUR / DUS	
				Měřítko :	
Situace katastrální				1 : 500	
				č. výkresu:	
				8	

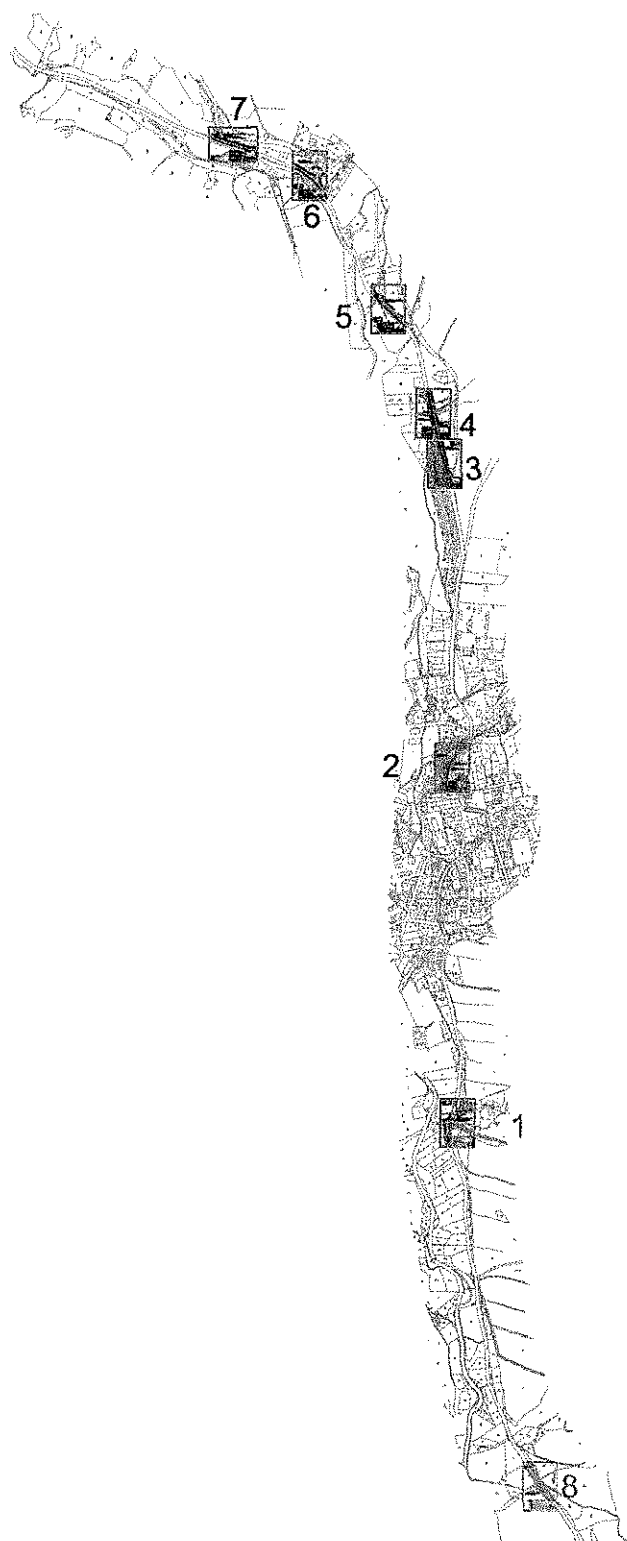

Vypracoval :		Generální projektant:	
Lucie Šufnerová		VEGACOM a.s.	
Zkontroloval :		Novodvorská 1010/14, Praha 4	
Jiří Chlapík		Investor:	
Zodp. pracovník:		Česká telekomunikační infrastruktura	
Ing. Petr Pilař		Olšanská 268/6, Praha 3	
Místo :		Odsouhlasil :	
		Ing. Petr Pilař	
		k.ú.: Staré Město	
Název akce :			Datum :
VPIC Hanušovice - Nová Seninka, silnice			08/2016
Stupeň :			DUR / DUS
Měřítko :			1 : 500
č. výkresu:			0
Příloha : Situace katastrální - přehled			


Stranová přeložka v délce 50m

výstavba nové aut. zastávky a příkopu
stávající kabely budou odkopány a přemístěny
do nové trasy vedle projektované aut. zastávky

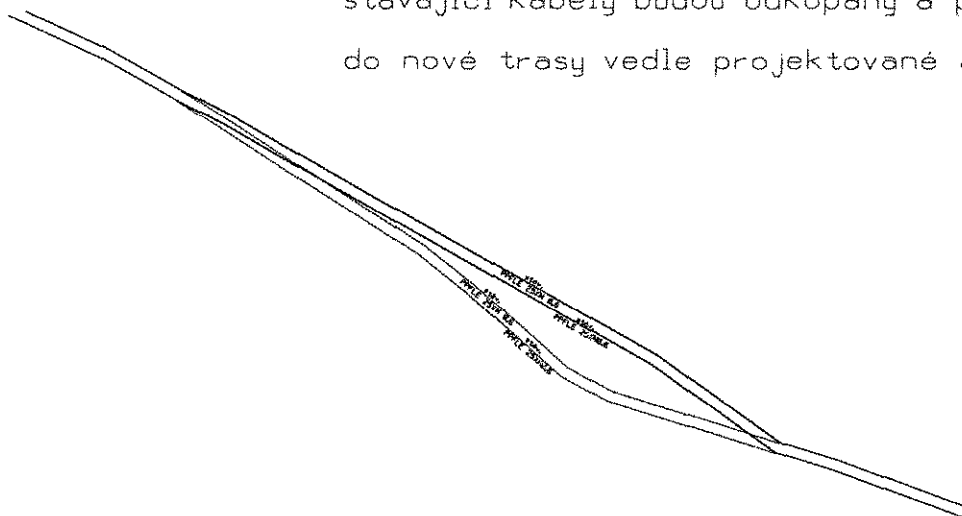


Vypracoval :	Generální projektant: VEGACOM a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4		  ČESKÁ TELEKOMUNICAČNÍ INFRASTRUKTURA	
Lucie Šufnerová				
Zkontroloval:	Investor:			
Jiří Chlepík	Česká telekomunikační infrastruktura Olšanská 268/8, Praha 3			
Zodp. pracovník:	Odsouhlasil :			
Ing. Petr Píloř	Ing. Petr Píloř			
Místo :	k.ú.: Staré Město			
Název okce :			Datum :	08/2016
VPIC Hanušovice - Nová Seninka, silnice			Stupeň :	DUR / DUS
Příloha :			Měřítko :	1 : 500
Schéma -sit.6			č. výkresu:	6

- úprava a prohloubení stáv. příkopu, rekonstrukce propustku
- stranová přeložka 88m
- stávající kabely budou odkopány a přemístěny
- do nové trasy vedle příkopu a mimo rekonstruovaný propustek

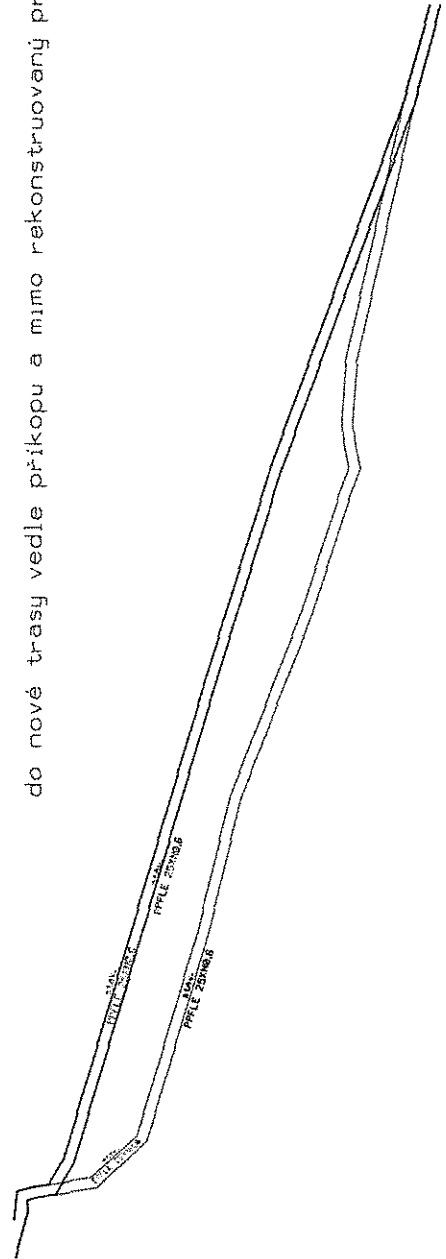

Výpracoval :		Generální projektant:		 VEGA COM  CETIN ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA	
Lucie Šufnerová		VEGACOM a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4			
Zkontroloval :		Investor:		Datum : 08/2016	
Jiří Chlapík		Česká telekomunikační infrastruktura Úšonská 268/8, Praha 3			
Zodp. pracovník:		Odsouhlasil :		Stupeň : DUR / DUS	
Ing. Petr Pilarš		Ing. Petr Pilarš		Měřítko : 1 : 500	
Místo :		k.ú.: Staré Město		č.výkresu: 7	
Název akce :		VPIC Hanušovice - Nová Seninka, silnice Příloha : Schéma - síť.			
VPIC Hanušovice - Nová Seninka, silnice					

doplnění mechanické ochrany kabelovými žlaby
pod projektovaným nástupištěm

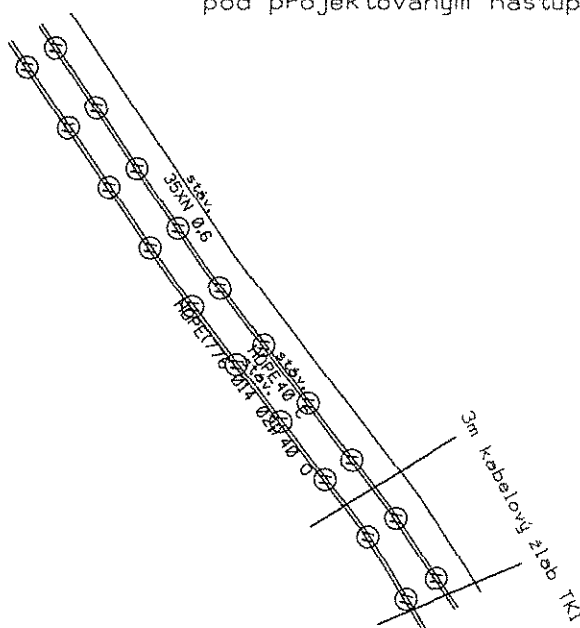

Vypracoval :		Generální projektant: VEGACOM o.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4	  ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA
Lucie Šufnerová		Investor: Česká telekomunikační infrastruktura Olšanská 268/8, Praha 3	
Zkontroloval :		Odsouhlasil :	
Jiří Chlapík		Ing. Petr Pilarš	
Zodp. pracovník:			
Ing. Petr Pilarš			
Místo :	k.ú.: Staré Město		
Název akce :	VPIC Hanušovice - Nová Seninka, silnice		Datum : 08/2016
Příloha :	Schéma - sit.8		Stupeň : DUR / DUS
			Měřítko : 1 : 500
			č. výkresu: 1

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2016.09

Položková 2016.09

databáze:

Název stavby: **VPIC Hanušovice-Nová Seninka,silnice**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAV	27 052,83 Kč
A	
ZEMNÍ PRÁCE	165 157,05 Kč
MONTÁŽ	79 639,98 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	26 902,95 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	16 663,05 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	34 048,26 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	93 904,89 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
NÁHRADY	20 800,00 Kč
VBŘ	
Celkové náklady:	464 169,01 Kč
 STAVEBNÍ ČINNOST	 365 604,87 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	98 564,14 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAV				
A				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	22 165,00 Kč
	Z1 - 519m			
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	80.00 m	1 185,60 Kč
952367	S	Pokládka žlabů TK1	3.00 m	177,75 Kč
955551	S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	234.00 m	10 167,30 Kč
955552	S	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	4.00 m	51,36 Kč
955576	S	Rýha v chodníku 25/50	45.00 m	14 974,65 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	468.00 m	129 397,32 Kč
954958	S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	4.00 m	316,00 Kč
955570	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	6.00 m	6 461,58 Kč

955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	76.00 m	675,64 Kč
955052	S	Vytyčení trasy ve volném terénu	443.00 m	1 749,85 Kč
MONTÁŽ				
955031	S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	163.00 m	4 185,84 Kč
955030	S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	288.00 m	5 120,64 Kč
955029	S	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	110.00 m	1 630,20 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	385,11 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	155.00 ks	4 592,65 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	155.00 ks	3 061,25 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	207,39 Kč
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	3.00 ks	385,11 Kč
955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	561.00 ks	13 851,09 Kč
955288	S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks	79,00 Kč
955282	S	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	5.00 ks	6 912,10 Kč
955281	S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	7.00 ks	6 566,49 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	204.00 m	3 425,16 Kč
954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	217.00 m	6 429,71 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	353.00 m	7 321,22 Kč
954980	S	Překládka trubky úložné	24.00 m	343,68 Kč
957753	S	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	7 440,00 Kč
koordinace se stavbou				
958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	1 761,60 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955199	S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	6.00 ks	13 367,52 Kč
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	419.00 m	8 845,09 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 690,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	9.00 ks	16 663,05 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	9.00 ks	18 995,94 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	9.00 ks	15 052,32 Kč
955367		Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	9.00 ks	20 800,00 Kč
položka použita na náhrady VBř - odhadovaná				

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303857	S	Deska krycí plast. 250x1000 mm	45.00 ks	1 293,30 Kč
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	468.00 ks	17 147,52 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	57.00 m	211,47 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	468.00 m	1 993,68 Kč
300127	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,8	20.00 m	1 290,20 Kč
300123	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6	60.00 m	37 744,80 Kč

300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	20.00 m	245,20 Kč
300121 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	65.00 m	10 427,30 Kč
300105 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	60.00 m	907,20 Kč
316541 S	Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	2.00 ks	217,22 Kč
312240 S	Konektor UY2 přímý - plněný	24.00 ks	33,36 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	7.00 ks	1 877,54 Kč
312417 S	Modul konektor. 4000-25P	36.00 ks	1 673,64 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	21.00 ks	616,77 Kč
305338 S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	6.00 ks	286,56 Kč
407578 S	Souprava čistící 4413L	2.00 ks	1 230,90 Kč
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks	837,74 Kč
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	5.00 ks	2 467,55 Kč
320294 S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	2.00 ks	1 612,48 Kč
320302 S	Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-500	3.00 ks	4 113,63 Kč
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	10.00 m	4 448,50 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	70.00 m	2 757,30 Kč
305195 S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	3.00 ks	471,03 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	7.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	7.00 ks	0,00 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2016.09

Položková 2016.09

databáze:

Název stavby: **VPIC Hanušovice-Nová Seninka,silnice**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAV 27 052,83 Kč

A

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 16 663,05 Kč

Celkové náklady První etapy: 43 715,88 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAV				
A				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	22 165,00 Kč
	Z1 - 519m			
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	9.00 ks	16 663,05 Kč

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Z ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená Ing. Stanislavem Nevrtalem, supervizorem pro výstavbu sítě Morava dle pověření
na straně jedné

(dále jen „Nabyvatel“)

a

.....
IČ:, DIČ:

se sídlem

zapsaná v obchodním rejstříku, odd., vložce

zastoupena jednatelem

na straně druhé

(dále jen „Převodce“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby („dále jen „tato dohoda““).

čl. I.

Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „.....“, kteréžto bylo vydáno dne , (kým) pod čj. a nabylo právní moci dne (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění (dále jen „Stavba“/ event. „Stavební objekt“).

Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby a to právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“), tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

čl. II.

Převodce ke dni podpisu této dohody převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v Rozhodnutí

