

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3 – TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: I/19 Kámen - Leskovice

Číslo: 12PT-001077

10/2015

Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou následující Technické kvalitativní podmínky („TKP“):

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP

Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1

ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007,

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998

a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120

ze dne 21.2.2000.

Praha květen 2007

Kapitola 2 TKP

Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1

ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120

ze dne 30.6.1998

Praha 2006

Kapitola 3 TKP

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP

Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1

ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010

**se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1
Praha, prosinec 2009**

**Kapitola 5 TKP
Podkladní vrstvy**

**MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008
Praha, leden 2015**

**Kapitola 6 TKP
Cementobetonový kryt**

**MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1
ze dne 3.8.2006
Praha, leden 2015**

**Kapitola 7 TKP
Hutněné asfaltové vrstvy**

**MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, duben 2008**

**Kapitola 8 TKP
Litý asfalt**

**MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1**

ze dne 15.12.2003
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP
Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP
Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 11
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením pátého znění této kapitoly
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1
ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP
Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, březen 2008

**Kapitola 13 TKP
Vegetační úpravy**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120
ze dne 27.10.1997
Praha, srpen 2006

**Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravní zařízení**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6
ze dne 27.3.2015, s účinností od 1.4.2015
se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2
ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

**Kapitola 15 TKP
Osvětlení pozemních komunikací**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 9/2015-120-TN/3
ze dne 2.2.2015, s účinností od 15.2.2015.
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20.4.2007
a Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/1
ze dne 30.5.2013
Praha, únor 2015

**Kapitola 16 TKP
Piloty a podzemní stěny**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002

Praha, prosinec 2010

Kapitola 17 TKP

Zrušeno

Kapitola 18 TKP

Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1

ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005,

**se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 24894/96-120 ze dne 27.12.1996
Praha, srpen 2005**

Kapitola 19 TKP

ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce

ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

ČÁST A: Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1

ze dne 13.4.2015, s účinností od 23.4.2015

**se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002**

**a TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
schválených MD-OPK, č.j.635/03-120-RS/1 ze dne 18. 12. 2003
Praha, březen 2008**

ČÁST B: Schváleno: MD-OPK č. j. 107/2013-120-TN/1

ze dne 23.12.2013, s účinností od 1.1.2014

**se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schválené MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008**

Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP

Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1

ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

**se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000**

Praha, duben 2008

**Kapitola 21 TKP
Izolace proti vodě**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, leden 2010

**Kapitola 22 TKP
Mostní ložiska**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD - OI, č.j. 653/07-910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21. 2. 2000.
Praha, duben 2007

**Kapitola 23 TKP
Mostní závěry**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21. 2. 2000
Praha, květen 2007

**Kapitola 24 TKP
Tunely**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, prosinec 2006

**Kapitola 25 TKP
Protihlukové clony**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1

ze dne 20.12.2002

Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP

Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4

ze dne 2.2.2015, s účinností od 15.2.2015

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schválené MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1

ze dne 12.3.2008

Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP

Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5

ze dne 2.2.2015, s účinností od 15.2.2015

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schválené MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1

ze dne 12.3.2008

Praha, únor 2015

Kapitola 28 TKP

zrušeno

Kapitola 29 TKP

Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1

ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003

Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP
Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120
Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120
Ze dne 19.3.1999
Praha, květen 2009

Distribuci TKP zajišťuje:
Pragoprojekt a.s.
K Ryšánce 16
147 54 Praha 4

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3, ČÁST 2 ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: I/19 Kámen - Leskovice

Číslo: 12PT-001077

10/2015

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

1. Přípustné odchylky tloušťek asfaltových vrstev jsou stanoveny následovně:

- 1.1. minimální tloušťka vrstvy – min. 1,00 h**
- 1.2. průměrná tloušťka vrstvy – min. 1,00 h**

2. Ostatní informace.

- 2.1. Veškerý silniční provoz na realizovaný opravený úsek může být převeden nejdříve po položení ložných vrstev. Tento požadavek platí i pro část opravovaného úseku, kde bude provedeno pouze odfrézování stávajících asfaltových vrstev. Toto se netýká staveništního provozu nutného k realizaci a dokončení stavby.**
- 2.2. V případě eventuálního rozporu mezi PD a soupisem prací (vč. výkazu výměr) platí údaje uvedené v soupisu prací.**
- 2.3. Maximální doba pro uvedení stavby do provozu - dokončení všech stavebních prací v rámci stavby**
- 2.4. Předpokládaná doba pro dokončení stavby – doba pro předložení všech dokladů pro vydání protokolu o předání a převzetí stavby, včetně vydání tohoto protokolu.**
- 2.5. Vybraný zhotovitel upozorní Katastrální úřad, katastr. pracoviště v Pelhřimově, že v rámci stavby dojde k dotčení, resp. zrušení dvou stávajících nivelačních bodů (dle PD).**

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.2
ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od:

SWIETELSKY stavební s. r. o.,

SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

se sídlem: K Sílu 1143/ 393 01 Pelhřimov, IČ: 480 35 599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26.

11. 1992, oddíl C, vložka 8032,

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/19 Kámen - Leskovice“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 519686 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství (Corrupt practice)** znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání (Fraudulent practice)** znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel (Employer)** je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel (Public official)** je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky (Prohibited practice)** znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Pelhřimově dne 25. 11. 2015

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

SWIETELSKY stavební s.r.o. , odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

[Redacted signature block] ®

FL

[Handwritten mark]

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.2
ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 00014915

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/19 Kámen - Leskovice“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 519686 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky



nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 11.11.2015

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: **I/19 Kámen - Leskovice**

Společnost: **SDRUŽENÍ SWIETELSKY + MTS, Kámen - Leskovice**
se sídlem: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD,
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČ: 480 35 599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26.
11. 1992, oddíl C, vložka 8032,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/19 Kámen -
Leskovice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 519686 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Asfaltové směsi frézované	11 750 t	117,- Kč/t
Asfaltové směsi vybourané	58 t	117,- Kč/t
Ocelové konstrukce určené do šrotu - Zábradlí u propustku v km 1,772 - Mříž vpustí vč. rámu - Sloupky a stojky ocel. k DZ - Dopravní značky ocel.	10 m 4 ks 6 ks 5 ks	Za cenu šrotu
Štěpkovaný materiál – křoviny, větve z lípy	38 m ²	230,- Kč/m ³
Dřevo měkké - lípa	1 ks	250,- Kč/m ³

Jednotkové ceny jsou stanoveny Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 6/2013 verze 2.0

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené
tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní
cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího
zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu
realizace zakázky.

F

255

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Pelhřimově dne 25. 11. 2015







DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6
PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ
A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost: **SDRUŽENÍ SWIETELSKY + MTS, Kámen - Leskovice**
se sídlem: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD,
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČ: 480 35 599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26.
11. 1992, oddíl C, vložka 8032,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/19 Kámen -
Leskovice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 519686 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živice), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu,
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích: Stavba bude díky své délce rozdělena na 4 stavebních etap. Způsob opravy spočívá v odfrézování stávajících asfaltových konstrukcí, opravě trhlin a položení tří nových asfaltových vrstev. Bude obnoveno vodorovné dopravní značení a provedena výměna záchytných dopravních zařízení. Jednotlivé úseky budou prováděny po polovinách za kyvadlového provozu, řízeného světelnou signalizací. Středová spára bude ošetřena zálivkou. Celková doba realizace stavby je 6 měsíců. Předpokládaný termín zahájení (realizace) stavby je 04/2016. Maximální doba pro uvedení stavby do provozu je 5 měsíců.
3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)

DIO + trvalé DZ	MŠ - Milan Šerý	1,25%	I/19 Leskovice – Starý Pelhřimov
CELKEM %		1,25%	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Pelhřimově dne 25/11. 2015

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

I/19 KÁMEN - LESKOVICE



Sdružení Swietelsky + MTS, Kámen - Leskovice



Časový harmonogram realizace díla

TÝDEN	2016																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
MĚSÍC:	DUBEN					MÁJ					ČERVEN					ČERVENEC					SRPEN					ZÁŘÍ										
SO000 Všeobecné položky																																				
SO101 Silnice I/19																																				
01 FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY																																				
02 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC, PŘÍKOPŮ																																				
03 VÝSPRAVA TRHLIN																																				
04 SPOJOVACÍ POSTŘÍK + VMT																																				
05 SPOJOVACÍ POSTŘÍK + ACL																																				
06 SPOJOVACÍ POSTŘÍK + ACO																																				
07 DOSYPÁNÍ KRAJNIC																																				
08 PROPUSTEK																																				
SO181 DIO - Silnice I/19																																				
SO190.1 Dopravní značení silnice I/19																																				

Předpokládaný termín zahájení prací:

04/2016

Dokončení prací:

08/2016

Lhůta realizace stavby:

5 měsíců

V Pelhřimově dne 25. 11. 2015

263
K

I/19 KÁMEN - LESKOVICE



Sdružení Swietelsky + MTS, Kámen - Leskovice



Finanční harmonogram realizace díla

TÝDEN	2016																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MĚSÍC	Leden 2016						Únor 2016					Březen 2016					Duben 2016					Květen 2016											
S0000 Všeobecné položky																																	
S0101 Silnice I/19																																	
01 FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY																																	
02 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC, PŘÍKOPŮ																																	
03 VÝSPRAVA TRHLIN, LOKÁLNÍ VÝSPRAVY, KRAJNICE																																	
04 SPOJOVACÍ POSTŘÍK + VMT																																	
05 SPOJOVACÍ POSTŘÍK + ACI																																	
06 SPOJOVACÍ POSTŘÍK + ACO																																	
07 DOSYPÁNÍ KRAJNIC, SVODIDLA, DOKONČOVACÍ PRÁCE																																	
08 PROPUSTEK																																	
S0181 DIO - Silnice I/19																																	
S0190.1 Dopravní značení silnice I/19																																	

Předpokládaný termín zahájení prací:
 Dokončení prací:
 Lhůta realizace stavby:

04/2016
 08/2016
 5 měsíců



PH

V Pelhřimově dne 25. 11. 2015

265

H

I/19 KÁMEN - LESKOVICE



Sdružení Swietelsky + MTS, Kámen - Leskovice



Harmonogram předávání RDS

TÝDEN	2016																														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MĚSÍC																															
SO000 Všeobecné položky																															
SO101 Silnice I/19																															
01 FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY																															
02 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC, PŘÍKOPŮ																															
03 VÝSPRAVA TRHLIN																															
04 SPOJOVACÍ POSTŘÍK + VMT																															
05 SPOJOVACÍ POSTŘÍK + ACL																															
06 SPOJOVACÍ POSTŘÍK + ACO																															
07 DOSYPÁNÍ KRAJNIC																															
08 PROPUSTEK																															
SO181 DIO - Silnice I/19																															
SO190.1 Dopravní značení silnice I/19																															

Předpokládaný termín zahájení prací:
 Dokončení prací:
 Lhůta realizace stavby:

04/2016
 08/2016
 5 - měsíců

V Peňhřimově dne 25. 11. 2015


267

A

I/19 KÁMEN - LESKOVICE

SDRUŽENÍ SWIETELSKY + MTS, KÁMEN - LESKOVICE

SCHÉMA STAVENIŠTĚ

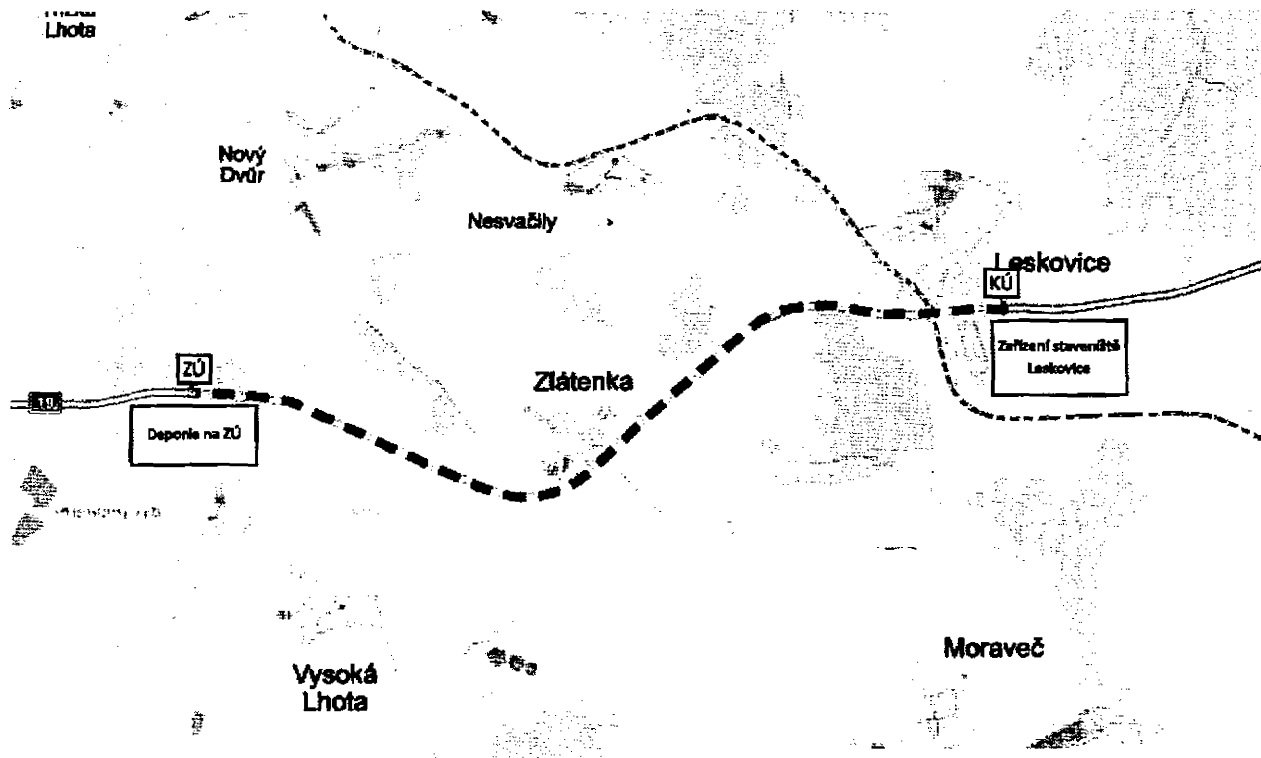

v Pelhřimově dne 25. 11. 2015

69

8

„Závazné prohlášení o budoucí spolupráci“

Jako osoba oprávněná zastupovat společnost

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MŠ, s. r. o.
Jihlava, Hruškové Dvory 74, PSČ 586 01
IČ:276 653 21

prohlašujeme na svou čest , že v případě úspěchu společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o , odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD , se sídlem K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ: 480 35 599 , při účasti ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby :

„I/19 KÁMEN - LESKOVICE“

se zavazujeme , že pro tuto společnost jako subdodavatel provedeme práce spojené se zajištěním dopravně – inženýrských opatření a další práce související s dopravním značením.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z nedodržení výše uvedeného závazku .

V Jihlavě dne 23. 11. 2015

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 50144

Datum zápisu:	3. prosince 2005
Spisová značka:	C 50144 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	Dopravní značení MŠ, s.r.o.
Sídlo:	Jihlava - Hruškové Dvory 74, PSČ 58601
Identifikační číslo:	276 65 321
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje jednatel.
Společníci:	
Společník:	
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč Splaceno: 200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7
SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost: **SDRUŽENÍ SWIETELSKY + MTS, Kámen - Leskovice**
se sídlem: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD,**
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČ: 480 35 599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26.
11. 1992, oddíl C, vložka 8032,


jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/19 Kámen - Leskovice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 519686 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
SDRUŽENÍ SWIETELSKY + , Kámen - Leskovice	IČ: 480 35 599	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD K Silu 1143,393 01 Pelhřimov

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Pelhřimově dne 25. 11. 2015

System výstupní kontroly RDS

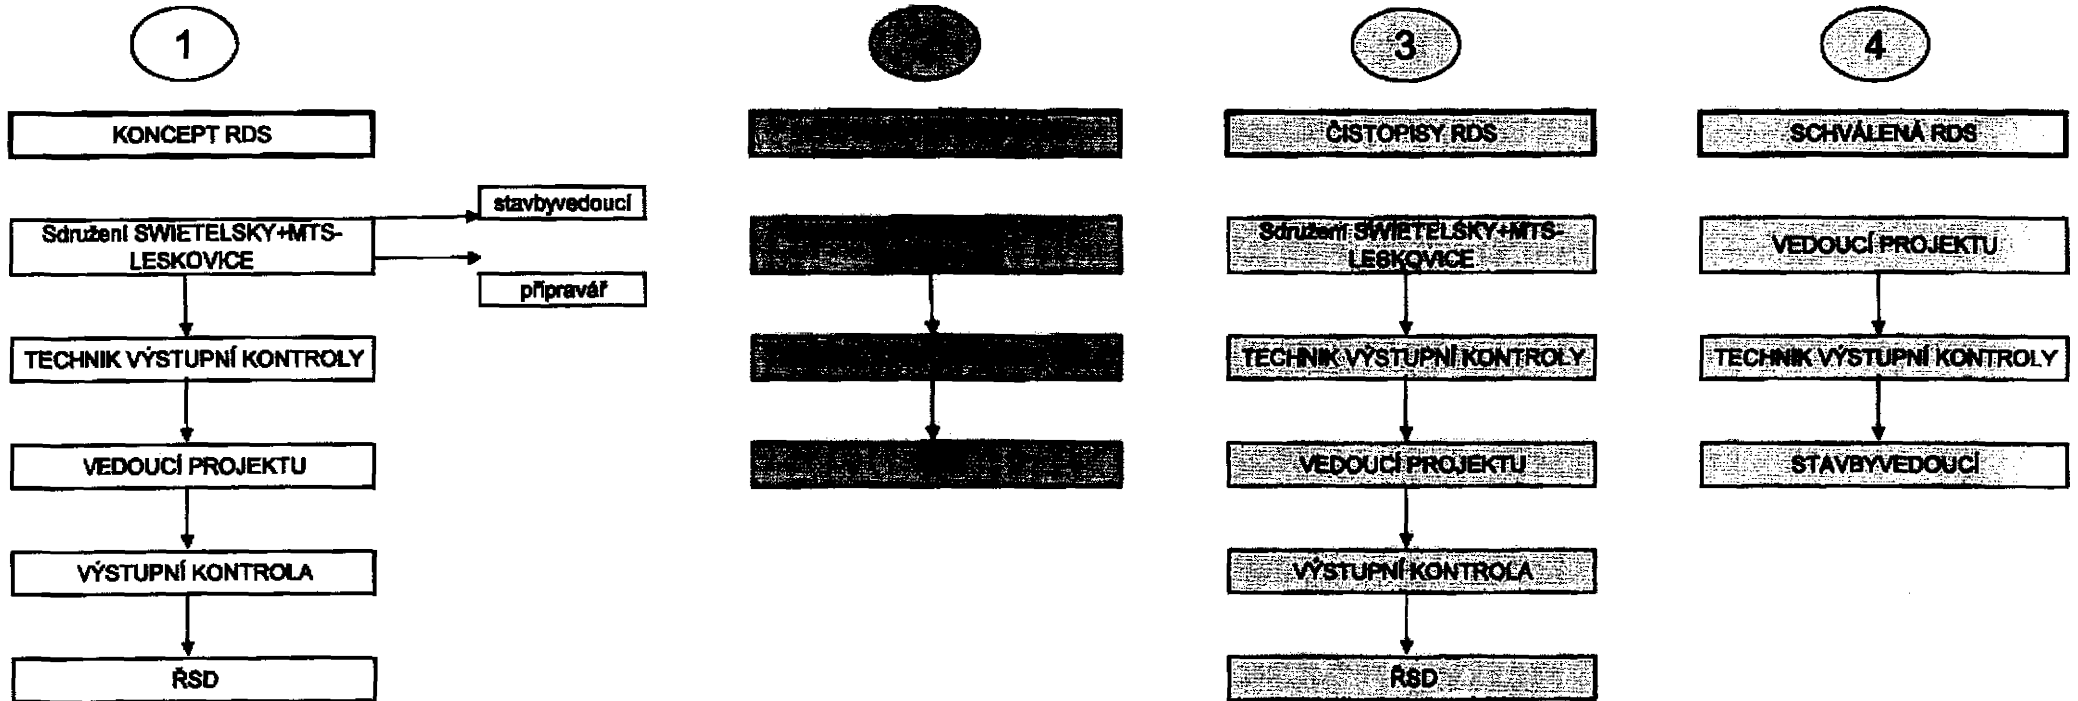

V Pelhřimově dne 25. 11. 2015

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.8
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: **SWIETELSKY stavební s.r.o.,**
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD,

Sídlo vedoucího účastníka: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČ 480 35 599 DIČ CZ48035599

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26.
11. 1992, oddíl C, vložka 8032,

Telefon / Fax 565 333 150 / 387 002 710

Obchodní firma vedoucího účastníka: společnost s ručením omezeným

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):
Netýká se

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice:

Telefon / Fax

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

- i) **METROSTAV a. s.,** Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, Česká
Republika

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

SDRUŽENÍ SWIETELSKY + MTS, KÁMEN – LESKOVICE

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti
s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a
nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny ostatní
účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků,
a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky sdružení
bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení („Smlouva“)

- i) Datum uzavření: 11. 11. 2015
ii) Místo: Pelhřimov
iii) Příloha – Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

SWIETELSKY stavební s.r.o., 60%

METROSTAV a. s, 40%, ČINNOSTI ROZDĚLENY PO ÚSECÍCH

V Pelhřimově dne 25. 11. 2015

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost: **SDRUŽENÍ SWIETELSKY + MTS, Kámen - Leskovice**
se sídlem: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD,
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČ: 480 35 599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26.
11. 1992, oddíl C, vložka 8032,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/19 Kámen -
Leskovice“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 519686 (dále jen „uchazeč“), tímto
závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným
vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném
znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které
požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	NEVZTAHUJE SE			
2.				

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí,
výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či

obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	NEVZTAHUJE SE			
2.				


3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Pelhřimově dne 25. 11. 2015

F


SM

SWIETELSKY stavební s.r.o.

a

Metrostav a.s.

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

SWIETELSKY

Název akce: I/19 Kámen – Leskovice

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

Č. smlouvy SWIETELSKY stavební s.r.o.: S16-043-0161

Č. smlouvy Metrostav a.s.: OS15040531

uzavřená mezi:

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
Na základě plné moci: I
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

- dále jen **společník nebo správce**

Obchodní firma: **Metrostav a.s.**
Sídlo: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

- dále jen **společník**

1. Předmět

1.1. Zadavatel **Ředitelství silnic a dálnic ČR** se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4 (dále jen zadavatel) vyhlásil otevřené výběrové řízení veřejné zakázky na realizaci stavby:

"I/19 Kámen – Leskovice"

1.2. V návaznosti na vyhlášení tohoto výběrového řízení zakládají společníci touto smlouvou společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem: **Sdružení Swietelsky + MTS, Kámen - Leskovice**
sídlo společnosti: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

1.4. Výše podílu účasti jednotlivých společníků na činnosti společnosti činí:

- **Swietelsky stavební s.r.o. (správce) – 60 %**

- **Metrostav a.s. (společník) - 40 %**

1.5. Účelem společnosti je získání veřejné zakázky na zhotovení výše citované stavby a dále, pokud zadavatel uzavře se společností na podkladě společné nabídky společníků smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“), provedení tohoto Díla společníky této společnosti.

1.6. Společnost vzniká na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká po dosažení účelu,

pro který byla založena, tj. po splnění všech ustanovení Smlouvy se zadavatelem. Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel soutěž zruší, nepřijme žádnou nabídku nebo uzavře smlouvu s jiným uchazečem.

- 1.7. Správcem společnosti je **SWIETELSKY stavební s.r.o.**, odštěpný závod **Dopravní stavby VÝCHOD** a podpisem této smlouvy přebírá odpovědnost za Smlouvu.
- 1.8. Ze závazků vyplývajících z účasti v otevřeném řízení a ze závazků vyplývajících ze Smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a společností, jsou všichni společníci ve vztahu k zadavateli a třetím osobám odpovědní společně a nerozdílně.
- 1.9. Ve vztahu k zadavateli je vedoucí společník za podmínek této smlouvy zplnomocněn ostatními společníky:
 - podat společnou nabídku společnosti na zhotovení daného Díla
 - před uzavřením Smlouvy mezi zadavatelem a společností zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se podání společné nabídky
 - po uzavření Smlouvy zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se realizace Díla, je pověřen, aby dostával pokyny pro každého společníka, provádění Smlouvy včetně plateb je v jeho odpovědnosti

2. Práva a povinnosti společníků, dodávky a výkony, riziko

- 2.1 Vůči zadavateli jsou společníci zavázáni realizovat všechny dodávky a výkony, které jsou nutné ke splnění Smlouvy se zadavatelem společně a nerozdílně.
- 2.2 Členové sdružení se dohodli, že do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo uzavřené se zadavatelem uzavřou Dodatek č. 1 k této smlouvě, jehož předmětem bude detailní vymezení a přerozdělení kompetencí společníků společnosti při realizaci zakázky blíže specifikované v článku I. této smlouvy.

2.3 Vedoucí společník společnosti má ve stádiu přípravy, zpracování a předložení nabídky, příp. její realizace, následující práva a povinnosti:

- v případech jednání za společníky, jednat vždy za spoluúčasti zástupce ostatních společníků společnosti, a to vyjma případů, kdy k takovému jednání bude vedoucí společník dalšími společníky předem zmocněn nebo v případě naléhavosti takového jednání, kdy nebude možné z hlediska časového účasti společníka zajistit;
- zajistit koordinaci činnosti společníků společnosti při zpracování nabídky;
- podepsat nabídku, včetně návrhu smlouvy o dílo, jménem všech společníků společnosti;
- včas předat podepsanou kompletní nabídku společnosti zadavateli;
- zajistit dle požadavků zadavatele zakázky požadovanou jistotu ve smyslu zadání a zákona o veřejných zakázkách k zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení;
- zpracovat příslušnou část nabídky do otevřeného zadávacího řízení v rozsahu týkajícím se předmětu jeho činnosti a dohodnutého rozsahu účasti;
- v případě výběru nabídky jako nejvhodnější projednat a společně s ostatními společníky společnosti uzavřít smlouvu o dílo se zadavatelem a realizovat komplexně svůj podíl na díle.

Další společníci společnosti mají ve stádiu přípravy, zpracování a předložení nabídky, příp. její realizace, následující práva a povinnosti:

- zpracovat příslušnou část nabídky do otevřeného zadávacího řízení v rozsahu týkajícím se předmětu jeho činnosti a dohodnutého rozsahu účasti;
- předat zpracovanou část nabídky vedoucímu společníkovi společnosti v takovém předstihu, aby vedoucí společník mohl řádně splnit povinnost podání nabídky;
- v případě výběru nabídky jako nejvhodnější účastnit se na výzvu vedoucího společníka projednání podmínek smlouvy o dílo se zadavatelem (objednatelem) včetně jejich případných dodatků, spolu s vedoucím společníkem smlouvu o dílo se zadavatelem (objednatelem), resp. dodatky k ní, podepsat a realizovat komplexně svůj podíl na Díle;

- účastnit se, na výzvu vedoucího společníka, všech jednání, která souvisejí s předmětem plnění společníků této společnosti.
- 2.4 Ve vnitřním vztahu je každý společník sám zavázán vykonat svůj rozsah plnění nutný ke splnění Smlouvy se zadavatelem. Každý společník uzavře se svými subdodavateli smlouvu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Koordinace prostřednictvím vedoucího společníka **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD** zůstává tímto nedotčena.
- 2.5 Společníci jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů společnosti a starat se o dosažení účelu společnosti.
- 2.6 Každý ze společníků je povinen organizovat provádění svého rozsahu plnění tak, aby byl ve lhůtách sjednaných se zadavatelem realizován nejen jeho rozsah plnění, ale aby bylo i dalším společníkům umožněno řádné provedení jeho rozsahu plnění ve lhůtě sjednané se zadavatelem.
- 2.7 Případné vícenáklady spojené s realizací díla nese každý společník za svůj rozsah plnění. To však neplatí při vícenákladech vzniklých v důsledku toho, že jiný společník nespínil řádně a včas své povinnosti. V takovém případě je vícenáklady povinen nést ten společník, který jejich vznik zavinil.
- 2.8 Podíly společníků na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě a přerozdělení kompetencí společníku při realizaci zakázky společností určí písemný Dodatek k této smlouvě o společnosti uzavřený v souladu s bodem 2.2 této smlouvy.
- 2.9 Každý Společník je povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 ZVZ pouze takové informace a podklady, které odpovídají skutečnosti. Každý Společník je rovněž povinen mít k dispozici podklady prokazující správnost a pravdivost informací a podkladů, které předkládá k prokázání splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 ZVZ.
- 2.10 V případě, že Společník zajišťuje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 ZVZ prostřednictvím subdodavatele, je povinen zajistit a prověřit, že informace a podklady předložené příslušným subdodavatelem odpovídají skutečnosti. Společník je rovněž povinen zajistit od subdodavatele, případně získat od třetích osob, podklady prokazující správnost a pravdivost subdodavatelem předložených informací a podkladů.
- 2.11 Na výzvu Správce/Dalšího Společníka je každý Společník bez zbytečného odkladu povinen:
- 2.11.1 předložit Správci/Dalšímu Společníkovi podklady a informace, ze kterých plyne, že informace a podklady předložené samotným Společníkem, stejně jako prostřednictvím jeho subdodavatele, k prokázání kvalifikace dle § 50 odst. 1 ZVZ odpovídají skutečnosti;
- 2.11.2 poskytnout Správci/Dalšímu Společníkovi veškerou součinnost nezbytnou k ověření správnosti a pravdivosti podkladů a informací předkládaných samotným Společníkem, stejně jako prostřednictvím jeho subdodavatele, k prokázání kvalifikace dle § 50 odst. 1 ZVZ.
- 2.12 Porušení povinností dle odst. 2.10, 2.11 a 2.12 výše Společníkem je považováno za podstatné porušení povinností z této Smlouvy dle § 2740 občanského zákoníku, pro které může být Společník ze Společnosti vyloučen.

3. Odpovědnost společností vůči třetím osobám

- 3.1 Společníci odpovídají zadavateli a třetím osobám společně a nerozdílně za splnění závazků vyplývajících ze Smlouvy se zadavatelem. V interním vztahu je každý společník vzhledem k jinému společníkovi zodpovědný za oprávněné nároky zadavatele nebo třetí osoby, které vzniknou z jeho viny při realizaci jeho

dodavatelského podílu uvedeném ve článku I bode 1.4 této smlouvy (včetně jeho podzhotovitelů a jejich podzhotovitelů).

- 3.2 Pokud budou vůči jednomu společníkovi vzneseny nároky, za které odpovídá jiný společník, musí společník, který vznik těchto nároků zaviniil, tyto nároky uspokojit, jsou-li vzneseny oprávněně.

4. Pojištění, garance, ručení

- 4.1 Vedoucí společník je povinen obstarat veškeré bankovní záruky požadované zadavatelem, přičemž náklady na zajištění této bankovní záruky ponosou všichni společníci v poměru uvedeném ve článku I bodě 1.4 této smlouvy, popř. v rozsahu podílů upravených dodatkem dle odst. 2.8 výše.
- 4.2 Vedoucí společník je povinen obstarat veškerá pojištění požadovaná zadavatelem v souladu se zadávacími podmínkami, přičemž náklady na pojistné ponosou všichni společníci v poměru uvedeném ve článku I bode 1.4 této smlouvy, popř. v rozsahu podílů upravených dodatkem dle odst. 2.8 výše.

5. Vystoupení ze společnosti

- 5.1. Společník může ze společnosti vystoupit; ne však v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků. Pro tento případ sjednávají společníci tří měsíční výpovědní dobu, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi všem společníkům společnosti.

6. Nabytí účinnosti a délka trvání smlouvy

- 6.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců všech smluvních stran.

- 6.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí:

- pokud zadavatel neuzavře se společností Smlouvu,
- pokud zadavatel zruší výběrové řízení nebo nepřijme žádnou nabídku,
- pokud z jakýchkoliv důvodů nebude dané Dílo realizováno,

po dosažení účelu, pro který byla společnost založena, tj. po splnění všech závazků ze Smlouvy uzavřené se zadavatelem.

7. Zákaz konkurence

- 7.1 Po dobu účinnosti této Smlouvy není žádný ze Společníků oprávněn uzavřít se zadavatelem či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo vyloučila nebo omezila možnost kteréhokoliv společníka na získání nebo plnění Zakázky. Společníci současně prohlašují, že výše uvedenou smlouvu či dohodu se zadavatelem či třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této Smlouvy.
- 7.2 Společníci se dále zavazují, že v rámci Zadávacího řízení nepředloží samostatně anebo ve spojení s třetí osobou další nabídku, že nebudou působit jako subdodavatelé žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak neučinila ani žádná z osob, které jsou ve vztahu ke společníkovi ovládanými osobami. Společníci současně prohlašují, že žádná další nabídka specifikovaná v tomto odstavci před podpisem této Smlouvy nebyla předložena.

8. Ochrana údajů

- 8.1 Společníci se zavazují, že veškeré informace, které se dozvěděli od druhého společníka Společnosti v souvislosti s jejich spoluprací v rámci této smlouvy, použijí výhradně pro účely přípravy nabídky a realizace

Díla. Tyto informace budou dávány k dispozici třetím osobám jenom do míry nutné pro přípravu nabídky a realizaci Díla.

9. Řešení sporů

9.1 Společníci budou řešit vzájemné spory vzniklé z jejich účasti ve společnosti především vzájemnou dohodou. Pokud se takovéto spory nepodaří dohodou vyřešit, budou je společníci řešit u Okresního soudu v Českých Budějovicích.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Společníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

10.2 Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

10.3 Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a ostatními příslušnými právními předpisy.

10.4 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení (závazků) této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru zamýšlenému touto smlouvou. V případě, že nastane situace dle tohoto odstavce, zavazují se společníci postupovat zejména tak, aby nebyl ohrožen účel Společnosti dle této smlouvy.

10.5 Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, každý s platností originálu. Každý společník obdrží 1 výtisk, jeden je určen pro zadávací řízení.

V Pelhřimově dne: 11.11. 2015

Swietelsky stavební s.r.o.

PLNÁ MOC

Zmocnitelé:

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupená: _____, členem představenstva

členem představenstva

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

jakožto společník

uděluje tímto

plnou moc

Zmocněnci

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupená: _____, vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci Ing. Radkem

Plechatou – obchodním ředitelem a _____ - vedoucím obchodního oddělení

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 48035599

jako Správci společnosti:

„Sdružení Swietelsky + MTS, Kámen – Leskovice“

k podpisu a podání předem vzájemně odsouhlasené společné nabídky na realizaci veřejné zakázky
„I/19 Kámen - Leskovice“

- včetně všech dalších dokumentů tvořících součást této nabídky nebo s touto nabídkou souvisejících
- k jednání se zadavatelem po celou dobu zadávacího řízení
- k podání námitek zadavateli, příp. k podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonu zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se činnosti společníků podle smlouvy o společnosti a realizace smlouvy o dílo po celou dobu plnění zakázky
- k podepisování za Společnost ve věcech souvisejících s realizací veřejné zakázky
- k uplatňování nároků vyplývajících ze smlouvy o dílo vůči zadavateli
- k přijímání pokynů od zadavatele týkajících se provádění díla
- k přijímání plateb od zadavatele a k poskytování části přijatých plnění v dohodnutém rozsahu společníků společnosti

V Pelhřimově dne 11.11 2015

Zmocněnec SWIETELSKY stavební s.r.o. tuto plnou moc v plném rozsahu přijímá

F

✓

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 2 - PODMÍNKY SMLOUVY O DÍLO

DÍL 2, ČÁST 1 FORMULÁŘ SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Název veřejné zakázky: I/19 Kámen - Leskovice

Číslo veřejné zakázky: 12PT-001077

10/2015





3.1.1

2

F

X

335

Změnový list

Stavby a evidenční číslo Stavby: Kámen - Leskovice, 500 111 0006 Stavby stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): obecné a předběžné položky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 1
Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.2.2016 (dále jen Smlouva): 12PT-001077 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení Swietelsky + MTS, Kámen - Leskovice		

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Důvodnění změn množství položek: viz. Samostatná příloha v dokladové části ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-10 209,58		-10 209,58

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	_____	datum	16. 12. 2016	_____
Asistent Správce stavby	jméno	_____	_____	_____	_____
Supervize	jméno	_____	datum	_____	podpis _____
Správce stavby	jméno	_____	rá	datum 22. 12. 2016	podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušný oprávněný jednatel jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	_____	datum	22. 12. 2016	podpis _____
Zhotovitel	jméno	_____	datum	16. 12. 2016	podpis _____

Číslo paré:

ZÁPIS

projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

stav Stavby: I/19 Kámen - Leskovice

číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 000/1

stav stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a předběžné položky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

304 150,57

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	304 150,57	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-10 209,58	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-10 209,58	293 940,99	-10 209,58	-3,36%

schvázení (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Stavbyvedoucí: souhlasím/nesouhlasím

Projektant (autorský dozor): souhlasím/nesouhlasím

Stavební dozor: souhlasím/nesouhlasím

Stavbař: souhlasím/nesouhlasím Ing.

Stavbař RSD ČR odpovědný za cenové projednání: souhlasím/nesouhlasím Ing. I

-
-
S
S
-
O
S
O
-
1
B

Změnový list

Stavba a evidenční číslo Stavby: Kámen - Leskovice, 500 111 0006	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 2
--	---	------------------------

Objekt smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.2.2016 (dále jen Smlouva): 12PT-001077

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Objednatel: Sdružení Svietelsky + MTS, Kámen - Leskovice

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

Autor změny: Zhotovitel

Obsah Změny:

Podrobnosti změn množství položek: viz. Samostatná příloha v dokladové části ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-8 999 919,66	0,00	-8 999 919,66

Objednatel vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 16. 12. 2016 podpis

Objednatel (Správce stavby) jméno

datum 19. 12. 16 podpis

Objednatel (Zhotovitel) jméno

datum podpis

Objednatel (Stavba) jméno

datum 22. 12. 2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, změn, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci v souladu s předpisem dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel právně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného Stavby, budou provedeny Změny dle této Smlouvy shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu. Smlouva se mění v rozporu s Smlouvou. Smlouva se mění v rozporu s Smlouvou nedotčeny. Na důkaz této dohody jsou vypracovány tyto písemnosti.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) jméno
Směrnice č. 18/2016)

datum 22. 12. 2016 podpis

Objednatel jméno

datum 16. 12. 2016 podpis

Číslo

ZÁPIS

projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Stavby: I/19 Kámen - Leskovice	
SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/1	
stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice I/19	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
76 120 299,61

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Instalace/montážní práce	0,00	0,00	76 120 299,61	0,00

SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Instalace/montážní práce	-8 999 919,66	0,00	0,00	0,00%

SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
Instalace/montážní práce	-8 999 919,66	67 120 379,95	-8 999 919,66	-11,82%

Podpis (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Stavbyvedoucí: souhlasím/nesouhlasím

12. 2016

Projektant (autorský dozor): souhlasím/nesouhlasím

Stavbyvedoucí dozor: souhlasím/nesouhlasím

Stavbyvedoucí: souhlasím/nesouhlasím Ing.

22. 12. 1

Ředitel RSD ČR odpovědný za cenové projednání souhlasím/nesouhlasím Ing.

20. 12.

