
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. HK 2019_0031**

mezi

CETIN a.s.

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK 2019_0031

SAP S/4 Hana: 8030000972

Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-16/1163/INV/20/2020

Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená [redacted] supervizorem, Výstavba přístupové sítě

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu [redacted]

(dále jen „**CETIN**“)

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 162

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Překládka je stavba v k.ú. Ústí nad Orlicí spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ ze dne 5.11. 2018 vydané pod čj. 772265/18, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Ústí n/O, rek. mostu 360-012_provizor. most**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (c) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17

Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **332 692,00 Kč** (slovy: tři sta třicet dva tisíc šest set devadesát dva korun českých) (dále jen „Náklady překládky stanovené na základě Projektu“). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázanosti na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované

- subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktura bude společností CETIN vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

funkce: specialista pro výstavbu sítě
[REDACTED] z

ve věcech technických: [REDACTED]

funkce: specialista pro výstavbu sítě
[REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Němec

funkce: ředitel
[REDACTED] z

ve věcech technických: [REDACTED]

funkce: technik oddělení přípravy staveb
[REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

funkce: vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED]

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené

v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
- (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK 2019_0031

SAP S/4 Hana: 8030000972

Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-16/1163/INV/20/2020


Registr smluv: ANO

CETIN

Stavebník



V Pelhřimově dne 04. 02. 2020



V Pardubicích dne 17. 02. 2020


CETIN a.s.
Ing. Miroslav Kot
supervizor, Výstavba pevné přístupové sítě


Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec
ředitel



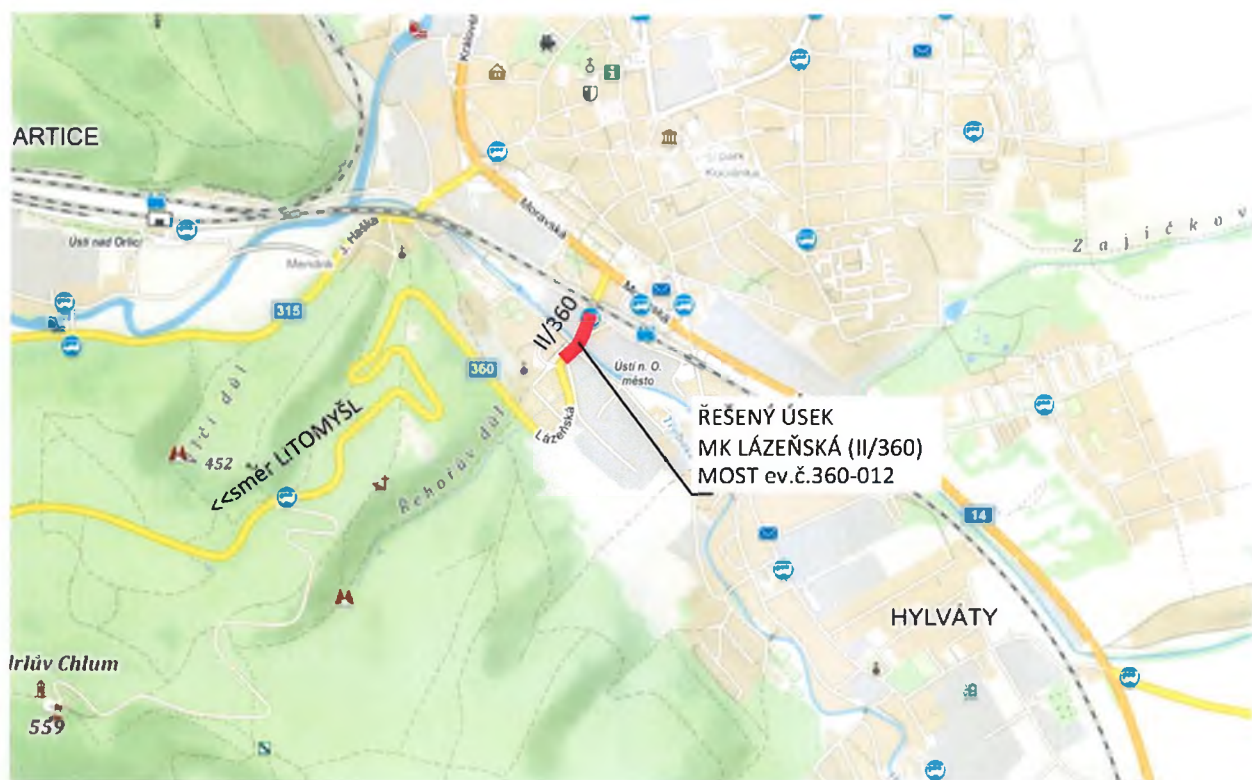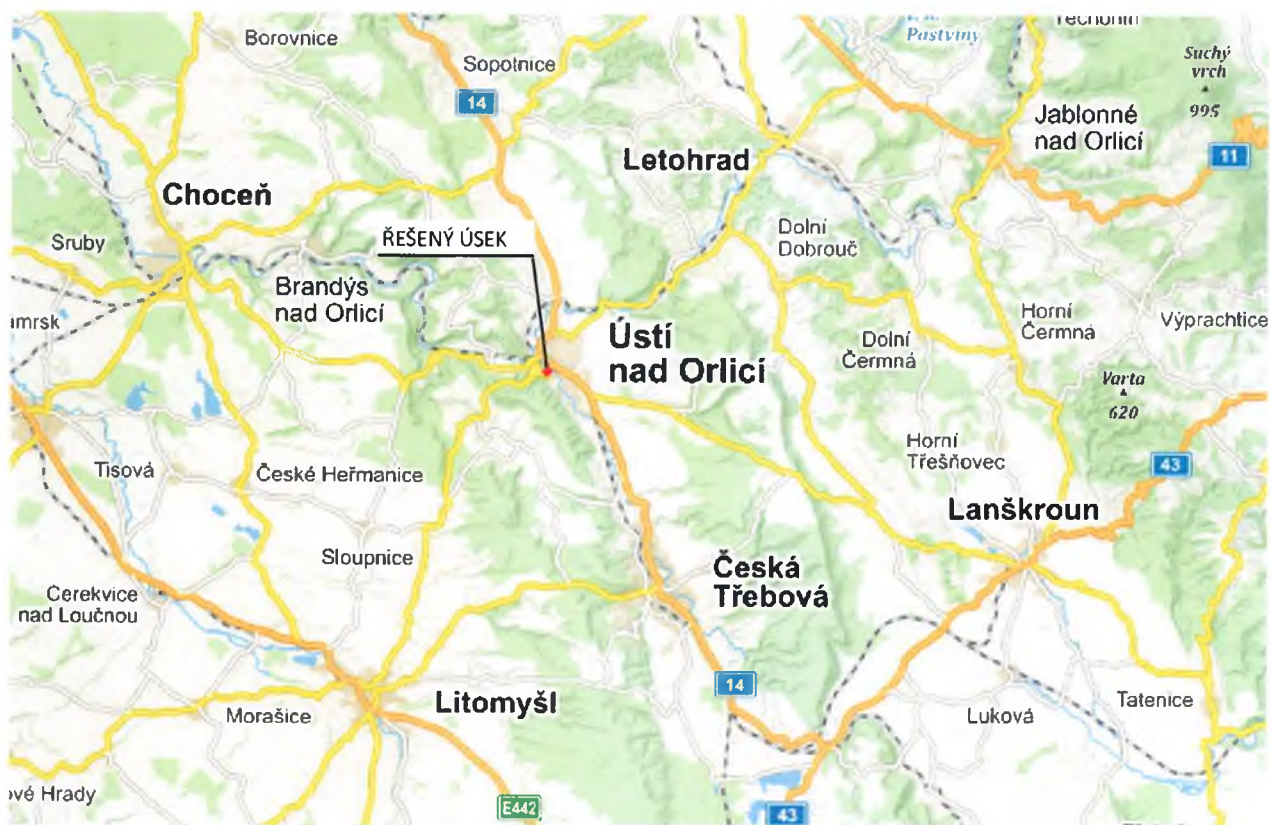

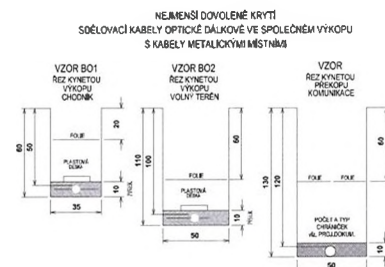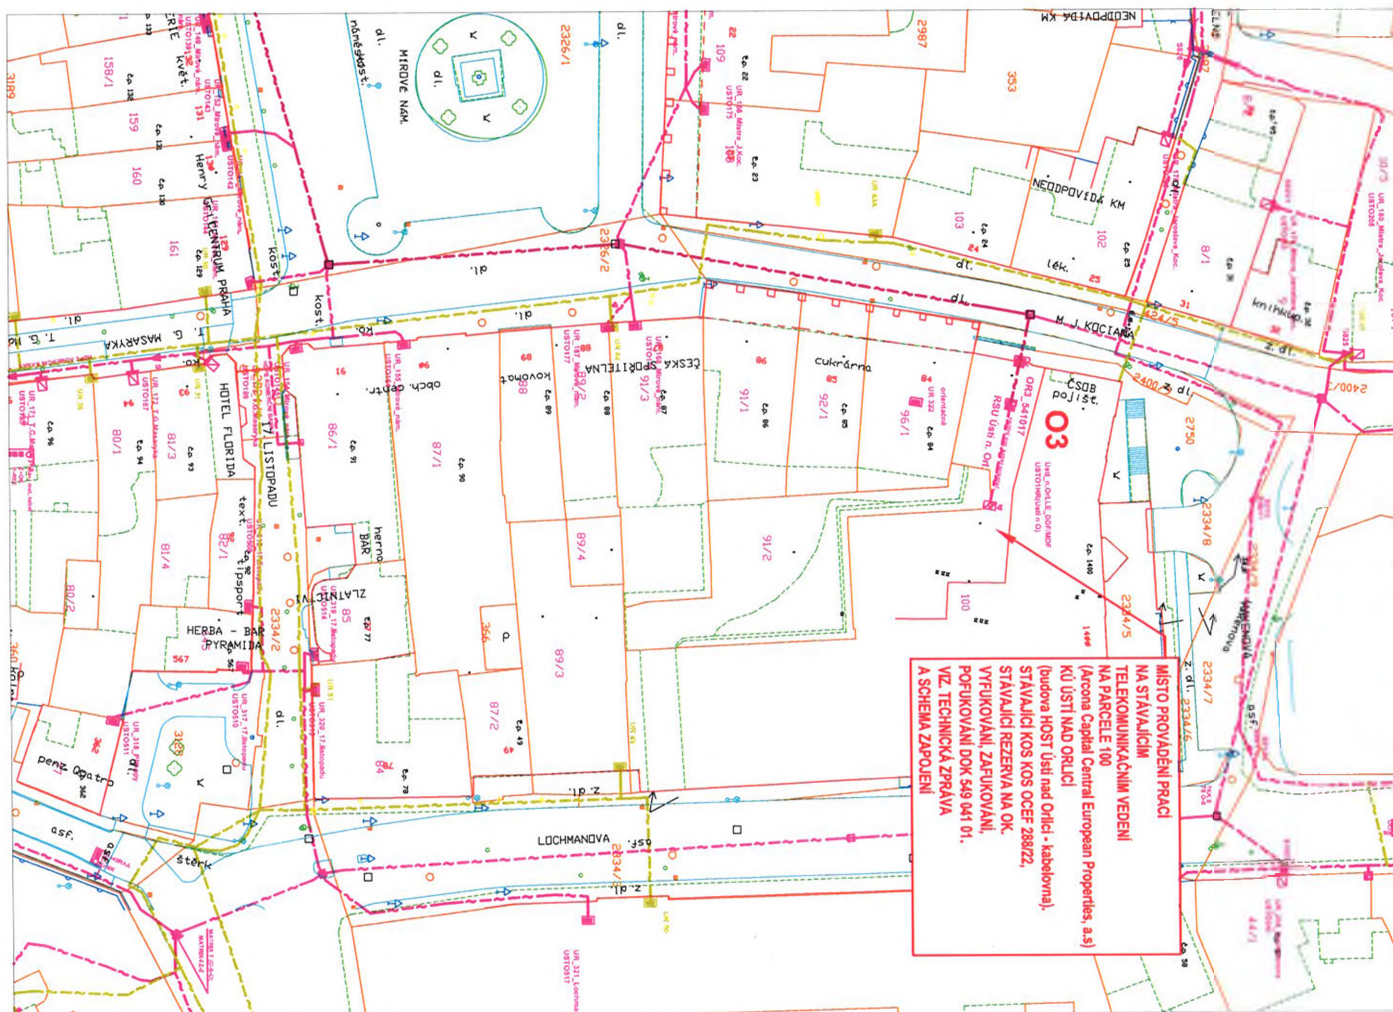

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:


- NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ - 1.ETAPA DOČASNÁ TRASA
- NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ - 1.ETAPA KONEČNÁ TRASA
- NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ - 2.ETAPA
- STAVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ZEMNÍ - TRASA VYUŽÍVANÁ PRO PŘELOŽKU
- STAVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ZEMNÍ
- PŘEKLÁDANÉ, RUŠENÉ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ ZEMNÍ
- NEPROVOZOVANÉ PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ




POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU SDĚLOVACÍCH KABELŮ JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ NACHÁZÍCÍ SE V ZÁJMĚVÉ OBLASTI POKLÁDKY TĚCHTO SDĚLOVACÍCH KABELŮ - SONDAŽI A VYTÝČENÍM. NORMATIVNÍ ULŐZENÍ KABELŮ A TRUBEK HOPE V PŘEKOPECH A VÝKOPECH JE PATROVNĚ NA TOMTO VÝKRESĚ. ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH INŽ. SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNĚ. TRASA TLK. KABELU JE OKÓTOVÁNA POUZE ORIENTAČNĚ. SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVĚNA V DOBĚ VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND.

Generální projektant:		TOMO TELEKOMUNIKACE a.s. V. Narvala 1329, 565 01 Chocot IČO: 44452948 tel. 604 234 060, e-mail: projekt@tomo.cz	
Zpracoval:	BULENA PETR	 Ing. Stanislav Marhold CTI PROJEKT V. Narvala 1329, 565 01 Chocot IČO: 44452948 tel. 604 234 060, e-mail: projekt@tomo.cz	
Zodp. projektant:	ING. STANISLAV MARHOLD		
Technická kontrola:	ING. STANISLAV MARHOLD		
Kraj:	PARDUBICKÝ	Oblast:	ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Investor:	Pardubický kraj	Stupeň:	CTN
Arco:	VPIC Ústí n/O, rek. mostu 360-012 číslo stavby 11840/19/0004		Zak. č.: 710
Obsah:	SITUACE TRASY		Arch. č.: 710
			Datum: 03/2019
			Formát: 3 A4
		Měřítko:	1:500
		Kódy:	M
		Číslo příl. výkresu:	P05

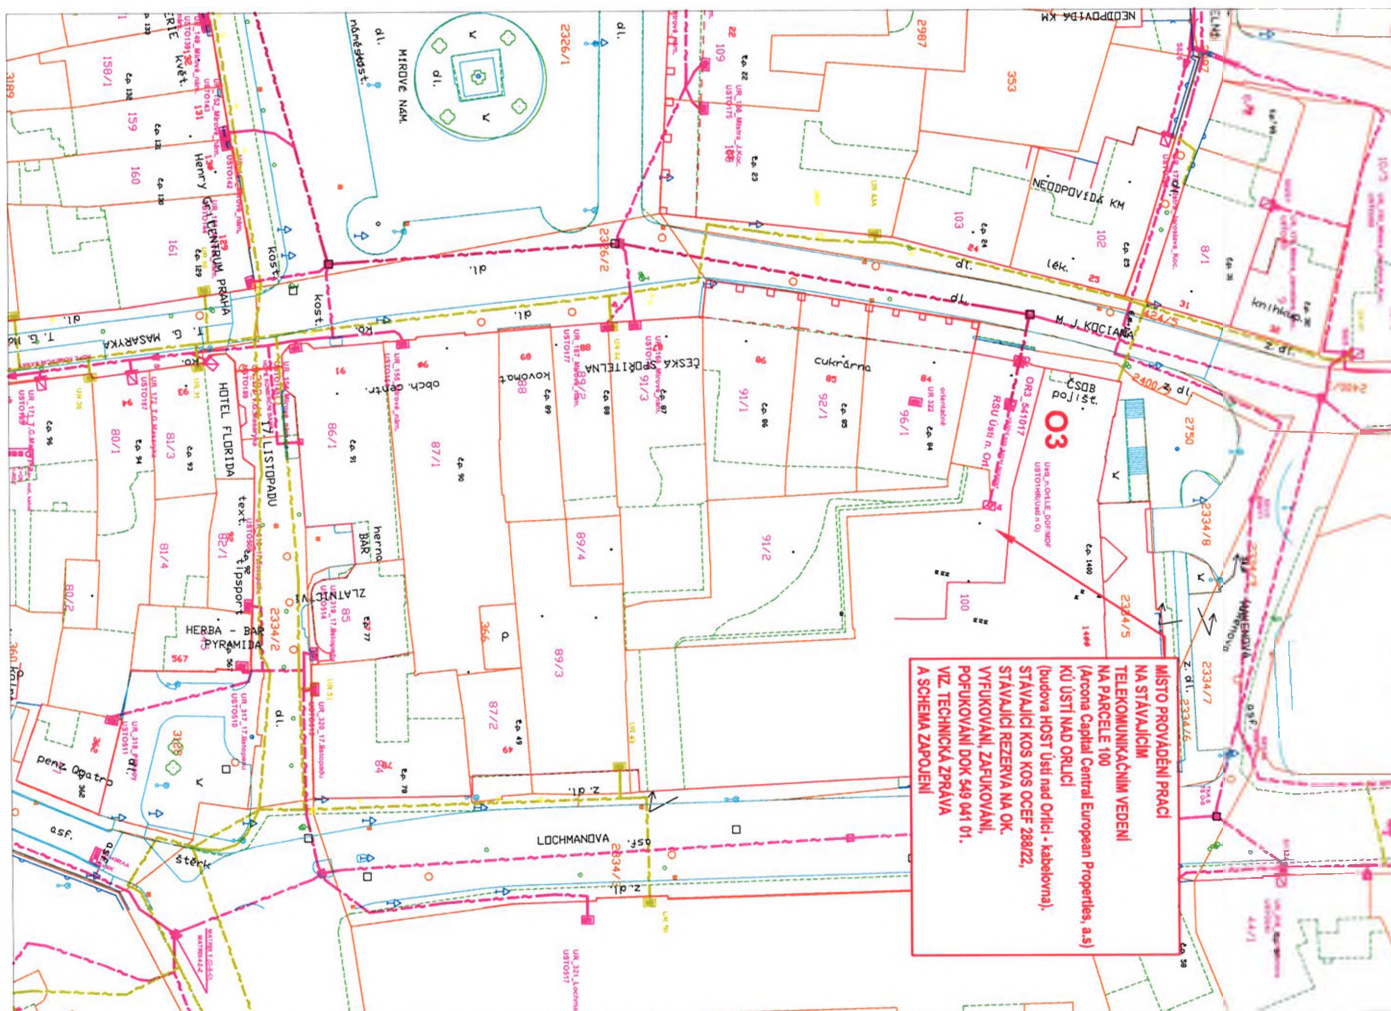

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ
SDĚLOVACÍ KABELY OPTICKÉ DÁLKOVĚ VE SPOLEČNÉM VÝKOPU
S KABELY METALICKÝMI MÍSTNĚMI



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:


- NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ - 1. ETAPA DOČASNÁ TRASA
- NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ - 1. ETAPA KONEČNÁ TRASA
- NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ - 2. ETAPA
- STAVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ZEMNÍ - TRASA VYUŽÍVANÁ PRO PŘELOŽKU
- STAVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ZEMNÍ
- PŘEKLADANÉ, RUŠENÉ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ ZEMNÍ
- NEPROVOZOVANÉ PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ




POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU SDĚLOVACÍCH KABELŮ JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZÁŘEZNY NACHÁZĚJÍCÍ SE V ZÁJMOVÉ OBLASTI POKLÁDKY TĚCHTO SDĚLOVACÍCH KABELŮ - SONDAŽNÍ A VYTÝČENÍ. NORMATIVNÍ ULOŽENÍ KABELŮ A TRUBEK HOPE V PŘEKOPECH A VÝKOPECH JE PATRNO NA TOMTO VÝKRESU. ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH INŽ. SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. TRASA TLK. KABELŮ JE OKOTOVÁNA POUZE ORIENTAČNĚ. SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVĚNA V DOBĚ VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND.


Generální projektant:		
Zpracoval:		
Zast. projektant:		
Technická kontrola:		
Kresl. PARDUBICKÝ		Ověř. ÚSTÍ NAD ORLÍ
Investor: Pardubický kraj		Stupeň: CTN
Akce:		Zak. č.: 710
VPIC Ústí n/O, rek. mostu 360-012		Arch. č.: 710
číslo stavby 11840/19/0004		Datum: 03/2019
Obsah:		Formát: 3 A4
SITUACE TRASY		Měří: 1:500
		Číslo příl. výkresu: P05
		Kódy: M



1. ETAPA

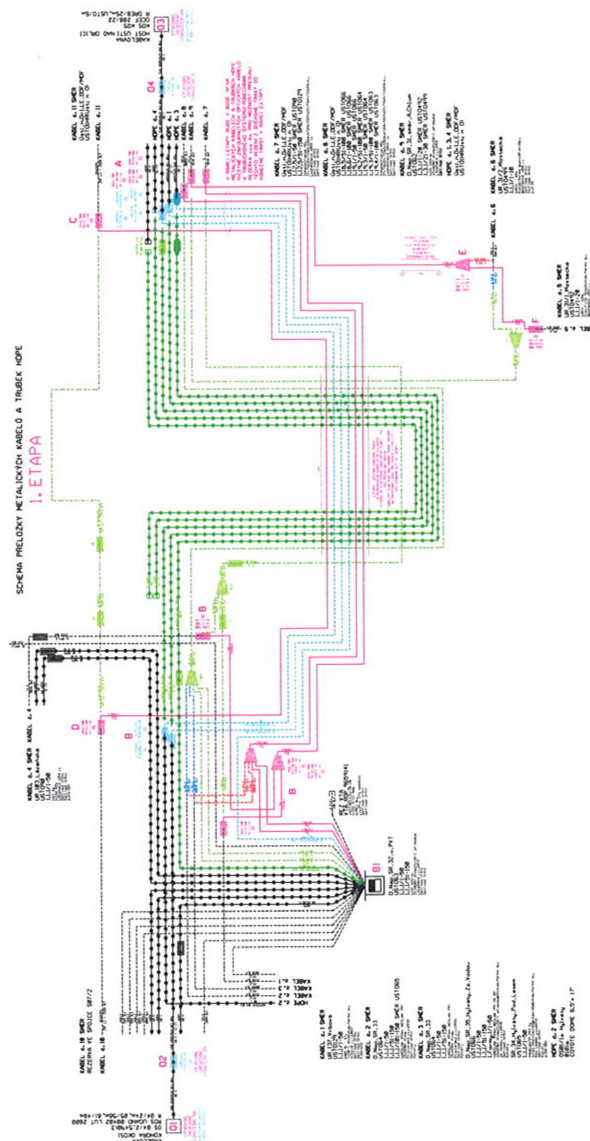

2. ETAPA

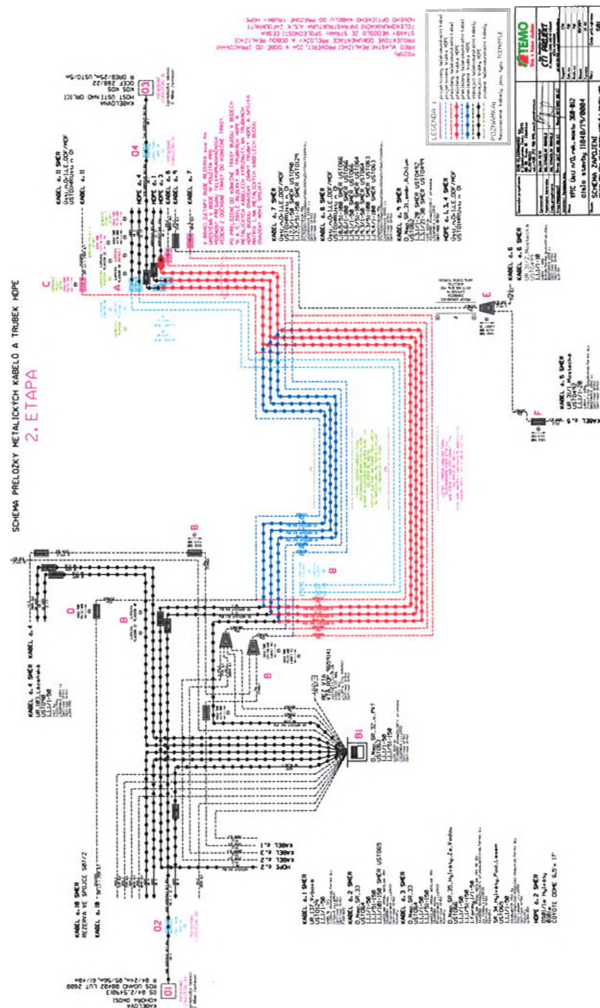

Kabel: 549 013 - DKO LITOMYSL - ÚSTÍ N.O. (ON:28.02.2019 10:35:10)

(LIMY:BS:I - USTO:BS:I) Stránka: [K] Provozni



SCHEMA PŘELOŽKY DOK 549 013
USEK USTO:BS:I Lochmanova-HOST - RETO:BS:I Retava-RSU
1. ETAPA



SCHEMA PŘELOŽKY DOK 549 013
USEK USTO:BS:I Lochmanova-HOST - RETO:BS:I Retava-RSU
2. ETAPA



LEGENDA:	
-----	projektovaný kabel
-----	existující kabel
-----	navržený kabel
-----	kabel
SCHEMA PŘELOŽKY DOK 549 013	
USEK USTO:BS:I Lochmanova-HOST - RETO:BS:I Retava-RSU	
1. ETAPA	
2. ETAPA	

(USTO:BS:I - LANS:BS:I) Stranka: [K] Provozni


1. *Introduction*



SCHEMA PRELOŽKY DOX 549 B41

ÚSEK ÚSTOJISI Lochmanova-NOST - CETRISI Václovská-RSU-mal PT

1. ETAPA

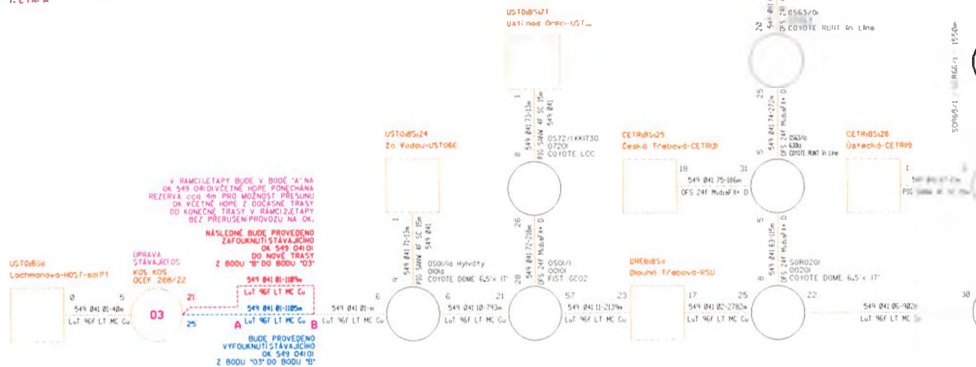


[illegible]

Trubkový kabel: 549 RAC - ÚSTÍN.O. - GTT SYCHROVA (TS) (ON:02.01.2018 10:04:37)
(USTO:BS:I - USTO:BS:9) Stránka: [K] Provozní

USTO:BS:2I
Lázeňská-UST063

549 RAC 10-TRUBKA-2m
RAC/02 10 10/8 CV 1549 RAC 64/75 2m 4 50 50m
RAC/03 10 10/8 1 1m
TS(056I/2)
06I02

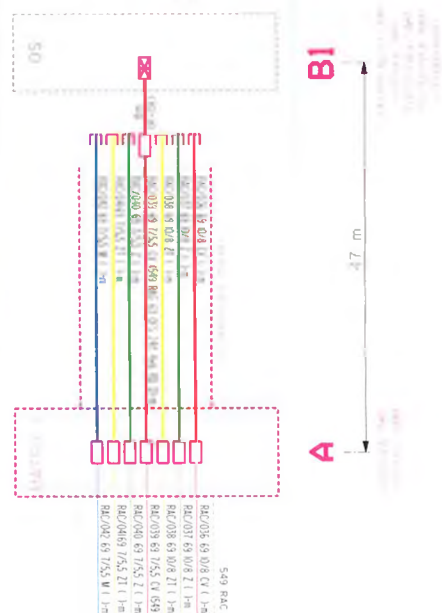

USTO:BS:20
Lázeňská-UST062

549 RAC 68-TRUBKA-5m
RAC/06 68 10/8 CV 1549 RAC 62 PG 1ANR 4F 50 15m 13m
RAC/07 68 10/8 2 1 1m

TS(056I/1)
06I01


549 RAC 67-TRUBKA-363m
RAC/08 67 10/8 CV 1 1 392m
RAC/09 67 10/8 2 1 1 392m
RAC/020 67 10/8 21 1 1 392m
RAC/021 67 1/5,5 CV 1549 RAC 60FS 241 446 RB DI 1 392m
RAC/022 67 1/5,5 21 1 1 392m
RAC/023 67 1/5,5 21 1 1 392m
RAC/024 67 1/5,5 21 1 1 392m

1. ETAPA

V RÁMCI ETAPY BUDE V BODĚ "A" NA DOK 549 0410I VČETNĚ HDPE A TS PONECHÁNA REZERVA cca 4m PRO MOŽNOST PŘESUNU OK VČETNĚ HDPE A TS Z DOČASNÉ TRASY DO KONEČNÉ TRASY V RÁMCI 2. ETAPY BEZ PŘERUŠENÍ PROVOZU NA OK.


2. ETAPA

V RÁMCI 2. ETAPY BUDE VYUŽITA REZERVA ULOŽENÁ NA OK VČETNĚ HDPE A TS V 1. ETAPĚ (BOD "A") PRO PŘELOŽENÍ Z DOČASNÉ TRASY DO KONEČNÉ TRASY BEZ PŘERUŠENÍ PROVOZU NA OK. PRO MOŽNOST POFOUKNUTÍ ZBYLÉ REZERVY OK Z BODU "A" DO BODU "B1" BUDE PROVEDENO VYŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍ HDPE A TS (BEZ PORUŠENÍ OK). NA KONCE PŘERUŠENÉ HDPE BUDE OSAZENÁ SPOJKA MATRIX I.

Generální projektant: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. U Záběhlického Zámku 233/15 106 00 Praha 10 - Záběhlice IČ: 25748253 tel: +420 272 760 095, email: temo@temo.cz		 Síť k Vaším službám	
Zpracoval: BULENA PETR Technická kontrola: ING. STANISLAV MARHOLD Zodp. projektant: ING. STANISLAV MARHOLD		 Ing. Stanislav Marhold CTI PROJEKT V. Nesvala 1329, 565 01 Chocet IČO: 44462948 tel: 604 234 065, e-mail: projekt@ctiprojekt.cz	
Kraj: PARDUBICKÝ Okres: ÚSTÍ NAD ORLICÍ Obec: ÚSTÍ NAD ORLICÍ		Investor: Pardubický kraj Akces: VPIC Ústí n/O, rek. mostu 360-012 číslo stavby 11840/19/0004	
Obsah: SCHEMA ZAPOJENÍ SCHEMA PŘELOŽKY TRUBČKOVÉHO SYSTÉMU		Stupně: CTN Zek. č.s: 710 Arch. č.s: 710 Datum: 03/2019 Formát: 2 A4 Měří: Číslo příl. výkresu Kóty: 506	


(USTO:BS:I - USTO:BS:I8) Stránka: [K] Provozni

1. 3.0 MPa

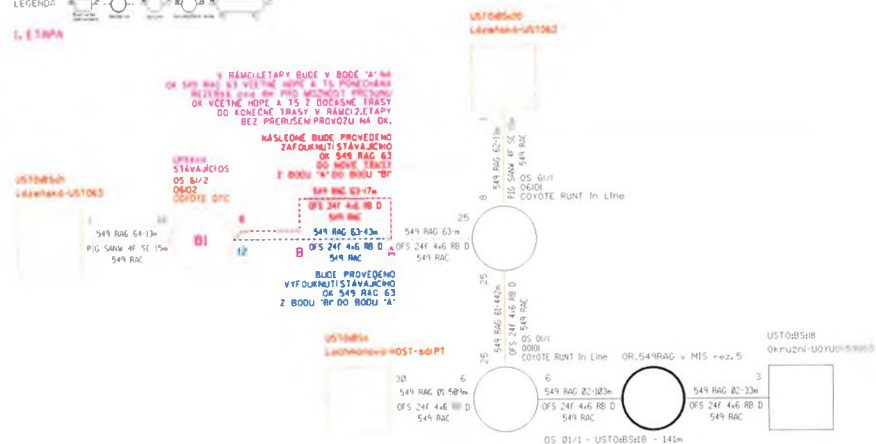

(USTO;BS;I - USTO;BS;I8) Stránka: [K] Provozni

2. ETAPA

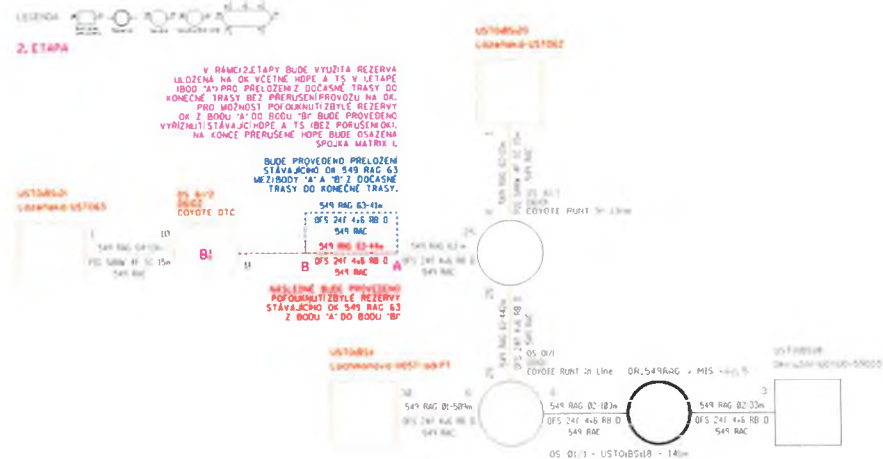

LEGENDA :

- projektovaný telekomunikačný kábel
- preložený telekomunikačný kábel
- prekladaný telekomunikačný kábel
- ručný telekomunikačný kábel
- stávajúcí telekomunikačný kábel
- stávajúcí telekomunikačný kábel majúci vzťah k predch.

[illegible]

Název stavby:

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Chocẽň

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK: 0.180

KMVYK: voz. 0.004

km otvorů: 0.000

KMP: 1.100

KMMK: 0.046

KMNT: 0.000

KMTRU: 0.000

KMOK: 0.000

KMVL: 0.000

KMTRK: 0.000

bytových HTS: 0

podnik. HTS: 0

rekreač. HTS: 0

PP HR: 0

PP UR: 0

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km

Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km

Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km

Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA 25 112,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 163 094,08 Kč

MONTÁŽ 61 855,16 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 6 381,50 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0,00 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 0,00 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 74 248,81 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč

POPLATKY 2 000,00 Kč

CELKEM: 332 691,55 Kč

STAVEB. ČINNOST 305 579,55 Kč

NESTAVEB. ČINNOST 27 112,00 Kč

.....
Zhotovil.....
Kontroloval

Seznam položek					
SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena	
		Popis			
PŘÍPRAVA					
958210	S	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks		4 937,20 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě PD úložná trasa Z1 (0,101 - 0,400 km)	20174.80 JV		20 174,80 Kč
ZEMNÍ PRÁCE					
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	97.00 m		1 796,44 Kč
952369	S	Pokládka žlabů ostatních	97.00 m		5 986,84 Kč
955265	S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	6080.96 JV		6 080,96 Kč
		Materiál a práce spojené s obetonováním chrániček (7m) včetně dopravy - beton	2,52 m3		
955551	S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	453.00 m		24 602,43 Kč
955550	S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	56.00 m		4 285,68 Kč
951549	S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	3.00 ks		111,09 Kč
955552	S	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	183.00 m		2 937,15 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	162.00 m		55 988,82 Kč
954958	S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	465.00 m		45 918,75 Kč
952355	S	Rýha v trávě 50/110	14.00 m		6 393,80 Kč
954952	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	4.00 m		6 788,68 Kč
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	165.00 m		1 833,15 Kč
951349	S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	3.00 ks		370,29 Kč
MONTÁŽ					
955031	S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	164.00 m		5 264,40 Kč
955030	S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	164.00 m		3 644,08 Kč
955029	S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	143.00 m		2 648,36 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks		641,84 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	10.00 ks		370,30 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	14.00 ks		345,66 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks		86,41 Kč
955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	30.00 ks		925,80 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	20088.00 JV		20 088,00 Kč
		Zvýšené náklady za výkop po stávajícím vedení bez jeho porušení- 162m			
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks		2 345,18 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	189.00 m		3 967,11 Kč
954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	164.00 m		6 072,92 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	164.00 m		4 252,52 Kč
954980	S	Překládka trubky úložné	164.00 m		2 612,52 Kč
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	5.00 ks		123,45 Kč
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks		357,95 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu	5208.00 JV		5 208,00 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks		2 666,09 Kč
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	5.00 ks		86,45 Kč
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks		148,12 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE					
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	65.00 m		1 444,30 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks		4 937,20 Kč
POPLATKY					
955367		Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. Správní poplatek - 2000,-	2000.00 JV		2 000,00 Kč

Limitka materiálu S1				
SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838	S	Deska krycí plast. 150x1000 mm	68.00 ks	1 174,36 Kč
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	14.00 ks	512,96 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	76.00 m	281,96 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	194.00 m	826,44 Kč
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	330.00 m	726,00 Kč
300107	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	32.00 m	1 113,92 Kč
300105	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	14.00 m	226,10 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	6.00 ks	1 177,56 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	6.00 ks	133,32 Kč
407582	S	Souprava čistící 4413S	2.00 ks	844,18 Kč
320312	S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	142,80 Kč
312863	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	2.00 ks	1 003,60 Kč
319184	S	Spona trubkySYSPRO	970.00 ks	19 041,10 Kč
301537	S	Trubička smršť. SD 190F 19,0/9,5mm černá	0.10 m	12,66 Kč
319209	S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	97.00 m	43 150,45 Kč
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	97.00 m	3 820,83 Kč
303204	S	Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35	1.00 ks	60,57 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
301685	S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	2.00 ks	0,00 Kč
403175	S	Pěna montážní Soudal 300ml	3.00 ks	0,00 Kč

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zastoupená [•]

(dále jen „**Nabyvatel**“)

a

[•]

se sídlem [•]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]
IČO: [•]
DIČ: [•]
zastoupena [•]

(dále jen „**Převodce**“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ (dále jen „**Dohoda**“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „**Rozhodnutí o umístění stavby**“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „**Stavba**“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby

stanoveny.

- 2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
- 3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
- 3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel:

Převodce:

V _____ dne _____

V _____ dne _____

CETIN a.s.

Jméno:

Funkce:

[]
