



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo smlouvy: 03403/SOPK/20
Dotační titul: OPŽP

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Zastoupený: RNDr. František Pelc
Telefon: 283 069 241

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Stanislav Koukal, ředitel RP Jižní Morava

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Ing. Martin Chytrý – Zahradnictví Zahrada

Sídlo:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
IČO: 665 57 232
DIČ:
zapsaný v živnostenském rejstříku Blansko, sp. zn. MBK 790/2017 ŽÚ/Nm
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2 Dílem se rozumí: Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě 2020-2023, dílčí zakázka DUN-OST-JIH.

Specifikace díla je uvedena v příloze č.1, č. 2 a č. 3 (včetně rozloh jednotlivých ploch, na nichž má být dílo realizováno).

(dále jen „dílo“)

Rozsah díla uvedený ve specifikaci díla je rozsah maximální. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že skutečný rozsah díla bude upřesňován objednatelem průběžně každý rok, a to na základě výsledků monitoringu vlivu opatření prováděného na základě této smlouvy (zaznamenávání vývoje lokality a reakce ekosystémů na prováděná opatření). Monitoring bude prováděn objednatelem každoročně v průběhu platnosti smlouvy. V případě omezení rozsahu díla bude v odpovídajícím rozsahu poměrně snížena jeho cena.

- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, nebo jím pověřené osoby.
- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli z Operačního programu Životní prostředí. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Opatření	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2020	DUN-2020-025, DUN-2020-028,	417 757,04	87 728,97	505 486,01
2. část	2021	DUN-2021-025, DUN-2021-027, DUN-2021-029	323 814,74	68 001,11	391 815,85
3. část	2022	DUN-2022-025, DUN-2022-028,	375 992,50	78 958,43	454 950,93
4. část	2023	DUN-2023-026, DUN-2023-027, DUN-2023-028, DUN-2023-029	479 660,95	100 728,79	580 389,74
Cena celkem			1 597 225,23	335 417,30	1 932 642,53

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří **přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.**

- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15

pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu (v žádném případě však ne později než do 11.11. každého kalendářního roku, v roce 2023 ne později než 15.10.2023) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

- 3.5 Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat Identifikační číslo projektu EIS "CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002599" a Název projektu (akce) "Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě".
- 3.6 Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.9.2023.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje provést částí díla a předat jej objednateli **v termínech uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy o dílo.**
- 4.3 Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.4 Předpokládané datum zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad: květen 2020. Dojde-li k nabytí účinnosti smlouvy k pozdějšímu datu, mohou se smluvní strany dohodnout na posunu termínu pro provedení díla podle čl. 4.2 smlouvy, a to až o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že tato smlouva nenabyde účinnosti ani do 30.6.2020, mohou se smluvní strany dohodnout na omezení rozsahu díla o 1. část (rok 2020).
- 4.5 Vznikne-li nezávisle na vůli zhotovitele mimořádná nepředvídatelná překážka, pro kterou není dočasně možné dílo provádět, mohou se smluvní strany dohodnout na posunu termínu pro provedení 1., 2. a/nebo 3. části díla podle čl. 4.2 smlouvy, a to až o dobu trvání mimořádné nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, pro kterou není dočasně možné dílo provádět. Termín však může být dle věty první posunutý maximálně do 31. 10. 2020 u 1. části (rok 2020), do 30. 11. 2021 u 2. části (rok 2021) a do 31. 10. 2022 u 3. části (rok 2022). V případě že posun termínu dle věty druhé nepostačuje, mohou se smluvní strany dohodnout na poměrném omezení rozsahu díla v části, kterou nelze provést ani v maximálně posunutém termínu.
- 4.6 Vznikne-li nezávisle na vůli zhotovitele mimořádná nepředvídatelná překážka, pro kterou není dočasně možné provádět 4. část díla (rok 2023), mohou se smluvní strany dohodnout na poměrném omezení jejího rozsahu v části, kterou nelze provést ani v maximálně posunutém termínu.
- 4.7 Místem plnění je Česká republika – NPP Dunajovické kopce. Místa plnění jednotlivých částí jsou uvedeny v příloze č. 1, č. 2 a č. 3.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provádět části díla dle čl. 3.1 smlouvy na odpovídajících lokalitách (plochách) až po předání každé lokality objednatelem spolu se sdělením bližších pokynů ze strany objednatele. Konkrétní termíny předání jednotlivých lokalit zhotoviteli budou stanoveny dohodou smluvních stran (telefonicky, emailem). Před předáním lokality zhotovitel není oprávněn začít s prováděním příslušné části díla.
- 5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.3 Strany se dohodly, že způsob provedení díla musí být v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (dále jen „Standardy“) platnými ke dni zahájení zadávacího řízení. Standardy stanoví parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR: <http://www.standardy.nature.cz>.
- 5.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí částí díla

- 6.1 O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. O předání poslední části díla vyhotoví smluvní strany závěrečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3 V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Při předání každé dílčí části díla je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k opravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2 V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu dílčí části díla připadající na předmětnou plochu (podle přílohy č. 2).
- 7.3 Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených dle vzoru uvedeného v příloze č. 4.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některého opatření v příslušné části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušné opatření v části díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Ukončení smlouvy

- 9.1 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. Uplynutí výpovědní doby má za následek ukončení platnosti smlouvy.
- 9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně či v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení druhé smluvní straně.

X. Poddodavatelé

- 10.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně věcného a procentního podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli.
- 10.2 Zhotovitel zajistí, aby se poddodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a veškeré práce poddodavatelů bude řádně koordinovat.
- 10.3 Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.

10.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 10.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené poddodavatele vykázat z místa provádění díla a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.

10.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

11.2 Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel je povinen minimálně po stejnou dobu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost).

11.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

11.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

11.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla z Operačního programu Životní prostředí. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

11.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tisni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - podrobná specifikace díla,

Příloha č. 2 - položkový rozpočet,

Příloha č. 3 - mapový zákres,

Příloha č. 4 - vzor dílčího protokolu o předání a převzetí dílčí části díla, vzor závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

V Praze dne _____

V Lipůvce dne 24. 1. 2020

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Ing. Martin Chytrý

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov

-1-

Obecné požadavky na provádění opatření:

- opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky, se kterými má příslušnost hospodařit Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, a to uvnitř Národní přírodní památky Dunajovické kopce na pozemcích p. č. 837 v k.ú. Dobré Pole, p. č. 3614/1 v k.ú. Dolní Dunajovice a p. č. 6896 a 6897 v k.ú. Březí u Mikulova
- Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016
- krátce před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření
- poměr plochy ponechané bez zásahu je vždy specifikován v popisu opatření viz tab. Příloha č. 2

Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu

Opatření bude prováděno ve vegetační sezóně, při plně rozvinutém olistění výmladků dřevin a probíhající asimilaci tj. v červnu až srpnu (termín se na jednotlivých plochách liší v závislosti na tom, jaké doplňující opatření pro potlačení výmladnosti, jestli sečení či pastva, bude na řešené ploše v daném roce uplatněno). Postřik kořenových i pařezových výmladků po předchozí vyřezávce dřevin i případného náletu dřevin ze semenné banky bude proveden herbicidem schváleným pro použití na hubení výmladků dřevin aplikací na list. Herbicid bude aplikován tak, aby při předání prací byly viditelné projevy působení herbicidu (vadnutí, žloutnutí, zasychání, hnědnutí) na všech výmladcích po předchozích vyřezávkách a náletu ze semenné banky na místech, která mají být zbavena dřevin. První aplikace tedy proběhne vždy na počátku časového rozmezí pro dané opatření. Po 30 dnech bude provedena druhá aplikace na dřive nezasažené jedince dřevin. Herbicid bude aplikován výhradně na listy likvidovaných jedinců tak, aby jim nebyly zbytečně zasaženy jiné rostliny. Na část zmlazení dřevin nebude aplikován herbicid z důvodu zachování biotopu zmlazujících křovin využívaného některými druhy bezobratlých živočichů. Rozsah a konkrétní lokalizace plochy bez aplikace budou určeny při terénní pochůzce se zadavatelem.

Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)

Ruční seč křovinořezem v rámci mozaiky degradovaných biotopů T3.3B a T3.4D bude prováděna v průběhu všech let realizace projektu. Účelem je odstranění stařiny bylin i travin (tzn. důsledné vyhrabání), odstranění živin, potlačení expanze i invaze dřevin redukcí zmlazení dřevin po předchozích vyřezávkách. Sečení, shrabání i odklizení bude prováděno vč. výmladků dřevin, které lze odstranit křovinořezem. Výjimku tvoří dřeviny biotopů K4B a K4C! Tyto budou obsékány.

Výška vegetace po provedené seči bude maximálně 10 cm nad terénem. Veškerá hmota bude důsledně shrabána a z plochy zásahu odklizená nejpozději do 10 dní po každé seči. Pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Na okolních pozemcích objednatele nebude tato hmota ponechána ani po dobu nezbytně nutnou k její likvidaci, odvozu atd. Na některých plochách bude v jednom roce provedena dvojí seč, z toho první


Číslo smlouvy: 03403/SOPK/20

Dotační titul: OPŽP
v termínu květen až červen (před vymetáním nejpozději do 31.5. běžného roku) a druhá pak v průběhu měsíce srpna v závislosti na kvetení nežádoucích druhů jako jsou *Calamagrostis epigejos*, *Solidago canadensis*, *Arrhenantherum elatius*, *Arctium sp.*, *Conium maculatum*, *Urtica dioica* apod. Doba mezi první a druhou sečí nesmí být kratší než 30 dní, přičemž přesný termín druhé seče bude pro jednotlivé roky upřesněn zástupcem objednatele v závislosti na průběhu vegetační sezony.

Při mozaikové seči, tj. ponechání části ploch bez zásahu, budou přednostně překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin, invazních, expanzivních a ruderálních bylin. Naopak ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Určení ponechaných nekosených částí bude před zahájením prací konzultováno se zástupcem objednatele.



DUN OST-JIH										
část zakázky	č. opatření	typ opatření	plocha (ha)	Redukovaná plocha (ha)	pokyny pro realizaci na dané ploše	rozmezí, termín dokončení	Cena za hektar redukované plochy (Kč bez DPH)	Cena za hektar redukované plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (Kč bez DPH)	cena celkem (Kč vč. DPH)
část 1. (rok 2020)	DUN-2020-025	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	7,917	6,3336	20% plochy bez zásehu, přednostně sečet degradované plochy, odstranění stáří	V-VI (30.6.2020)	19800	23958	125405,28	151740,39
	DUN-2020-028	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	10,5466	7,36262	účelem je redukce expanze trav, sečet před květem trav, 30% plochy porostnat bez zásehu, dvojitá seč	V-VI (30.6.2020) VII (31.8.2020)	19800 19800	23958 23958	146175,88 146175,88	176872,81 176872,81
						Celkem č.1			417757,04	505488,01
část 2. (rok 2021)	DUN-2021-025	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	7,917	1,5834	postřik na list výmladků, výskyt rozptýleně na 20% výměry, u přežívajících zopakovat	VII (31.7.2021)	19800	23958	31351,32	37935,1
	DUN-2021-027	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	7,917	6,3336	20% plochy bez zásehu, přednostně sečet degradované plochy, odstranění stáří	IX-X (31.10.2021)	19800	23958	125405,28	151740,39
	DUN-2021-028	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	10,5466	4,21864	60% plochy bez zásehu, přednostně sečet degradované plochy = seaver plochy, dvojitá seč	V-VI (30.6.2021) VII (31.8.2021)	19800 19800	23958 23958	83529,07 83529,07	101070,18 101070,18
						Celkem č.2			323814,74	391818,85
část 3. (rok 2022)	DUN-2022-025	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	7,917	6,3336	20% plochy bez zásehu, přednostně sečet degradované plochy, odstranění hmoty	V-VI (30.6.2022)	19800	23958	125405,28	151740,39
	DUN-2022-028	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	10,5466	6,32796	účelem je redukce expanze trav, sečet před květem trav, 40% plochy porostnat bez zásehu, dvojitá seč	V (31.5.2022) VII (31.8.2022)	19800 19800	23958 23958	125293,61 125293,61	151605,27 151605,27
						Celkem č.3			375982,50	454850,83
část 4. (rok 2023)	DUN-2023-026	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	8,5275	6,822	20% plochy bez zásehu, přednostně sečet degradované plochy, odstranění hmoty, stáří	IX (30.9.2023)	19800	23958	136075,80	163441,46
	DUN-2023-027	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	7,917	1,5834	postřik na list výmladků, výskyt rozptýleně na 20% výměry, u přežívajících zopakovat	VIII (31.8.2023)	19800	23958	31351,32	37935,10
	DUN-2023-028	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	10,5466	7,36262	účelem je redukce expanze trav, sečet před květem trav, 30% plochy porostnat bez zásehu, dvojitá seč	V-VI (30.6.2023) VII (31.8.2023)	19800 19800	23958 23958	146175,88 146175,88	176872,81 176872,81
	DUN-2023-029	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	10,5466	1,05466	postřik na list výmladků, výskyt rozptýleně na 10% výměry, u přežívajících zopakovat	VII (31.7.2023)	19800	23958	20882,27	25267,54
						Celkem č.4			479886,95	580388,74
						Celkem			1597225,23	1932642,53

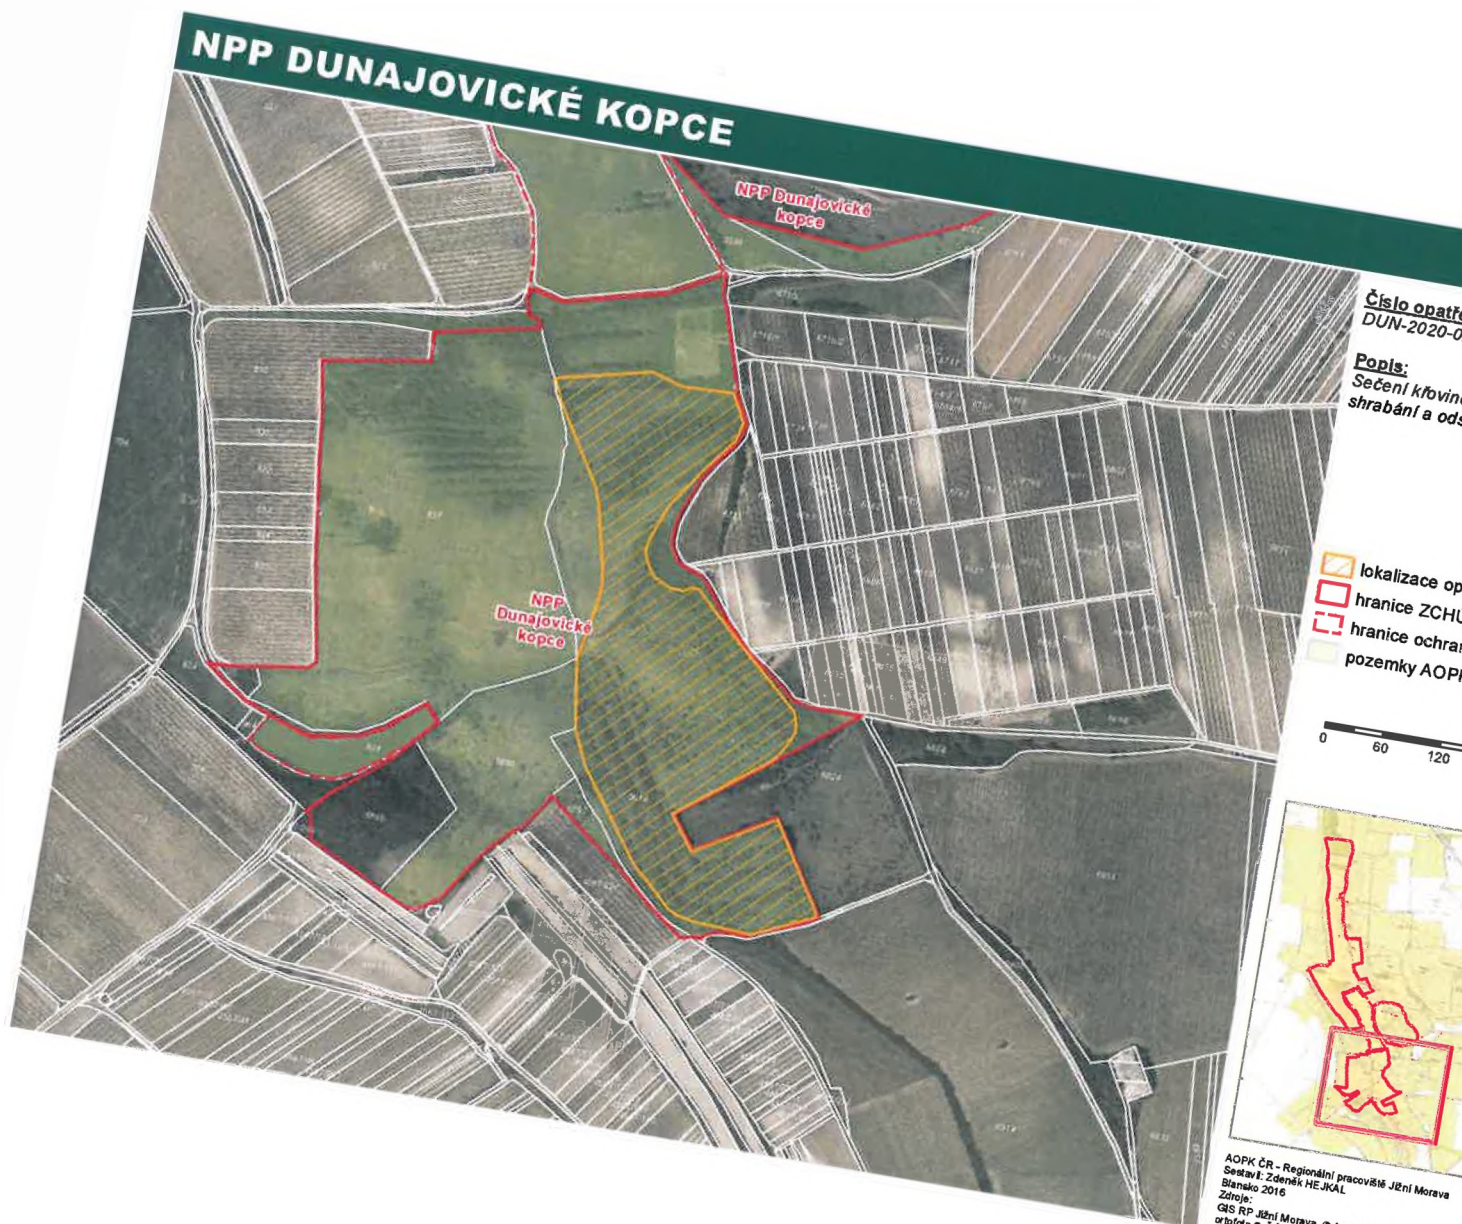
NPP DUNAJOVICKÉ KOPCE



Číslo opatření
DUN-2020-02

Popis:
Sečení křovin
shrabání a ods

-  lokalizace op
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochran
-  pozemky AOPK



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihomoravský územní úřad
Seřadil: Zdeněk HEJČAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jihomoravský územní úřad © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015





NPP DUNAJOVICKÉ KOPCE

rok 2020



Číslo opatření:
DUN-2020-028

Popis:
Sečení křovinořezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 75 150 225 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihní Morava
Seznam: Zdeněk HEJKAL
Brno 2016
Zařaje:
GIS RP Jihní Morava © AOPK ČR
grafika © ČÚZK 2015

NPP DUNAJOVICKÉ KOPCE





rok 2021




Číslo opatření:
DUN-2021-025

Popis:
Likvidace invazních
a expanzivních rostlin

Aplikace herbicidů

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 60 120 180 m

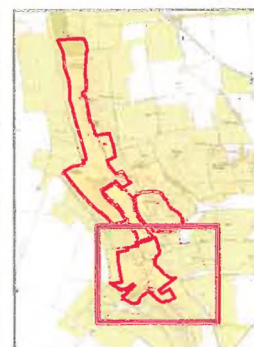

AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihl Morava
Seřazení: Zdeněk HEJKAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jihl Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015





NPP DUNAJOVICKÉ KOPCE

rok 2021



Číslo opatření:
DUN-2021-027

Popis:
Sečení křovinofezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 60 120 180 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jžní Morava
Sevadřil Zdeněk HEJHAL
Březen 2016
Zdroje:
GIS RP Jžní Morava © AOPK ČR
atbinfo © ČÚZK 2015





NPP DUNAJOVICKÉ KOPCE

rok 2021



Číslo opatření:
DUN-2021-029

Podís:
Sečení křovinořezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 75 150 225 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihomoravsko
Seznam: Zdeněk HEJKAL
Blatná: 2016
Zdroj:
GIS RP Jihomoravsko © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015

NPP DUNAJOVICKÉ KOPCE



Číslo opatření
DUN-2022-02

Popis:
Sečení křovin
shrabání a ods

- lokalizace opatření
- hranice ZCHÚ
- hranice ochranné zóny
- pozemky AOPK ČR

0 60 120



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihomoravský územní úřad
Seštelák Zdeněk HEJKAL
Biansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jihomoravský územní úřad © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015





NPP DUNAJOVICKÉ KOPCE

rok 2022



Číslo opatření:
DUN-2022-028

Popis:
Secení křovinořezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 75 150 225 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJKAL
Datum: 2016
Zdroj:
GIS RP Jihní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015





NPP DUNAJOVICKÉ KOPCE

rok 2023



Číslo opatření:
DUN-2023-026

Popis:
Sečení křovinořezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihomoravský územní úřad
Sestavil: Zdeněk HEJKA
Blansko 2016
Záměr
GIS RP Jihomoravský územní úřad © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015

NPP DUNAJOVICKÉ KOPCE



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihomoravský územní úřad
Seznam zeleně HEJKAL
Blatná 2016
Zdroj:
GIS RP Jihomoravský územní úřad
ortofoto © ČÚZK 2015




NPP DUNAJOVICKÉ KOPCE

rok 2023



Číslo opatření:
DUN-2023-028

Popis:
Sečení křovinořezem (ruční
shrabání a odstranění hmoty)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
pozemky AOPK ČR

0 75 150 225 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihlava
Seřadil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jihlava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015

NPP DUNAJOVICKÉ KOPCE




rok 2023




Číslo opatření:
DUN-2023-029

Popis:
Likvidace invazních
a expanzivních rostlin

Aplikace herbicidu

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
pozemky AOPK ČR

0 75 150 225 m

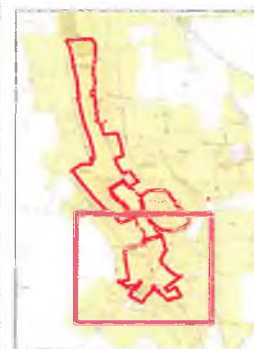

AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihní Morava
Seznam: Zeleník HEJKAL
Blansko 2016
Zdroj:
GIS RF Jihní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

**VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ”, ČÍSLO
PROJEKTU EIS: [CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002599]**

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a
objednatelům dne [●] (dále jen „Smlouva“).

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika díla:

.....

.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že dílo¹

a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přijímá bez výhrad;

b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přijímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:

c) bylo provedeno částečně. Objednatel přijímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:

.....
.....

Od zbytku plnění objednatel tímto odstupuje.

d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.

Důvod nepřevzetí díla:

.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....
.....

Objednatel doporučuje uvolnit, - Kč za zhotovení díla.

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ“, ČÍSLO
PROJEKTU EIS: [CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002599]
– ČÁST [•]

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [•]

Adresa: [•]

IČO: [•]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli část díla č. [•] (dále jen „Část díla“) provedeného dle smlouvy o dílo č.: [•] uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne [•] (dále jen „Smlouva“).

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika Části díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že Část díla¹

- a) byla provedena v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla přijímá bez výhrad;
- b) byla provedena v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělků, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přijímá Část díla s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:
- c) byla provedena zčásti. Objednatel přijímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:
.....
.....
Objednatel dokončení zbytku Části díla nepožaduje – objednatel omezuje rozsah Části díla.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla nepřijímá.
Důvod nepřevzetí Části díla:
.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....
.....

Objednatel doporučuje uvolnit, - Kč za zhotovení Části díla.

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.
