



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



Číslo smlouvy: 03402/SOPK/20  
Dotační titul: OPŽP

## SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO  
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc

Telefon:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: ředitel RP Jižní Morava

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel

**JC Forestgang s.r.o.**

Sídlo: č.p. 74, 687 33 Veletiny

Zastoupený: Janem Cimalou, jednatelem

Bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu 2601734463/2010

IČO: 08755779

DIČ: CZ08755779

*zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 115285*

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2 Dílem se rozumí: Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě 2020-2023, dílčí zakázka SKO\_J.

Specifikace díla je uvedena v příloze č. 1, č. 2 a č. 3 (včetně rozloh jednotlivých ploch, na nichž má být dílo realizováno).

(dále jen „dílo“)

Rozsah díla uvedený ve specifikaci díla je rozsah maximální. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že skutečný rozsah díla bude upřesňován objednatelem průběžně každý rok, a to na základě výsledků monitoringu vlivu opatření prováděného na základě této smlouvy (zaznamenávání vývoje lokality a reakce ekosystémů na prováděná opatření). Monitoring bude prováděn objednatelem každoročně v průběhu platnosti smlouvy. V případě omezení rozsahu díla bude v odpovídajícím rozsahu poměrně snížena jeho cena.

- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, nebo jím pověřené osoby.
- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli z Operačního programu Životní prostředí. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

## III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Opatření	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2019	SKO-2019-001	337 519,18 Kč	70 879,03 Kč	408 398,21 Kč
2. část	2020	SKO-2020-001;SKO-2020-010	115 853,27 Kč	24 329,19 Kč	140 182,46 Kč
3. část	2021	SKO-2021-001;SKO-2021-010	91 137,90 Kč	19 138,96 Kč	110 276,86 Kč
4. část	2022	SKO-2022-001;SKO-2022-010	72 601,38 Kč	15 246,29 Kč	87 847,67 Kč
5. část	2023	SKO-2023-001;SKO-2023-010	66 422,54 Kč	13 948,73 Kč	80 371,27 Kč
<b>Cena celkem</b>			<b>683 534,27 Kč</b>	<b>143 542,20 Kč</b>	<b>827 076,47 Kč</b>

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří **přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.**

- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu (v žádném případě však ne později než do 11.11. každého kalendářního roku,

v roce 2023 ne později než 30.9.2023) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

- 3.5 Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat identifikační číslo projektu EIS "CZ.05.4.27/0.0/0.0/15\_009/0002599" a Název projektu (akce) "Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě".
- 3.6 Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

#### IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 15.9.2023.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje provést částí díla a předat jej objednateli **v termínech uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy o dílo.**
- 4.3 Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.4 Předpokládané datum zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad: květen 2020. Dojde-li k nabytí účinnosti smlouvy k pozdějšímu datu a/nebo vznikne-li nezávisle na vůli zhotovitele mimořádná nepředvídatelná překážka, pro kterou není dočasně možné dílo provádět, mohou se smluvní strany dohodnout na posunu termínu pro provedení 1. části díla (rok 2019) podle čl. 4.2 smlouvy, a to až o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy, případně o dobu trvání mimořádné nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, pro kterou není dočasně možné dílo provádět. V případě, že tato smlouva nenabyde účinnosti ani do 30. 5. 2020, mohou se smluvní strany dohodnout na omezení rozsahu díla o 2. část (rok 2020) a posunu termínu pro provedení 1. části (rok 2019) dle věty druhé tohoto článku, nejpozději však do 31. 10. 2020. V případě, že tato smlouva nenabyde účinnosti ani do 30. 9. 2020, mohou se smluvní strany dohodnout na omezení rozsahu díla o 1. část (rok 2019) a 2. část (rok 2020).
- 4.5 Vznikne-li nezávisle na vůli zhotovitele mimořádná nepředvídatelná překážka, pro kterou není dočasně možné dílo provádět, mohou se smluvní strany dohodnout na posunu termínu pro provedení 2., 3. a/nebo 4. části díla podle čl. 4.2 smlouvy, a to až o dobu trvání mimořádné nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, pro kterou není dočasně možné dílo provádět. Termín však může být dle věty první posunutý maximálně do 15. 10. 2020 u 2. části (rok 2020), do 15. 10. 2021 u 3. části (rok 2021) a/nebo do 15. 10. 2022 u 4. části (rok 2022). V případě že posun termínu dle věty druhé nepostačuje, mohou se smluvní strany dohodnout na poměrném omezení rozsahu díla v části, kterou nelze provést ani v maximálně posunutém termínu.
- 4.6 Vznikne-li nezávisle na vůli zhotovitele mimořádná nepředvídatelná překážka, pro kterou není dočasně možné provádět 5. část díla (rok 2023), mohou se smluvní strany

dohodnout na poměrném omezení jejího rozsahu v části, kterou nelze provést ani v maximálně posunutém termínu.

- 4.7 Místem plnění je Česká republika – CHKO Pálava – Přírodní rezervace Svatý Kopeček. Místa plnění jednotlivých částí jsou uvedeny v příloze č. 1, č. 2 a č. 3.

## **V. Další ujednání**

- 5.1 Zhotovitel je povinen provádět části díla dle čl. 3.1 smlouvy na odpovídajících lokalitách (plochách) až po předání každé lokality objednatelem spolu se sdělením bližších pokynů ze strany objednatele. Konkrétní termíny předání jednotlivých lokalit zhotoviteli budou stanoveny dohodou smluvních stran (telefonicky, emailem). Před předáním lokality zhotovitel není oprávněn začít s prováděním příslušné části díla.
- 5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.3 Strany se dohodly, že způsob provedení díla musí být v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (dále jen „Standardy“) platnými ke dni zahájení zadávacího řízení. Standardy stanoví parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR: <http://www.standardy.nature.cz>.
- 5.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

## **VI. Předání a převzetí částí díla**

- 6.1 O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. O předání poslední části díla vyhotoví smluvní strany závěrečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3 V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.

## **VII. Odpovědnost za vady**

- 7.1 Při předání každé dílčí části díla je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2 V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu dílčí části díla připadající na předmětnou plochu (podle přílohy č. 2).
- 7.3 Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených dle vzoru uvedeného v příloze č. 4.

## **VIII. Sankce**

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některého opatření v příslušné části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušné opatření v části díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

## **IX. Ukončení smlouvy**

- 9.1 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. Uplynutí výpovědní doby má za následek ukončení platnosti smlouvy.
- 9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně či v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení druhé smluvní straně.

## **X. Poddodavatelé**

- 10.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně věcného a procentního podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli.
- 10.2 Zhotovitel zajistí, aby se poddodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a veškeré práce poddodavatelů bude řádně koordinovat.
- 10.3 Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.

**10.4** V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 10.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené poddodavatele vykázat z místa provádění díla a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.

**10.5** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

## **XI. Závěrečná ustanovení**

**11.1** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

**11.2** Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel je povinen minimálně po stejnou dobu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost).

**11.3** Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

**11.4** Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

**11.5** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

**11.6** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla z Operačního programu Životní prostředí. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

**11.7** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

**11.8** Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - podrobná specifikace díla,

Příloha č. 2 - položkový rozpočet,

Příloha č. 3 - mapový zakres,

Příloha č. 4 - vzor dílčího protokolu o předání a převzetí dílčí části díla; vzor závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

V Praze dne 12.3.2020

Ve Veletínách dne 14/02/2020

Objednatel

Zhotovitel

---

RNDr. František Pelc  
ředitel AOPK ČR

---

Jan Cimala  
JC Forestgang s.r.o., jednatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 - Chodov

-1-

Příloha č.1 – Podrobná specifikace díla - dílčí zakázka SKO-J

### **Obecné požadavky na provádění opatření:**

-Opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky, se kterými má příslušnost hospodařit Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, na území Přírodní rezervace Svatý Kopeček na pozemku KN p.č. 2695 v k.ú. Mikulov na Moravě.

-Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016

-Před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy či dřevin ponechávaných bez zásahu a upřesnění poměru prováděných opatření oproti ponechaným plochám bez zásahu

-u níže uvedených činností typu „Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřez“ a „Sečení křovinořezem“ se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací

-náletové dřeviny do průměru pařezu do 10cm jsou považovány za klest, který bude zlikvidován dodavatelem v souladu s právními předpisy; dřeviny nad 10cm průměru pařezu nejsou tímto projektem ani smlouvou o dílo dotčeny a bude s nimi naloženo dle vnitřních předpisů zadavatele

- konkretizace jednotlivých opatření viz Příloha č. 2

### **Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřez**

Budou odstraněna všechna stadia invazních a expanzivních dřevin *Robinia pseudacacia*, *Ailanthus altissima*, *Acer negundo*. Dále budou odstraněny především expanzivní a nevhodné druhy dřevin, bez zásahu zůstanou ponechány vhodné druhy dřevin či jejich skupiny různého stáří a zdravotního stavu, které budou vymezeny zástupcem objednatele před zahájením prací. Celkový poměr ponechaných dřevin je uveden ve specifikaci zásahu (tab Příloha č.2).

Vyřezaná hmota bude odstraněna z plochy zásahu a zlikvidována v souladu s platnou legislativou. V případě snížené únosnosti terénu není možný vjezd mechanizací do chráněného území mimo běžně užívané cesty. Za naprostého sucha či zámrazu lze po dohodě se zadavatelem krátkodobě vjíždět mimo cesty při zamezení negativního vlivu na zachovalé části stepních společenstev – vždy pouze po konzultaci se zástupcem zadavatele. Malá část hmoty (do 3,0 prm) z vyřezávek bude využita k tvorbě drobných zhuštěných kupek klestu jako úkryt pro drobné živočichy – opět výhradně po dohodě se zástupcem zadavatele (umístění, velikost).

Pařízky budou seříznuty na úrovni terénu (do max. výšky 3cm), řezné plochy budou ihned (nejpozději do 30 minut) po vyřezání zatřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin. Herbicid bude obarven pro přírodu nezávadným barvivem v takové koncentraci, aby byl na řezných plochách pařízků viditelný minimálně do doby kontroly při přebírání prací. V případě dlouhodobého (min. 5 dnů) poklesu teplot pod 0°C budou vyřezávka a aplikace herbicidu přerušeny do oteplení nad tuto hodnotu, nebo budou při vyřezávce ponechávány pařízky výšky cca 30-50cm, které budou seříznuty a následně ošetřeny herbicidem na řeznou plochu až po trvalejším (min. 7 dnů) zvýšení teplot nad +5°C .

### **Sečení křovinořezem**

Opatření bude prováděno v kombinaci s následnou šetrnou aplikací herbicidu na list nevhodných zmlazujících dřevin. Mezi jednotlivými navazujícími zásahy bude časový odstup min. 30 dnů, tzn. aplikace herbicidu bude provedena nejdříve 30 dnů od dokončení předchozího ručního sečení.

Budou překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin a invazních, expanzivních a



Číslo smlouvy: 03402/SOPK/20  
Dotační titul: OPŽP

ruderálních bylin. Ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Celkový poměr kosených částí (X%) je uveden ve specifikaci zásahu (tab Příloha č.2), přesné vymezení ploch bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací v závislosti na vývoji sezony a kvalitě provedení předchozích zásahů.

Výška vegetace po provedené seči bude maximálně 10 cm nad terénem. Veškerá hmota bude důsledně shrabána a z plochy zásahu odklizená nejpozději do 10 dnů od provedení seče. Pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Na okolních pozemcích v MZCHÚ nebude tato hmota ponechána ani po dobu nezbytně nutnou k její likvidaci, odvozu atd. Plochy s výskytem *Calamagrostis epigejos*, *Arrhenantherum elatius* budou překoseny před jejich vymetáním nejpozději do 31.5.

#### **Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu**

Následná aplikace herbicidu na list nevhodných zmlazujících dřevin bude prováděna na konci vegetační sezóny, při plně rozvinutém olistění výmladků dřevin a probíhající asimilaci, jako navazující zásah, nejdříve však 30 dnů od dokončení ručního sečení. Postřik kořenových i pařezových výmladků a semenáčů po předchozí vyřezávce a ručním sečení bude proveden herbicidem schváleným pro použití na hubení výmladků dřevin aplikací na list. Herbicid bude šetrně aplikován vhodnou technologií (směrový rosič, bodová jehla apod.) výhradně na likvidované dřeviny s minimálním dotčením okolní vegetace. Rozsah a vymezení ploch určených k ošetření a ponechávaných bez zásahu bude určen při terénní pochůzce se zadavatelem před zahájením prací. Práce bude převzata až po viditelném projevení (vadnutí, žloutnutí, zasychání, hnědnutí) účinků herbicidu.

## SKO-J

číslo zakázky	č. opatření	typ opatření	plocha (ha)	Bed. kumul. plocha (ha)	popis pro realizaci na dané ploše	rozmezí, termín dokončení	Cena za hektar redukované plochy (Kč bez DPH)	Cena za hektar redukované plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (Kč bez DPH)	cena celkem (Kč vč. DPH)
část 1. (rok 2018)*	SKO-2019-001	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřez	4,2554	1,617052	odstranění náletů (do 10cm průměru) kmenů na lesní ploše celkem, na cca 30% zůstatkové rozlohy	V (31.8.2020)	208 725,00	257 557,25	337 516,16	408 396,21
						Celkem část 1			337 516,16	408 396,21
část 2. (rok 2020)	SKO-2020-001	Sazení křovinohazem	4,2554	2,5532	sazení křovinohazem, 40% rozsahu, plochy ponechat bez zásahu formou rozhrádkování	VI-VI (15.7.2020)	21 175,00	26 821,75	54 064,86	65 418,48
	SKO-2020-010	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidů	4,2554	2,1277	Sažba aplikace herbicidů na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpokládá výsledek na 50% plochy	VIII-IX (15.8.2020)	29 040,00	36 138,40	61 768,41	74 763,96
						Celkem část 2			116 833,27	140 182,44
část 3. (rok 2021)	SKO-2021-001	Sazení křovinohazem	4,2554	2,5532	sazení křovinohazem, 40% rozsahu, plochy ponechat bez zásahu formou rozhrádkování	V-VI (15.7.2021)	21 175,00	26 821,75	54 064,86	65 418,48
	SKO-2021-010	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidů	4,2554	1,27862	Sažba aplikace herbicidů na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpokládá výsledek na 30% plochy	VIII-IX (15.8.2021)	29 040,00	36 138,40	37 073,04	44 658,38
						Celkem část 3			91 137,90	110 076,86
část 4. (rok 2022)	SKO-2022-001	Sazení křovinohazem	4,2554	2,5532	sazení křovinohazem, 40% rozsahu, plochy ponechat bez zásahu formou rozhrádkování	V-VI (15.7.2022)	21 175,00	26 821,75	54 064,86	65 418,48
	SKO-2022-010	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidů	4,2554	0,6393	Sažba aplikace herbicidů na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpokládá výsledek na 15% plochy	VIII-IX (15.8.2022)	29 040,00	36 138,40	18 536,52	22 428,16
						Celkem část 4			72 601,38	87 846,64
část 5. (rok 2023)	SKO-2023-001	Sazení křovinohazem	4,2554	2,5532	sazení křovinohazem, 40% rozsahu, plochy ponechat bez zásahu formou rozhrádkování	V-VI (15.7.2023)	21 175,00	26 821,75	54 064,86	65 418,48
	SKO-2023-010	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidů	4,2554	0,42554	Sažba aplikace herbicidů na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpokládá výsledek na 10% plochy	VIII-IX (15.8.2023)	29 040,00	36 138,40	12 357,68	14 952,78
						Celkem část 5			66 422,54	80 371,27
						Celkem			693 534,27	827 074,47

\* rok 2019 uveden z důvodu návaznosti na předcházející veřejnou zakázku, plnit se bude v roce 2020 dle harmonogramu





# PR SVATÝ KOPEČEK

rok 2019



**Číslo opatření:**  
SKO-2019-001

**Popis:**  
Likvidace invazních a  
expanzivních rostlin - výřez

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 30 60 90 m



AOPK ČR - Racionální péče o Vějířní Morys  
Sešlá v  
Mladěj 2019  
Zpracov:  
GIS RP Jihlav Morys © AOPK ČR  
ortefice © ČÚZK 2015

# PR SVATÝ KOPEČEK

rok 2020

**Číslo opatření:**  
SKO-2020-001

**Popis:** Sečení křovinofezem



- lokalizace opatření
- hranice ZCHÚ
- hranice ochranného pásma
- pozemky AOPK ČR


0 30 60 90 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihní Morava  
Sestavil:  
Miroslav Žurík  
Zdroje:  
GIS RP Jihní Morava © AOPK ČR  
ortofoto © ČÚZK 2015



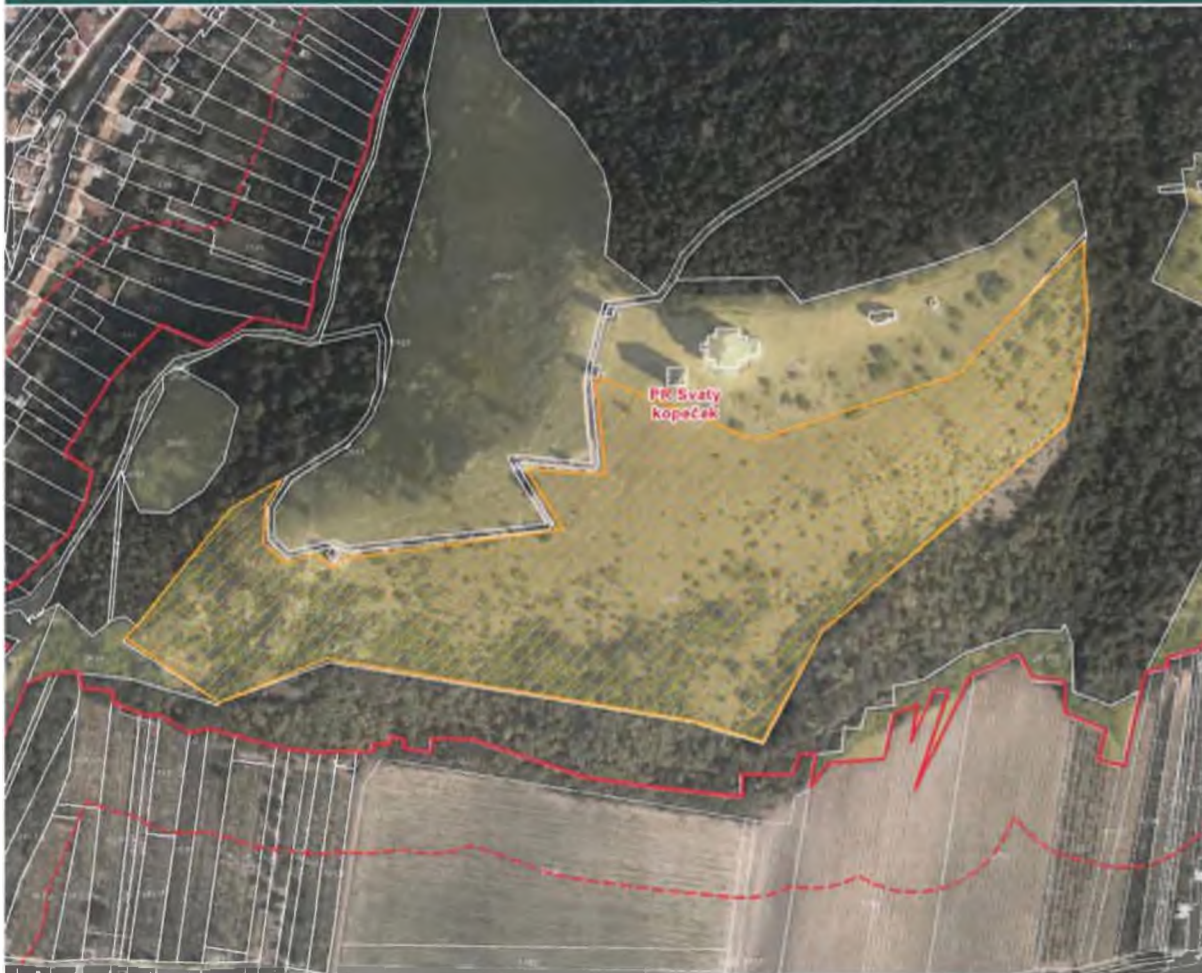

# PR SVATÝ KOPEČEK

rok 2020



**Číslo opatření:**  
SKO-2020-010

**Popis:**  
Likvidace invazních a  
expanzivních rostlin - aplikace  
herbicidu

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 30 60 90 m



AOPK ČR - Realizační pracoviště Jüžní Morava  
Sadařiv  
Mladov ovic  
Zdroje:  
GIS RP Jüžní Morava © AOPK ČR  
ortofoto © ČÜZK 2015





# PR SVATÝ KOPEČEK

rok 2021



**Číslo opatření:**  
SKO-2021-001

**Popis:**  
Sečení křovinořezem

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 30 60 90 m



ADPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava  
Sestava  
Mladov 2019  
Zdroje:  
G S RP Jižní Morava © ADPK ČR  
ortofoto © ČÚZK 2015




# PR SVATÝ KOPEČEK

rok 2021



**Číslo opatření:**  
SKO-2021-010

**Popis:**  
Likvidace invazivních a  
expanzivních rostlin - aplikace  
herbicidu

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma  
pozemky AOPK ČR

0 30 60 90 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava  
Seznam  
Město 2019  
Září  
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR  
ortofoto © ČÚZK 2015

## PR SVATÝ KOPEČEK









# PR SVATÝ KOPEČEK

rok 2022



**Číslo opatření:**  
SKO-2022-010

**Popis:**  
Likvidace invazních a  
expanzivních rostlin - aplikace  
herbicidu

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 30 60 90 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava  
Sestavil  
Měsíc 2015  
Zdroj:  
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR  
ortofoto © ČÚZK 2015





# PR SVATÝ KOPEČEK

rok 2023



**Číslo opatření:**  
SKO-2023-001

**Popis:**  
Sečení křovinofezem

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 30 60 90 m



AOPK ČR - Územní pracoviště Jižní Morava  
Seznam  
Měřítko 2019  
Zdroje:  
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR  
ortofoto © ČÚZK 2015




# PR SVATY KOPEČEK

rok 2023



**Číslo opatření:**  
SKO-2023-010

**Popis:**  
Likvidace invazních a  
expanzivních rostlin - aplikace  
herbicidů

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma  
pozemky AOPK ČR

0 30 60 90 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava  
Seřadil:  
Miroslav Zámečník  
Zatvořil:  
GIS RF Jižní Morava © AOPK ČR  
ortofoto © ČÚZK 2015



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
OP Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY  
PŘÍRODY A KRAJINY  
ČESKÉ REPUBLIKY

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ“, ČÍSLO  
PROJEKTU EIS: [CZ.05.4.27/0.0/0.0/15\_009/0002599]

**Zhotovitel (předávající)**

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele: .....

**Objednatel (přejímající)**

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele: .....

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a  
objednatелеm dne [●] (dále jen „Smlouva“).

**Předmět podpory:**

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

**Stručná charakteristika díla:**

.....  
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne ....., že dílo<sup>1</sup>

a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přijímá bez výhrad;

b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přijímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků: .....,

c) bylo provedeno částečně. Objednatel přijímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:

.....

.....

Od zbytku plnění objednatel tímto odstupuje.

d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.

Důvod nepřevzetí díla:

.....

.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....

.....

Objednatel doporučuje uvolnit ....., - Kč za zhotovení díla.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Objednatel

Zhotovitel

\_\_\_\_\_  
[jméno]  
[funkce]

\_\_\_\_\_  
[jméno]  
[funkce]

<sup>1</sup> Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
OP Životní prostředí



AGÉNTURA OCHRANY  
PŘÍRODY A KRAJINY  
ČESKÉ REPUBLIKY

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA  
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ“, ČÍSLO  
PROJEKTU EIS: [CZ.05.4.27/0.0/0.0/15\_009/0002599]  
– ČÁST [●]

**Zhotovitel (předávající)**

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele: .....

**Objednatel (přejímající)**

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele: .....

Zhotovitel předává objednateli část díla č. [●] (dále jen „Část díla“) provedeného dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne [●] (dále jen „Smlouva“).

**Předmět podpory:**

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

**Stručná charakteristika Části díla:**

.....  
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne ....., že Část díla<sup>1</sup>

a) byla provedena v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla přijímá bez výhrad;

b) byla provedena v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přijímá Část díla s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků: .....

c) byla provedena zčásti. Objednatel přijímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:

.....  
.....

Objednatel dokončení zbytku Části díla nepožaduje – objednatel omezuje rozsah Části díla.

d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla nepřijímá.  
Důvod nepřevzetí Části díla:

.....  
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....  
.....

Objednatel doporučuje uvolnit ....., - Kč za zhotovení Části díla.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Objednatel

Zhotovitel

\_\_\_\_\_  
[jméno]  
[funkce]

\_\_\_\_\_  
[jméno]  
[funkce]

<sup>1</sup> Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.
