

Smlouva o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

Název zakázky:

„GSM-R Chomutov - Cheb“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-1531/2020/PH**

ISPROFOND: **500 351 0096**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Kontron Transportation s.r.o.

se sídlem: Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

IČO: 45311005, DIČ: CZ45311005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8707
bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Petrem Vítkem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Kontron Transportation s.r.o., Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **2019/VIT/1282**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Objednatel si přeje, aby Dílo „GSM-R Chomutov – Cheb“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 30.03.2020.
 - 1.2 Dopis nabídky datovaný 17.02.2020.
 - 1.3 Smluvní podmínky [(i) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně- technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; (ii) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu elektro- a strojně- technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č.j.224/2018-520-DOP-/1, účinné od 3.8.2018(dále též jen Zvláštní podmínky)]
 - 1.4 Požadavky objednatele
 - 1.5 Formuláře:
 - 1.5.1 Požadavky na výkon nebo funkci,
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Požadavcích objednatele, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML:
 - 5.1.1 Faktura,
 - 5.1.2 souhrn fakturace,
 - 5.1.3 soupis zjišťovacích protokolů,
 - 5.1.4 zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92a odst. 1 zákona o DPH.
8. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
9. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.

10. Lhůty stanovené v odst 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se nepoužijí a nahrazují se lhůtou nejpozději do 3 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení poslední Sekce, tj. do 3 měsíců ode dne vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla.
11. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 18 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
12. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
13. NEOBSAZENO.
14. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou v listinné podobě Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
15. NEOBSAZENO.
16. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelém jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
17. Smlouva o dílo se vyhotovuje v **pěti (5)** vyhotoveních, z nich **tři (3)** vyhotovení obdrží Objednatel a **dvě (2)** vyhotovení Zhotovitel.
18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele:

V Praze dne 04 -05- 2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Vítek
jednatel společnosti
Kontron Transportation s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace ceny

stavba:		Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]
GSM-R Chomutov - Cheb		411 489 105	411 489 105
Cena díla za projektovou dokumentací stavby			
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení		
PDPs	Projektová dokumentace pro provádění stavby		
Cena díla za autorský dozor			
Cena díla za zhotovení stavby			
Číslo objektu	Název objektu	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení			
PS	100 Chomutov – Cheb, přenosový systém pro zabezpečovací zařízení		
D.2 Železniční sdělovací zařízení			
D2.1 Úsek Chomutov – Karlovy Vary			
PS	101 BTS 746 Málkov		
PS	102 BTS 747 Kadaň-Pruněřov		
PS	103 BTS 748 Klášterec nad Ohří		
PS	104 BTS 749 Kotvina		
PS	105 BTS 750 Perštejn		
PS	106 BTS 751 Boč		
PS	107 BTS 752 Stráň nad Ohří		
PS	108 BTS 753 Damice		
PS	109 BTS 754 Vojkovice nad Ohří		
PS	110 BTS 755 Hradistě		
PS	111 BTS 756 Ostrov nad Ohří		
PS	112 BTS 757 Ottův rybník		
PS	113 BTS 758 Hájek		
PS	114 BTS 759 Dalovice		
PS	115 BTS 760 Karlovy Vary		
PS	141 Uvedení do provozu, úsek Chomutov (mimo) - Karlovy Vary		
PS	151 Přenosové zařízení, úsek Chomutov (mimo) - Karlovy Vary		
D2.2 Úsek Karlovy Vary – Cheb			
PS	201 BTS 761 Karlovy Vary-Dvory		
PS	202 BTS 762 Zátisl		
PS	203 BTS 763 Chodov		
PS	204 BTS 764 Nové Sedlo-tunel		
PS	205 BTS 765 Staré Sedlo		
PS	206 BTS 766 Královské Poříčí		
PS	207 BTS 767 Sokolov		
PS	208 BTS 768 Hlavno		
PS	209 BTS 769 Chlum		
PS	210 BTS 770 Kynšperk nad Ohří		
PS	211 BTS 771 Nebanice		
PS	212 BTS 772 Tršnice		
PS	241 Uvedení do provozu, úsek Karlovy Vary - Cheb		
PS	251 Přenosové zařízení, úsek Karlovy Vary - Cheb		
D2.3 Pokrytí odbočných tratí			
PS	301 BTS 773 Loket		
PS	302 BTS 774 Loučky		
PS	303 BTS 775 Stará Role		
PS	304 BTS 776 Kadaň		
PS	341 Uvedení do provozu v úsecích odbočných tratí		
PS	351 Přenosové zařízení v úsecích odbočných tratí		
D2.6 Centrální a uživatelské části sítě, zapojovače			
PS	601 Doplnění centrálních částí sítě GSM-R		
PS	602 Vybavení hnacích vozidel a uživatelů terminály		
PS	603 Radionikly v úseku Cheb - Chomutov		
PS	611 Zapojovače v úseku Chomutov (mimo) - Karlovy Vary		
PS	612 Zapojovače v úseku Karlovy Vary - Cheb		
PS	613 ZST Karlovy Vary dolní nadraží - telefonní zapojovač		
PS	614 Doplnění přenosového systému pro energetické objekty		
PS	615 Doplnění pokrytí vnitřních prostor staničních objektů		
D2.7 Kabelizace			
PS	701 ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O.		
PS	702 ZOK v úseku Nove Sedlo u Lokte - Sokolov		
PS	703 DOK v úseku Loket - Nové Sedlo u Lokte		
PS	704 Zafukování OK v úseku Kadaň Pruněřov - Karlovy Vary		
PS	705 Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role		
PS	706 DOK v úseku Chomutov - Kadaň Pruněřov		
PS	707 Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb		
E.1.4 Mosty, propustky, zdi			
SO	802 Přechody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb		
SO	803 Přechody mostů v úseku Chomutov - Kadaň Pruněřov		
E.2 Pozemní stavební objekty			
SO	805 Doplnění klimatizací v úseku Chomutov - Cheb		
E.3.1 Závěsný optický kabel			

Rekapitulace ceny

SO	821	ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952		
SO	822	ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo		
E.3.6		Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		
SO	811	Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb		
SO	812	NN přípojka BTS Ottův rybník		
SO	813	NN přípojka BTS Staré Sedlo		
SO	814	NN přípojka BTS Hlavno		
SO	815	NN přípojka BTS Chlum		
SO	816	NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel		
		Všeobecné konstrukce a práce		
SO	98-98	Všeobecný objekt		

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- delegovaná osoba

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- projekt manager:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- odpovědný projektant:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- rádiový plánovač:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) pro systémové části GSM-R (NSS a BSS specialisté):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) pro pokládku a montáž metalických a optických kabelů:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů

Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, sídlo poddodavatele, IČO	Věcný popis části plnění uvažovaného zadat poddodavateli (označené dle čísel a názvů jednotlivých SO a PS, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS))	% hodnoty poddodávky z nabídkové ceny
Společnost AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, Praha 10, IČO: 480 29 483 a Vegacom a.s., Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201, IČO: 257 88 680	montážní práce a zajištění strojů a zařízení vyžadovaných při plnění veřejné zakázky v dané části díla PS 100 Chomutov - Cheb, přenosový systém pro zabezpečovací zařízení, PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvina, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Loket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň, PS 603 - Radlovníky v úseku Cheb - Chomutov, PS 701- ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O., PS 702-ZOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov, PS 703 - DOK v úseku Loket - Nové Sedlo u Lokte, PS 704 - Zafukování OK v úseku Kadaň Prunéřov - Karlovy Vary, PS 705 - Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role, PS 706 - DOK v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, PS 707 - Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 802 - Přechody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 803 - Přechody mostů v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, SO 805 - Doplnění klimatizací v úseku Chomutov - Cheb, SO 821 - ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST: v úseku Chomutov - Cheb, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 812 - NN přípojka BTS Ottův rybník, SO 813 - NN přípojka BTS Staré Sedlo, SO 814 - NN přípojka BTS Hlavno, SO 815 - NN přípojka BTS Chlum, SO 816 - NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel, SO 98-98 - Všeobecný objekt	■
ČD - Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, PSČ 130 00, Praha 3, IČO: 614 59 445	dodávka a montáž přenosové techniky, zajištění vstupů do drážních objektů PS 151 - Přenosové zařízení, úsek Chomutov (mlmo) - Karlovy Vary, PS 251 - Přenosové zařízení, úsek Karlovy Vary - Cheb, PS 351 - Přenosové zařízení v úsecích odbočných tratí, Doplnění přenosového systému pro energetické objekty	■

BETONBAU, s.r.o, Průmyslová 566/5, PSČ 108 50, Praha 10, IČO: 496 14 819	výroba a montáž technologických objektů (domků) PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvina, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň	■
SUDOP PRAHA a.s, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3, IČO: 257 93 349	projektové a zeměměřické práce, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace realizační, dokumentace skutečného stavu PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvina, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň, PS 603 - Radiovníky v úseku Cheb - Chomutov, PS 701- ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O., PS 702-ZOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov, PS 703 - DOK v úseku Locket - Nové Sedlo u Lokte, PS 704 - Zafukování OK v úseku Kadaň Prunéřov - Karlovy Vary, PS 705 - Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role, PS 706 - DOK v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, PS 707 - Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 802 - Přechody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 803 - Přechody mostů v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, SO 805 - Doplnění klimatizací v úseku Chomutov - Cheb, SO 821 - ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 812 - NN přípojka BTS Ottův rybník, SO 813 - NN přípojka BTS Staré Sedlo, SO 814 - NN přípojka BTS Hlavno, SO 815 - NN přípojka BTS Chlum, SO 816 - NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel, SO 98-98 - Všeobecný objekt	■

Ener:
PSČ:
IČO:

ELPR/
Nade:
IČO:

EnerSys, s.r.o., Roztylské náměstí 649/19, PSČ 141 00, Praha 4, IČO: 452 41 759	dodávka a montáž baterií a dalších napájecích komponent PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvina, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damlice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň	■
ELPRAMO s.r.o., Praha 9 - Hloubětín, Nademlejská 600/1, 198 00, IČO: 28187903	Dodávka el. rozvaděčů, el. instalace PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvina, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damlice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň	■

;%

ATE, s. r. o. Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb, IČO: 48360473	montážní práce a zajištění strojů a zařízení vyžadovaných při plnění veřejné zakázky v dané části díla PS 100 Chomutov – Cheb, přenosový systém pro zabezpečovací zařízení, PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvína, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň, PS 603 - Radlovníky v úseku Cheb - Chomutov, PS 701- ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O., PS 702-ZOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov, PS 703 - DOK v úseku Locket - Nové Sedlo u Lokte, PS 704 - Zafukování OK v úseku Kadaň Prunéřov - Karlovy Vary, PS 705 - Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role, PS 706 - DOK v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, PS 707 - Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 802 - Přečody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 803 - Přečody mostů v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, SO 805 - Doplnění klimatizací v úseku Chomutov - Cheb, SO 821 - ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 812 - NN přípojka BTS Ottův rybník, SO 813 - NN přípojka BTS Staré Sedlo, SO 814 - NN přípojka BTS Hlavno, SO 815 - NN přípojka BTS Chlum, SO 816 - NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel, SO 98-98 - Všeobecný objekt	ELTODC Lhotka, IČO: 45
--	--	---------------------------------------

ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14,
Lhotka, 142 00 Praha 4,
IČO: 45274517

montážní práce a zajištění strojů a zařízení vyžadovaných při plnění veřejné zakázky v dané části díla

PS 100 Chomutov - Cheb, přenosový systém pro zabezpečovací zařízení, PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvina, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň, PS 603 - Radiovníky v úseku Cheb - Chomutov, PS 701 - ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O., PS 702 - ZOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov, PS 703 - DOK v úseku Locket - Nové Sedlo u Lokte, PS 704 - Zafukování OK v úseku Kadaň Prunéřov - Karlovy Vary, PS 705 - Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role, PS 706 - DOK v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, PS 707 - Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 802 - Přečody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 803 - Přečody mostů v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, SO 805 - Doplnění klimatizací v úseku Chomutov - Cheb, SO 821 - ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 812 - NN přípojka BTS Ottův rybník, SO 813 - NN přípojka BTS Staré Sedlo, SO 814 - NN přípojka BTS Hlavno, SO 815 - NN přípojka BTS Chlum, SO 816 - NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel, SO 98-98 - Všeobecný objekt

Elektrizace železnic Praha a.s.,
 Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a,
 14000,
 IČO: 471 15 921

montážní práce a zajištění strojů a zařízení vyžadovaných při plnění veřejné zakázky v dané části díla

PS 100 Chomutov – Cheb, přenosový systém pro zabezpečovací zařízení, PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvina, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň, PS 603 - Radiovníky v úseku Cheb - Chomutov, PS 701- ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O., PS 702-ZOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov, PS 703 - DOK v úseku Locket - Nové Sedlo u Lokte, PS 704 - Zafukování OK v úseku Kadaň Prunéřov - Karlovy Vary, PS 705 - Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role, PS 706 - DOK v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, PS 707 - Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 802 - Přechody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 803 - Přechody mostů v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, SO 805 - Doplnění klimatizací v úseku Chomutov - Cheb, SO 821 - ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 812 - NN přípojka BTS Ottův rybník, SO 813 - NN přípojka BTS Staré Sedlo, SO 814 - NN přípojka BTS Hlavno, SO 815 - NN přípojka BTS Chlum, SO 816 - NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel, SO 98-98 - Všeobecný objekt

BR
 č.j.
 IC

BREMA, spol. s r.o.
č.p. 127, 251 01 Modletice
IČO: 44264321

montážní práce a zajištění strojů a zařízení vyžadovaných při plnění veřejné zakázky v dané části díla

PS 100 Chomutov – Cheb, přenosový systém pro zabezpečovací zařízení, PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvina, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Loket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň, PS 603 - Radiovníky v úseku Cheb - Chomutov, PS 701- ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O., PS 702-ZOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov, PS 703 - DOK v úseku Loket - Nové Sedlo u Lokte, PS 704 - Zafukování OK v úseku Kadaň Prunéřov - Karlovy Vary, PS 705 - Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role, PS 706 - DOK v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, PS 707 - Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 802 - Přechody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 803 - Přechody mostů v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, SO 805 - Doplnění klimatizací v úseku Chomutov - Cheb, SO 821 - ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 812 - NN přípojka BTS Ottův rybník, SO 813 - NN přípojka BTS Staré Sedlo, SO 814 - NN přípojka BTS Hlavno, SO 815 - NN přípojka BTS Chlum, SO 816 - NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel, SO 98-98 - Všeobecný objekt

Delta G s. r. o., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 02362538	Geodetické práce PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvina, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damlice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň, PS 603 - Radiovníky v úseku Cheb - Chomutov, PS 701- ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O., PS 702-ZOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov, PS 703 - DOK v úseku Locket - Nové Sedlo u Lokte, PS 704 - Zafukování OK v úseku Kadaň Prunéřov - Karlovy Vary, PS 705 - Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role, PS 706 - DOK v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, PS 707 - Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 802 - Přechody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 803 - Přechody mostů v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, SO 805 - Doplnění klimatizací v úseku Chomutov - Cheb, SO 821 - ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 812 - NN přípojka BTS Ottův rybník, SO 813 - NN přípojka BTS Staré Sedlo, SO 814 - NN přípojka BTS Hlavno, SO 815 - NN přípojka BTS Chlum, SO 816 - NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel, SO 98-98 - Všeobecný objekt	
CELKEM %		

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací


0%

100%

Harmonogram prací
Název stavby: GSM-R Chomutov - Cheb

Název práce / činnosti	Doba trvání (ve dnech)	Předpokládaný začátek (ve dnech)	Předpokládaný konec (ve dnech)
Podpis smlouvy / zahájení stavby k 04/20			
Přípravné práce			
Úvodní porada			
Zpracování rádlového plánování			
Zpracování projektu stavby, odsouhlasení, projednání			
Vydání stavebního povolení v právní moci			
PS 101 - PS 115			
PS 141 - Uvedení do provozu, úsek Chomutov (mimo) - Karlovy Vary			
PS 151 - Přenosové zařízení, úsek Chomutov (mimo) - Karlovy Vary			
PS 201 - PS 212			
PS 241 - Uvedení do provozu, úsek Karlovy Vary - Cheb			
PS 251 - Přenosové zařízení, úsek Karlovy Vary - Cheb			
PS 301 - PS 304			
PS 341 - Uvedení do provozu v úsecích odbočných tratí			
PS 351 - Přenosové zařízení v úsecích odbočných tratí			
PS 601 - Doplnění centrálních částí sítě GSM-R			
PS 602 - Vybavení hnacích vozidel a uživatelských terminálů			
PS 603 - Radiovníky v úseku Cheb - Chomutov			
PS 611 - Zapojovače v úseku Chomutov (mimo) - Karlovy Vary			
PS 612 - Zapojovače v úseku Karlovy Vary - Cheb			
PS 613 - ŽST Karlovy Vary dolní nádraží - telefonní zapojovač			
PS 614 - Doplnění přenosového systému pro energetické objekty			
PS 615 - Doplnění pokrytí vnitřních prostor staničních objektů			
PS 701 - ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O.			
PS 702 - ZOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov			
PS 703 - DOK v úseku Loket - Nové Sedlo u Lokte			
PS 704 - Zafukování OK v úseku Kadaň Pruněřov - Karlovy Vary			
PS 705 - Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role			
PS 706 - DOK v úseku Chomutov - Kadaň Pruněřov			
PS 707 - Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb			
SO 802 - Přechody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb			
SO 803 - Přechody mostů v úseku Chomutov - Kadaň Pruněřov			
SO 805 - Doplnění klimatizací v úseku Chomutov - Cheb			
SO 821 - ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952			
SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo			
SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb			
SO 812 - NN přípojka BTS Ottův rybník			
SO 813 - NN přípojka BTS Staré Sedlo			
SO 814 - NN přípojka BTS Hlavno			
SO 815 - NN přípojka BTS Chlum			
SO 816 - NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel			
SO 28-98 - Všeobecný objekt			
Provedení akceptačního měření			
Autorský dozor + rezerva			
Dokončení projekční a stavební části			
Vyhotovení a předání dokumentace projektu			
Lhůta pro dokončení projektu			

Harmonogram projektu GSM-R Chomutov - Cheb

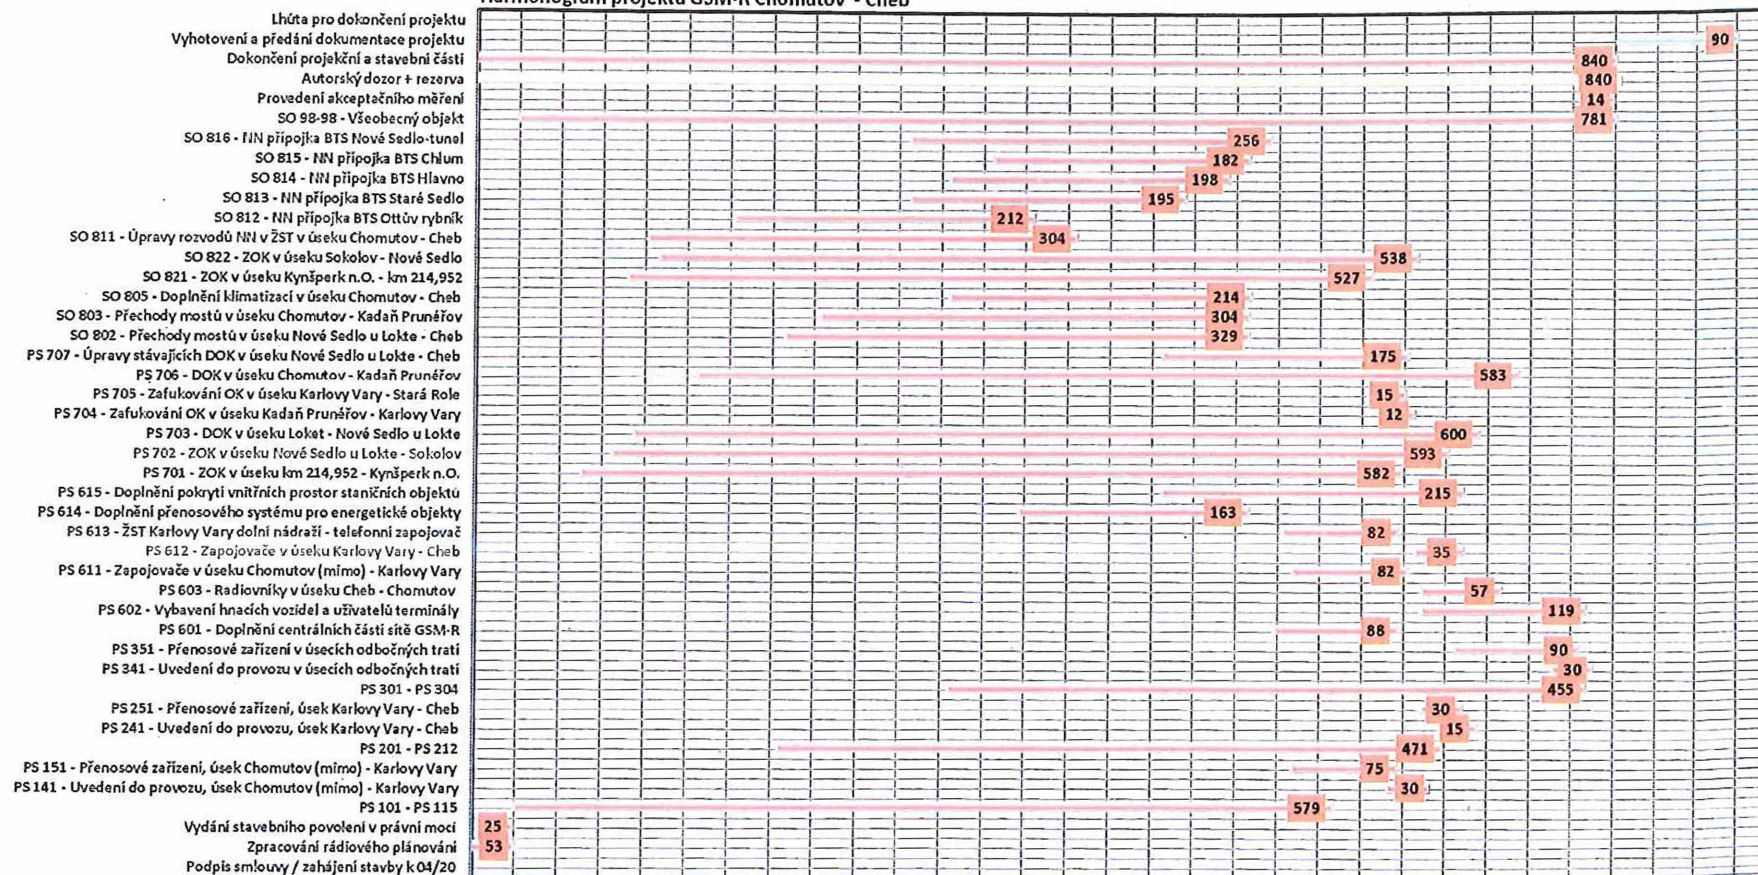

Dodací lhůta projekčních a stavební části-28 M, vyhotovení a předání dokumentace projektu - 3M, celková lhůta projektu 31M


harmonogram

Měsíce	Procenta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

Číslo v %

Harmonogram - finanční objemy po měsících

Měsíce	Procenta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

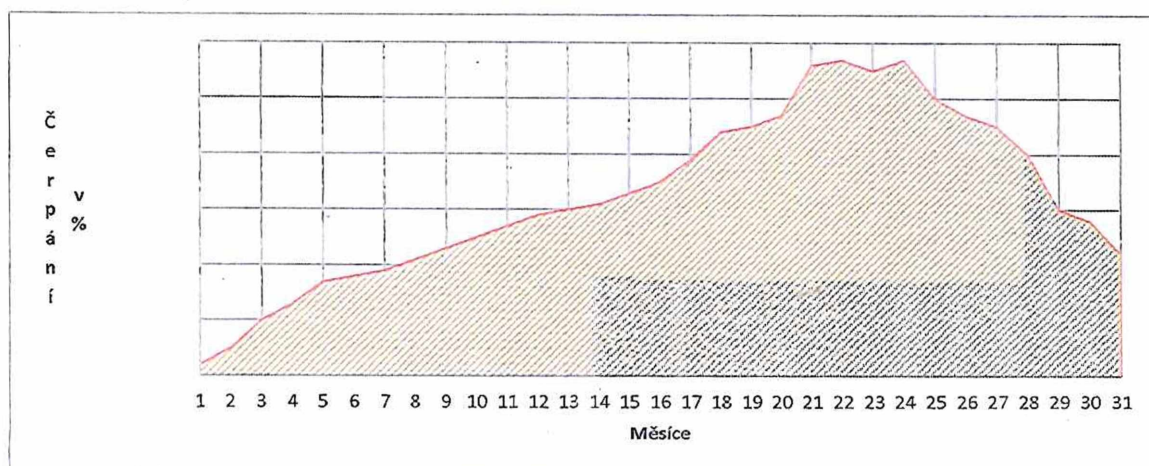

PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Požadavcích objednatel (odst. 2.3.25 Všeobecných technických podmínek).
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovávaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatel, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatel vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatel na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatel požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 738921

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 075d0ab6-e5ef-4215-8f60-89de238bbfa0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.05.2020 09:11:06



1c791e67-05eb-44b2-bd47-90ba8dda41f5
