

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA**  
**„II/111 NECHYBA I – ČESKÝ ŠTERNBERK, PD“**  
mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
č. smlouvy: S-1528/00066001/2020  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **HBH Projekt spol. s r.o.**  
zastoupeným: Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 44961944  
DIČ: CZ44961944  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  
vložka 3996  
**vedoucí společník**

zhotovitelem: **Link projekt s.r.o.**  
zastoupeným: Ing. Petrem Damkem, jednatelem společnosti  
IČ: 27678032  
DIČ: CZ27678032  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  
vložka 51304  
**společník**

zhotovitelem: **GEOtest, a.s.**  
zastoupeným: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva  
IČ: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B,  
vložka 699  
**společník**

zhotovitelem: **GEOSTAR, spol. s r.o.**  
zastoupeným: Ing. Karlem Komínkem, jednatelem společnosti  
IČO: 13690337

DIČ: CZ13690337

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436

**společník**

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOfest / GEOSTAR**

č. smlouvy: 2020/0552

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu k Rámcové dohodě  
(č. smlouvy 8/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: 2018/0832)**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) v oblasti: **„II/111 Nechyba I – Český Sternberk, PD“**.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

**Článek II.**

**Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 2 817 000,- Kč

DPH: 591 570,- Kč

včetně DPH: 3 408 570,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktními osobami objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou:

Ing. Ján Kukura, e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Petr Holan, e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

DSP/PDPS koncept: nejpozději do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy

DSP/PDPS Čistopis: nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP/PDPS od Objednatele

Podání oznámení o provedení údržbových prací: nejpozději do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby

#### **Majetkoprávní přípravy stavby, tj. zda budou výkupy: NE**

Veškeré plnění budou probíhat v souladu s Vyhláškou o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem č. 130/2019 ze dne 23.05.2019.

#### **Výsledky poskytnutých služeb:**

|                                                                                                                        |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Průzkumy a zaměření                                                                                                    | 1x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku                          |
| Dokumentace pro ohlášení stavby<br>nebo k žádosti o stavební povolení (DSP)/Dokumentace<br>pro provedení stavby (PDPS) | 5x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku ,<br>příčemž 1 x oceněná |
| Dokladová část                                                                                                         | 1x v tištěné podobě a 1x digitálně na flash disku                           |
| Originál oznámení o provedení údržbových<br>prací včetně dokladové části, v tištěné podobě                             | (+ 1x kopie na flash disku).                                                |

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech dne

V Brně dne

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic


Středočeského kraje, příspěvková organizace

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Funkce: ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele: HBH Projekt spol. s r.o.




Jméno: Ing. Radovan Hrnčíř

Funkce: ředitel a jednatel společnosti  
na základě plných mocí

## Technická specifikace

**Název akce :** II/111 Nechyba I – Český Šternberk, PD

**Místo realizace akce : silnice II/111 Nechyba I – Český Šternberk, staničení cca 25,500 – 35,201 km**

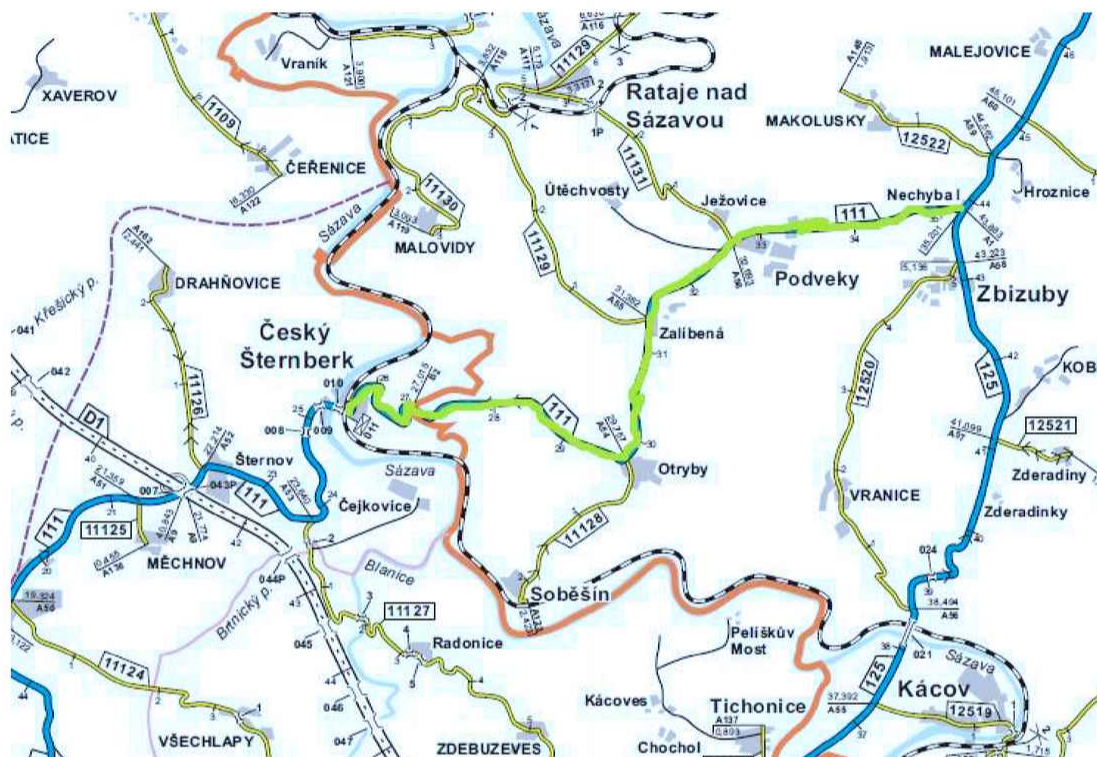

**Základní popis akce:**

Provedení diagnostiky vozovky a zpracování projektové dokumentace (DSP/PDPS) (vč. případné opravy objízdných tras) na opravu silnice II/111 v délce cca 9,700 hm vč. inženýrské činnosti (průzkum inž. sítí, oznámení o provedení údržby dle § 103 zákona č. 183/2006 Sb. dle platných ČSN, TKP, TP a autorského dozoru.

Jedná se o zpracování PD pro stavební řízení (DSP) a zadání stavby (PDPS), bude-li to stavebním úřadem akceptovatelné, pak jednostupňové dokumentace, na opravu silnice II/111 v délce 9,700 km, rozdělení na cca 4-5 úseků (stavebních objektů). Akce zahrnuje diagnostiku vozovky, geodetické zaměření, vyhotovení průzkumu IS a zajištění oznámení o provedení údržby dle § 103 zákona č. 183/2006 Sb. a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných ČSN, TKP a TP. Součástí akce bude též provedení návrhu DZ včetně projednání s dopravním inženýrem Policie ČR (zajištění souhlasného stanoviska).

**Zakázka bude zpracována v rozsahu:**

- a) Průzkumy a zaměření  
Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický průzkum vozovky pro řádné zhotovení DSP a PDPS.  
Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí (zaměření).

Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, soliterních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření.

Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

- b) Dokumentace pro stavební povolení zpracované dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb**“) ve smyslu novely zákona č. 225/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele
- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o VZ**“) a vyhláškou 69/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**vyhláška o předmětu stavebních prací**“). Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.

- d) Výkon IČ k SP

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

- e) Výkon autorského dozoru stavby

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na vyzvu Objednatele. Rozsah činnosti AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz [http://www.pjpk.cz/TKP\\_01.htm](http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm)).

Výkon autorského dozoru stavby



Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz [http://www.pjpk.cz/TKP\\_01.htm](http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm)).

**Součástí akce je i řešení odvodnění a vyčištění příkopů oprava/rekonstrukce všech propustků na trase.**

#### **Popis prací:**

Neurčí-li diagnostika vozovky jiné řešení, bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev, sanace konstrukčních vrstev, obnova nezpevněné krajnice (zazubení stávající svahu silničního tělesa, sanace a zpevnění krajnic), obnova a prohloubení příkopů v celé trase, pokládka ložné a ohrubné vrstvy, dosypání a zhutnění krajnic, oprava (rekonstrukce) propustků, zajištění odvodnění, VZD barvou a po zaježdění plastem.

Veškeré navržené technologie budou dle platných norem a TP, dojde ke sjednocení a provedení VZD v plastu, rektifikaci znaků inženýrských sítí, budou osazena (vyměněna, doplněna) veškerá nutná bezpečnostní zařízení (svodidla, zábradlí, směrové sloupky, zvýšené přechody, opticko-psychologické brzdy, rozbídná...), bude pročištěné, doplněné a obnovené odvodnění komunikace v řešeném úseku.

Celý úsek vykazuje příčné i podélné nerovnosti, výtluky, příčné, podélné a síťové trhliny, propady krajnic, hlučnost a zvýšenou prašnost.

#### **Zdůvodnění záměru akce:**


Odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu silnice, snížení prašnosti, hlučnosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

#### Fotodokumentace:

#### **Kontakt : Oblast Kutná Hora**

Petr Holan, vedoucí TSÚ, oblast Kutná Hora, mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Ján Kukura, silniční technik + DOSS, tel [REDACTED], email: [REDACTED]



## Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

## „II/111 Nechyba I - Český Šternberk“ – PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

| Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH  | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DÚR*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k ÚR*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DSP*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část VD-ZDS*) | Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**) | Cena celkem v Kč bez DPH****) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 85 000 000                                             |                                                                                        |                                                                                                  | 1,899%                                                                                 | 0,714%                                                                                                                    | 0,579%                                                                                    | 800                                               |                               |
| Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci       | x                                                                                      | x                                                                                                | x                                                                                      | x                                                                                                                         | x                                                                                         | 130                                               |                               |
| Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***) | 0                                                                                      | 0                                                                                                | 1 717 000                                                                              | 714 000                                                                                                                   | 552 500                                                                                   | 110 500                                           | 3 094 000                     |
| Nabídka uchazeč v Kč bez DPH                           | 0                                                                                      | 0                                                                                                | 1 614 000                                                                              | 607 000                                                                                                                   | 492 000                                                                                   | 104 000                                           | 2 817 000                     |
| % změna ceny Nabídka/Předpoklad                        | #DĚLENÍ_NULOU!                                                                         | #DĚLENÍ_NULOU!                                                                                   | 94,00%                                                                                 | 85,01%                                                                                                                    | 89,05%                                                                                    | 94,12%                                            | 91,05%                        |

3743740

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*)) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

\*\*\*\*)) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:     | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl: | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:     | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl: | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:  | Ok |

V Brně



Ing. Radovan Hrnčíř  
ředitel a jednatel společnosti  
na základě plných mocí



„II/111 Nechyba I - Český Šternberk“ – PD

| žlutě ocenění uchazeč                                                                                                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 0 popis položky                                                                                                                                                     | Nabídková cena uchazeče v Kč |
| <b>Průzkumy a podklady - DUR</b>                                                                                                                                    |                              |
| Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa, odeslání žádosti na OŽP z důvodu potvrzení, že záměr nepodléhá hodnocení EIA | 0,00                         |
| Předběžný GTP dle TP 76                                                                                                                                             | 0,00                         |
| Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a omíčky, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)                                              | 0,00                         |
| <b>Průzkumy DUR celkem</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                  |
| <b>DÚR</b>                                                                                                                                                          |                              |
| Průvodní zpráva                                                                                                                                                     | 0,00                         |
| Výkresová část                                                                                                                                                      | 0,00                         |
| Dokladová část                                                                                                                                                      | 0,00                         |
| <b>DÚR celkem</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                  |
| <b>DUR celkem včetně průzkumů</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                  |
| <b>Průzkumy a podklady - DSP</b>                                                                                                                                    |                              |
| Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace                                                                 | 310 000,00                   |
| Podrobný GTP dle TP 76                                                                                                                                              | 15 000,00                    |
| Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR                                                                                                                    | 275 000,00                   |
| <b>Průzkumy DSP celkem</b>                                                                                                                                          | <b>600 000,00</b>            |
| <b>DSP</b>                                                                                                                                                          |                              |
| Průvodní zpráva                                                                                                                                                     | 34 000,00                    |
| Souhrnné technické řešení                                                                                                                                           | 36 000,00                    |
| Stavební část                                                                                                                                                       | 750 000,00                   |
| DIO                                                                                                                                                                 | 117 000,00                   |
| ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady                                                                                                                   | 42 000,00                    |
| BOZP                                                                                                                                                                | 35 000,00                    |
| <b>DSP celkem</b>                                                                                                                                                   | <b>1 014 000,00</b>          |
| <b>DSP celkem včetně průzkumů</b>                                                                                                                                   | <b>1 614 000,00</b>          |
| <b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>                                                                                                                                       |                              |
| projednání dokumentace                                                                                                                                              | 0,00                         |
| majetkoprávní podklady                                                                                                                                              | 0,00                         |
| podání žádosti bez poplatků                                                                                                                                         | 0,00                         |
| <b>IČ celkem</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                  |
| <b>IČ-zajištění vydání SP</b>                                                                                                                                       |                              |
| projednání dokumentace                                                                                                                                              | 255 000,00                   |
| majetkoprávní podklady                                                                                                                                              | 162 000,00                   |
| podání žádosti bez poplatků                                                                                                                                         | 190 000,00                   |
| <b>IČ celkem</b>                                                                                                                                                    | <b>607 000,00</b>            |
| <b>PDPS</b>                                                                                                                                                         |                              |
| Technická zpráva                                                                                                                                                    | 41 000,00                    |
| Výkresová část                                                                                                                                                      | 294 000,00                   |
| ZTKP                                                                                                                                                                | 39 000,00                    |
| Soupis prací a rozpočet                                                                                                                                             | 118 000,00                   |
| <b>PDPS celkem</b>                                                                                                                                                  | <b>492 000,00</b>            |
| <b>celkem bez DPH</b>                                                                                                                                               | <b>2 713 000,00</b>          |

V Brně



Ing. Radovan Hrnčíř  
ředitel a jednatel společnosti  
na základě plných mocí

## Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

## „II/111 Nechyba I - Český Šternberk“ – PD

|                                                                               | Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| Cena Technická pomoc v rámci majetkoprávního projednání - vedení aplikace MPP | 0          | 800       | 0              |
| Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby          | 0          |           | 0              |
| Cena AD celkem bez DPH                                                        | 130        |           | 104 000        |
| <b>Celkem</b>                                                                 | <b>130</b> |           | <b>104 000</b> |

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.


| Dílčí činnosti při výkonu AD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AD      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hodin   |
| Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20      |
| Vyřádění k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30      |
| Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20      |
| Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15      |
| Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5       |
| Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul> | 40      |
| celkem hodin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130     |
| Kč/hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800     |
| Celkem Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104 000 |

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Brně



Ing. Radovan Hrnčíř  
ředitel a jednatel společnosti  
na základě plných mocí
